

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

13/6/19

428 /365

quinta-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	B	B

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	2	Servente	2

**Sub Empreiteiros**

Cimentela	2		
Eletricista	1		
Gesseiro	2		

**Principais Atividades do Dia**

- Execução de caixas de passagem das entradas do sistema elétrico e telefonia
- Aplicação de selador acrílico na fachada em placa cimentícia.
- Tratamento de juntas das placas cimentícias da fachada.
- Instalação de forro de gesso acartonado nos boxes de banheiro
- Colocação de guias de meio fio da calçada externa
- Execução da parte em bloco intertravado da calçada externa.
- Instalação elétrica na parte interna da edificação.
- Concretagem de parte da faixa lisa da calçada e assentamento de placa podotátil

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

Realizada vistoria na obra pelos fiscais do TRT eng. André Wagner e eng. Charles para verificação dos serviços executados.  
 Repassado as diretrizes apontadas pela Prefeitura de Canoinhas sobre a calçada, abaixo segue as definições que foram feitas pela fiscalização.  
 - A faixa podotátil deve continuar sendo executada com placa de concreto 40x40cm ao invés de bloco intertravado como foi solicitado pela prefeitura.  
 - Devido a incoerências no projeto quanto a inclinação das rampas e níveis, a rampa deverá ser realizada em duas etapas, conforme croqui em anexo.  
 Conforme acima citado, as rampas deverão ser feitas em duas etapas porém as mesmas já estão executadas, conforme projeto vigente, portanto acarretará em atraso e ônus a empresa pois a mesma deverá ser demolida e refeita. Esse retrabalho é devido a falha do projeto que não verificou as reais cotas de nível e inclinações.  
 Apresentado amostra do acabamento das molduras em grafiatto na fachada externa o qual foi aprovado pelo fiscal eng. André Wagner.

**Observações TRT**

*Fiscalização da SPO TRT realizada nesta data. Substituir os custos de colunas plásticas conforme material base do aditivo de valor 3. Atentar-se a profundidade mínima de 60 cm do cabe de aterramento. Substituir o espelho quebrado em um sqm do posto superior.*

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT


*Victor Ramirez Parquet*

Eng. Civil  
 CREA/SC 057652-9

*ANDRÉ WAGNER*

Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng.º Civil CREA-SC 068 622-7



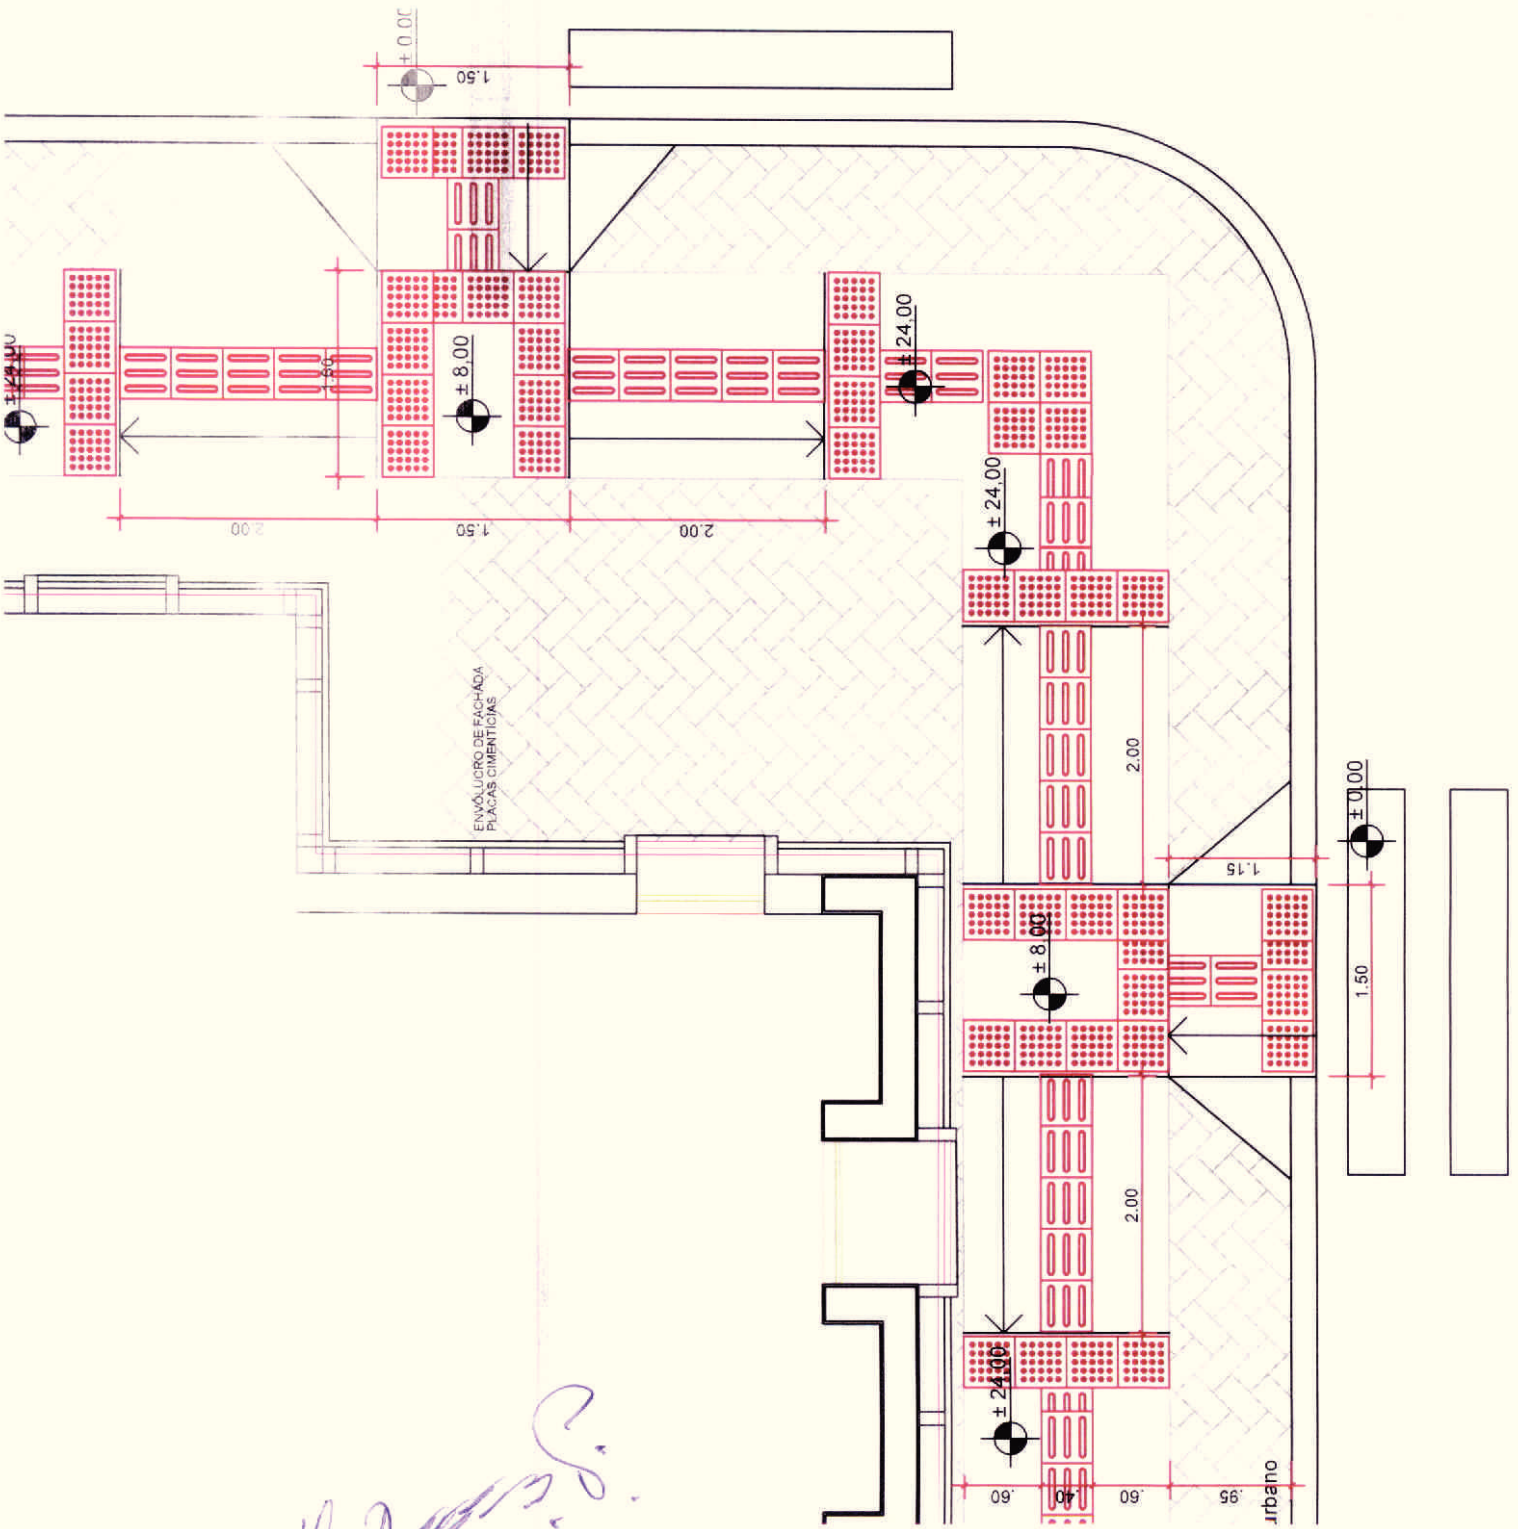

*Victor Ramirez Parquet*  
Eng. Civil  
CREA/SC 057652-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

12/6/19

427 /365

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>NB</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

quarta-feira

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	2	Servente	2

**Sub Empreiteiros**

Cimentela	2		
Eletricista	1		
Gesseiro	2		

**Principais Atividades do Dia**

Assentamento de guia de meio fio na calçada externa.  
execução de calçada em piso podotátil.  
Aplicação de selador acrílico em fachadas.  
posicionamento das caixas de passagem elétrica no estacionamento da edificação.  
Fechamento de paredes em gesso acartonado.  
Execução de estrutura de forro.  
Fechamento de juntas das placas cimentícias da fachada frontal da edificação.  
Execução de caixas de passagem de entrada do sistema elétrico e telefonia.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

Por solicitação nossa rebemos a fiscalização da secretária de planejamento da prefeitura de Canoinhas, na pessoa do sec. Rafael Roeder e fiscal sr. João Litsmaier para verificação dos serviços da calçada, abaixo segue instruções dada por eles.  
-Inclinação máxima da rampa é de 8,33%, portanto, devido a nossa altura do meio fio e caimento solicitado projeto da calçada é impossível a execução conforme projeto, deverá ser feito em 2 lances conforme croqui em anexo.  
- Conforme lei municipal, toda a calçada deve ser em bloco intertravado, incluindo rampas, faixa podotátil e restante do passeio, ainda segundo eles o modelo com placa de cimento costuma dar problema devido a quebra.  
- O modelo com faixa lisa em concreto não está definido na lei municipal portanto poderá acarretar problema no processo de habite-se, porém segundo os mesmo, como já foi executado e está totalmente nivelado o mesmo poderá ser mantido, já o podotátil e as rampas foram solicitadas que a execução seja em bloco intertravado.

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

Victor Ramirez Parquet  
Eng. Civil  
CREA/SC 057652-9

ANDRÉ WAGNER  
Analista Judiciário  
Matrícula: 4262  
Eggº, Civil CREA-SC 068.622-2

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



### DIÁRIO DE OBRA

DATA :

11/6/19

426 /365

#### Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

terça-feira

#### Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	2	Servente	2

#### Sub Empreiteiros

Cimentela	2		
Eletricista	1		
Gesseiro	2		

#### Principais Atividades do Dia

Assentamento de guia de meio fio na calçada externa.  
execução de calçada em piso podotátil.  
instalação de caixas das descidas de captação ode água pluvial.  
posicionamento das caixas de passagem elétrica no estacionamento da edificação.  
Fechamento de paredes em gesso acartonado.  
Execução de estrutura de forro.  
Fechamento de juntas das placas cimentícias da fachada frontal da edificação.  
Execução de caixas de passagem de entrada do sistema elétrico e telefonia.

#### Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

#### Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

  
Victor Ramirez Parquet

Eng. Civil

CREA/SC 057652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário

Matrícula: 4262

Eng.º Civil CREA-SC 068 622-2

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

10/6/19

425 /365

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

segunda-feira

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	2	Servente	2

**Sub Empreiteiros**

Cimentela	2		
Eletricista	1		
Gesseiro	2		

**Principais Atividades do Dia**

Concretagem da faixa lisa do passeio público, conforme projeto arquitetônico.  
Escavação para execução de caixas de passagem de entrada do sistema elétrico e telefonia/dados da edificação.  
Execução de parede do shaft em gesso acartonado.  
Remoção da guia de meio fio da calçada externa.  
Fechamento das juntas das placas cimentícias da fachada com fita telada e massa específica para tratamento de juntas em placa cimentícia.  
Pintura de paredes em gesso acartonado no pavimento superior.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

  
Victor Ramirez Parquet  
Eng. Civil  
CREA/SC 057652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER  
Analista Judiciário  
Matrícula: 4262  
Eng. Civil CREA-SC 068 622-2

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

9/6/19

424 /365

domingo

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
-	-	-

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mestre		Carpinteiro	
Contra-mestre		Encanador	
Pintor		Servente	

**Sub Empreiteiros**


**Principais Atividades do Dia**

Não houve atividade em obra.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*Victor Ramirez Parquet*  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 057652-9

TRT

**ANDRÉ WAGNER**  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng. Civil CREA-SC 068.622-2

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

8/6/19

423 /365

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
-	-	-

sábado

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mestre		Carpinteiro	
Contra-mestre		Encanador	
Pintor		Servente	

**Sub Empreiteiros**

Função	Efetivo	Função	Efetivo

**Principais Atividades do Dia**

Não houve atividade em obra.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

*Victor Ramirez Parquet*  
Eng. Civil  
CREA/SC 057652-9

**ANDRÉ WAGNER**  
Analista Judiciário  
Matricula: 4262  
Eng. Civil CREA-SC 068.622-2

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA:

7/6/19

422 /365

sexta-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>CM</b>	<b>CM</b>	<b>CM</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	2	Servente	2

**Sub Empreiteiros**

Cimentela	2		
Eletricista	1		
Gesseiro	2		

**Principais Atividades do Dia**

Pintura de paredes em gesso acartando no pavimento superior.  
 Instalações elétricas internas.  
 Execução de forro de gesso no hall de entrada.  
 Limpeza da obra.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

Casan verificou a ligação e a mesma é obsoleta e não será mais usada, daremos prosseguimento com a escavação da caixa na locação apontada pela Celesc. Solicitado ao arquiteto do TRT sr. Breno a confirmação da pintura das molduras e laterais das janelas na fachada externa na cor branco, o mesmo confirmou.

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*Victor Ramirez Parquet*  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 057652-7

TRT

**ANDRÉ WAGNER**  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng. Civil CREA-SC 068 622-2



ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

6/6/19	421 /365
quinta-feira	

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>CM</b>	<b>CM</b>	<b>CM</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	2	Servente	2

**Sub Empreiteiros**

Cimentela	2		
Eletricista	1		
Gesseiro	2		

**Principais Atividades do Dia**

Fechamento das juntas das placas cimenticias da fachada com fita telada e massa especifica para tratamento de juntas em placa cimenticia.  
 Pintura de paredes em gesso acartando no pavimento superior.  
 Instalações elétricas internas.  
 Execução de forro de gesso no hall de entrada.  
 Limpeza da obra.  
 Assentamento de capa de muro na platibanda da edificação.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

Conforme descrito no diário anterior, nos deparamos com uma ligação de água no local onde deverá ser feita a caixa de passagem de entrada de energia. Realizada consulta com a Casan para identificação e deslocamento, porém ainda sem resposta.

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*Victor Ramirez Parquet*  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 057653-9

TRT

**ANDRÉ WAGNER**

Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng.º Civil CREA-SC 068.622-9

**ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.**  
**Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA**  
**TRABALHISTA DE CANOINHAS**



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

5/6/19

420 /365

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>NB</b>	<b>NB</b>	<b>NB</b>

quarta-feira

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	2	Servente	2

**Sub Empreiteiros**

Cimentela	2		
Eletricista	1		
Gesseiro	2		

**Principais Atividades do Dia**

Fechamento das juntas das placas cimenticias da fachada com fita telada e massa especifica para tratamento de juntas em placa cimenticia.

Pintura de paredes em gesso acartando no pavimento superior.

Instalações elétricas internas.

Execução de forro de gesso no hall de entrada.

Limpeza da obra.

Assentamento de capa de muro na platibanda da edificação.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

Durante a a escavação para execução das caixas de passagem da entrada de energia foi encontrada a entrada de água do prédio vizinho, solicitado ao eng. Fiscal Charles se deveríamos deslocar a caixa ou deixar a tubulação de água por dentro da caixa.

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

*Victor Ramirez Parquet*  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 057453-7

**ANDRÉ WAGNER**  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng. Civil CREA-SC 068.622-2

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

4/6/19

419 /365

terça-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	NB	NB

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	2	Servente	2

**Sub Empreiteiros**

Cimentela	2		
Eletricista	1		
Gesseiro	2		

**Principais Atividades do Dia**

Concretagem da faixa lisa do passeio público, conforme projeto arquitetônico.  
 Execução de forro de gesso acartonado no hall de entrada do prédio.  
 Execução de paredes em gesso acartonado e acabamentos em gesso.  
 Pintura de paredes internas do pavimento superior.  
 Tratamento de juntas das paredes de gesso acartando no pavimento térreo.  
 Posicionamento de cabos de cobre nú do sistema de aterramento da edificação

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*Victor Ramirez Parquet*  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 057652-9

TRT

**ANDRÉ WAGNER**

Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng. Civil CREA-SC 068.622-2

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

3/6/19

418 /365

segunda-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>CM</b>	<b>CM</b>	<b>CM</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	2

**Sub Empreiteiros**

Eletricista	1		
Gesseiro	2		

**Principais Atividades do Dia**

- Execução de forro de gesso no pavimento térreo.
- Execução de parede em gesso acarotando no pavimento térreo.
- Limpeza geral da obra.
- Impossibilidade de concretagem da calçada devido a incidência de chuva na data.
- Adiada a concretagem para o próximo dia.
- Posicionamento de cabos de cobre nú do sistema de aterramento da edificação

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*Victor Ramirez Parquet*  
 Eng. Civil  
 CRE/SC 057692-9

TRT

**ANDRÉ WAGNER**  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng. Civil CREA-SC 068.622-2

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

2/6/19

417 /365

domingo

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
-	-	-

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mestre		Carpinteiro	
Contra-mestre		Encanador	
Pintor		Servente	

**Sub Empreiteiros**


**Principais Atividades do Dia**

Não houve atividade em obra.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*Victor Ramirez Parquet*

Eng. Civil

CREA/TC 057654-7

TRT

**ANDRÉ WAGNER**

Analista Judiciário

Matrícula: 4262

Eng. Civil CREA-SC 068.622-7

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

1/6/19

416 /365

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
-	-	-

sábado

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mestre		Carpinteiro	
Contra-mestre		Encanador	
Pintor		Servente	

**Sub Empreiteiros**


**Principais Atividades do Dia**

**Não houve atividade em obra.**

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

*Victor Ramirez Parquet*  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 057452-9

*ANDRÉ WAGNER*  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng. Civil CREA-SC 068 622-2



ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

31/5/19

415 /365

sexta-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>CM</b>	<b>CM</b>	<b>CM</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	2

**Sub Empreiteiros**

Eletricista	1		
Gesseiro	2		

**Principais Atividades do Dia**

Impossibilidade de concretagem da calçada devido a incidência de chuva na data.  
Adiada a concretagem para o próximo dia.  
Pintura das paredes internas do pavimento superior.  
Execução de paredes em gesso acartando do pavimento térreo.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

*Victor Ramirez Parquet*  
Eng. Civil  
CREA/SC 057452-7

**ANDRÉ WAGNER**

Analista Judiciário  
Matrícula: 4262  
Eng. Civil CREA-SC 068.622-2

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

30/5/19

414 /365

quinta-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>CM</b>	<b>CM</b>	<b>CM</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	2

**Sub Empreiteiros**

Eletricista	1		
Gesseiro	2		

**Principais Atividades do Dia**

Impossibilidade de concretagem da calçada devido a incidência de chuva na data.  
 Adiada a concretagem para o próximo dia.  
 Pintura das paredes internas do pavimento superior.  
 Execução de paredes em gesso acartando do pavimento térreo.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

Realizada consulta com a Celesc referente a locação das caixas de passagem da entrada do sistema elétrico, a mesma deve ficar a 70 centímetros do poste existente.

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

*Wagner Parquet*  
 Eng. Civil  
 CRECI/SC 057651-9

**ANDRÉ WAGNER**  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Ent. Civil CREA-SC 068.622-2



ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

29/5/19

413 /365

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>CM</b>	<b>CM</b>	<b>CM</b>

quarta-feira

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	2	Servente	2

**Sub Empreiteiros**

Eletricista	1		
Gesseiro	2		

**Principais Atividades do Dia**

- Arremates com massa PVA nas paredes internas do pavimento superior
- Pintura das paredes internas do pavimento superior com tinta acrílica cor palha.
- Limpeza do Pavimento superior.
- Execução de paredes em gesso acartonado no pavimento térreo.
- Pintura de portas internas com tinta esmalte sintético fosco na cor cinza médio.
- Impossibilidade de concretagem da calçada devido a incidência de chuva na data.
- Adiada a concretagem para o próximo dia.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

Reciclagem do treinamento sobre a NR-18 e NR-35 abordando tópicos como segurança em trabalho em altura e utilização de EPI's.

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

*Victor Ranziroz Parquet*  
Eng. CMI  
CREA/SC 057652-9

**ANDRÉ WAGNER**

Analista Judiciário  
Matrícula: 4262  
Eng. Civil CREA SC 068.622-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

28/5/19

412 /365

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
CM	CM	CM

terça-feira

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	2	Servente	2

**Sub Empreiteiros**

Eletricista	1		
Gesseiro	2		

**Principais Atividades do Dia**

Impossibilidade de concretagem da calçada devido a incidência de chuva na data.  
 Adiada a concretagem para o próximo dia.  
 Pintura das paredes internas do pavimento superior.  
 Pintura em esmalte sintético das portas internas de madeira.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*[Handwritten Signature]*  
 Victor Ramirez Parquet  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 057652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng. Civil CREA-SC 068 622-2

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

27/5/19

411 /365

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>CM</b>	<b>CM</b>	<b>CM</b>

segunda-feira

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	2	Servente	2

**Sub Empreiteiros**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Eletricista	1		
Gesseiro	2		

**Principais Atividades do Dia**

- Impossibilidade de concretagem da calçada devido a incidência de chuva na data.
- Adiada a concretagem para o próximo dia.
- Pintura das paredes internas do pavimento superior.
- Pintura em esmalte sintético das portas internas de madeira.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA:**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

*Victor Ramirez Parquet*  
Eng. Civil  
CREA/SC 067652-9

**ANDRÉ WAGNER**  
Analista Judiciário  
Matrícula: 4262  
Eng.º CREA-SC 068.622-2

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

26/5/19

410 /365

domingo

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
-	-	-

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mestre		Carpinteiro	
Contra-mestre		Encanador	
Pintor		Servente	

**Sub Empreiteiros**


**Principais Atividades do Dia**

Não houve atividade em obra.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

*Victor Ramirez Parquet*  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 05/652-9

**ANDRÉ WAGNER**  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng. Civil CREA-SC 068.622-2

**ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.**  
**Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA**  
**TRABALHISTA DE CANOINHAS**



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

25/5/19

409 /365

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
-	-	-

sábado

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mestre		Carpinteiro	
Contra-mestre		Encanador	
Pintor		Servente	

**Sub Empreiteiros**


**Principais Atividades do Dia**

**Não houve atividade em obra.**

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*Victor Ramirez Parquet*  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 057452-9

TRT

**ANDRÉ WAGNER**

Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng. Civil CREA-SC 068.622-2

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

24/5/19

408 /365

sexta-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>CM</b>	<b>CM</b>	<b>CM</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	2	Servente	2

**Sub Empreiteiros**

Eletricista	1		
Gesseiro	2		

**Principais Atividades do Dia**

- Posicionamento de armaduras na faixa lisa da calçada externa da edificação para posterior concretagem.
- Montagem de formas da faixa lisa da calçada externa.
- Pintura das paredes internas do pavimento superior.
- Pintura em esmalte sintético das portas internas de madeira.
- Montagem de estrutura de forro fibro mineral.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*Victor Ramirez Parquet*  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 057652-2

TRT

**ANDRÉ WAGNER**

Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng. Civil CREA-SC 068.622-2

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

23/5/19

407 /365

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
CM	CM	CM

quinta-feira

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	2	Servente	2

**Sub Empreiteiros**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Eletricista	1		
Gesseiro	2		

**Principais Atividades do Dia**

Posicionamento de armaduras na faixa lisa da calçada externa da edificação para posterior concretagem.

Montagem de formas da faixa lisa da calçada externa.

Pintura das paredes internas do pavimento superior.

Arremates em paredes com massa PVA e posterior lixamento.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*Victor Ramirez Parquet*  
Eng. Civil  
CRE-15C 057452-9

TRT

**ANDRÉ WAGNER**

Analista Judiciário  
Matrícula: 4262  
Eng. Civil CREA-SC 068 622-2

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

22/5/19

406 /365

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>CM</b>	<b>CM</b>	<b>CM</b>

quarta-feira

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	2	Servente	2

**Sub Empreiteiros**

Eletricista	1		
Gesseiro	2		

**Principais Atividades do Dia**

Posicionamento de armaduras na faixa lisa da calçada externa da edificação para posterior concretagem.

Montagem de formas da faixa lisa da calçada externa.

Pintura das paredes internas do pavimento superior.

Arremates em paredes com massa PVA e posterior lixamento.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

*Victor Raimundo Parquet*  
Eng. Civil  
CREA/SC 057452-9

**ANDRÉ WAGNER**

Analista Judiciário  
Matrícula: 4262  
Eng. Civil CREA-SC 068.622-2



ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

21/5/19

405 /365

terça-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
CM	CM	CM

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	1
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	1	Servente	5

**Sub Empreiteiros**

Nome	Função	Efetivo

**Principais Atividades do Dia**

Posicionamento de armaduras na faixa lisa da calçada externa da edificação para posterior concretagem.

Montagem de formas da faixa lisa da calçada externa.

Pintura das paredes internas do pavimento superior.

Arremates em paredes com massa PVA e posterior lixamento.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*Victor Ramirez Parquet*  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 057452-2

TRT

**ANDRÉ WAGNER**

Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng. Civil CREA-SC 068.622-2

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

20/5/19

404 /365

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>CM</b>	<b>CM</b>	<b>CM</b>

segunda-feira

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	1
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	1	Servente	5

**Sub Empreiteiros**

Nome	Função	Efetivo

**Principais Atividades do Dia**

Posicionamento de armaduras na faixa lisa da calçada externa da edificação para posterior concretagem.

Montagem de formas da faixa lisa da calçada externa.

Pintura das paredes internas do pavimento superior.

Arremates em paredes com massa PVA e posterior lixamento.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*Victor Ramirez Parquet*

Eng. Civil  
CREA/SC 057652-7

TRT

**ANDRÉ WAGNER**

Analista Judiciário  
Matricula: 4262  
Eng. Civil CREA-SC 068.622-2

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
TRABALHISTA DE CANOINHAS



ANDRE  
WAGNER

### DIÁRIO DE OBRA

DATA :

19/5/19

403 /365

domingo

#### Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
-	-	-

#### Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mesire		Carpinteiro	
Contra-mestre		Encanador	
Pintor		Servente	

#### Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo

#### Principais Atividades do Dia

Não houve atividade em obra.

#### Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

#### Observações TRT

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*Victor Ramirez Parques*

Eng. Civil  
CREA-SC 057452-9

TRT

**ANDRE WAGNER**

Analista Judiciário

Matrícula: 4262

Eng. Civil CREA-SC 068.622-2

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

18/5/19

402 /365

sábado

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
-	-	-

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mestre		Carpinteiro	
Contra-mestre		Encanador	
Pintor		Servente	

**Sub Empreiteiros**


**Principais Atividades do Dia**

Não houve atividade em obra.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

*Victor Ramirez Parquet*  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 057652-7

**ANDRÉ WAGNER**  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Reg. Civil CREA-SC 068.622-2

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

17/5/19

401 /365

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>CM</b>	<b>CM</b>	<b>CM</b>

sexta-feira

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	1
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	1	Servente	5

**Sub Empreiteiros**

Nome	Função	Efetivo

**Principais Atividades do Dia**

- Remoção do transformador antigo da edificação com auxílio de munck.
- Montagem de formas da faixa lisa da calçada externa.
- Pintura das paredes internas do pavimento superior.
- Arremates em paredes com massa PVA e posterior lixamento.
- Escavação de valetas para passagem dos cabos de cobre nú do sistema de aterramento da edificação.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

*Victor*  
 Victor Ramirez Parques  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 057452-4

**ANDRÉ WAGNER**  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng. Civil CREA-SC 068.622-2

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA:

16/5/19

400 /365

quinta-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	1
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	1	Servente	5

**Sub Empreiteiros**

Nome	Função	Efetivo

**Principais Atividades do Dia**

- Montagem de formas da faixa lisa do passeio público.
- Pintura das paredes internas do pavimento superior.
- Arremates em paredes com massa PVA e posterior lixamento.
- Escavação de valetas para passagem dos cabos de cobre nú do sistema de aterramento da edificação.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*Victor Romero Parquet*  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 057452-7

TRT

*AK*  
**ANDRÉ WAGNER**  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng.º Civil CREA-SC 068.622-2

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

15/5/19

399 /365

quarta-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	1
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	1	Servente	5

**Sub Empreiteiros**


**Principais Atividades do Dia**

Montagem de formas da faixa lisa da calçada externa.  
 Pintura das paredes internas do pavimento superior.  
 Arremates em paredes com massa PVA e posterior lixamento.  
 Escavação de valetas para passagem dos cabos de cobre nú do sistema de aterramento da edificação.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*Victor Ramirez Parquet*  
 Eng. Civil  
 CREA/CC 057654-9

TRT

**ANDRÉ WAGNER**  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng. Civil CREA-SC 068.622-2

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

14/5/19

398 /365

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>CM</b>	<b>CM</b>	<b>CM</b>

terça-feira

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	1
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	1	Servente	5

**Sub Empreiteiros**

Nome	Função	Efetivo

**Principais Atividades do Dia**

Montagem de formas da faixa lisa da calçada externa.  
 Pintura das paredes internas do pavimento superior.  
 Arremates em paredes com massa PVA e posterior lixamento.  
 Escavação de valetas para passagem dos cabos de cobre nú do sistema de aterramento da edificação.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

Victor Ramirez Parquet  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 057352-7

ANDRÉ WAGNER  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng. Civil CREA-SC 068.622-2



ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA:

13/5/19

397 /365

segunda-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	NB	NB

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	1
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	1	Servente	5

**Sub Empreiteiros**


**Principais Atividades do Dia**

Montagem de formas da faixa lisa da calçada externa.  
 Pintura das paredes internas do pavimento superior.  
 Arremates em paredes com massa PVA e posterior lixamento.  
 Escavação de valetas para passagem dos cabos de cobre nú do sistema de aterramento da edificação.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*Victor Ramirez Parquet*  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 057852-9

TRT

**ANDRE WAGNER**  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng. Civil CREA-SC 068.622-7

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA:

12/5/19

396 /365

domingo

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
-	-	-

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mestre		Carpinteiro	
Contra-mestre		Encanador	
Pintor		Servente	

**Sub Empreiteiros**


**Principais Atividades do Dia**

Não houve atividade em obra.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*Victor Ramirez Parquet*  
 Eng. Civil

CREA/SC 057652-9

TRT

**ANDRÉ WAGNER**

Analista Judiciário

Matrícula: 4262

Eng. Civil CREA-SC 068.622-9

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

11/5/19

395 /365

sábado

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
-	-	-

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mestre		Carpinteiro	
Contra-mestre		Encanador	
Pintor		Servente	

**Sub Empreiteiros**


**Principais Atividades do Dia**

Não houve atividade em obra.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

*Victor Ramirez Parquet*  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 057652-7

TRT

**ANDRÉ WAGNER**  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng.º Civil CREA-SC 068.622-2

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

10/5/19

394 /365

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

sexta-feira

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	1
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	1	Servente	5

**Sub Empreiteiros**


**Principais Atividades do Dia**

Execução de caixa de passagem do sistema de lógica da edificação  
 limpeza geral do pavimento superior.  
 Pintura das paredes internas do pavimento superior.  
 Arremates em paredes com massa PVA e posterior lixamento.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

*Victor Ramirez Parquet*  
 Eng. Civil  
 CREA/RSC 057652-9

**ANDRÉ WAGNER**  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng. Civil CREA-SC 068.622-2

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

9/5/19

393 /365

quinta-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	1
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	1	Servente	5

**Sub Empreiteiros**


**Principais Atividades do Dia**

Execução de caixa de passagem do sistema de lógica da edificação  
 limpeza geral do pavimento superior.  
 Pintura das paredes internas do pavimento superior.  
 Arremates em paredes com massa PVA e posterior lixamento.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

*Victor Ramirez Parquet*  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 057652-7

**ANDRÉ WAGNER**  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng°. Civil CREA-SC 068 622-2

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA:

8/5/19

392 /365

quarta-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	1
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	1	Servente	5

**Sub Empreiteiros**


**Principais Atividades do Dia**

Execução de caixa de passagem do sistema de lógica da edificação  
 limpeza geral do pavimento superior.  
 Pintura das paredes internas do pavimento superior.  
 Arremates em paredes com massa PVA e posterior lixamento.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

*[Handwritten Signature]*  
 Victor Ranzires Parquet  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 057652-7

**ANDRE WAGNER**  
 Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng. Civil CREA-SC 068.622-2

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA  
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA :

7/5/19

391 /365

terça-feira

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>NB</b>	<b>NB</b>	<b>B</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	1
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	1	Servente	5

**Sub Empreiteiros**


**Principais Atividades do Dia**

Arremates em azulejos dos banheiros.  
 Pintura das paredes internas do pavimento superior.  
 Arremates em paredes com massa PVA e posterior lixamento.

**Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.**

**Observações TRT**

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

*Victor Ramirez Parquet*  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 057652-7

**ANDRÉ WAGNER**

Analista Judiciário  
 Matrícula: 4262  
 Eng.º. Civil CREA-SC.068 622-7

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**Medição:** 18

**Período:** 07/05/2019 a 13/06/2019

**Resumo Atividades:** Execução de caixa de passagem da entrada do sistema elétrico e telefonia, remoção das guias de meio fio, assentamento de novas guias de meio fio, assentamento de bloco intertravado na calçada externa, fechamento de juntas da fachada em placa cimentícia, aplicação de selador acrílico em fachada de placa cimentícia, instalações elétricas, fechamento de forros em gesso acartonado em placas ST e RU, execução de novas paredes em gesso acartonado, concretagem de faixa lisa da calçada, assentamento de placa podotátil na calçada externa, pintura interna no pavimento superior.

**FOTOS ANEXAS**

FOTOS	COMENTÁRIOS
	<p>Execução de Caixas de passagem da entrada do sistema elétrico e telefonia.</p>
	<p>Assentamento de bloco intertravado sobre colchão de pó de pedra</p>








Instalação de caixas de passagem do sistema de captação de água pluvial da cobertura



Remoção de guia de meio fio existente para posterior colocação de peças novas.



Instalação de luminárias no pavimento superior.




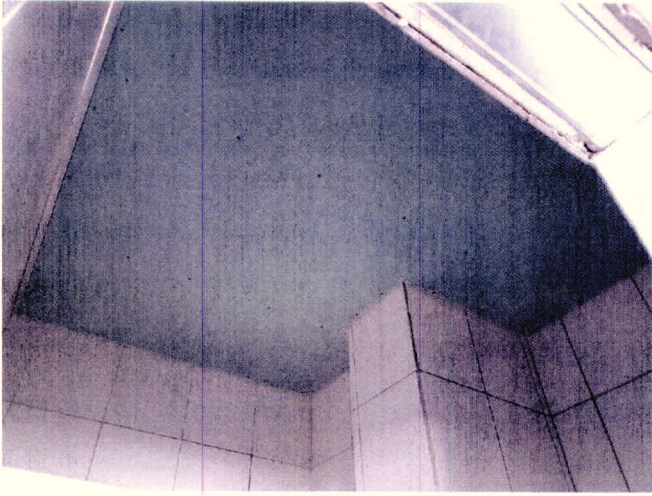

Forro em gesso acartonado no hall de entrada e paredes em gesso acartonado na escada conforme solicitação.






Aplicação de fita telada com massa específica para placa cimentícia na fachada externa.



Remoção das guias de meio fio antigas.

	<p>Execução do shaft das instalações.</p>
	<p>Instalação de forro de gesso acartonado com placa RU em áreas molhadas.</p>
	<p>Paredes do pavimento superior pintadas com tinta acrílica na cor palha.</p>



	<p>Parede em gesso acartonado com estrutura reforçada e tábuas para fixação do corrimão.</p>
	<p>Forro em placas de gesso acartonado no hall de entrada.</p>
	<p>Instalação de caixas de passagem elétrica na parte externa do prédio.</p>





Fachada em placa cimentícia com juntas fechadas com fita telada adesiva e massa específica para placa cimentícia.



Aplicação de selador acrílico em fachada em placa cimentícia.



Calçada externa – Faixa lisa, placa podotátil e bloco intertravado.





Calçada externa  
– Faixa lisa,  
placa podotátil e  
bloco  
intertravado.

  
VICTOR RAMIREZ PARQUET  
(Diretor Técnico)  
Engenheiro Civil  
CREA-057.652-9

AO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIÃO  
Rua Esteves Junior, 395  
Centro – Florianópolis – SC  
A/C: Eng. André Wagner

Ref.: Documentos Medição de obra

N/Ref.: 025/CNH/2019

Florianópolis, 14 de Junho de 2.019.

Prezados Senhores,

Vimos por meio deste fazer entrega dos documentos relativo à 17ª medição da obra "reforma do prédio que abrigará a nova sede da Vara do Trabalho de Canoas", convencionado pelo contrato número CP 9376/2017-1, no valor total de R\$ 99.723,42 (noventa e nove mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), sendo de mão de obra R\$ 30.516,90 e de material R\$ 69.211,52, bem como os documentos requeridos, conforme segue:

- Diário de Obras;
- Relatório fotográfico;
- Planilha de medição do período;
- Guia FGTS competência 05/2019 e comprovante de pagamento;
- Guia GPS competência 05/2019 e comprovante de pagamento;
- Nota fiscal nº 91
- Documentos contábeis competência 05/2019
- Curso de Reciclagem da NR 35 e NR 18
- Ficha de EPI

Qualquer dúvida quanto aos documentos entregues, estamos ao inteiro dispor.

Cordiais cumprimentos,



**VICTOR RAMIREZ PARQUET**  
(Diretor Técnico)  
CPF: 713.186.319-04



FOLHA DE MEDIÇÃO

ITEM	REFER.	SERVIÇO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM B.D.I.	VALOR ATUAL	ESTA MEDIÇÃO	QUANTITATIVO		VALORES R\$1	
								ANTERIOR ACUMULADA	ACUMULADA	ANTERIOR ACUMULADA	ACUMULADA
1.1	93895	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5 HORAS SEMANAS	MES	2,00	1.780,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	COMP ADM.001	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 6	MES	2,00	1.780,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	COMP ADM.002	ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 6	MES	2,00	1.780,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	93372	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS	MES	12,00	7.700,00	92.400,00	0,28	11,72	12,00	90.240,00	92.400,00
1.5	ART	ART CREA SCS	UNID	10,00	101,91	1.019,10	-1,00	11,00	10,00	1.019,10	1.019,10
1.6	Arbitrio	Itens de Licitação e despesas administrativas	MES	12,00	187,50	2.250,00	0,30	11,70	12,00	2.250,00	2.250,00
1.7	Arbitrio	Itens de Consumo Mensal	MES	12,00	687,50	8.250,00	0,28	11,72	12,00	8.250,00	8.250,00
1.8	Arbitrio	Ass Buro e Data Book	MES	12,00	500,00	6.000,00	0,00	10,42	10,42	5.210,00	5.210,00
1.9	COI ACOM.001	Validação de Elicitação Engenheria (emissão de ENCC por CDA cadastrada no Siqui) Insc de engenharia - obras, reformas e/ou ampliações	MP	1,00076	2.351,79	2.351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,79
2.1	73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERREIRO COM ARBORES ATE Q 15CM UTILIZANDO TRATOR DE ESTERILAS PAVIMENTO DE C/TA E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	260,00	0,40	104,00	0,00	260,00	260,00	104,00	104,00
2.2	742201	CANTINEIRO DE OBRA	M2	150,00	56,41	8.461,50	0,00	150,00	150,00	8.461,50	8.461,50
2.3	7422971	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	5,40	452,85	2.445,39	0,00	5,40	5,40	2.445,39	2.445,39
2.4	3777	LOJA PLASTICA PRETA E=150 MICRA	M2	500,00	1,28	640,00	0,00	120,00	120,00	153,60	153,60
2.5	95135	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	MMES	192,50	33,90	6.489,50	0,00	192,50	192,00	6.489,50	6.489,50
2.5.2	84111	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	M2	50,00	3,89	194,50	0,00	50,00	50,00	194,50	194,50
3.1	7389972	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS FURADOS	M3	200,00	75,41	15.082,00	0,00	200,00	200,00	15.082,00	15.082,00
3.2	COMP ARG.013	DEMOIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL OU LAMINADO	M2	100,00	1,95	195,00	0,00	100,00	100,00	195,00	195,00
3.3	7380271	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	800,00	8,80	7.040,00	0,00	800,00	800,00	7.040,00	7.040,00
3.4	COMP ARG.002	DEMOIÇÃO DE CONTRA PISO	M2	655,00	18,55	13.000,75	0,00	655,00	655,00	13.000,75	13.000,75
3.5	COMP ARG.003	DEMOIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	655,00	11,14	7.297,70	0,00	655,00	655,00	7.297,70	7.297,70
3.6	85371	REMOÇÃO DE PISO EM CARPETE	M2	57,51	3,29	188,21	0,00	57,51	57,51	188,21	188,21
3.7	85375	REMOÇÃO DE BORDO DE C/TA IMPLANTAMENTO	M2	260,00	13,98	3.634,80	0,00	260,00	260,00	3.634,80	3.634,80
3.8	COMP ARG.004	REMOÇÃO DE PASSADILHO EM PISO INERTIVADO	M2	200,00	28,58	5.716,00	0,00	200,00	200,00	5.716,00	5.716,00
3.9	85405	REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE MADEIRAS EM ARGAMASSA	M2	205,00	49,96	10.241,80	0,00	205,00	205,00	10.241,80	10.241,80
3.10	84182	DEMOIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR /VIGA /LAJE) - INCL EMPILHAGEM LATERAL NO CANTINEIRO	M3	2,70	338,76	915,55	0,00	2,70	2,70	915,55	915,55
3.11	84152	DEMOIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (PILAR /VIGA /LAJE) - INCL EMPILHAGEM LATERAL NO CANTINEIRO	M3	2,70	338,76	915,55	0,00	2,70	2,70	915,55	915,55
3.12	89293	DEMOIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOÇÃO	M2	10,50	33,50	351,75	0,00	10,50	10,50	351,75	351,75
3.13	COMP ARG.017	REMOÇÃO/GUARDA-CORPO E COBRANÇA	M	41,70	35,01	1.460,94	0,00	41,70	41,70	1.460,94	1.460,94
3.14	72224	DEMOIÇÃO E REMOÇÃO DO TELHADO	M2	465,00	10,55	4.905,75	0,00	465,00	465,00	4.905,75	4.905,75
3.14.1	72224	DEMOIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M2	200,00	20,54	4.108,00	0,00	200,00	200,00	4.108,00	4.108,00
3.14.2	72228	RETRABA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOUREAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M2	20,00	17,60	352,00	0,00	20,00	20,00	352,00	352,00
3.15	85336	RETRABA DE EQUILIBRANTES METÁLICOS	M2	20,00	17,60	352,00	0,00	20,00	20,00	352,00	352,00
3.16	85333	RETRABA DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	UN	10,00	20,70	207,00	0,00	10,00	10,00	207,00	207,00
3.16.1	85333	RETRABA DE AZEITEIROS SANITÁRIOS	UN	10,00	11,73	117,30	0,00	10,00	10,00	117,30	117,30
3.16.2	85374	RETRABA DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	10,00	11,73	117,30	0,00	10,00	10,00	117,30	117,30



Documento 512 do PROAD 9379/2017. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.TMDP.RSND: <https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>





ITEM	REFER.	SERVIÇO	UN	QUANT															
6.2		MOLDURAS DAS ESQUADRIAS																	
6.2.1		MOLDURAS DAS ABERTURAS EXTERNAS 15cm EM PLACA CIMENTICA 12mm FALDAS EM PERFIS METALICOS CONFORME PROJETO	M	380,28	86,75	32.608,07	0,00	296,00	0,00	20.237,00	0,00	20.237,00							
6.3		REVESTIMENTOS EXTERNOS																	
6.3.3	COI ARQ.008	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO COM GRANITO FLAMEADO PADRAO ARABESCO OU SIMILAR	M2	77,34	546,44	42.416,35	0,00	77,34	0,00	42.416,35	0,00	42.416,35							
6.3.4		FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FACHADA CIMENTICA (incluindo estrutura metálica e mda de obra especializada, conforme memoria descritiva e cotação com detalhamento dos serviços)		1,00	99875,00	96.875,00	0,00	0,65	0,00	62.998,75	0,00	62.998,75							
7.1	96115	FORRO DE TERRA MINERAL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE TACAO AT 0,92017 P	M2	820,00	75,64	61.532,80	0,00	738,00	0,00	58.379,52	0,00	55.379,52							
7.2	96114	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO AT 0,92017 P	M2	85,00	60,93	5.179,05	50,00	5,00	0,00	304,65	0,00	3.351,15							
8.1		TELHAS																	
8.1.1	94278	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOCOLISTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO, AT 0,660016	M2	510,45	108,23	55.246,00	0,00	510,45	0,00	55.246,00	0,00	55.246,00							
8.1.2	94662	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO DUAS DEMAS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	510,45	28,61	14.592,93	0,00	510,45	0,00	14.592,93	0,00	14.592,93							
8.2		ESTRUTURA METALICA																	
8.2.1	739701	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFL 172 X 5 1/4	KG	5.468,00	8,25	45.083,08	0,00	5.468,00	0,00	45.083,08	0,00	45.083,08							
8.2.2	94680	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO PARA ESTRUTURA METALICA UMA DEMAO ESPESURA DE 25 MICRA	M2	350,00	7,29	2.551,50	0,00	350,00	0,00	2.551,50	0,00	2.551,50							
9		INTERMEDIALIZACAO																	
9.1		IntermedIALIZACAO dos reguladores e petitas das Esquadras de Alumínio	m	135,00	22,75	3.071,25	0,00	135,00	0,00	3.071,25	0,00	3.071,25							
10		PAVIMENTACAO																	
10.1		PAVIMENTACAO INTERNAS																	
10.1.1	67640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONIERA 400 L APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE ADRERDO, ESPESURA COM NF 06/2014	M2	190,00	31,35	5.965,50	0,00	190,00	0,00	5.965,50	0,00	5.965,50							
10.1.3	72186	PISO VINILICO SEMPLEVEL TACAO LISO, ESPESURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	M2	655,00	116,88	76.566,40	0,00	655,00	0,00	76.566,40	0,00	76.566,40							
10.1.4		PISO VINILICO SEMPLEVEL TACAO LISO, ESPESURA 3,2MM, PISO Ceramico Inia Uniter AC 30x30 cm cor Branco com acabamento de superfiie esmerilado ELITE de su equivalente (PSI), incluindo assentamento e limpeza	M2	110,85	64,64	6.056,84	0,00	110,85	0,00	6.056,84	0,00	6.056,84							
10.1.5	COMP ARQ.025	REPOSICAO DE PISOS PODOTATIS AREA INTERNA	M2	28,00	187,21	5.241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10.1.6	COMP ARQ.025	REPOSICAO DE PISOS PODOTATIS AREA INTERNA	M	320,50	23,97	7.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10.1.7	64161	SOLEIRA DE MARMOLE BRANCO, LANGUIRA 15CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	3,50	80,85	282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10.1.8	COMP ARQ.006	ASSENTAMENTO DE PISO EM BASALTO FOSCO 40x40	M2	2,50	151,26	305,65	0,00	2,50	0,00	305,65	0,00	305,65							
10.1.9	COMP ARQ.006	ASSENTAMENTO DE PISO EM BASALTO FOSCO 40x40	M2	68,00	10,70	707,68	0,00	68,00	0,00	707,68	0,00	707,68							
10.1.10	COMP ARQ.016	DECK PLASTICO	M2	10,00	516,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10.1.11	4886	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO 45 X 2,5 CM, E = 2 MW	M	74,57	13,31	992,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10.2		PAVIMENTACAO EXTERNAS																	
10.2.1	COMP ARQ.023	PISOS PODOTATIS AREA EXTERNA	M2	25,00	59,78	1.494,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,50							
10.2.2.1	92396	EXECUCAO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RELEVADO COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 3CM	M2	200,00	70,70	14.140,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00							
10.2.2.2	92400	EXECUCAO DE PATIOS/INSTALACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM, AT 12/2015.	M2	300,00	66,49	19.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,00							
10.2.3.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AT 06/2016 P	M	65,00	35,55	2.307,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,50							
10.2.3.2	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AT 06/2016 P	M	3,00	38,20	117,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60							
11.1	72116	ESQUADRIAS	M2	2,52	211,58	533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

ITEM	REFER.	SERVIÇO	UN	QUANT.													
11.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-COXA LEVE OU MEDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X10CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	UN	16,00	888,33	14.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-COXA LEVE OU MEDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X10CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	UN	16,00	650,71	10.471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-COXA LEVE OU MEDIA, PADRÃO MÉDIO, 90X10CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	UN	3,00	688,33	2.064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.1	COMP.ARC.007	BARRA PARA PORTA EM AÇO INOX 48CM	UNID.	6,00	122,41	734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	COMP.ARC.007	PORTA NAVAL 90CM COM INSTALAÇÃO	M2	2,00	236,58	473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-COXA LEVE OU MEDIA, PADRÃO MÉDIO, 70X10CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	UN	3,00	752,48	2.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUADRICÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	M2	3,26	1070,48	3.485,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7.1	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESURA 8MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	0,47	211,57	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESURA 8MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	5,46	211,58	1.155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9	COMP.ARC.008	PORTA NAVAL 80CM COM INSTALAÇÃO	M2	1,00	232,10	232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUADRICÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	M2	2,94	1070,48	2.826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12	11946ORSE	Porta em alumínio, cor NIPR, em perfil suizo quadrado ou lambil, completo inclusive vidros, perfis e fechadura	M2	3,95	396,83	1.567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13		Instalação do motor do ponto de acesso mecânica com sistema de abertura e	Unid.	2,00	1022,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13		JANELA BASCULANTE - ALTURA 200CM	M2	40,60	287,50	11.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.1	11946ORSE	Basculante em alumínio, cor NIPR, modular-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusiva vidro	M2	15,37	156,60	2.391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.2	84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 6MM	M2	15,37	156,60	2.391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14		JANELA BASCULANTE - ALTURA 200CM	M2	26,40	287,50	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14.1	11946ORSE	Basculante em alumínio, cor NIPR, modular-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusiva vidro	M2	5,80	287,50	1.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14.2	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESURA 4MM	M2	2,20	96,23	211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15.1	11946ORSE	JANELA BASCULANTE - ALTURA 110CM	M2	26,40	287,50	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15.2	84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 6MM	M2	13,44	156,60	2.091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16	11946ORSE	JANELA BASCULANTE - ALTURA 200CM	M2	8,80	287,50	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16.1	11946ORSE	Basculante em alumínio, cor NIPR, modular-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusiva vidro	M2	4,48	287,50	1.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16.2	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESURA 4MM	M2	4,32	96,23	413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17		JANELA BASCULANTE - ALTURA 130CM	M2	7,25	287,50	2.084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17.1	11946ORSE	Basculante em alumínio, cor NIPR, modular-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusiva vidro	M2	3,72	287,50	1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17.2	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESURA 4MM	M2	3,53	96,23	337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.18		JANELA BASCULANTE - ALTURA 110CM	M2	3,00	287,50	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.18.1	11946ORSE	Basculante em alumínio, cor NIPR, modular-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusiva vidro	M2	1,47	287,50	421,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.18.2	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESURA 4MM	M2	1,53	96,23	144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.19.1	11946ORSE	Basculante em alumínio, cor NIPR, modular-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusiva vidro	M2	2,00	287,50	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.19.2	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESURA 4MM	M2	0,46	96,23	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.20		JANELA BASCULANTE - ALTURA 130CM	M2	3,13	287,50	898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.20.1	11946ORSE	Basculante em alumínio, cor NIPR, modular-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusiva vidro	M2	1,63	287,50	469,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.20.2	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESURA 4MM	M2	1,50	96,23	157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITEM	REFER.	SERVICO	UN	QUANT.																
11.21	11945GRSE	JANELA BASCULANTE - ALTURA 190CM	M2	0.72	287.50	207.00	0.00	0.72	0.00	207.00	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	
11.21.1	11945GRSE	Basculante em alumínio, cor N/PIB, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	0.26	155.61	41.08	0.00	0.26	0.00	41.08	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.08	
11.21.2	84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE - ESPESURA 6MM	M2	0.66	155.59	102.38	0.00	0.66	0.00	102.38	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38	
11.22	11945GRSE	JANELA BASCULANTE - ALTURA 210CM	M2	1.82	287.50	465.75	0.00	1.82	0.00	465.75	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.75	
11.22.1	11945GRSE	Basculante em alumínio, cor N/PIB, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	0.66	155.59	102.38	0.00	0.66	0.00	102.38	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38	
11.23	11945GRSE	JANELA BASCULANTE - ALTURA 200CM	M2	8.00	287.50	2.300.00	0.00	8.00	0.00	2.300.00	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.300.00	
11.23.1	11945GRSE	Basculante em alumínio, cor N/PIB, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	4.08	155.60	634.85	0.00	4.08	0.00	634.85	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.85	
11.23.2	84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE - ESPESURA 6MM	M2	4.08	155.60	634.85	0.00	4.08	0.00	634.85	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.85	
11.24	11945GRSE	JANELA BASCULANTE - ALTURA 200CM	M2	2.80	287.50	805.00	0.00	2.80	0.00	805.00	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	
11.24.1	11945GRSE	Basculante em alumínio, cor N/PIB, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	1.63	155.60	253.84	0.00	1.63	0.00	253.84	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.84	
11.24.2	84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE - ESPESURA 6MM	M2	1.63	155.60	253.84	0.00	1.63	0.00	253.84	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.84	
11.25	11945GRSE	JANELA BASCULANTE - ALTURA 200CM	M2	13.60	287.50	3.910.00	0.00	13.60	0.00	3.910.00	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.910.00	
11.25.1	11945GRSE	Basculante em alumínio, cor N/PIB, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	7.60	156.60	1.182.56	0.00	7.60	0.00	1.182.56	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.182.56	
11.25.2	84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE - ESPESURA 6MM	M2	7.60	156.60	1.182.56	0.00	7.60	0.00	1.182.56	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.182.56	
11.26	11945GRSE	JANELA BASCULANTE - ALTURA 200CM	M2	1.44	1428.34	2.056.81	0.00	1.44	0.00	2.056.81	1428.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.056.81	
11.26.1	91338	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRIL COM GUARNICAO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1.44	1428.34	2.056.81	0.00	1.44	0.00	2.056.81	1428.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.056.81	
11.27	91338	ESQUADRIA DE VENTILACAO DEBILANTE	M2	1.44	1428.34	2.056.81	0.00	1.44	0.00	2.056.81	1428.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.056.81	
11.28	91338	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRIL COM GUARNICAO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1.10	1428.34	1.571.17	0.00	1.10	0.00	1.571.17	1428.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.571.17	
11.29	91338	ESQUADRIA DE INSPECCAO (SHALLI)	M2	1.10	1428.34	1.571.17	0.00	1.10	0.00	1.571.17	1428.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.571.17	
12.1	72.119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR - ESPESURA 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	16.00	211.56	3.385.28	0.00	16.00	0.00	3.385.28	211.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.385.28	
12.2	72.118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR - ESPESURA 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	5.00	168.48	842.40	0.00	5.00	0.00	842.40	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.40	
13.1	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO PR VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	3.00	1652.50	3.187.50	0.00	3.00	0.00	3.187.50	1652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.187.50	
13.2	38168	PODADOR / TUBULAR RETO DUPLO - EM ALUMINIO POLIDO DIAMETRO APOX DE 1" - COMPRIMENTO APOX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE ALUMINIO E FERROSIS CROMADAS PR PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	3.00	143.14	429.42	0.00	3.00	0.00	429.42	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.42	
13.3	3104	UMA FOLHA COMPOSTA DOBADA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (62), FECHADURA (63), CONTRA FECHADURA (631), COM CAPUCHINHO	CJ	3.00	408.79	1.220.37	0.00	3.00	0.00	1.220.37	408.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.220.37
13.4	11572	PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM LATÃO /ZAMAC CROMADO	UN	3.00	17.36	52.08	0.00	3.00	0.00	52.08	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.08	
13.5	EOT ARO 026	PRENDEDORES DE PORTA	UNID.	25.00	49.88	1.247.00	0.00	25.00	0.00	1.247.00	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.247.00	
13.6	EOT ARO 026	AMORTECEDORES DE PORTA	UNID.	15.00	29.01	435.16	0.00	15.00	0.00	435.16	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.16	
13.7 A		SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VIDRO LAMINADO / FACHADA (HALI) - PERFIL TUBULAR EM AÇO INOX Ø 3"	M	24.90	140.00	3.486.00	0.00	24.90	0.00	3.486.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.486.00	
13.7 B		SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VIDRO LAMINADO / FACHADA (HALI) - SUPORTES EM AÇO INOX, TIPO ARANHÃ DE QUATRO PONTOS, 316 da linha Spider Class Serie F1 200mm da Figpass ou similar (resistência à compressão 1.900 kgf e a tração de 8.200 kgf)	UNID	3.00	307.50	922.50	0.00	3.00	0.00	922.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.50	
13.7 C		SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VIDRO LAMINADO / FACHADA (HALI) - SUPORTES EM AÇO INOX, TIPO ARANHÃ DE TRÊS PONTOS, 316 da linha Spider Class Serie F1 200mm da Figpass ou similar (resistência à compressão 1.200 kgf e a tração de 5.800 kgf)	UNID	1.00	265.00	265.00	0.00	1.00	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	
13.7 D		SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VIDRO LAMINADO / FACHADA (HALI) - SUPORTES EM AÇO INOX, TIPO ARANHÃ DE DOIS PONTOS, 316 da linha Spider Class Serie F1 200mm da Figpass ou similar (resistência à compressão 1.900 kgf e a tração de 8.200 kgf)	UNID	8.30	225.00	1.860.00	0.00	8.30	0.00	1.860.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.860.00	
13.7 E		SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VIDRO LAMINADO / FACHADA (HALI) - SUPORTES EM AÇO INOX, TIPO ARANHÃ DE UM PONTO, 316 da linha Spider Class Serie F1 200mm da Figpass ou similar (resistência à compressão 450 kgf e a tração de 5.200 kgf)	UNID	6.00	175.00	1.050.00	0.00	6.00	0.00	1.050.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.050.00	
14		SOMENTE O EQUIPAMENTO (para instalação das placas convexas de Isolamento Acústico)				810,00	0,00		0,00										810,00	
																			254,00,00	























ITEM	REFER.	SERVIÇO	UN	QUANT.															
32.6.4	92675	JOELHO 45 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2,00	51,18	122,36	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	122,36	122,36						
32.6.5	92872	JOELHO 90 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,00	58,15	38,45	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	38,15	38,15						
32.6.6	94487	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSCAVEL, 1 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFIBROCEMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	1,00	65,01	86,01	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	86,01	86,01						
32.6.7	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSCAVEL, 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFIBROCEMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	1,00	63,38	63,38	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	63,38	63,38						
32.6.8	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	2,00	41,45	82,90	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	82,90	82,90						
32.6.9	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	2,00	22,04	44,08	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	44,08	44,08						
32.6.10	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSCAVEL, 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	1,00	63,38	63,38	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	63,38	63,38						
32.6.11	94487	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSCAVEL, 1 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	1,00	86,01	86,01	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	86,01	86,01						
32.6.12	3294	FLANGE SECAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	3,00	21,89	65,67	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	65,67	65,67						
32.6.13	3272	FLANGE SECAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	1,00	38,31	38,31	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	38,31	38,31						
32.6.14	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	3,00	41,45	124,35	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	124,35	124,35						
32.7		REDE DE DISTRIBUIÇÃO						0,00											
32.7.1	89386	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	9,00	13,44	120,96	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	120,96	120,96						
32.7.2	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	18,00	12,44	223,96	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	223,96	223,96						
32.7.3	89373	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	3,00	5,36	16,08	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	16,08	16,08						
32.7.4	89396	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	2,00	18,39	36,78	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	36,78	36,78						
32.7.5	89394	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	2,00	16,21	32,42	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	32,42	32,42						
32.7.6	90374	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2015	UN	4,00	18,95	74,60	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	74,60	74,60						
32.7.7	89945	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO LATAO ROSCAVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	3,00	55,93	167,79	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	167,79	167,79						
32.7.8	89887	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSCAVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	23,00	58,60	1.347,80	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	1.347,80	1.347,80						
32.7.9	40728	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	240,19	720,57	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	720,57	720,57						
32.7.10	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	46,00	5,81	267,26	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	267,26	267,26						
32.7.11	89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1 1/2" INSTALADO EM PRIMAVALVA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	6,00	7,31	43,86	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	43,86	43,86						
32.7.12	89827	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMAVALVA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	6,00	17,18	103,08	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	103,08	103,08						
32.7.13	12613	TUBO DE DESCARGA, PVC, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - FUBRILTR, 40 MM X 50 CM	UN	3,00	12,69	37,77	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	37,77	37,77						







ITEM	REFER.	SERVIÇO	UN	QUANT.																
33.20	COT CLIM 020	Linha Fibrigrama Kit composto de 1 tubo de cobre para Equidre dia 3,5 mm com tubo de isolamento + 1 tubo de cobre para gás dia 15,0 mm com tubo de isolamento (Equipamento específico de polietileno)	UNID	1,00	20000,00															20.000,00
33.21	COT CLIM 021	Linha Fibrigrama Kit composto de 1 tubo de cobre para Equidre dia 9,8 mm com tubo de isolamento + 1 tubo de cobre para gás dia 12,7 mm com tubo de isolamento (Equipamento específico de polietileno)	UNID	1,00	17500,00															17.500,00
33.22	2687	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO COM ALARME A DE 16MM	M	420,00	1,26	526,20	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00			0,00	0,00					529,20
33.23	COT CLIM 023	Junta de demarcação REINET 28,6 - 15,9 mm ref. 721 (gas-inox / Dabini)	UNID	27,00	1050,00					28.350,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00					28.350,00
33.24		Tubo redutor de aço galvanizado de 250x200mm	m	55,50	50,00					2.750,00	0,00	55,50	55,50	0,00	0,00					2.750,00
33.25	12082	ELETRODUTO FLEXIVEL EM AÇO TIPO CONDUTE DIAMETRO DE 3"	M	6,50	47,93	309,60	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00					309,60
33.26	12082	ELETRODUTO FLEXIVEL EM AÇO TIPO CONDUTE DIAMETRO DE 3"	M	12,00	47,93	571,56	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00					571,56
33.27	12082	ELETRODUTO FLEXIVEL EM AÇO TIPO CONDUTE DIAMETRO DE 3"	M	21,00	47,93	1.000,23	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00					1.000,23
33.28	COT CLIM 024	Junta Flexível de Isola e Injecção, Material 701/0005	UNID	1,00	75,00					75,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00					75,00
33.29	09591/CRSE	Barra Usada 3/4" galvanizada Perfilado, pré-tensionado a frio, perfurada 3/8 x 3/8 x 800xmm	M	3,00	26,89	80,67	0,00	3,00	3,00	77,67	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00					80,67
33.30		Barra Usada 3/4" galvanizada	m	120,00	3,75	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00					450,00
33.31		Chumbador de aço 3/8" galvanizado	UN	120,00	10,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00					1.200,00
33.32	4342	FORÇA ZINCOADA SEXTAVADA DIAMETRO 3/8"	UN	180,00	0,14	25,20	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00					25,20
33.33	366	ABRACADEIRA EM AÇO PARA ABRACAO DE ELETRODUTOS TIPO D COM 2 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	UN	320,00	1,74	556,80	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00					556,80
33.34		Barra Usada 1/4" galvanizada	m	332,00	2,50	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00					830,00
33.35		Chumbador de aço 1/4" galvanizado	UN	468,00	6,25	2.931,00	0,00	2.931,00	2.931,00	0,00	0,00	2.931,00	2.931,00	0,00	0,00					2.931,00
33.36	39997	FORÇA ZINCOADA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"	UN	1.454,00	0,20	290,80	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00	0,00					290,80
33.37		Veneziana auto-freante, para tubo dia 150 mm (Venobal)	PE	2,00	92,50	185,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00					185,00
33.38	9R86	UBO PVC SERIE NORMAL DN 100 MM PARA ESSOTO FREDDAL (NBR 6699)	M	9,00	43,75	393,75	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00					393,75
33.40	1564	CURVA DE PVC 45 GRAUS SOLDAYEL 110 MM PARA AGUA FRIA	UN	6,00	85,15	510,90	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00					510,90
33.41		Soposco, 1,60 m com pinna inox 50x60x6 mm (conjunto)	conj	2,00	212,50	425,00	0,00	2,00	2,00	425,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00					425,00
33.42		Fita perfurada 15 mm de aço galvanizado	m	18,00	1,63	29,34	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00					29,34



Documento 514 do PROAD 9379/2017. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.CYZV.CCCD: <https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>





ITEM	REFER.	SERVICO	UN	QUANT.														
1/4"			un.	25,00	172,50	4.312,65	0,00	13,00	0,00	2.342,50	0,00	2.342,50	2.342,50	1.065,00				
3/8"			un.	11,00	177,50	1.652,50	0,00	6,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00				
1/2"			un.	28,00	203,75	5.706,00	0,00	14,00	0,00	2.852,50	0,00	2.852,50	2.852,50	2.852,50				
5/8"			un.	11,00	208,75	2.296,25	0,00	6,00	0,00	1.252,50	0,00	1.252,50	1.252,50	1.252,50				
1/4"			un.	3,00	208,75	626,25	0,00	1,00	0,00	208,75	0,00	208,75	208,75	208,75				
					2952,38	13.581,92	0,00	6,03	0,00	77.063,41	0,00	77.063,41	77.063,41	77.063,41				
				<b>TOTAL GERAL</b>		<b>77.063,42</b>		<b>77.063,42</b>		<b>77.063,41</b>		<b>77.063,41</b>	<b>77.063,41</b>	<b>77.063,41</b>				
				<b>TOTAL DESTA MEDICAO TERMO</b>														
				<b>TOTAL GERAL</b>		<b>181.058,49</b>		<b>11.104,69</b>		<b>120.003,89</b>		<b>134.108,58</b>	<b>134.108,58</b>	<b>134.108,58</b>				

**TERMO CIRCUNSTANCIADO**

**REMEDIÇÕES**

		Remoção da estrutura de madeira do forro no pavimento térreo - Incluir transporte horizontal, vertical e bola fora do entorno devido.	m³	337,60	29,51	9.903,42	0,00	337,60	0,00	9.903,42	0,00	9.903,42	9.903,42	9.903,42				
		Demolimento da escada metálica	kg	1.484,81	3,83	5.967,53	0,00	1.484,81	0,00	5.967,52	0,00	5.967,52	5.967,52	5.967,52				
		Transporte horizontal da escada	un.	1,00	540,85	540,85	0,00	1,00	0,00	540,86	0,00	540,86	540,86	540,86				
		Montagem da escada metálica - Incluir transporte horizontal	kg	1.195,93	4,04	4.828,57	0,00	1.195,93	0,00	4.828,57	0,00	4.828,57	4.828,57	4.828,57				
		Remoção de detritos na cobertura - Incluir remoção do material presente na cobertura, transporte horizontal, transporte vertical por 2 pavimentos e bola fora do material.	m³	100,00	284,14	28.413,75	0,00	100,00	0,00	28.413,75	0,00	28.413,75	28.413,75	28.413,75				
		Contratos					0,00		0,00		0,00							
		Contrato de pintura superior e inferior - CONTRATO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADEQUADO.	m²	50,75	31,35	1.873,16	0,00	50,75	0,00	1.873,16	0,00	1.873,16	1.873,16	1.873,16				
		Contrato de pintura inferior e interior - CONTRATO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADEQUADO.	m²	50,75	31,35	1.873,16	0,00	50,75	0,00	1.873,16	0,00	1.873,16	1.873,16	1.873,16				
		Regularização do contrapiso para instalação do seq. pavimento - CONTRATO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADEQUADO, ESPESURA 4CM AF. 06/2014 - Item 10.1.1 da Planilha Obrig.	m²	382,60	31,35	11.994,51	0,00	382,60	0,00	11.994,51	0,00	11.994,51	11.994,51	11.994,51				
		Ejecução de vigas e contra vigas estruturais de apoio para esquadras e fachada em placa cimentícia. Incluir corte, sobra e montagem de amolduras, montagem de formas e contrafôrmas	m³	6,03	2952,38	13.581,92	0,00	6,03	0,00	13.581,82	0,00	13.581,82	13.581,82	13.581,82				
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>77.063,42</b>		<b>77.063,42</b>		<b>77.063,41</b>		<b>77.063,41</b>	<b>77.063,41</b>	<b>77.063,41</b>				

**SUPRÊSSÃO**

		<b>Remoção de Acabado</b>	m²	105,00	4.196,85	0,00	105,00	0,00	4.196,85	0,00	4.196,85	4.196,85	4.196,85					
		Remoção de piso cerâmico	m²	655,00	8.539,59	0,00	655,00	0,00	8.539,59	0,00	8.539,59	8.539,59	8.539,59					

*[Handwritten signature]*











ITEM	REFER.	SERVICO	UN.	QUANTI.															
10.1		VIDRO TEMPERADO INCLUIDO. ESPESSURA SIM. FORNIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (BON)	m²	-1,05	R\$198,48	-176,90	-1,05	0,00	0,00	-176,90	0,00	0,00	-176,90						
10.2		VIDRO temperado sim para bon	m²	3,04	R\$211,88	643,19	3,04	0,00	0,00	643,19	0,00	0,00	643,19						
10.3		Ferragem para bon de concreto	UN.	4,00	R\$247,25	989,00	4,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	989,00						
11		<b>SUBTOTAL DO BLOCO DE OBRA</b>				<b>6.927,35</b>				<b>6.927,35</b>			<b>6.927,35</b>						
11.1		Faixa de acabamento de piso de concreto (assentado) - espessura 10 cm - <b>ADMISSÃO</b> com 2 mm em milha 10 x 10 cm	m²	73,66	R\$22,69	1.667,35	73,66	0,00	0,00	1.667,35	0,00	0,00	1.667,35						
11.2		Calçada externa em pavimento de bloco intertravado nas dimensões 20x10cm (a qual a 25 Mm - Estacionamento)	m²	300,00	R\$74,18	22.252,90	3,88	0,00	0,00	22.252,90	3,88	0,00	22.252,90						
11.3		Faixa de acabamento de piso de concreto (assentado) - espessura 10 cm - <b>ADMISSÃO</b> com 2 mm em milha 10 x 10 cm	m²	3,48	R\$208,53	725,67	3,88	0,00	0,00	725,67	3,88	0,00	725,67						
11.4		Faixa de acabamento de piso de concreto (assentado) - espessura 10 cm - <b>ADMISSÃO</b> com 2 mm em milha 10 x 10 cm	m	284,00	R\$13,31	3.779,24	264,00	0,00	0,00	3.779,24	264,00	0,00	3.779,24						
11.5		Base em pó de port para assentamento dos blocos intertravados - altura média para substituição de nível média do pavimento de graxa	m³	33,00	R\$30,00	990,00	7,98	0,00	0,00	990,00	7,98	0,00	990,00						
11.6		Frente conforme a área medida para execução de pavimentação em blocos intertravados - 30 km	m²	649,22	R\$11,88	7.708,28	227,00	0,00	0,00	7.708,28	227,00	0,00	7.708,28						
11.7		APARACAMENTO DE MECHAS DE CONCRETO (RETO E CURVOS)	m	60,00	R\$20,28	1.216,50	60,00	0,00	0,00	1.216,50	60,00	0,00	1.216,50						
11.8		Destinação final das mechas - bota fora em área aberta	m³	5,94	R\$40,00	237,80	5,94	0,00	0,00	237,80	5,94	0,00	237,80						
11.9		ASSESTAMENTO DE GUIA (MECHAS) EM TRILHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO - DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE X FERRO X BASE SUPR FIOR X ALTURA) PARA URBANIZAÇÃO INTERVA DE EMPREENDIMENTOS. AF - 05/2016 P	m	6,00	R\$25,50	153,00	6,00	0,00	0,00	153,00	6,00	0,00	153,00						
11.10		Execução para adequação de nível do caisado público para a remoção da pavimentação atual	m³	10,00	R\$82,09	820,88	10,00	0,00	0,00	820,88	10,00	0,00	820,88						
11.11		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF - 2/2015	m²	-73,66	R\$70,70	-5.207,76	-73,66	0,00	0,00	-5.207,76	-73,66	0,00	-5.207,76						
11.12		EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM. AF - 2/2015	m²	-300,00	R\$66,49	-19.946,25	-300,00	0,00	0,00	-19.946,25	-300,00	0,00	-19.946,25						
12		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>																	
12.1		Engenharia civil de obra unito com encargos complementares	mês	3,00	R\$13.825,00	41.475,00	0,72	0,00	0,00	41.475,00	0,72	0,00	41.475,00						
12.2		Taxas, Licenças e despesas administrativas	mês	3,00	R\$1.671,50	5.014,50	0,72	0,00	0,00	5.014,50	0,72	0,00	5.014,50						
12.3		Items de Consumo mensal	mês	3,00	R\$587,50	1.762,50	0,72	0,00	0,00	1.762,50	0,72	0,00	1.762,50						
13		<b>FORRO</b>																	
13.1		Viga-tala para acabamento entre forro de gesso acartonado e forro fibrocimentado	m²	12,00	R\$51,45	617,40	12,00	0,00	0,00	617,40	12,00	0,00	617,40						
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>197.403,88</b>				<b>43.786,76</b>	<b>0,00</b>	<b>43.786,76</b>		

  
 Eng. Civil Victor/Julio Ramirez Parquet  
 CPF: 040.040.040-00  
 CREFISC 081.83249

Medição R\$44.836,98      Aditivo R\$11.104,69      Termo R\$0,00      Supressão R\$0,00      Aditivo 02 R\$0,00      Aditivo 03 R\$43.786,76  
 TOTAL R\$599.728,42

De: Eng. André Wagner - SPO  
Para: Diretor do SPO



**Assunto: MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA – 18ª MEDIÇÃO – REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A VARA TRABALHISTA DE CANOINHAS**

**PROAD: CP 9379/2017**

Prezado Diretor do SPO,

Pelo presente, junto ao PROAD 9379/2017, as notas fiscais eletrônicas nº 91 e 92 da empresa **ESPHERA SUL Empreendimentos LTDA - ME**, nos respectivos valores de **R\$ 99.728,42** correspondente à **18ª medição** e **R\$ 1.705,90** correspondente à medição do reajuste.


Esta medição, com serviços realizados no período de 08/05/2019 a 13/06/2019, totaliza 75,67% do valor do contrato.

O valor previsto no Cronograma Físico Financeiro (CFF) para este mês de obra não foi atingido. Em pedido de aditivo de prazo a ser posteriormente analisado, a empresa alega problemas com chuvas por um período prolongado no último mês e também impedimento causado por demora da Celesc em providenciar serviços na rede pública junto ao prédio. Em outro documento que ora junto a esta manifestação, a empresa também informa em que condições financeiras se dará o fornecimento dos equipamentos de ar condicionado da obra, já que esta é uma etapa que tem sido de difícil transposição pela contratada por questões financeiras da mesma.

Entende-se que, após a análise do pedido de aditivo por este TRT e, posto em prática o desembolso informado no documento anexo para a aquisição dos equipamentos de ar condicionado, a obra terá condições de seguir para a conclusão.

O gráfico a seguir demonstra o andamento da obra segundo o CFF Previsto em comparação ao valor medido ainda na referência Jun/19:



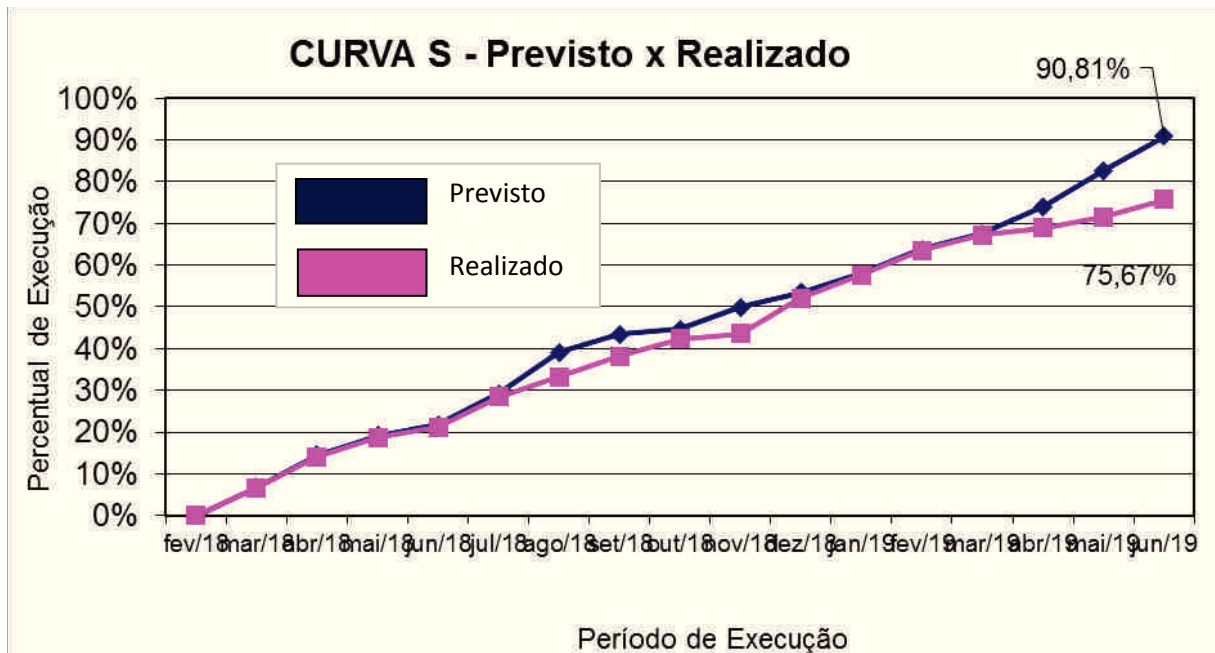

Documentos juntados:

- Pedido da empresa;
- Notas Fiscais;
- Diários de obra;
- Relatório fotográfico;
- Documentos relacionados à segurança do trabalho;
- Providências para aquisição de ar condicionado;
- Planilha da 18ª Medição.

Atenciosamente,

**André Wagner**

Analista Judiciário – Especialidade Engenharia Civil  
Matrícula 4262 – CREA/SC 068.622-2  
Serviço de Projetos e Obras

9379/17

## ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RUA PROF WALTER DE BONA CASTELAN, 173,  
CORREGO GRANDE - FLORIANOPOLIS - SC - 88.037-300  
Telefone: 32046919  
CNPJ: 03.594.924/0001-51  
CMC: 458.774-0

## DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número: 92

Autorização: 035918

Emissão: 14/06/2019

Código de Verificação: 59C4-44F3-73F5-8BF5

ANGELA  
TEREZIN  
HA  
TEIXEIRA

## Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO			CFPS 9205
ENDEREÇO Rua Esteves Júnior, 395 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88.015-905
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 02.482.005/0001-23 CMC

## Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
4120400	(CONSTRUCAO DE EDIFICIOS) REFERENTE AO REAJUSTE DA MÃO DE OBRA DA REFORMA DO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS-SC.	0	0,00	R\$ 522,01	1	R\$ 522,01
4120400	(CONSTRUCAO DE EDIFICIOS) REFERENTE AO REAJUSTE DO MATERIAL DA REFORMA DO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS-SC.	0	0,00	R\$ 1.183,89	1	R\$ 1.183,89
3,9265%						

## Cálculo do imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 1.705,90
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

## Dados adicionais

BANCO CECRED (085). AGÊNCIA: 0106-6. CONTA CORRENTE: 6507-2. CEI: 51.242.69909/77. INSS (11%) R\$ 57,42, Pis, Cofins, CS (4,65%) R\$ 79,32, IRPJ (1,20%) R\$ 20,47. VALOR DA ALÍQUOTA DE ISS É 3,00% (R\$ 51,18) NA REGIÃO DE CANOINHAS/SC, RETIDO NA FONTE. VALOR TOTAL REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDIÇÃO 18 NO VALOR DE R\$ 99.728,42.

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA


A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO [portal.pmf.sc.gov.br/pt/ass/nota\\_eletronica](http://portal.pmf.sc.gov.br/pt/ass/nota_eletronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 59C444F373F58BF5 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 4587740



Documento 517 do PROAD 9379/2017. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.NDMJ.DPSK: <https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Certifico que os serviços/materiais especificados na presente nota/fatura foram efetivamente prestados/entregues.

Em 18/06/19

  
**ANDRÉ WAGNER**

Analista Judiciário  
Matricula: 4262  
Engº. Civil CREA-SC 068.622-2

  
**Alexandre Koenig S. Thiane**  
Diretor do Setor

**TERMO DE LIQUIDAÇÃO**

Liquida-se o presente documento de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64. O documento refere-se ao original da 1ª via, arquivado neste Setor.

Em 18/06/19.

  
**EDINETE VOLPATO D. DE SOUZA**  
Técnico Judiciário

17 NE 1338

39.16

CP. 9379/17

**ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

RUA PROF WALTER DE BONA CASTELAN, 173,  
CORREGO GRANDE - FLORIANOPOLIS - SC - 88.037-300  
Telefone: 32048919  
CNPJ: 03.594.924/0001-51  
CMC: 458.774-0

**DANFPS-E**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica  
Número: 91  
Autorização: 035918  
Emissão: 14/06/2019  
Código de Verificação: 43DA-27D0-5199-9D82



**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO			CFPS 9205
ENDEREÇO Rua Esteves Júnior, 395 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88.015-905
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 02.482.005/0001-23 CMC

**Dados do(s) serviço(s)**

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
4120400	(CONSTRUCAO DE EDIFICIOS) REFERENTE A MÃO DE OBRA DA REFORMA DO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS-SC.	0	0,00	R\$ 30.516,90	1	R\$ 30.516,90
4120400	(CONSTRUCAO DE EDIFICIOS) REFERENTE AO MATERIAL DA REFORMA DO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS-SC.	0	0,00	R\$ 69.211,52	1	R\$ 69.211,52

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 99.728,42
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	---

**Dados adicionais**

BANCO CECRED (085). AGÊNCIA: 0106-6. CONTA CORRENTE: 6507-2. CEI: 51.242.69909/77. INSS (11%) R\$ 3.356,86, Pis, Cofins, CS (4,65%) R\$ 4.637,37, IRPJ (1,20%) R\$ 1.186,74. VALOR DA ALÍQUOTA DE ISS É 3,00% (R\$ 2.991,85) NA REGIÃO DE CANOINHAS/SC, RETIDO NA FONTE.

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO [portal.pmf.sc.gov.br/fees/note\\_eletronica](http://portal.pmf.sc.gov.br/fees/note_eletronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43DA27D051999D82 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4587740

Certifico que os serviços/materiais especificados na presente nota/fatura foram efetivamente prestados/entregues.

Em 18/06/19

  
**ANDRÉ WAGNER**  
Analista Judiciário  
Matricula: 4262  
Eng.º Civil CREA-SC 068.622-2

  
**Alexandre Koenig S. Thiann**  
Diretor do Setor

**TERMO DE LIQUIDAÇÃO**

Liquida-se o presente documento de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64. O documento refere-se ao original da 1ª via, arquivado neste Setor.

Em 19/06/19.

  
**EDINETE VOLPATO D. DE SOUZA**  
Técnico Judiciário

57VE 1338

39-16

CP. 9379/17



**ANEXO – V**

**ATESTADO DE CONFORMIDADE PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL**

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL			
CONTRATO/PROAD Nº: <u>CP 9373117</u>	UNIDADE:		
EMPRESA CONTRATADA:			
PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:	<u>14/02/19</u>		
RESPONSÁVEL:			
Item	SIM	NÃO	Não se aplica
<b>1. NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:</b>			
1.1 Houve anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social			<input checked="" type="checkbox"/>
1.2 Abertura de conta-depósito vinculada			<input checked="" type="checkbox"/>
1.3 Apresentação da garantia contratual			<input checked="" type="checkbox"/>
1.4 Relação de todos os empregados que prestarão serviço			<input checked="" type="checkbox"/>
1.5 Houve o encaminhamento dos exames admissionais dos empregados			<input checked="" type="checkbox"/>
1.6 Outros documentos exigidos no edital/contrato			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>2. NA LIQUIDAÇÃO MENSAL DA NOTA FISCAL:</b>			
2.1 O Fiscal de Contrato atestou a conformidade na prestação dos serviços (Caso afirmativo informar o número do marcador do referido documento do respectivo proad)	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.2 Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal			<input checked="" type="checkbox"/>
2.3 Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho)	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4 Período da prestação de serviços está correto (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura)			<input checked="" type="checkbox"/>
2.5 Caso haja falta informada pelo Fiscal do Contrato, verificar se houve desconto respectivo na Nota Fiscal			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>3. A CONTRATADA FORNECEU TODA A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DA MAO DE OBRA DIRETAMENTE ENVOLVIDA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>			
3.1 Aviso de férias e os respectivos comprovantes de quitação ao trabalhador			<input checked="" type="checkbox"/>
3.2 Comprovantes de pagamento dos salários, vale-transporte e auxílio-alimentação dos empregados e cartão ponto			<input checked="" type="checkbox"/>
3.3 Verificar se a empresa realizou a retenção da contribuição previdenciária	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.4 Verificar se a empresa realizou o recolhimento dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>4. COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DO FGTS POR MEIO DE:</b>			
4.1 Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	<input checked="" type="checkbox"/>		
4.2 Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	<input checked="" type="checkbox"/>		
4.3 Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)	<input checked="" type="checkbox"/>		
4.4 Cópia da relação de Tomadores/Obras (RET)	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>5. COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS POR MEIO DE:</b>			
5.1 Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	<input checked="" type="checkbox"/>		
5.2 Cópia do comprovante de declaração à Previdência	<input checked="" type="checkbox"/>		
5.3 Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	<input checked="" type="checkbox"/>		

5.4	Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)	✓		
5.5	Cópia da relação de Tomadores/Obras (RET)	✓		
<b>6. NA ADMISSÃO/SUBSTITUIÇÃO DE TRABALHADORES:</b>				
6.1	Houve anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social?			
6.2	Houve encaminhamento dos exames admissionais dos empregados?			
<b>7. NA DISPENSA DE TRABALHADORES:</b>				
7.1	Termo de rescisão de contrato de trabalho, devidamente homologado pelo Sindicato da categoria profissional do trabalhador			✓
7.2	Comprovante das verbas rescisórias devidamente assinado			✓
7.3	Exames médicos demissionais dos empregados			✓
7.4	Notificação de aviso prévio			✓
<b>8. VALIDADE DAS CERTIDÕES NEGATIVAS:</b>				
8.1	Certidão negativa de débitos trabalhistas	✓		
8.2	GPS (INSS)	✓		
8.3	GRF (GFTS)	✓		
8.4	Certidão conjunta de débitos relativos as Tributos Federais	✓		
8.5	Certidão Dívida Ativa da União	✓		
8.6	Certidão Negativa de Débitos Salariais	✓		
8.7	Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	✓		
8.8	Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	✓		
<b>9. OUTROS ITENS PREVISTOS NO EDITAL/CONTRATO</b>				
9.1				
9.2				
9.3				
9.4				
9.5				
9.6				

EDINETE ROBERTO D. DE SOUZA  
Técnico Judiciário

**AO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIÃO**  
**Rua Esteves Junior, 395**  
**Centro - Florianópolis - SC**  
**A/C: Eng. André Wagner**

**Ref.: Documentos Medição de obra**

**N/Ref.: 025/CNH/2019**

Florianópolis, 14 de Junho de 2019.

Prezados Senhores,

Vimos por meio deste fazer entrega dos documentos relativo à 18ª medição da obra "reforma do prédio que abrigará a nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas", convencionado pelo contrato número CP 9376/2017-1, no valor total de R\$ 99.728,42 (noventa e nove mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), sendo de mão de obra R\$ 30.516,90 e de material R\$ 69.211,52, bem como os documentos requeridos, conforme segue:

- Diário de Obras;
- Relatório fotográfico;
- Planilha de medição do período;
- Guia FGTS competência 05/2019 e comprovante de pagamento;
- Guia GPS competência 05/2019 e comprovante de pagamento;
- Nota fiscal nº 91
- Documentos contábeis competência 05/2019
- Curso de Reciclagem da NR 35 e NR 18
- Ficha de EPI

Qualquer dúvida quanto aos documentos entregues, estamos ao inteiro dispo-.

Cordialmente,



**VICTOR RAMIREZ PARQUET**  
**(Diretor Técnico)**  
**CPF: 713.186.319-04**

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIC ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S S:00253398000178 ,

Seu arquivo MJNtpNddyPw00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/06/2019 às 14:26:57.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D637EF4936DDDC65..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

**Transmissor:** SIC ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S S:00253398000178  
**Inscrição Transmissor:** 00.253.398/0001-78

**Responsável:** SIC ASSESSORIA CONTABIL E EMPR  
**Inscrição Responsável:** 00.253.398/0001-78  
**Competência:** 05/2019  
**NRA:** MJNtpNddyPw00009  
**Base de Processamento:** SC - Florianópolis  
**Código de Recolhimento:** 150  
**Contato:** JOSE SAULO LUCKMANN  
**Telefone:** 004832253401

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/06/2019 - 14:26:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0048)32253401
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.686,20	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.594.924/0001-51	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.014,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.014,89
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

858100000102 148901801900 607629180801 359492400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/06/2019 - 14:26:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0048)32253401
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.686,20	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.594.924/0001-51	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.014,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.014,89
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

858100000102 148901801900 607629180801 359492400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
12/06/2019 - COMPROVANTE - 14:47:14  
COMPROVANTE DE ARRECAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS  
COOP. 4416 - Credicrea  
Conta/DV: 6507-2  
Cliente: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

-----  
Código de barras: 858100000102 148901801901  
060762918080 135949240001


Tipo de Documento:.....FGTS - GRF - 0180  
Código do Convênio: .....0180  
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....03.594.924/0001-51  
Identificador:.....  
Data de Validade:.....07/06/2019  
Competência:.....05/2019  
Data do Pagamento:.....07/06/2019

Valor Recolhido:.....R\$ 1.014,89


-----  
Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:  
622A.981F.5958.6C67.B96C.3992.9A21.6A8B

-----  
OUVIDORIA BANCOOB 0800-646-4001  
SAC 0800-123-4567

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	05/2019
		5-IDENTIFICADOR	03.594.924/0001-51
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA</b> Rua WALTER DE BONA CASTELAN, 173 CORREGO GRANDE 88037300 FLORIANOPOLIS - SC 4832253401		6-VALOR DO INSS	8.556,52
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	735,74
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	9.292,26
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	05/2019
		5-IDENTIFICADOR	03.594.924/0001-51
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA</b> Rua WALTER DE BONA CASTELAN, 173 CORREGO GRANDE 88037300 FLORIANOPOLIS - SC 4832253401		6-VALOR DO INSS	8.556,52
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	735,74
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	9.292,26
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO GPS****DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	65072 - ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

**DADOS DO PAGAMENTO**

03 - Código Pagamento	2100
04 - Competência	05/2019
05 - Identificador	03594924000151
06 - Valor Do INSS	8.556,52
09 - Valor Out. Entidades	735,74
10 - Atm/Multa e Juros	0,00
11 - Valor Total	9.292,26
Data/Hora Do Pagamento	07/06/2019 14:38:04
Sequência De Autenticação	7143
Código de Barras	Não Informado
Linha Digitável	Não Informado
Protocolo	0F5D.C728.C659.90AE.88EC.9AC8.6D6C.779E

SAC 0800 647.2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 03/06/2019  
HORA: 14:26:08  
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA  
COMP: 05/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0  
Nº ARQUIVO: MJNtPnddyPw0000-9  
INSCRIÇÃO: 03.594.924/0001-51  
FAP: 1,86 RAT AJUSTADO: 5,58

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA: WALTER DE BONA CASTELAN 173  
LOGRADOURO: FLORIANOPOLIS  
CIDADE: FLORIANOPOLIS  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779

BAIRRO: CORREGO GRANDE  
CEP: 88037-300  
TELEFONE: 0048-32253401  
CNAE: 7112000

CNAE PREPONDERANTE:  
7112000

SEGUARADO									TOTAL
Empregados/Avulsos	1.039,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,72
Contribuintes Individuais	861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,89
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	2.537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,22
Contribuintes Individuais	5.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,20
RAT	707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,88
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	2.189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,42
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.556,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556,49
OUTRAS ENTIDADES	735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,78
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,78
TOTAL A RECOLHER	9.292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.292,27

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO REGOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FSPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 03.594.924/0001-51 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal Maio de 2019

Código Nome do Funcionário  
 135 ALEXANDRO VEIGA PEDREIRO  
 CBO 715210 Dependência 591 Total 1  
 Admissão: 09/07/2018

Código	Descrição	Ref.ância	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.613,00	
998	I.N.S.S.	8,00		129,04
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.613,00	129,04
			Valeu Líquido	
			1.483,96	

06.06.19  
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 MAICON JOSÉ BARBOSA  
 Assinatura do Funcionário

FSPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 03.594.924/0001-51 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal Maio de 2019

Código Nome do Funcionário  
 184 MAICON JOSÉ BARBOSA SERVENTE  
 CBO 717020 Dependência 591 Total 1  
 Admissão: 27/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.110,00			
998	I.N.S.S.	8,00		88,80		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.110,00	88,80		
			Valeu Líquido			
			1.021,20			
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Des. Cál. FGTS	FGTS de 13º Sal	Rateo Cál. IRRF	Fundo FVZ
1.110,00		1.110,00	1.110,00	88,80	1.021,20	0,00

06.06.2019  
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 MAICON JOSÉ BARBOSA  
 Assinatura do Funcionário

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 03.594.924/0001-5		CC: ESPHERA SUL - TRT Mensalista		Folha Mensal Maio de 2019	
Código	Nome do Funcionário	Departamento		Folha	
199	RODRIGO VEIGA PEDREIRO	71210		591 1	
		Admissão:		05/09/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.613,00		
998	I.N.S.S.	8,00		129,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.613,00	129,04	
999.999.999,00			Valor Líquido →	1.483,96	
Salário Base	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Folha IRPF
1.613,00	1.613,00	1.613,00	129,04	1.483,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Rodrigo Veiga  
 Ass: 05/05/2019  
 Data

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 03.594.924/0001-5		CC: ESPHERA SUL - TRT CA Mensalista		Folha Mensal Maio de 2019	
Código	Nome do Funcionário	Departamento		Folha	
198	LUIZ CASTRO DE BARROS PEDREIRO	71210		591 1	
		Admissão:		13/03/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST. INSS (P/DOENC	168:40	1.236,63		
8697	HORAS AFAST. P/DOENC C/DIR. INTEGRAIS	51:20	376,37		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	168:40		1.236,63	
998	I.N.S.S.	8,00		30,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.613,00	1.266,73	
999.999.999,00			Valor Líquido →	346,27	
Salário Base	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Folha IRPF
1.613,00	376,37	376,37	30,10	346,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Luiz C. de Barros  
 Ass: 05/05/2019  
 Data

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000102 148901801900 607629180801 359492400015

EMPRESA: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA  
 COMP: 05/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: ESPHERA REFORMA TRT CANOINHAS

LOGRADOURO: WALTER DE BONA CASTELAN 173  
 CIDADE: FLORIANOPOLIS

UF: SC  
 CEP: 88037-300

Nº ARQUIVO: MJNtpNddyPw0000-9  
 INSCRIÇÃO: 03.594.924/0001-51  
 FAP: 1.86 RAT AJUSTADO: 5.58  
 INSCRIÇÃO: 512426990977

BAIRRO: CORREGO GRANDE  
 CNAE PREPONDERANTE: 7112000  
 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	4.712,37	0,00	4.712,37	0,00
TOTAIS:	4	4.712,37	0,00	4.712,37	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA  
 COMP: 05/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: ESPHERA REFORMA TRT CANOINHAS N° DE CONTROLE: LLEQ02fB9EV0000-1

LOGRADOURO: WALTER DE BONA CASTELAN 173  
 CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88037-300 TELEFONE: 0048 3225 3401  
 BAIRRO: CORREGO GRANDE CNAE PREPONDERANTE: 7112000  
 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.855.71 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 376.98  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 2.189.42 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 2.189.42  
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J	0	K	0	L	0	M	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W	0	X	0	Y	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000102 148901801900 607629180801 359492400015

EMPRESA: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA  
 COMP: 05/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 03.594.924/0001-51  
 TOMADOR/OPERA: ESPHERA REFORMA TRT CANOINHAS PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO  
 INSCRIÇÃO: 512426990977

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ALEXANDRO VEIGA	1.613,00	0,00	128.00101.72-7	0,00	0,00	09/07/2018	01					129,04	07152
LUIZ CASTRO DE ANDROS	376,37	0,00	122.86007.07-3	0,00	0,00	13/08/2018	01					22/04/2019	07152
MAICON JOSE BARBOSA	1.110,00	0,00	163.68796.15-5	0,00	0,00	27/03/2018	01					30,11	07170
RODRIGO VEIGA	1.613,00	0,00	165.96123.64-3	0,00	0,00	05/09/2018	01					88,80	07152
												129,04	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 376,98 376,99 0,00

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000102 148901801900 607629180801 359492400015

EMPRESA: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 03.594.924/0001-51 N° ARQUIVO: MJNtpNcdyPw0000-9  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,86 RAT AJUSTADO: 5,58 COD REC: 150 COMP: 05/2019 N° CONTROLE: HJifzMPLYs70000-0  
TOMADOR/OBRA : ESPHERA REFORMA TRT CANOINHAS INSCRIÇÃO: 512426990977 N° CONTROLE: LLEqQ2fB9EV0000-1 UF  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP  
VIDAL RAMOS 200 CENTRO CANOINHAS 89460000 SC

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 4.712,37  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 4

REM SEM 13° SALÁRIO 4.712,37  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 376,99  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 4.712,37  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 376,98  
VAL DEVIDO PREV SOC 1.855,71  
TOTAL TRABALHADORES 4

VALORES FGTS - 8%  
REM SEM 13° SALÁRIO 4.712,37  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 376,99  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 4

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000102 148901801900 607629180801 359492400015

EMPRESA: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA      INSCRIÇÃO: 03.594.924/0001-51      N° ARQUIVO: MJNtpNddyPw0000-9  
FPAS: 507    OUTRAS ENTIDADES: 0079    SIMPLES: 1    ALIQ RAT: 3,0    FAP: 1,86    RAT AJUSTADO: 5,58    COD REC: 150    COMP: 05/2019    N° CONTROLE: HjfzmpLYs70000-0

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	40.682,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.901,61
VAL DEVIDO PREV SOC	11.481,69
TOTAL TRABALHADORES	12

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	12.686,20
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	1.014,89
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9

TOTAL A RECOLHER 1.014,89





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 03.594.924/0001-51  
Razão Social: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: ESPHERA SUL  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/02/2020

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento (Possui Pendência)**

**II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/09/2019
FGTS	Validade:	26/06/2019
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	29/11/2019

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/12/2017 (*)
Receita Municipal	Validade:	17/01/2018 (*)

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

Sem Informação



MINISTÉRIO DO TRABALHO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos  
CERTIDÃO DE DÉBITOS

**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA (ESPHERA SUL)

**CNPJ:** 03.594.924/0001-51

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 18/06/2019, às 17h55

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
- 3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 328OBTA.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA**  
CNPJ/CPF: **03.594.924/0001-51**  
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

**Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.**

**O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	190140044082290
Data de emissão:	03/05/2019 15:45:12
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	02/07/2019

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda

## Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais e Dívida Ativa do Município

CMC	CNPJ	Nome
4587740	03.594.924/0001-51	ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da(s) pessoa(s) acima identificada(s) que vieram a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) e a inscrições em Dívida Ativa do Município. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/receita>>, Serviços - Serviços on-line - link Verificação de Documentos Eletrônicos, passando o número do documento 1935749 e o código 1555C32C

Certidão Número 42290IX

Emitida 01/04/2019 16:59:52

Válida até 30/06/2019 conforme o Art. 194 Lei Complementar 4823 de 02 de janeiro de 1996.

Florianópolis (SC) 01 de abril de 2019  
Secretaria Municipal da Fazenda

Assinatura Digital: 1555C32CC2AE87CBD269EEA38698260F784BB90D  
Data: 01/04/2019 16:59:52 - Protocolo: 16549916 - Documento: 1935749  
Documento autenticado digitalmente



**ATENÇÃO:** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Rua Tenente Silveira 60, Centro - Florianópolis - SC 0\*\*48 3251 6400 - CEP 88010-300.  
<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/receita>, link Serviços - Serviços on-line -Verificação de Documentos Eletrônicos.

21/06/19 16:35 USUARIO : GAMBA  
DATA EMISSAO : 21Jun19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB802657  
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI  
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 03594924/0001-51 - ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA  
BANCO : 085 AGENCIA : 0106 CONTA CORRENTE : 65072  
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2019NP000901 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 002889928-8 PROCESSO : CP-9379/2017  
VALOR : 89.043,10

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 21/06/19  
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 91 E 92 - REFORMA DO IMÓVEL DA NOVA SEDE DA VARA D  
O TRABALHO DE CANOINHAS. 18A. MEDIÇÃO E REAJUSTE. PROAD 9379/2017. RETIDO R\$ 3  
.043,03 REF. ISS

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Documento 518 do PROAD 9379/2017. Para verificar a autenticidade desta cópia,  
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.NBZC.YWRQ:  
<https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

21/06/19 16:35 USUARIO : GAMBA  
DATA EMISSAO : 21Jun19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB802657  
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI  
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 03594924/0001-51 - ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA  
BANCO : 085 AGENCIA : 0106 CONTA CORRENTE : 65072

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401006	2017NE001338400		33903916	89.043,10
02	531814	2017NE001338	213110400	33903916	89.043,10
03	561602	01000000000400C			89.043,10

LANCADO POR : 81265549915 - ANA PAULA UG : 080013 21Jun19 15:41  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

21/06/19 16:35

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 21Jun19 VENCIMENTO: 21Jun19 NUMERO : 2019DF800656  
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI  
CONTRIBUINTE : 03594924/0001-51 - ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA  
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO  
PROCESSO : CP-9379/2017 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2019NP000901  
PERIODO APURACAO : 21Jun19 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6147  
VALORES : BASE DE CALCULO : 101434,32  
RECEITA : 5.933,91  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 21/06/19  
TOTAL : 5.933,91

OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuições, retidas cfe. Instr. Normativa RFB 1234/2012, ref. Pagamento das Notas Fiscais 91 e 92 - Reforma do imóvel da nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas. 18a. Medição e reajuste. Proad 9379/2017.

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 21Jun19 14:07

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

21/06/19 16:35

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 21Jun19

NUMERO : 2019GP800117

UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO

RECOLHEDOR : 512426990977

CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI

COMPETENCIA : JUN19

RECURSO : 3

PROCESSO : CP-9379/2017

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2019NP000901 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 3582 , EM 21/06/19

VALOR INSS : 3.414,28

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 3.414,28

OBSERVACAO

Recolhimento de contribuição, retida cfe. Instr. Normativa RFB 971/2009, ref. Pagamento das Notas Fiscais 91 e 92 - Reforma do imóvel da nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas. 18a. Medição e reajuste. Proad 9379/2017.

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 21Jun19 14:07

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
