

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 3/9/18 183 /365

segunda-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contramestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec. em refrigeração	2	Elétricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

Aplicação do revestimento cerâmico 30x40cm nas paredes do refeitório/DML e vestiário masculino terceirizado no pavimento superior da edificação.
 Execução do sistema de drenagem das evaporadoras do pavimento superior da edificação.
 Remoção de entulho gerado e limpeza da obra.
 Execução do sistema hidrossanitário da edificação.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER
 Analista Judiciário
 Matrícula: 4262
 Eng. Civil CREA-SC 068.622-2

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 2/9/18 182 /365

domingo

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	0

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec. em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	0	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

Não houve atividade em obra.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMIREZ PARQUETI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário
 Matrícula: 4262
 Enq. Civil CREA-SC 058 099-7

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 1/9/18 181 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

sábado

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	0

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec. em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	0	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

Não houve atividade em obra

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

[Handwritten Signature]
VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT

ANDRE WAGNER

[Handwritten Signature]
 Analista Judiciário
 Matrícula: 4262
 Eng. Civil CREA-SC 088.623-2

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 30/8/18 179 /365

quinta-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Tec. em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

Aplicação do revestimento cerâmico 30x40cm nas paredes do refeitório/DML no pavimento superior
Execução do sistema de drenagem das evaporadoras do pavimento superior da edificação.
Remoção de entulho gerado e limpeza da obra.
Execução do sistema hidrossanitário da edificação
Chumbamento das caixas e eletrodutos do sistema de iluminação externa nos muros de divisa da edificação.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER
Arquiteto Judiciário
Matrícula: 4262
Engº CIVIL CREA-SC 069.622-2

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 31/8/18 180 /365

sexta-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec. em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

Aplicação do revestimento cerâmico 30x40cm nas paredes do refeitório/DML e vestiário masculino terceirizado no pavimento superior da edificação
 Execução do sistema de drenagem das evaporadoras do pavimento superior da edificação.
 Remoção de entulho gerado e limpeza da obra.
 Execução do sistema hidrossanitário da edificação.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

[Handwritten Signature]
 VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT

[Handwritten Signature]

ANDRE WAGNER
 Analista Judiciário
 Matrícula: 4282
 Eng.º Civil CREA-SC 098.001

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: **29/8/18** **178 /365**

quarta-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

- Aplicação do revestimento cerâmico 30x40cm nas paredes do refeitório/DML no pavimento superior.
- Execução do sistema de drenagem das evaporadoras do pavimento superior da edificação.
- Remoção de entulho gerado e limpeza da obra.
- Execução do sistema hidrossanitário da edificação.
- Chumbamento das caixas e eletrodutos do sistema de iluminação externa nos muros de divisa da edificação.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

[Handwritten Signature]
VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT

[Handwritten Signature]

ANDRÉ WAGNER
 Analista Judiciário
 Matrícula: 4282
 Eng.º. CMI CREA-SC.068.622-1

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: **28/8/18** **177 /365**

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

terça-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Tec. em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

Execução do sistema de drenagem das evaporadoras do pavimento superior da edificação.
 Posicionamento das caixas de iluminação e eletrodutos do sistema de iluminação externa nos muros de divisa.
 Ligação da rede de esgoto do prédio na caixa de passagem da Casa# posicionada na rua Felipe Schmidt.
 Execução do sistema hidrossanitário da edificação.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PAROULET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT


ANDRÉ WAGNÉR
 Analista Judicial
 Matrícula: 4262
 Eng.º Civil CREA-SC 038.622-7

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 27/8/18 176 /365

segunda-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec. em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

Execução do sistema de drenagem das evaporadoras do pavimento superior da edificação.
 Posicionamento das caixas de iluminação e eletrodutos do sistema de iluminação externa nos muros de divisa.
 Execução de caixas de passagem do sistema de esgoto predial para nova saída de esgoto.
 Limpeza da obra.
 Execução do sistema hidrossanitário da edificação.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT


ANDRÉ WAGNER
 Analista Judiciário
 Matrícula: 4262
 Eng.º Civil CREA-SC 038.622-7

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 26/8/18 175 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

domingo

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	0

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec. em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	0	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

Não houve atividade em obra.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT



ANDRE WAGNER
Arquiteto Judiciário
Matrícula: 4262
Eng.º CIVIL- CREA-SC. 068.622-2

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

25/8/18

174 /365

sábado

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	0

Sub Empreiteiros

Tec. em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	0	Ajudante de pintor	0


Principais Atividades do Dia

Não houve atividades em obra

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.


Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT

ANDRE WAGNER


Analista Judiciário
Matricula: 4262
Eng. Civil CREA-SC 066.622-6

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: **24/8/18** **173 /365**

sexta-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
 OM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec em refrigeração	2	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudants de pintor	0

Principais Atividades do Dia

- Execução da infraestrutura do sistema de climatização no pavimento superior da edificação.
- Execução do sistema de drenagem das evaporadoras do pavimento superior da edificação
- Execução dos rasgos no muro de divisa dos fundos para execução do sistema de iluminação externa.
- Execução de caixas de passagem do sistema de esgoto predial para nova saída de esgoto.
- Limpeza da obra.
- Recebimento do elevador da ThyssenKrupp, armazenado em lugar seguro e protegido de intempéries.
- Execução do sistema hidrossanitário da edificação.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

[Handwritten Signature]
VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT

[Handwritten Signature]

ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário
 Matrícula 4262
 Eng. Civil CREA-SC 068.622-0

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: **23/8/18** / **172 /365**

quinta-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
 GM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec. em refrigeração	2	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

- Execução da infraestrutura do sistema de climatização no pavimento superior da edificação.
- Execução do sistema de drenagem das evaporadoras do pavimento superior da edificação.
- Execução dos rasgos no muro de divisa dos fundos para execução do sistema de iluminação externa.
- Execução de caixas de passagem do sistema de esgoto predial para nova saída de esgoto.
- Limpeza da obra.
- Execução do sistema hidrossanitário da edificação.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

[Handwritten Signature]
VICTOR RAMIREZ PAROQUE
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT

[Handwritten Signature]

ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário
 Matrícula: 4262
 Eng. Civil CREA-SC 055.822-7

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 22/8/18 171 /365

quarta-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec. em refrigeração	2	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

- Execução da infraestrutura do sistema de climatização no pavimento superior da edificação.
- Execução do sistema de drenagem das evaporadoras do pavimento superior da edificação.
- Execução dos rasgos no muro de divisa dos fundos para execução do sistema de iluminação externa.
- Execução de caixas de passagem do sistema de esgoto predial para nova saída de esgoto.
- Limpeza da obra.
- Execução do sistema hidrossanitário da edificação.


Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


 VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT


 ANDRÉ WAGNER
 Arquiteto / Urbanista
 Matrícula: 4262
 Eng.º Civil CREA-SC 068.622-3

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 21/8/18 170 /365

terça-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec. em refrigeração	2	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

- Execução da infraestrutura do sistema de climatização no pavimento superior da edificação.
- Execução dos rasgos no muro de divisa dos fundos para execução do sistema de iluminação externa.
- Execução de caixas de passagem do sistema de esgoto predial para nova saída de esgoto.
- Limpeza da obra
- Execução do sistema hidrossanitário da edificação.
- Remoção do sistema de hidrantes existente do prédio para nova instalação conforme projeto vigente.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

[Handwritten Signature]
VICTOR RAMIREZ PARQUEI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT

[Handwritten Signature]
ANDRÉ WAGNER
 Analista Judiciário
 Matrícula: 4262
 Eng.º CWI/CREA-SC 068.622-2

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 20/8/18 169 /365

segunda-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encarador	1
Pintor	0	Serveite	3

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec. em refrigeração	2	Eletricista	0
Ajudante de Encarador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

- Execução da infraestrutura do sistema de climatização no pavimento superior da edificação.
- Execução dos rasgos no muro de divisa dos fundos para execução do sistema de iluminação externa.
- Execução de caixas de passagem do sistema de esgoto predial para nova saída de esgoto.
- Limpeza da obra
- Execução do sistema hidrossanitário da edificação.
- Remoção do sistema de hidrantes existente do prédio para nova instalação conforme projeto vigente.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Victor Ramirez Parquet
 VICTOR RAMIREZ-PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT

Andre Wab

ANDRÉ WABER
 Analista Industrial
 Matrícula: 1552
 Eng. CREA 057.652-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 19/8/18 168 /365

domingo

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	0

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec. em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	0	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

Não houve atividades em obra.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

Victor Ramirez Parquet
VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER
 Analista Judicial
 Matrícula 4362
 Eng. Civil CREA-SC 068 622-7

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: **18/8/18** **167 /365**
sábado

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	0

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec. em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	0	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

Não houve atividades em obra

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário
 Matrícula: 4262
 Eng. Civil CREA-SC 668 622-2

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: **17/8/18** **166 /365**

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

sexta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	2	Servente	3

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec. em refrigeração	2	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	1

Principais Atividades do Dia

Execução da infraestrutura do sistema de climatização no pavimento superior da edificação.
 Pintura nas fachadas externas da edificação com tinta acrílica Suvini Fosco Premium na cor cinza.
 Concretagem do sôculo em concreto para máquinas de refrigeração, conforme dimensões em projeto.
 Execução de caixas de passagem do sistema de esgoto predial para nova saída de esgoto.
 Execução do sistema hidrossanitário da edificação.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT



ANDRE WAGNER
 Advogado Judicial
 Matrícula: 4262
 Eng.º CIVIL CREA-SC 068.622-2

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 16/8/18 165 /365

quinta-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	2	Servente	3

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec. em refrigeração	2	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	1

Principais Atividades do Dia

Execução da infraestrutura do sistema de climatização no pavimento superior da edificação.
 Pintura nas fachadas externas da edificação com tinta acrílica Suvini Fosco Premium na cor cinza.
 Montagem de formas e preparação da base do sôculo em concreto para máquinas de refrigeração, conforme dimensões em projeto.
 Execução de caixas de passagem do sistema de esgoto predial para nova saída de esgoto.
 Execução do sistema hidrossanitário da edificação.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMIREZ PAROULET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER
 Analista Judiciário
 Matrícula: 4262
 Eng.º Civil CREA-SC 088-622-7

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 15/8/18 164 /365

quarta-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	2	Servente	3

Sub Empreiteiros

Tec. em refrigeração	2	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	1


Principais Atividades do Dia

Execução da infraestrutura do sistema de climatização no pavimento superior da edificação.
Pintura nas fachadas externas da edificação com tinta acrílica Suvilil Fosco Premium na cor cinza.
Locação do sóculo em concreto para máquinas de refrigeração conforme dimensões em projeto.
Execução de caixas de passagem do sistema de esgoto predial para nova saída de esgoto.
Execução do sistema hidrossanitário da edificação.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT


ANDRÉ WAGNER
Analista Judiciário
Matrícula: 4262
Eng.º Civil CREA-SC 058.622-7

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 14/8/18 163 /365

Mapa de Tempo

B = Bgm
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

terça-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	2	Servente	3

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec. em refrigeração	2	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	1

Principais Atividades do Dia

- Execução da infraestrutura do sistema de climatização no pavimento superior da edificação.
- Execução do sistema hidrossanitário da edificação.
- Pintura na fachada externa do prédio, fachada do estacionamento da edificação.
- Execução das caixas de passagem da alimentação do sistema elétrico do prédio.
- Execução das caixas de passagem do sistema hidrossanitário para nova saída do sistema de esgoto predial.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Aprovado pela fiscalização a utilização de piso cerâmico Forma Dual Branco AC 45x45 anti derrapante conforme laudo técnico apresentado pela fabricante (Eilane) para utilização em banheiros e áreas molhadas

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMIREZ PAROUF
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER
Analista Judiciário
Matricular: 4262
Eng. Civil CREA-SC 638.822-2

Relatório Fotográfico – 7ª Medição

Obra: REFORMA DE CANOINHAS/NOVA SEDE - CP 9379/2017

Responsável pelas informações do relatório: Eng. Civil André Wagner – Matrícula 4262



Foto 1: Tubulação da climatização

De: Eng. André Wagner - SPO

Para: Diretor do SPO

Assunto: MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA – 7ª MEDIÇÃO – REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A VARA TRABALHISTA DE CANOINHAS


PROAD: CP 9379/2017

Prezado Diretor do SPO,

Pelo presente, junto ao PROAD 9379/2017 a nota fiscal eletrônica nº 33 da empresa **ESPHERA SUL Empreendimentos LTDA - ME**, no valor de **R\$ 117.603,84** correspondente à **7ª medição** do contrato cujo valor original é de R\$ 2.187.480,19. Somado ao 1º Termo Aditivo e ao 1º Termo Circunstanciado, o contrato totaliza **R\$ 2.360.441,35**.

Esta medição, com serviços realizados no período de 14/08/2018 a 05/09/2018 totaliza 36,53% do valor do contrato. O valor previsto no Cronograma Físico Financeiro (CFF) para esta 7ª medição não foi atingido. Deve-se considerar, contudo, que o tempo decorrido de obra também é de pouco mais de 6 meses. Assim, é mais justo se comparar o percentual executado acumulado com a 7ª medição (36,53%) com o percentual acumulado previsto para o 6º mês de obra (41,96%). Ainda assim, percebe-se que a obra já apresenta indícios de atraso, razão pela qual se informa que a mesma será notificada a apresentar justificativas, bem como, informar o que será feito para retomar o cronograma previsto.

O gráfico a seguir demonstra o andamento da obra segundo o CFF Previsto em comparação ao valor medido na referência Setembro/18, com destaque aos percentuais de serviços previstos e realizados:

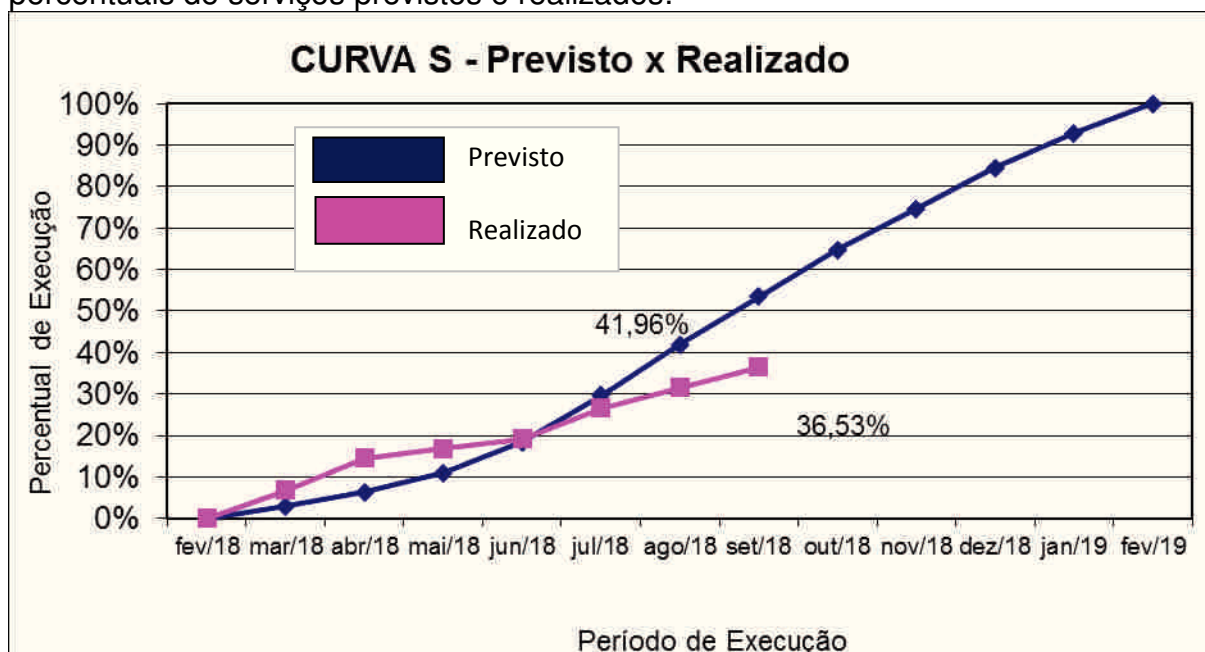

Documentos juntados:

- Nota Fiscal;
- Relatório fotográfico;
- Planilha da 7ª Medição.

Atenciosamente,

André Wagner

Analista Judiciário – Especialidade Engenharia Civil
Matrícula 4262 – CREA/SC 068.622-2
Serviço de Projetos e Obras

De acordo,

Alexandre Koenig S. Thiago

Diretor do SPO



TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS - SC

FOLHA DE MEDIÇÃO

EMPREITEIRA

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBRA

REFORMA VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS

CONTRATO Nº	CP 9379/2017	MEDIÇÃO Nº	7	Período de Aterção	08/08/2018 À 30/08/2018
VALOR CONTRATO	R\$ 2.187.480,19	INICIO CONTRATO	TÉRMINO CONTRATO		DATA
		06/03/2018	28/02/2019		08/08/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATO				QUANTITATIVO			VALORES (R\$)		
		UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO COM B.D.I.	VALOR ATUAL	ESTA MEDIÇÃO	ANTERIOR ACUMULADA	ACUMULADA	ESTA MEDIÇÃO	ANTERIOR ACUMULADA	ACUMULADA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		REVISÃO:	16								
CLIENTE: DATA ORÇAMENTO:		7-nov-17									
ENDEREÇO: DATA DA IMPRESSÃO:		7-nov-17									
MUNICÍPIO: B.D.I. EQUIPAMENTOS:		17,00%									
EMPRESA: Esfera Sul Empreendimentos Ltda.											
CNPJ: 03.594.924/0001-51											
Responsável Técnico: Eng. Victor Ramirez Parquet - CREA/SC 057.652-9											
OBRA: AREA CONSTRUÍDA:		1.000,76									
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.								
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				317.710,89				22.900,00		173.285,14
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	13.825,00	165.900,00	1,00	6,42	7,42	13.825,00	88.756,50	102.581,50
1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5 HORAS SEMANAIS	MÊS	2,00	1.760,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5 HORAS SEMANAIS	MÊS	2,00	1.760,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS	MES	12,00	7.700,00	92.400,00	1,00	6,42	7,42	7.700,00	49.434,00	57.134,00
1.5	ART CREA SC	UNID.	10,00	101,91	1.019,10	0,00	10,00	10,00	0,00	1.019,10	1.019,10
1.6	Taxas, Licenças e despesas administrativas	MES	12,00	187,50	2.250,00	1,00	6,40	7,40	187,50	1.200,00	1.387,50
1.7	Itens de Consumo Mensal	MES	12,00	687,50	8.250,00	1,00	6,42	7,42	687,50	4.413,75	5.101,25
1.8	As Built e Data Book	MES	12,00	500,00	6.000,00	1,00	6,42	7,42	500,00	3.210,00	3.710,00
1.9	Avaliação de Eficiência Energética (Emissão da ENCE por OIA cadastrada no INMETRO)	VB	1,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro risco de engenharia - obras, reformas e/ou ampliações	m²	1.000,76	2,35	2.351,79	0,00	1.000,76	1.000,76	0,00	2.351,79	2.351,79
2	SERVIÇOS INICIAIS				18.334,99				0,00		17.066,09
2.1	LIMPEZA DO TERRENO										
2.1.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	260,00	0,40	104,00	0,00	260,00	260,00	0,00	104,00	104,00
2.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	COMP. SI	150,00	56,41	8.461,50	0,00	150,00	150,00	0,00	8.461,50	8.461,50
2.3	CANTEIRO DE OBRA										
2.3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	5,40	452,85	2.445,39	0,00	5,40	5,40	0,00	2.445,39	2.445,39
2.4	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	500,00	1,28	640,00	0,00	120,00	120,00	0,00	153,60	153,60
2.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME										
2.5.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	192,00	33,80	6.489,60	0,00	170,00	170,00	0,00	5.746,00	5.746,00
2.5.2	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	M2	50,00	3,89	194,50	0,00	40,00	40,00	0,00	155,60	155,60
3	DEMOLICOES E REMOÇOES				93.494,54				0,00		84.906,10
3.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	200,00	75,41	15.082,00	0,00	200,00	200,00	0,00	15.082,00	15.082,00
3.2	DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE DRYWALL OU LAMINADO	M2	100,00	1,95	195,00	0,00	100,00	100,00	0,00	195,00	195,00
3.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	800,00	8,80	7.040,00	0,00	800,00	800,00	0,00	7.040,00	7.040,00
3.4	DEMOLICAO DE CONTRA PISO	M2	665,00	19,55	13.000,75	0,00	665,00	665,00	0,00	13.000,75	13.000,75
3.5	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO	M2	855,00	13,04	11.149,20	0,00	855,00	855,00	0,00	11.149,20	11.149,20
3.6	REMOÇÃO DE PISO EM CARPETE	M2	57,51	3,29	189,21	0,00	57,51	57,51	0,00	189,21	189,21
3.7	REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2	260,00	13,98	3.634,80	0,00	30,00	30,00	0,00	419,40	419,40
3.8	REMOÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	M2	200,00	28,58	5.716,00	0,00	12,00	12,00	0,00	342,96	342,96
3.9	REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	205,00	49,96	10.241,80	0,00	205,00	205,00	0,00	10.241,80	10.241,80
3.10	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	2,94	339,76	998,89	0,00	2,94	2,94	0,00	998,89	998,89
3.11	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	2,70	339,76	917,35	0,00	2,70	2,70	0,00	917,35	917,35
3.12	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOÇAO	M2	10,50	33,50	351,75	0,00	10,50	10,50	0,00	351,75	351,75
3.13	REMOÇÃO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	M	41,70	35,61	1.484,94	0,00	41,70	41,70	0,00	1.484,94	1.484,94
3.14	DEMOLICAO E REMOÇÃO DO TELHADO										
3.14.1	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	465,00	10,55	4.905,75	0,00	465,00	465,00	0,00	4.905,75	4.905,75
3.14.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	200,00	20,54	4.108,00	0,00	200,00	200,00	0,00	4.108,00	4.108,00

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.									
27.05.7	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	11,00	0,18	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.05.8	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	11,00	0,26	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.05.9	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	11,00	0,53	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.05.10	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXAÇÃO	UN	38,00	31,70	1.204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haste de aterramento 2,40x5/8"	Un.	11,00	45,83	504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caixa de aterramento em concreto	Un.	11,00	59,04	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA											
27.06.2	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA LED	UNID.	40,00	50,26	2.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	284,25	25,00	7.106,25	0,00	284,00	284,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
27.06.4	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	568,50	1,16	659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	568,50	1,16	659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.6	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	569,00	1,16	660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.7	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	44,00	7,36	323,84	0,00	44,00	44,00	0,00	323,84	323,84	0,00
27.06.8	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	47,00	2,08	97,76	0,00	47,00	47,00	0,00	97,76	97,76	0,00
27.06.9	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	94,00	0,90	84,60	0,00	94,00	94,00	0,00	84,60	84,60	0,00
27.06.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	40,00	27,54	1.101,60	0,00	40,00	40,00	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00
27.06.13	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1,1/2")	UN	228,00	0,10	22,80	0,00	228,00	228,00	0,00	22,80	22,80	0,00
27.06.14	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	228,00	0,13	29,64	0,00	228,00	228,00	0,00	29,64	29,64	0,00
27.06.15	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	40,00	3,24	129,60	0,00	40,00	40,00	0,00	129,60	129,60	0,00
27.07	SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO											
27.07.1	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL DE INCENDIO	UNID.	1,00	5000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.2	Acionador Manual Endereçavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	UNID.	2,00	212,95	425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.3	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	UNID.	2,00	288,63	577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.4	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	UNID.	8,00	234,71	1.877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	61,25	3,11	190,49	0,00	61,25	61,25	0,00	190,49	190,49	0,00
27.07.6	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	26,00	7,36	191,36	0,00	26,00	26,00	0,00	191,36	191,36	0,00
27.07.7	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	122,50	3,20	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.9	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1,1/2")	UN	49,00	0,10	4,90	0,00	49,00	49,00	0,00	4,90	4,90	0,00
27.07.10	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	49,00	0,13	6,37	0,00	49,00	49,00	0,00	6,37	6,37	0,00
27.07.1	PLACA INDICATIVA DE SAIDA	UNID.	8,00	95,48	763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.2	PLACA INDICATIVA DE SAIDA	UNID.	3,00	95,48	286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.3	PLACA INDICATIVA DE SAIDA	UNID.	4,00	95,48	381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.5	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	24,93	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.6	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	24,93	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÃO				107.952,27				0,00		68.894,42	
28.01	INFRAESTRUTURA ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS											
28.01.1	Abraçadeira sobrenial com chaveta para eletroduto pvc rígido diam. 1"	UN	240,00	0,91	218,40	0,00	240,00	240,00	0,00	218,40	218,40	0,00
28.01.2	Abraçadeira sobrenial com chaveta para eletroduto pvc rígido diam. 2"	UN	3,00	1,74	5,22	0,00	3,00	3,00	0,00	5,22	5,22	0,00
28.01.3	Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4"	UNID.	1.000,00	0,04	40,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	40,00	40,00	0,00
28.01.4	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	200,00	0,51	102,00	0,00	200,00	200,00	0,00	102,00	102,00	0,00
28.01.5	BUCHA DE NYLON SEM ABA S5	UN	280,00	0,08	22,40	0,00	280,00	280,00	0,00	22,40	22,40	0,00
28.01.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	110,00	14,28	1.570,80	0,00	110,00	110,00	0,00	1.570,80	1.570,80	0,00
28.01.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	12,00	17,95	215,40	0,00	12,00	12,00	0,00	215,40	215,40	0,00
28.01.8	Caixa de passagem em alvenaria rebocada dim. 65x45x80cm	UM	3,00	837,50	2.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.9	Cinta de alumínio 10/1mmx1m com fecho	UM	4,00	53,35	213,40	0,00	4,00	4,00	0,00	213,40	213,40	0,00

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
	QUADRO ORION PLUS, SOBREPOR, IP65 ATE 630A, 500X400X200mm MONTADO E ENSAIADO CONFORME NORMA IEC60439, INCLUI: 01 ORION PLUS MET PO a.500 l.400 p.200, 03 DISJ 3 POLOS 32A CURVA C 6KA, 01 CHAVE 32A 3 POSIÇÕES 4 POLOS TRANSFERENCIA LW28, ACESSÓRIOS, BARRAMENTOS, MONTAGENS E ENSAIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pç	1,00	2128,04	2.128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.03	Chave de partida direta para motor monofásico de 1,5 CV (do sistema de renovação de ar), tensão de operação 220 V, com relé de proteção de falta de fase. Deverá ter comomando local e poder a ser acionado também por relé horário. Modelo de referência PDW Weg ou similar	PÇ	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELÉTRICOS												
30.01	INFRAESTRUTURA ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS												
								105.565,47				576,51	14.275,42
30.01.1	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	280,00	0,79	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	10,00	0,91	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.3	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	3,00	1,56	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.4	Arruela lisa diam. 1/4" GF	UN	3.300,00	0,40	1.320,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
30.01.5	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4.80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	300,00	0,51	153,00	0,00	300,00	300,00	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00
30.01.6	BUCHA DE NYLON SEM ABA S5	UN	300,00	0,08	24,00	0,00	300,00	300,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00
30.01.7	Caixa de passagem em alumínio dim. 20x20x10cm com anel de vedação e tampa anti-derrapante	UN	6,00	28,23	169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.8	Caixa de embutir em pvc retangular dim. 4"x2"	UN	210,00	14,28	2.998,80	27,00	0,00	27,00	385,56	0,00	385,56	0,00	385,56
30.01.9	Caixa de embutir em pvc retangular dim. 4"x2"tipo aquatic	UN	1,00	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.10	Caixa de embutir em pvc quadrada diam. 4"x4	UN	10,00	17,95	179,50	5,00	0,00	5,00	89,75	0,00	89,75	0,00	89,75
30.01.11	Caixa de embutir no piso em alumínio quadrada diam. 4"x4"	PÇ	10,00	40,24	402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.12	Coluna plus standart de alumínio cor branca com dois extensores e duas luvas de acabamento. Ref. Dutotec. H= 3,0m útil.	PÇ	4,00	1175,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 4" para duto PEAD	oç	2,00	8,69	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 4" para duto pvc rígido	pç	2,00	8,69	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 2" para duto pvc rígido	pç	4,00	6,06	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 1" para duto pvc rígido	pç	21,00	4,73	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 1.1/2" para duto pvc rígido	pç	1,00	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conjunto de bucha e arruela de alumínio diam 3/4" para duto pvc rígido	pç	164,00	2,96	485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13	Condulete em alumínio multiplas saídas diam. 3/4"	UN	173,00	30,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.14	Condulete em alumínio multiplas saídas diam. 1"	UN	8,00	42,54	340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.15	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	6,00	3,14	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.16	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	6,00	4,30	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.17	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	284,00	2,08	590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.18	Curva horizontal 90 graus para eletrocalha GF 100x50mm	UNID.	1,00	89,84	89,84	0,00	1,00	1,00	89,84	0,00	89,84	89,84	89,84
30.01.19	Curva vertical 90 graus interna para eletrocalha GF 100x50mm	UNID.	3,00	57,86	173,58	0,00	3,00	3,00	173,58	0,00	173,58	173,58	173,58
30.01.20	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00	5,71	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.21	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	6,00	2,70	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.22	Eletrocalha perfurada tipo U, chapa #18, GF-galvanizada á fogo dim. 100x50x3000mm	UNID.	55,00	40,86	2.247,30	0,00	55,00	55,00	2.247,30	0,00	2.247,30	2.247,30	2.247,30
30.01.23	Eletrocuto de pvc antichama, tipo corrugado reforçado diam. 3/4" cor laranja	M	350,00	1,84	644,00	55,00	0,00	55,00	101,20	0,00	101,20	0,00	101,20

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
30.03.25	Cabo sintenâx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #2,5mm2 cor azul-claro	M	200,00	4,74	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.26	Cabo sintenâx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #4,0mm2 cor preto	M	20,00	7,23	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.27	Cabo sintenâx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #4,0mm2 cor vermelho	M	60,00	7,23	433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.28	Cabo sintenâx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #4,0mm2 cor cinza	M	20,00	7,23	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.29	Cabo sintenâx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #4,0mm2 cor azul-claro	M	100,00	7,23	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.30	Cabo sintenâx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #6,0mm2 cor preto	M	60,00	10,29	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.31	Cabo sintenâx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #6,0mm2 cor vermelho	M	60,00	10,29	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.32	Cabo sintenâx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #6,0mm2 cor cinza	M	60,00	10,29	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.33	Cabo sintenâx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #6,0mm2 cor azul-claro	M	60,00	10,29	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.34	Cabo sintenâx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #10,0mm2 cor preto	M	30,00	17,05	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.35	Cabo sintenâx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #10,0mm2 cor azul-claro	M	30,00	17,05	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.36	Cabo sintenâx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #25,0mm2 cor preto	M	10,00	41,25	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.37	Cabo sintenâx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #25,0mm2 cor vermelho	M	10,00	41,25	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.38	Cabo sintenâx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #25,0mm2 cor cinza	M	10,00	41,25	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.39	Cabo sintenâx 0,6/1kV - isolação EPR 90 graus - #25,0mm2 cor azul-claro	M	10,00	41,25	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.40	Fita de alta fusão 10m	un	3,00	1,63	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.41	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	20,00	4,54	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS				25.998,35				0,00			22.484,85	
32.4	ALIMENTAÇÃO PREDIAL												
32.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	52,19	26,94	1.406,00	0,00	52,19	52,19	0,00	1.406,00	1.406,00		
32.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,01	19,60	490,20	0,00	25,01	25,01	0,00	490,20	490,20		
32.4.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	8,70	8,70	0,00	1,00	1,00	0,00	8,70	8,70		
32.4.4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,58	11,16	0,00	2,00	2,00	0,00	11,16	11,16		
32.4.5	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	24,71	49,42	0,00	2,00	2,00	0,00	49,42	49,42		
32.4.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,30	10,60	0,00	2,00	2,00	0,00	10,60	10,60		
32.4.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	18,96	18,96	0,00	1,00	1,00	0,00	18,96	18,96		
32.4.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	5,81	23,24	0,00	4,00	4,00	0,00	23,24	23,24		
32.4.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,61	15,22	0,00	2,00	2,00	0,00	15,22	15,22		
32.4.10	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4) , 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	207,50	207,50	0,00	1,00	1,00	0,00	207,50	207,50		
32.4.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	27,86	27,86	0,00	1,00	1,00	0,00	27,86	27,86		
32.4.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2". FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	26,86	53,72	0,00	2,00	2,00	0,00	53,72	53,72		
32.6	BARRILETE												
32.6.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,93	68,26	1.292,16	0,00	18,93	18,93	0,00	1.292,16	1.292,16		

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.									
32.6.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,25	36,19	298,57	0,00	8,25	8,25	0,00	298,57	298,57	
32.6.3	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	103,16	103,16	0,00	1,00	1,00	0,00	103,16	103,16	
32.6.4	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	61,18	122,36	0,00	2,00	2,00	0,00	122,36	122,36	
32.6.5	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	38,15	38,15	0,00	1,00	1,00	0,00	38,15	38,15	
32.6.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	86,01	86,01	0,00	1,00	1,00	0,00	86,01	86,01	
32.6.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	63,38	63,38	0,00	1,00	1,00	0,00	63,38	63,38	
32.6.8	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	41,45	82,90	0,00	2,00	2,00	0,00	82,90	82,90	
32.6.9	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	22,04	44,08	0,00	2,00	2,00	0,00	44,08	44,08	
32.6.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	63,38	63,38	0,00	1,00	1,00	0,00	63,38	63,38	
32.6.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	86,01	86,01	0,00	1,00	1,00	0,00	86,01	86,01	
32.6.12	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	UN	3,00	21,89	65,67	0,00	3,00	3,00	0,00	65,67	65,67	
32.6.13	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	1,00	38,31	38,31	0,00	1,00	1,00	0,00	38,31	38,31	
32.6.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	41,45	124,35	0,00	3,00	3,00	0,00	124,35	124,35	
32.7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO											
32.7.1	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	13,44	120,96	0,00	9,00	9,00	0,00	120,96	120,96	
32.7.2	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00	12,44	236,36	0,00	19,00	19,00	0,00	236,36	236,36	
32.7.3	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	5,36	16,08	0,00	3,00	3,00	0,00	16,08	16,08	
32.7.4	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	18,39	36,78	0,00	2,00	2,00	0,00	36,78	36,78	
32.7.5	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	16,21	32,42	0,00	2,00	2,00	0,00	32,42	32,42	
32.7.6	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	4,00	18,65	74,60	0,00	4,00	4,00	0,00	74,60	74,60	
32.7.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00	55,93	167,79	0,00	3,00	3,00	0,00	167,79	167,79	
32.7.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	23,00	58,60	1.347,80	0,00	23,00	23,00	0,00	1.347,80	1.347,80	

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
32.7.9	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	240,19	720,57	0,00	3,00	3,00	0,00	720,57	720,57		
32.7.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	46,00	5,81	267,26	0,00	46,00	46,00	0,00	267,26	267,26		
32.7.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	7,31	43,86	0,00	6,00	6,00	0,00	43,86	43,86		
32.7.12	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	17,18	103,08	0,00	6,00	6,00	0,00	103,08	103,08		
32.7.13	TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM	UN	3,00	12,59	37,77	0,00	3,00	3,00	0,00	37,77	37,77		
32.7.14	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 " X 20 CM)	UN	3,00	8,29	24,87	0,00	3,00	3,00	0,00	24,87	24,87		
32.7.15	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	UN	19,00	2,74	52,06	0,00	19,00	19,00	0,00	52,06	52,06		
32.7.16	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	3,79	15,16	0,00	4,00	4,00	0,00	15,16	15,16		
32.7.17	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	4,14	4,14	0,00	2,00	2,00	0,00	8,28	8,28		
32.7.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	88,00	3,99	351,12	0,00	88,00	88,00	0,00	351,12	351,12		
32.7.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	11,43	160,02	0,00	14,00	14,00	0,00	160,02	160,02		
32.7.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	319,79	4,41	1.410,27	0,00	319,79	319,79	0,00	1.410,27	1.410,27		
32.7.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,20	8,85	1,77	0,00	0,20	0,20	0,00	1,77	1,77		
32.7.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,41	12,74	17,96	0,00	1,41	1,41	0,00	17,96	17,96		
32.7.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	83,89	15,78	1.323,78	0,00	83,89	83,89	0,00	1.323,78	1.323,78		
32.7.24	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	26,00	1,15	29,90	0,00	26,00	26,00	0,00	29,90	29,90		
32.7.25	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	7,00	23,91	167,37	0,00	7,00	7,00	0,00	167,37	167,37		
32.7.26	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	8,06	16,12	0,00	2,00	2,00	0,00	16,12	16,12		
32.7.27	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	2,53	2,53	0,00	1,00	1,00	0,00	2,53	2,53		
32.7.28	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2". PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	1,50	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00		
32.7.29	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4". PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10,00	2,65	26,50	0,00	10,00	10,00	0,00	26,50	26,50		
32.7.30	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	1,21	2,42	0,00	2,00	2,00	0,00	2,42	2,42		
32.08	DESCONECTORES												
32.08.1	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA	UN	18,00	22,88	411,84	0,00	18,00	18,00	0,00	411,84	411,84		
32.08.2	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	3,00	5,10	15,30	0,00	3,00	3,00	0,00	15,30	15,30		
32.08.3	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	18,00	162,38	2.922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.08.4	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	1,00	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.09	VENTILACAO												
32.09.1	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	2,75	13,75	0,00	5,00	5,00	0,00	13,75	13,75		
32.09.2	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	6,31	12,62	0,00	2,00	2,00	0,00	12,62	12,62		
32.09.3	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	18,00	2,11	37,98	0,00	18,00	18,00	0,00	37,98	37,98		
32.09.4	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	13,00	5,39	70,07	0,00	13,00	13,00	0,00	70,07	70,07		
32.09.5	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	7,78	23,34	0,00	3,00	3,00	0,00	23,34	23,34		
32.09.6	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	88,71	6,55	581,05	0,00	88,71	88,71	0,00	581,05	581,05		
32.09.7	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	70,39	8,86	623,66	0,00	70,39	70,39	0,00	623,66	623,66		

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.									
33.8	Unidade Evaporadora Tipo Cassete. Capacidade 12.600 Btu/h. Ref. Daikin FXFSQ32AVE	UNID.	5,00	1500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.9	Unidade Evaporadora Tipo Cassete. Capacidade 16.000 Btu/h. Ref. Daikin FXFSQ40AVE	UNID.	1,00	1625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.10	Unidade Evaporadora Tipo Cassete. Capacidade 19.800 Btu/h. Ref. Daikin FXFSQ50AVE	UNID.	5,00	2062,50	10.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.11	Unidade Evaporadora Tipo Cassete. Capacidade 24.900 Btu/h. Ref. Daikin FXFSQ63AVE	UNID.	6,00	2187,50	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.12	Unidade Evaporadora Tipo Cassete. Capacidade 31.700 Btu/h. Ref. Daikin FXFSQ80AVE	UNID.	1,00	2562,50	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.13	Unidade Evaporadora Split Hi Wall. Capacidade 15.400 Btu/h. Ref. Daikin FXAQ40PVE	UNID.	1,00	1287,50	1.287,50	0,00	1,00	1,00	0,00	1.287,50	1.287,50	0,00
33.14	Unidade Evaporadora Split Hi Wall. Capacidade 19.100 Btu/h. Ref. Daikin FXAQ50PVE	UNID.	1,00	1400,00	1.400,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
33.15	Unidade Tipo Piso/Teto. Capacidade 38.200 Btu/h. Ref. Daikin FXHQ100MAVE	UNID.	1,00	2937,50	2.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.16	Caixa de Ventilação com filtro. Modelo CVLD. Capacidade de 2.130 m3/h. Ref. Termodin	UNID.	2,00	2000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.17	Caixa Plenum com Difusor 4 vias. Capacidade de insuflação de 250 m3/h. Ref. Trocalor.	UNID.	9,00	375,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.18	Exaustão Conjunto Ventokit Modelo 80. Capacidade de 80 m3/h.	UNID.	5,00	337,50	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.19	Linha Frigorígena Kit composto de : 1 tubo de cobre para líquido dia. 15,9 mm com tubo de isolamento + 1 tubo de cobre para gás dia. 28,6 mm, com tubo de isolamento (Elastômero esponjoso de polietileno).	UNID.	1,00	10625,00	10.625,00	0,00	1,00	1,00	0,00	10.625,00	10.625,00	0,00
33.20	Linha Frigorígena Kit composto de : 1 tubo de cobre para líquido dia. 9,5 mm com tubo de isolamento + 1 tubo de cobre para gás dia. 15,9 mm, com tubo de isolamento (Elastômero esponjoso de polietileno).	UNID.	1,00	20000,00	20.000,00	0,00	1,00	1,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
33.21	Linha Frigorígena Kit composto de : 1 tubo de cobre para líquido dia. 6,4 mm com tubo de isolamento + 1 tubo de cobre para gás dia. 12,7 mm, com tubo de isolamento (Elastômero esponjoso de polietileno).	UNID.	1,00	17500,00	17.500,00	0,00	1,00	1,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
33.22	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM	M	420,00	1,26	529,20	420,00	0,00	420,00	529,20	0,00	529,20	0,00
33.23	Junta de derivação REFNET 28,6 - 15,9 mm ref. 72T (gás-liquido / Daikin)	UNID.	27,00	1050,00	28.350,00	0,00	27,00	27,00	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
33.24	Duto retangular de aço galvanizado de 250x300mm	m	55,00	50,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.25	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3"	M	6,50	47,63	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.26	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3"	M	12,00	47,63	571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.27	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3"	M	21,00	47,63	1.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.28	Junta Flexível de Iona e metálica. Multivac 70/100/05	UNID.	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.29	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	UNID.	3,00	25,89	77,67	3,00	0,00	3,00	77,67	0,00	77,67	0,00
33.30	Barra roscada 3/8", galvanizada	m	120,00	3,75	450,00	120,00	0,00	120,00	450,00	0,00	450,00	0,00
33.31	Chumbador de aço 3/8", galvanizado	pc	120,00	10,00	1.200,00	120,00	0,00	120,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33.32	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	180,00	0,14	25,20	180,00	0,00	180,00	25,20	0,00	25,20	0,00
33.33	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	320,00	1,74	556,80	320,00	0,00	320,00	556,80	0,00	556,80	0,00
33.34	Barra roscada 1/4", galvanizada	m	332,00	2,50	830,00	332,00	0,00	332,00	830,00	0,00	830,00	0,00
33.35	Chumbador de aço 1/4", galvanizado	pc	488,00	6,25	3.050,00	488,00	0,00	488,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
33.36	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	1.464,00	0,20	292,80	1.464,00	0,00	1.464,00	292,80	0,00	292,80	0,00
33.37	Veneziana auto-fechante, para tubo dia. 150 mm (Ventokit)	pc	2,00	62,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.38	Veneziana auto-fechante, para tubo dia. 100 mm (Ventokit)	pc	1,00	43,75	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.39	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	9,00	10,06	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.40	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	6,00	85,15	510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.41	Suporte L de aço com pintura epoxi, 600x600 mm (conjunto)	conj	2,00	212,50	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.42	Fita perfurada 19 mm de aço galvanizado	m	18,00	1,63	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	IMPERMEABILIZAÇÃO				7.006,17				2.246,54		6.237,62	
34.01	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PRODUTOS ASFÁLTICOS											
34.01.1	Manta Asfática (filamentos de poliéster ou véu de fibra de vidro) com espessura de 0,3 cm, com proteção mecânica (1:4 argamassa de cimento e areia, desempenada com espessura mínima de 3 cm) e proteção regularização (1:3 argamassa de cimento e areia média com espessura de 1,5 cm)	M2	43,14	60,00	2.588,40	0,00	43,14	43,14	0,00	2.588,40	2.588,40	0,00
34.01.2	Manta Asfática (filamentos de poliéster ou véu de fibra de vidro) com espessura de 0,3 cm e com tela de poliéster em ralos	M2	9,82	60,00	589,20	0,82	9,00	9,82	49,20	540,00	589,20	0,00
34.02	IMPERMEABILIZAÇÃO COM SISTEMA CRISTALIZANTE											
34.02.1	Argamassa polimérica (cimento, agregados minerais inertes, polímeros acrílicos e aditivos), com tela de poliéster em ralos e proteção de regularização (1:3 argamassa de cimento e areia média com espessura de 1,5 cm)	KG	149,86	5,63	843,71	0,00	30,00	30,00	0,00	168,90	168,90	0,00
34.02.2	Argamassa polimérica (cimento, agregados minerais inertes, polímeros acrílicos e aditivos)	KG	21,65	5,63	121,89	0,00	5,00	5,00	0,00	28,15	28,15	0,00

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.									
	CONDULETE EM PVC TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	0	44,00	13,09	575,85	44,00	0,00	44,00	575,85	0,00	575,85	
	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	0	47,00	6,41	301,39	47,00	0,00	47,00	301,39	0,00	301,39	
	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	0	94,00	6,39	600,43	94,00	0,00	94,00	600,43	0,00	600,43	
	Entrada provisória de energia - Poste trifásico	Cj	1,00	2937,50	2.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Haste de aterramento 2 40x5/8"	un.	1,00	45,83	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Caixa de aterramento em concreto	un.	2,00	59,04	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cabo multiplexado 3x10 mm² + Neutro para entrada de energia	m	27,00	11,54	311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Armação com Isolador de porcelana tripolar	un.	1,00	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Mão de obra para instalação da subestação											
	Instalação de transformador	un.	1,00	6455,00	6.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Mão de obra para ligação de entrada de energia em poste, passagem de cabos, montagem e ligação da cabina de medição.	vb	1,00	20000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Climatização											
	Alimentadores para as evaporadoras - Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #2,5mm2 cor cinza/preta/azul/verde	m	1.300,00	2,80	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cabo de comunicação entre as evaporadoras e condensadoras - cabo shield 2x1,5 mm²	m	420,00	5,31	2.229,42	420,00	0,00	420,00	2.229,42	0,00	2.229,42	
	Válvula de bloqueio para gás refrigerante instalado nas linhas de refrigeração.											
	1/4"	un.	25,00	172,50	4.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3/8"	un.	11,00	177,50	1.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1/2"	un.	28,00	203,75	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5/8"	un.	11,00	208,75	2.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 1/4"	un.	3,00	208,75	626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DRENAGEM DA CLIMATIZAÇÃO.											
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	124,00	8,86	1.098,95	124,00	0,00	124,00	1.098,95	0,00	1.098,95	
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	60,00	12,74	764,25	60,00	0,00	60,00	764,25	0,00	764,25	
	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8" (cobre) ou 3/4" (ferro)	m	60,00	21,50	1.290,00	60,00	0,00	60,00	1.290,00	0,00	1.290,00	
	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8" (cobre) ou 3/4" (ferro)	m	124,00	21,50	2.666,00	124,00	0,00	124,00	2.666,00	0,00	2.666,00	
	Fixação das tubulações de drenagem no teto e paredes com fita metálica perfurada de 18 mm- 1 apoio a cada 50 cm	m	184,00	18,78	3.454,60	184,00	0,00	184,00	3.454,60	0,00	3.454,60	
	Gás refrigerante R410a	kg	42,83	98,99	4.239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Andaime para montagem da fachada ventilada											
	Andaime fachadeiro - montagem e desmontagem	m²	1.148,40	8,08	9.273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Andaime fachadeiro - locação mensal de andaime - 90 dias	m²/mês	3.445,20	6,11	21.058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Basalto fosco na escada - Assentamento Piso Basalto Fosco 40x40	m²	12,00	158,26	1.899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IMPERMEABILIZAÇÕES											
	Impermeabilização com manta aluminizada na calha da cobertura e na tampa do reservatório (face superior)	m²	74,67	60,00	4.480,20	74,67	0,00	74,67	4.480,20	0,00	4.480,20	
	INSTALAÇÃO PLUVIAL DA COBERTURA											
	Perfuração de laje para execução das descidas >75mm	un.	12,00	158,75	1.905,00	12,00	0,00	12,00	1.905,00	0,00	1.905,00	
	Tubulação de descida e no terreno em PVC 100 mm	m	147,00	26,16	3.845,89	147,00	0,00	147,00	3.845,89	0,00	3.845,89	
	Caixas de inspeção e limpeza em concreto pré-moldado com tampa de concreto.	un.	2,00	103,98	207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Caixas de inspeção em PVC	un.	6,00	151,59	909,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grelha de ferro fundido para caixa de passagem pluvial no estacionamento 30x50 cm	un.	1,00	124,38	124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Escavação de vala	m³	43,20	82,09	3.546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lastro de areia	m³	5,40	91,68	495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reaterro de vala	m³	37,09	16,39	607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rufo de aço galvanizado	m	144,50	73,44	10.611,72	33,50	0,00	33,50	2.460,16	0,00	2.460,16	
	GESSO											
	GESSO ACARTONADO (ST) - 1 FACE	m²	107,81	51,45	5.546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GESSO ACARTONADO (RU) - 1 FACE	m²	24,81	69,20	1.716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GESSO ACARTONADO - SOMENTE ESTRUTURA SOBRE O FORRO	m²	206,48	24,78	5.115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS											
	Chapisco em áreas não contabilizadas	m²	165,50	3,61	597,87	165,50	0,00	165,50	597,87	0,00	597,87	
	Reboco em áreas não contabilizadas	m²	138,52	33,10	4.585,01	138,52	0,00	138,52	4.585,01	0,00	4.585,01	
	Regradouro	m²	26,79	33,10	886,75	26,79	0,00	26,79	886,75	0,00	886,75	
	Fornecimento e Instalação de revestimento com granito flameado padrão arabesco ou similar. Áreas não contabilizadas.	m²	15,83	548,44	8.681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL				191.058,49			TOTAL DESTA MEDIÇÃO ADITIVO			46.322,80	

TERMO CIRCUNSTANCIADO

REMOÇÕES												
	Remoção da estrutura de madeira do forro no pavimento térreo - Incluso transporte horizontal, vertical e bota fora do entulho gerado.	m²	337,60	29,51	9.963,42	337,60	0,00	337,60	9.963,42	0,00	9.963,42	
	Desmontagem da escada metálica	kg	1.494,91	3,93	5.867,53	1.494,91	0,00	1.494,91	5.867,53	0,00	5.867,53	

ITEM	SERVIÇO	UN.	QUANT.									
	Transporte horizontal da escada	un.	1,00	540,66	540,66	1,00	0,00	1,00	540,66	0,00	540,66	
	Montagem da escada metálica - incluso transporte horizontal	kg	1.195,93	4,04	4.828,57	1.195,93	0,00	1.195,93	4.828,57	0,00	4.828,57	
	Remoção de dejetos na cobertura - Incluso remoção do material presente na cobertura, transporte horizontal, transporte vertical por 2 pavimentos e bota fora do material.	m3	100,00	284,14	28.413,75	100,00	0,00	100,00	28.413,75	0,00	28.413,75	
	Contrapiso											
	Contrapiso pavimento superior e inferior - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	59,75	31,35	1.873,16	59,75	0,00	59,75	1.873,16	0,00	1.873,16	
	Regularização do contrapiso para nivelção do seg. pavimento. - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 - Item 10.1.1 da Planilha Obra	m²	382,60	31,35	11.994,51	382,60	0,00	382,60	11.994,51	0,00	11.994,51	
	Execução de vergas e contra vergas estruturais de apoio para esquadrias e fachada em placa cimentícia. Incluso corte, dobra e montagem de armaduras, montagem de formas e concretagem.	m³	6,03	2252,38	13.581,82	6,03	0,00	6,03	13.581,82	0,00	13.581,82	
TOTAL GERAL					77.063,42				TOTAL DESTA MEDIÇÃO TERMO		77.063,42	

SUPRESSÃO

REMOÇÕES												
	Remoção de Azulejo	m²	105,00	R\$39,97	4.196,85	105,00	0,00	105,00	4.196,85	0,00	4.196,85	
	Remoção de piso cerâmico	m²	655,00	R\$13,04	8.539,56	655,00	0,00	655,00	8.539,56	0,00	8.539,56	
	Remoção de contrapiso	m²	0,00	R\$19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Remoção do revestimento de argamassa	m²	800,00	R\$8,80	7.040,00	800,00	0,00	800,00	7.040,00	0,00	7.040,00	
	Demolição de alvenaria	m³	134,00	R\$75,41	10.105,28	134,00	0,00	134,00	10.105,28	0,00	10.105,28	
	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO (cons. Forro metalico e de fibra)	M²	880,00	R\$2,64	2.321,00	330,00	0,00	330,00	870,38	0,00	870,38	
	Peitoris e Vergas											
	Peitoris e vergas	m	100,00	R\$17,28	1.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fixação de peitoris e vergas em alvenarias e pilares existentes	m	150,00	R\$17,28	2.591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ESTRUTURA											
	Escada em concreto	m³	3,00	R\$2.252,38	6.757,13	3,00	0,00	3,00	6.757,13	0,00	6.757,13	
	Escavação manual para execução da fundação da escada	m³	0,84	R\$82,09	68,95	0,84	0,00	0,84	68,95	0,00	68,95	
	Cantoneira metálica L 6" x 1/2 A36	kg	38,54	R\$8,91	343,52	38,54	0,00	38,54	343,49	0,00	343,49	
	Barra rosca 1/2" A193	un.	8,00	R\$9,85	78,80	8,00	0,00	8,00	78,80	0,00	78,80	
	Solda química do tipo sikadur 52 - contato concreto novo x existente	lata	1,00	R\$134,71	134,71	1,00	0,00	1,00	134,71	0,00	134,71	
	Solda química do tipo sikadur 32 - armadura da escada na viga superior	lata	0,50	R\$134,71	67,36	0,50	0,00	0,50	67,36	0,00	67,36	
	INSTALAÇÕES E MOBILIARIOS											
	Bancada de granito de vestiário de 2o pav.	Cj	2,00	R\$494,31	988,63	2,00	0,00	2,00	988,63	0,00	988,63	
	Instalações hidro sanitárias (50 %)	Cj	1,00	R\$17.229,35	17.229,35	1,00	0,00	1,00	17.229,35	0,00	17.229,35	
	REVESTIMENTOS											
	Revestimento cerâmico	m2	110,00	R\$34,71	3.818,10	110,00	0,00	110,00	3.818,10	0,00	3.818,10	
	IMPERMEABILIZAÇÕES											
	Poliuretano modificado de alta resistência química e mecânica, e com selante base poliuretano	m²	37,05	R\$75,64	2.802,37	37,05	0,00	37,05	2.802,37	0,00	2.802,37	
	Poliuretano modificado de alta resistência química e mecânica, com calafetação e grout	m²	0,80	R\$75,64	60,51	0,80	0,00	0,80	60,51	0,00	60,51	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS											
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	284,25	R\$25,00	7.106,25	284,25	0,00	284,25	7.106,25	0,00	7.106,25	
	GESSO											
	GESSO ACARTONADO (ST) - 2 FACES	m²	37,25	R\$77,98	2.904,57	37,25	0,00	37,25	2.904,57	0,00	2.904,57	
	GESSO ACARTONADO (RU) - 2 FACES	m²	54,10	R\$113,49	6.139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	m²	146,35	R\$69,29	10.140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL					95.161,58				TOTAL DESTA MEDIÇÃO A SUPRIMIR		73.112,27	

AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIÃO
Rua Esteves Junior, 395
Centro - Florianópolis - SC
A/C: Eng. André

Ref.: Documentos Medição de obra

N/Ref.: 009/CNH/2018

Florianópolis, 03 de Setembro de 2018.

Prezados Senhores,

Vimos por meio deste fazer entrega dos documentos relativo à 7ª medição da obra "reforma do prédio que abrigará a nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas", convencionado pelo contrato número CP 9376/2017-1, no valor total de R\$ 117.603,84 (cento e dezessete mil seiscientos e três reais e oitenta e quatro centavos), sendo de mão de obra R\$ 35.986,78 e de material R\$ 81.617,06, bem como os documentos requeridos, conforme segue:

- Diário de obra;
- Relatório fotográfico;
- Planilha de medição do período;
- Recibos de salários
- Documentos contábeis competência 06/2018;
- Nota fiscal nº 33

Qualquer dúvida quanto aos documentos entregues, estamos ao inteiro dispor.

Cordialmente,



SANTIAGO RAMIREZ/PARQUET
(Diretor Administrativo)
CPF: 041.269.779-37

AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIÃO
Rua Esteves Junior, 395
Centro – Florianópolis – SC
A/C: Eng. André

Ref.: Documentos Medição de obra

N/Ref.: 009/CNH/2018

Florianópolis, 03 de Setembro de 2.018.

Prezados Senhores,

Vimos por meio deste fazer entrega dos documentos relativo à 7ª medição da obra "reforma do prédio que abrigará a nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas", convencionado pelo contrato número CP 9376/2017-1, no valor total de R\$ 117.603,84 (cento e dezessete mil seiscentos e três reais e oitenta e quatro centavos), sendo de mão de obra R\$ 35.986,78 e de material R\$ 81.617,06, bem como os documentos requeridos, conforme segue:

- Diário de obra;
- Relatório fotográfico;
- Planilha de medição do período;
- Recibos de salários
- Documentos contábeis competência 06/2018;
- Nota fiscal nº 33

Qualquer dúvida quanto aos documentos entregues, estamos ao inteiro dispor.

Cordialmente,



SANTIAGO RAMIREZ PARQUET
(Diretor Administrativo)
CPF: 041.269.779-37

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente SIC SOC CIVIL AUD E PLANEJAMENT - 010025339800017800,

Seu arquivo lulftilopmc00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/08/2018 às 13:42.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9C75FFCA.6AE1439C.A9C9E691.2695AAB8.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:


NRA:LULFTILoPMC00004

Base de Processamento: SC


Município de apresentação da RE: Florianopolis/SC

Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	07/2018	
	5-IDENTIFICADOR	03.594.924/0001-51	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>172 - ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA Rua WALTER DE BONA CASTELAN, 173 CORREGO GRANDE 88037300 FLORIANOPOLIS - SC 4832253401</p>	6-VALOR DO INSS	1.008,57	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2018	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.088,50
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.097,07	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	07/2018	
	5-IDENTIFICADOR	03.594.924/0001-51	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>172 - ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA Rua WALTER DE BONA CASTELAN, 173 CORREGO GRANDE 88037300 FLORIANOPOLIS - SC 4832253401</p>	6-VALOR DO INSS	1.008,57	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2018	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.088,50
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.097,07	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pagamento de GPS



Nome: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA | Conta: 65072

NR DOCUMENTO 16		EMIÇÃO 06/08/2018 11:04:16
BANCO 85	AGÊNCIA 106	CONTA-DV 65072 - ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS
03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100	04 - COMPETÊNCIA 07/2018	05 - IDENTIFICADOR 03594924000151
06 - VALOR DO INSS 1.008,57	09 - VALOR OUT. ENTIDADES 1.088,50	10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
11 - VALOR TOTAL 2.097,07 ✓	DATA/HORA DO PAGAMENTO 06/08/2018 11:03:24	SEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO 5845
CÓDIGO DE BARRAS: Não Informado		
LINHA DIGITÁVEL Não Informado		
PROTOCOLO 18F0.5E5A.BDFA.275C.A42E.33E5.CB76.E88B		

SAC - 0800 647 2200
Atendimento todos os dias das 06:00:00às 22:00:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100
Atendimento todos os dias das 08:00:00às 17:00:00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2018 - 13:43:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0048) 32253401
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.346,92	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.594.924/0001-51	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.467,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.467,75
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858800000148 677501801800 807619180801 359492400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2018 - 13:43:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0048) 32253401
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.346,92	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.594.924/0001-51	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.467,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.467,75
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858800000148 677501801800 807619180801 359492400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Convenio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
COMPROVANTE DE ARRECADACAO DE FGTS - 06/08/2018

ORIGEM DA OPERACAO

CREDCREA - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
COOP. 4416 - Credicrea
Conta/DV: 6507-2
Cliente: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

Codigo de barras: 858800000148 677501801800
807619180801 359492400015

Tipo de Documento.....FGTS - GRF - 0180
Codigo do Convenio:0180
CNPJ/CEI empresa/CPF.....03.594.924/0001-51
Identificador.....
Data de Validade:.....31/12/2017
Competencia.....07/2018
Data do Pagamento.....06/08/2018

Valor Recolhido.....R\$ 1.467,75 /

Canal de Recebimento.....Internet Banking

Autenticacao:
EF36.0920.0CE6.741A.3036.BA21.C515.4721

OUVIDORIA BANCOOB 0800-646-4001
SAC 0800-123-4567

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000148 677501801800 807619180801 359492400015

EMPRESA: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 03.594.924/0001-51 N° ARQUIVO: LULFTILOPMC0000-4
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,74 RAT AJUSTADO: 5,22 COD REC: 150 COMP: 07/2018 N° CONTROLE: A7Fb08f2sxE0000-7
 TOMADOR/OBRA : ESPHERA REFORMA TRT CANOINHAS INSCRIÇÃO: 512426990977 N° CONTROLE: J9sU4NJMu600000-0
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 VIDAL RAMOS 200 CENTRO CANOINHAS 89460000 SC

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.195,95	REM SEM 13° SALÁRIO	2.195,95
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	175,67
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.195,95	REM SEM 13° SALÁRIO	2.195,95
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	175,67	DEPÓSITO	175,67
VAL DEVIDO PREV SOC	856,84	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA N° ARQUIVO: LULFILOPMC0000-4
 COMP: 07/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 5,22
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 03.594.924/0001-51

LOGRADOURO: WALTER DE BONA CASTELAN 173 BAIRRO: CORREGO GRANDE CNAE PREPONDERANTE: 7112000
 CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88037-300 TELEFONE: 0048-32253401 CNAE: 7112000
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos		1.581,25	0,00	0,00	1.581,25
Contribuintes Individuais		209,88	0,00	0,00	209,88
Empregados/Avulsos		3.753,38	0,00	0,00	3.753,38
Contribuintes Individuais		381,60	0,00	0,00	381,60
RAT		979,62	0,00	0,00	979,62
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		5.897,19	0,00	0,00	5.897,19
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.008,54	0,00	0,00	1.008,54
OUTRAS ENTIDADES		1.088,47	0,00	0,00	1.088,47
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		1.088,47	0,00	0,00	1.088,47
TOTAL A RECOLHER		2.097,01	0,00	0,00	2.097,01

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES-À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA
 COMP: 07/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: ESPHERA REFORMA TRT CANOINHAS
 N° DE CONTROLE: J9su4NJMu600000-0
 N° ARQUIVO: LULFTILOPMC0000-4
 INSCRIÇÃO: 03.594.924/0001-51
 FAP: 1,74 RAT AJUSTADO: 5,22
 INSCRIÇÃO: 5142426990977

LOGRADOURO: WALTER DE BONA CASTELAN 173
 CIDADE: FLORIANOPOLIS
 UF: SC CEP: 88037-300
 BAIRRO: CORREGO GRANDE
 TELEFONE: 0048 3225 3401
 CNAE PREPONDERANTE: 7112000
 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 856,84 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 175,67
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 5.897,19 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 5.897,19
 VALOR INFORMADO: 5.897,19

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 03.594.924/0001-51
 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Julho de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
195	ALEXANDRO VEIGA PEDREIRO	715210	591	1
			Admissão:	09/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168:40	1.085,95		
998	I.N.S.S.	8,00		86,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.085,95	86,87	
			Valor Líquido →	999,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.A de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.416,45	1.085,95	1.085,95	86,87	999,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 06/08/2018
 Assinatura do Funcionário
 Alex Sandro Veiga

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE JULHO ***

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 03.594.924/0001-51
 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Julho de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
184	MAICON JOSE BARBOSA SERVENTE	717020	591	1
			Admissão:	27/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.110,00		
998	I.N.S.S.	8,00		88,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.110,00	88,80	
			Valor Líquido →	1.021,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.A de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.110,00	1.110,00	1.110,00	88,80	1.021,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 06/08/2018
 Assinatura do Funcionário
 Maicon Jose Barbosa

FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI

- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: TRT de CAVOINHAS Data: 27/03/18

Nome do Funcionário: MAICON JOSÉ BARBOSA

DECLARAÇÃO

Declaro haver recebido gratuitamente e em perfeito estado de utilização, os Equipamentos de Proteção Individuais - EPI's relacionados nesta ficha, comprometendo-me a utilizá-los em conformidade com as normas vigentes, estando ciente da obrigatoriedade do uso dos mesmos. Responsabilizo-me pela guarda e conservação dos EPI's e estou ciente de que terei que devolvê-los quando sua vida útil estiver vencida, quando da troca por outro e no caso de desligamento da empresa. Autorizo o desconto em meus haveres, do valor do material extraviado ou danificado por mau uso ou pela falta de manutenção adequada. OBS.: um novo EPI será fornecido somente mediante a devolução do usado.

Data: 27/03/2018 Assinatura do Funcionário: maicon José BARBOSA

Material	Nº do CA	Data da Entrega	Assinatura
BOTA	17015	27/03/18	x maicon José BARBOSA
CAPACETE PROTEÇÃO	23782	27/03/18	x maicon José BARBOSA
CALÇA		27/03/18	x maicon José BARBOSA
CAMISETA		27/03/18	x maicon José BARBOSA
PROTETOR AURICULAR	9584		x
MÁSCARA PROTEÇÃO C/ FILTRO	39127		x
ÓCULOS PROTEÇÃO	33248	27/03/18	x maicon José BARBOSA
LUVA PIGMENTADA	34491	27/03/18	x maicon José BARBOSA
luva látex	38662	29/3/18	maicon José BARBOSA
luva pigmentada	34491	4/4/18	maicon José BARBOSA
luva látex	38662	10/4/18	maicon José BARBOSA
luva pigmentada	34491	13/4/18	maicon José BARBOSA
luva pigmentada	34491	18/4/18	maicon José BARBOSA
máscara PFF	38514	18/4/18	maicon José BARBOSA
luva pigmentada	34491	23/4/18	maicon José BARBOSA
Colcoado de aço	17015		
luva pigmentada	34491	3/5/18	maicon José BARBOSA
luva látex	38662	14/5/18	maicon José BARBOSA
luva nitrilica	38662	23/5/18	maicon José BARBOSA
CINTO DE SEGURANÇA	33547	29/5/18	maicon José BARBOSA

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA : 3/9/18 183 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

segunda-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contramestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Tec. em refrigeração	2	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

Aplicação do revestimento cerâmico 30x40cm nas paredes do refeitório/DML e vestiário masculino terceirizado no pavimento superior da edificação.
 Execução do sistema de drenagem das evaporadoras do pavimento superior da edificação.
 Remoção de entulho gerado e limpeza da obra.
 Execução do sistema hidrossanitário da edificação.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: **2/9/18** **182 /365**

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

domingo

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	0

Sub Empreiteiros

Tec. em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	0	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia


Não houve atividade em obra.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT


VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: **1/9/18** **181 /365**

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

sábado

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	0

Sub Empreiteiros

Tec. em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	0	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

Não houve atividade em obra.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 30/8/18 179 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

quinta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Tec. em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

Aplicação do revestimento cerâmico 30x40cm nas paredes do refeitório/DML no pavimento superior.

Execução do sistema de drenagem das evaporadoras do pavimento superior da edificação.

Remoção de entulho gerado e limpeza da obra.

Execução do sistema hidrossanitário da edificação.

Chumbamento das caixas e eletrodutos do sistema de iluminação externa nos muros de divisa da edificação.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 31/8/18 180 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

sexta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Tec. em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

Aplicação do revestimento cerâmico 30x40cm nas paredes do refeitório/DML e vestiário masculino terceirizado no pavimento superior da edificação.
Execução do sistema de drenagem das evaporadoras do pavimento superior da edificação.
Remoção de entulho gerado e limpeza da obra.
Execução do sistema hidrossanitário da edificação.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

29/8/18

178 /365

quarta-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Tec. em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

- Aplicação do revestimento cerâmico 30x40cm nas paredes do refeitório/DML no pavimento superior.
- Execução do sistema de drenagem das evaporadoras do pavimento superior da edificação.
- Remoção de entulho gerado e limpeza da obra.
- Execução do sistema hidrossanitário da edificação.
- Chumbamento das caixas e eletrodutos do sistema de iluminação externa nos muros de divisa da edificação.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT

[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

CSA-025 629
INGENIERO CIVIL
N. LOS RIOS PARQUE

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 27/8/18 176 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

segunda-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec. em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia


- Execução do sistema de drenagem das evaporadoras do pavimento superior da edificação.
- Posicionamento das caixas de iluminação e eletrodutos do sistema de iluminação externa nos muros de divisa.
- Execução de caixas de passagem do sistema de esgoto predial para nova saída de esgoto.
- Limpeza da obra.
- Execução do sistema hidrossanitário da edificação.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: **26/8/18** **175 /365**

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

domingo

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	0

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec. em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	0	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

.....
 Não houve atividade em obra.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

.....

Observações TRT

.....

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

[Handwritten Signature]
VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 25/8/18 174 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

sábado

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	0

Sub Empreiteiros

Tec. em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	0	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

Não houve atividades em obra.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMIREZ PARQUE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA : 24/8/18 173 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

sexta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Tec. em refrigeração	2	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia


- Execução da infraestrutura do sistema de climatização no pavimento superior da edificação.
- Execução do sistema de drenagem das evaporadoras do pavimento superior da edificação.
- Execução dos rasgos no muro de divisa dos fundos para execução do sistema de iluminação externa.
- Execução de caixas de passagem do sistema de esgoto predial para nova saída de esgoto.
- Limpeza da obra.
- Recebimento do elevador da ThyssenKrupp, armazenado em lugar seguro e protegido de intempéries.
- Execução do sistema hidrossanitário da edificação.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

TRT


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: **23/8/18** **172 /365**

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

quinta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Tec. em refrigeração	2	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

- Execução da infraestrutura do sistema de climatização no pavimento superior da edificação.
- Execução do sistema de drenagem das evaporadoras do pavimento superior da edificação.
- Execução dos rasgos no muro de divisa dos fundos para execução do sistema de iluminação externa.
- Execução de caixas de passagem do sistema de esgoto predial para nova saída de esgoto.
- Limpeza da obra.
- Execução do sistema hidrossanitário da edificação.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: **22/8/18** **171 /365**

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

quarta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Tec. em refrigeração	2	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

- Execução da infraestrutura do sistema de climatização no pavimento superior da edificação.
- Execução do sistema de drenagem das evaporadoras do pavimento superior da edificação.
- Execução dos rasgos no muro de divisa dos fundos para execução do sistema de iluminação externa.
- Execução de caixas de passagem do sistema de esgoto predial para nova saída de esgoto.
- Limpeza da obra.
- Execução do sistema hidrossanitário da edificação.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 21/8/18 170 /365

terça-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Tec. em refrigeração	2	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

- Execução da infraestrutura do sistema de climatização no pavimento superior da edificação.
- Execução dos rasgos no muro de divisa dos fundos para execução do sistema de iluminação externa.
- Execução de caixas de passagem do sistema de esgoto predial para nova saída de esgoto.
- Limpeza da obra.
- Execução do sistema hidrossanitário da edificação.
- Remoção do sistema de hidrantes existente do prédio para nova instalação conforme projeto vigente.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: **20/8/18** **169 /365**

segunda-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	3

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Tec. em refrigeração	2	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	1	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

- Execução da infraestrutura do sistema de climatização no pavimento superior da edificação.
- Execução dos rasgos no muro de divisa dos fundos para execução do sistema de iluminação externa.
- Execução de caixas de passagem do sistema de esgoto predial para nova saída de esgoto.
- Limpeza da obra.
- Execução do sistema hidrossanitário da edificação.
- Remoção do sistema de hidrantes existente do prédio para nova instalação conforme projeto vigente.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Observações TRT

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

[Handwritten Signature]
VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA: **19/8/18** **168 /365**

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

domingo

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	0

Sub Empreiteiros

Tec. em refrigeração	0	Eletricista	0
Ajudante de Encanador	0	Ajudante de pintor	0

Principais Atividades do Dia

Não houve atividades em obra.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Victor Ramirez Parquet
VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9

TRT



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Medição: 07

Período: 14/08/2018 à 03/08/2018

Resumo Atividades: Pintura da fachada externa, execução da infraestrutura do sistema de climatização, assentamento do revestimento cerâmico em paredes, execução do sistema de drenagem das evaporadoras do prédio, remoção do sistema antigo de hidrantes, execução da infra estrutura elétrica de iluminação externa no pátio, execução do sóculo de base para condensadoras do sistema de refrigeração, execução do sistema hidrossanitário do prédio, execução de caixas de passagem para sistema elétrico e esgoto, ligação de esgoto na rede da Casan.


FOTOS ANEXAS

FOTOS	COMENTÁRIOS
	Sóculos executados e infraestrutura de iluminação externa chumbada.
	Infraestrutura do sistema de iluminação externa do pátio.






Revestimento cerâmico de paredes internas.




Revestimento cerâmico de paredes internas.



Revestimento cerâmico de paredes internas.

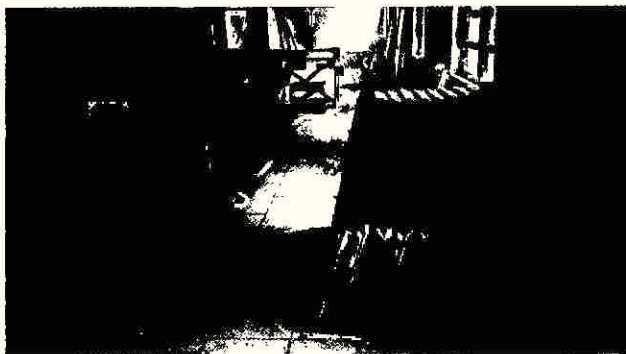

Piso e azulejo para toda a obra.

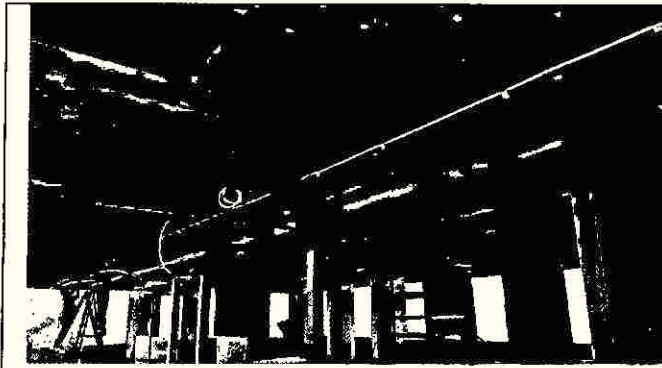


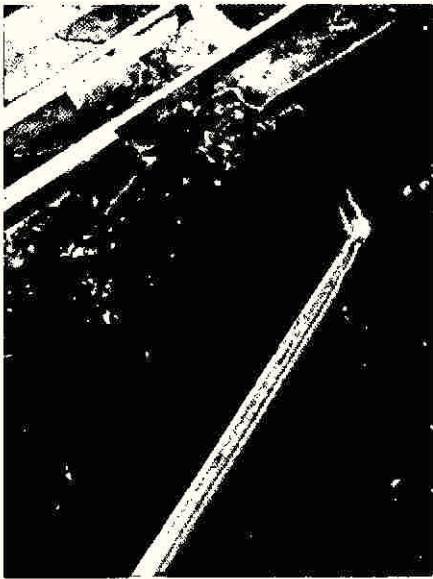
Infra estrutura do sistema de climatização executado. Em execução sistema de drenagem das evaporadoras.



Execução da drenagem das evaporadoras, detalhe para a colocação do isolante térmico na tubulação.



Remoção do sistema antigo de hidrantes.

	<p>Execução do sistema hidrossanitário do prédio.</p>
	<p>Ligação do esgoto predial na caixa de passagem da Casan.</p>



VICTOR RAMIREZ PARQUET
(Diretor Técnico)
Engenheiro Civil
CREA-057.652-9



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS - SC

EMPREENHIMENTOS LTDA.

REFORMA VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS

CONTRATO Nº	CP 83782017	EMPREENHIMENTOS LTDA.
VALOR CONTRATO	R\$ 2.187.440,19	OBRA
REVISÃO	16	PERÍODO DE ANÁLISE
DATA DA IMPRESSÃO	17/01/17	7
B.D.I. EQUIPAMENTOS	17,00%	TÉRMINO CONTRATO
		28/02/2018
		DATA
		03/09/2018


FOLHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO COM B.D.I.	VALOR ATUAL	QUANTITATIVO			VALORES (R\$)		VERIFICAÇÃO		
						ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	TESTE	SALDO		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	12,00	13.825,00	165.900,00	312.710,43	6,42	7,42	22.900,00	102.561,50	173.205,14	OK	4,58
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5	MES	2,00	1.760,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	2,00
1.3	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5	MES	2,00	1.760,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	2,00
1.4	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5	MES	12,00	7.700,00	92.400,00	0,00	0,00	7.700,00	49.434,00	57.134,00	0,00	OK	4,58
1.5	ART CREA SC	UNID	10,00	101,01	1.010,10	0,00	0,00	10,00	1.010,10	1.010,10	0,00	OK	0,00
1.6	Verba, Licenças e despesas administrativas	MES	12,00	187,50	2.250,00	0,00	0,00	7,40	187,50	1.387,50	0,00	OK	4,50
1.7	Verba de Consumo Mensal	MES	12,00	6.230,00	74.760,00	0,00	0,00	7,42	6.230,00	4.413,75	5.101,25	OK	4,58
1.8	As Built e Data Book	MES	12,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	7,42	500,00	3.210,00	3.710,00	OK	4,58
1.9	Atividade de Eficiência Energética (emitida de ENCE por OIA cadastrada no INMETRO)	VB	1,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	1,00
1.9	Seguro Fidejussório de empreitada - obras, reformas e ou ampliações	m²	1.000,76	2,35	2.351,79	0,00	0,00	1.000,76	2.351,79	2.351,79	0,00	OK	0,00
2	SERVIÇOS TÉCNICOS				18.314,83				0,00		17.063,93		
2.1	Limpeza do Terreno												
2.1.1	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvoredos ate Ø 15cm, utilizando trator de esteiras	M2	260,00	0,40	104,00	0,00	0,00	260,00	104,00	104,00	0,00	OK	0,00
2.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENBADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPOVEDIMENTAMENTO DE 2X	COMP. SFH	150,00	56,41	8.461,50	0,00	0,00	150,00	8.461,50	8.461,50	0,00	OK	0,00
2.3	CANTEIRO DE OBRA												
2.3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,40	452,85	2.445,39	0,00	0,00	5,40	2.445,39	2.445,39	0,00	OK	0,00
2.4	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	500,00	1,28	640,00	0,00	0,00	120,00	153,60	153,60	0,00	OK	380,00
2.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME												
2.5.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	MMES	182,00	33,80	6.151,60	0,00	0,00	170,00	5.746,00	5.746,00	0,00	OK	22,00
2.5.2	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEDIMENTADO 20 VEZES	M2	50,00	3,89	194,50	0,00	0,00	40,00	155,60	155,60	0,00	OK	10,00
3	DEMOLICOES E REACOES				92.654,64				0,00		84.506,10		
3.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUBOS FURADOS	M3		75,41	15.082,00	0,00	0,00	200,00	15.082,00	15.082,00	0,00	OK	0,00
3.2	REAPROVEDIMENTAMENTO	M2		1,85	195,00	0,00	0,00	100,00	185,00	185,00	0,00	OK	0,00
3.3	DEMOLICAO DE DIMOSRIAS DE DRYWALL OU LAMINADO AREA	M2		8,80	7.040,00	0,00	0,00	800,00	7.040,00	7.040,00	0,00	OK	0,00
3.4	DEMOLICAO DE CONTRA PISO	M2		19,55	13.000,75	0,00	0,00	685,00	13.000,75	13.000,75	0,00	OK	0,00
3.5	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO	M2		13,04	11.149,20	0,00	0,00	855,00	11.149,20	11.149,20	0,00	OK	0,00
3.6	REMOCAO DE PISO EM GARRETE	M2		57,51	1.892,21	0,00	0,00	57,51	1.892,21	1.892,21	0,00	OK	0,00
3.7	REMOCAO DE BLOQUET COM EMPILHAMENTO	M2		260,00	3.634,80	0,00	0,00	30,00	419,40	419,40	0,00	OK	230,00
3.8	REMOCAO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO ARGAMASSA	M2		28,58	5.716,00	0,00	0,00	12,00	342,96	342,96	0,00	OK	188,00
3.8	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERESCA EM ARGAMASSA	M2		48,86	10.241,80	0,00	0,00	205,00	2.110,40	2.110,40	0,00	OK	0,00
3.10	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3		339,76	998,89	0,00	0,00	2,94	998,89	998,89	0,00	OK	0,00
3.11	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3		339,76	917,35	0,00	0,00	2,70	917,35	917,35	0,00	OK	0,00
3.12	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	M2		33,50	351,75	0,00	0,00	10,50	351,75	351,75	0,00	OK	0,00
3.13	REMOCAO GUARDA-CORPO E CORRIDA	M		35,61	1.484,84	0,00	0,00	41,70	1.484,84	1.484,84	0,00	OK	0,00

[Handwritten signature]

ITEM	SERVICO	UN	QUANT.															
29.04.03	QUADRO ORION PLUS SOBREPOR, P45 ATE 630A, 500X400X200mm MONTADO E ENSAIADO CONFORME NORMA IEC60439, INCLUI: 01 ORION PLUS MET PO # 5001 400 p 200, 03 DISJ 3 POLOS 32A CURVA C 65A, 01 CHAVE 2X3 POSIÇÕES 4 POLOS TRANSFERENCIA LW28, ACESSÓRIOS, BARRAMENTOS, MONTAGENS E ENSAIOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pq	1,00	2120,04	2.120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
29.04.03	Chave de partida direta para motor monofásico de 1,5 CV (do sistema de renovação de ar), estado de operação 220 V, com rede de proteção de fase de fase. Deverá ter comando local e poder a ser adicionado também por telé telef. Modelo de referência POW Htg ou similar	PC	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30	INSTALACOES DE SISTEMAS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS			105.565,47	105.565,47													14.276,42
30.01	INFRAESTRUTURA ELÉTRICUTOS E ACESSÓRIOS																	
30.01.1	ABRACADERIA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	280,00	0,79	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
30.01.2	ABRACADERIA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	10,00	0,91	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
30.01.3	ABRACADERIA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	3,00	1,56	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
30.01.4	Aruchê lba dim. 1/4" GF	UN	3.300,00	0,40	1.320,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.5	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	300,00	0,51	153,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.6	BUCHA DE NYLON SEM ABA S3	UN	300,00	0,08	24,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.																
	GESSO ACARTONADO (SI) - 2 FACES	m²	37,25	R\$17,90	2.004,57	37,25	0,00	0,00	2.004,57	0,00	0,00	2.004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GESSO ACARTONADO (BU) - 2 FACES	m²	54,10	R\$113,48	6.139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	
	ISOLAMENTO TERMICO COM LANTANA DE LA DE VIDRO, ESPESURA 2,5CM	m²	146,35	R\$68,29	10.140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,35	
	TOTAL GERAL				R\$5.191,58	TOTAL DESTA MEDIÇÃO A SUPRIMIR			75.112,27			75.112,27						146,35	
	MEDIÇÃO - CONTRATO																		67.359,88
	MEDIÇÃO - ADITIVO																		46.332,80
	MEDIÇÃO - TERMO CIRCUNSTANCIADO																		77.083,42
	MEDIÇÃO - CONTRATO																		75.112,27
	TOTAL DA MEDIÇÃO																		117.603,44


 Eng. Claudio de Albuquerque Parquet
 (Diretor Técnico)
 CREASC 657.662-4

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	DANFPS-E
1300 RUA PROF WALTER DE BONA CASTELAN, 173, CORREGO GRANDE - FLORIANOPOLIS - SC - 88.037-300 Telefone: 32046919 CNPJ: 03.594.924/0001-51 CMC: 458.774-0	Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 33 Autorização: 035918 Emissão: 03/09/2018 Código de Verificação: 0EB2-BFA3-9DB7-6677

SILENO
JACINTH
DE
OLIVEIR

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO			CFPS 9205
ENDEREÇO Rua Esteves Júnior, 395 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88.015-905
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 02.482.005/0001-23 CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
4120400	(CONSTRUCAO DE EDIFICIOS) REFERENTE A MÃO DE OBRA DE REFORMA DO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS-SC.	0	0,00	R\$ 35.986,78	1	R\$ 35.986,78
4120400	(CONSTRUCAO DE EDIFICIOS) REFERENTE A MATERIAL DE REFORMA DO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS-SC. 7ª medição	0	0,00	R\$ 81.617,06	1	R\$ 81.617,06

NP-1396 - OB 4327
4328
DF 1018
GP-238

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 117.603,84
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

BANCO CECRED (085).AGÊNCIA: 0106-6.CONTA CORRENTE: 6507-2.CEI: 51.242.69909/77.INSS (11%) R\$ 3.958,55, Pis, Cofins, CS (4,65%) R\$ 5.468,58, IRPJ (1,20%) R\$ 1.411,25.VALOR DA ALÍQUOTA DE ISS É 3,00% (R\$ 3.528,12) NA REGIÃO DE CANOINHAS/SC, RETIDO NA FONTE.

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
SIGNATÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
DATA DO CARIMBO: 03/09/2018 14:57:36

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/nota_eletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0EB2BFA39DB76677 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 4587740



Documento 254 do PROAD 9379/2017. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2018.HBZM.XHPT:
<https://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento>

ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO DA MEDICAO DE FORMA
FISICA, BJS QUE O PLOAD ESTA EM TRAMITE.

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 04/09/2018


Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor de SPP

TERMO DE LIQUIDAÇÃO

Liquida-se o presente documento de
acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64.
O documento refere-se ao original da
1ª via, arquivado neste Setor.

Em 04/09/18


Simone Benatti Cardoso
Técnico Judiciário

17NE1338 - R.R

39-16

CP 9379/17

Instruções: Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
 Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm. Utilize folha A4 (210 x 291 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
 Corte na linha indicada. Não rasure, risque fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



Estado de Santa Catarina
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS

Guia de pagamento - Serviços Tomados

Página: 1/1

Data: 05/09/2018

RECIBO DO SACADO

104-0		10493.11531 72999.100042 00842.693053 4 76830000352812									
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 20/10/2018						
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - ISS - RETENÇÃO NA FONTE					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 0413 / 311537-2						
DATA DO DOCUMENTO 05/09/2018	NÚMERO DO DOCUMENTO 8426930	ESPECIE DE DOCUMENTO RC	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 05/09/2018	NOSSO NÚMERO 14999000008426930-1						
PARCELA 9	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	ECONÔMICO 0	VLR IMPOSTO SERVIÇOS PRESTADOS	VLR IMPOSTO SERVIÇOS TOMADOS 3.528,12						
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE): VENCIMENTO ORIGINAL: 20/10/2018 <table border="1"> <thead> <tr> <th>RECEITA</th> <th>NOME</th> <th>VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>910</td> <td>I.S.S Não Econômicos - Livro Eletrônico</td> <td>3.528,12</td> </tr> </tbody> </table> Pedidos: Declaração de ISS, realizado por contribuinte não econômico. Atividades: OBRAS DE ALVENARIA					RECEITA	NOME	VALOR R\$	910	I.S.S Não Econômicos - Livro Eletrônico	3.528,12	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA (+) JUROS (+) MULTA (=) VALOR COBRADO NFs: 33
RECEITA	NOME	VALOR R\$									
910	I.S.S Não Econômicos - Livro Eletrônico	3.528,12									
COMPETÊNCIA Setembro/2018											
SACADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO - TRT 12ª REGIÃO (251422) RUA ESTEVES JUNIOR, 395 - CENTRO - CEP 88015905 Florianópolis - SC					CNPJ: 02.482.005/0001-23						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECORTE AQUI

Página: 1/1

Data: 05/09/2018

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Estado de Santa Catarina
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS

Guia de pagamento - Serviços Tomados

104-0		10493.11531 72999.100042 00842.693053 4 76830000352812									
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 20/10/2018						
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - ISS - RETENÇÃO NA FONTE					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 0413 / 311537-2						
DATA DO DOCUMENTO 05/09/2018	NÚMERO DO DOCUMENTO 8426930	ESPECIE DE DOCUMENTO RC	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 05/09/2018	NOSSO NÚMERO 14999000008426930-1						
PARCELA 9	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	ECONÔMICO 0	VLR IMPOSTO SERVIÇOS PRESTADOS	VLR IMPOSTO SERVIÇOS TOMADOS 3.528,12						
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE): VENCIMENTO ORIGINAL: 20/10/2018 <table border="1"> <thead> <tr> <th>RECEITA</th> <th>NOME</th> <th>VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>910</td> <td>I.S.S Não Econômicos - Livro Eletrônico</td> <td>3.528,12</td> </tr> </tbody> </table> Pedidos: Declaração de ISS, realizado por contribuinte não econômico. Atividades: OBRAS DE ALVENARIA					RECEITA	NOME	VALOR R\$	910	I.S.S Não Econômicos - Livro Eletrônico	3.528,12	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA (+) JUROS (+) MULTA (=) VALOR COBRADO NFs: 33 LF-485
RECEITA	NOME	VALOR R\$									
910	I.S.S Não Econômicos - Livro Eletrônico	3.528,12									
COMPETÊNCIA Setembro/2018											
SACADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO - TRT 12ª REGIÃO (251422) RUA ESTEVES JUNIOR, 395 - CENTRO - CEP 88015905 Florianópolis - SC					CNPJ: 02.482.005/0001-23						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Capital

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 5768230

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Capital, com distribuição anterior à data de 09/08/2018, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME, portador do CNPJ: 03.594.924/0001-51. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Capital, segunda-feira, 27 de agosto de 2018.

PEDIDO Nº: 7879645



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 03.594.924/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:40:40 do dia 03/09/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2019.

Código de controle da certidão: **1AE1.7F7E.6529.CB2D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANEXO - V

ATESTADO DE CONFORMIDADE PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL			
CONTRATO/PROAD Nº: 9379 /17	UNIDADE:		
EMPRESA CONTRATADA:	Esphera Sul		
PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:	14/06/19		
RESPONSÁVEL:			
Item	SIM	NÃO	Não se aplica
1. NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
1.1 Houve anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social			X
1.2 Abertura de conta-depósito vinculada			X
1.3 Apresentação da garantia contratual			X
1.4 Relação de todos os empregados que prestarão serviço			X
1.5 Houve o encaminhamento dos exames admissionais dos empregados			X
1.6 Outros documentos exigidos no edital/contrato			X
2. NA LIQUIDAÇÃO MENSAL DA NOTA FISCAL:			
2.1 O Fiscal de Contrato atestou a conformidade na prestação dos serviços (Caso afirmativo informar o número do marcador do referido documento do respectivo proad)	X		
2.2 Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal			X
2.3 Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho)	X		
2.4 Período da prestação de serviços está correto (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura)			X
2.5 Caso haja falta informada pelo Fiscal do Contrato, verificar se houve desconto respectivo na Nota Fiscal			X
3. A CONTRATADA FORNECEU TODA A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA DA MÃO DE OBRA DIRETAMENTE ENVOLVIDA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:			
3.1 Aviso de férias e os respectivos comprovantes de quitação ao trabalhador	X		
3.2 Comprovantes de pagamento dos salários, vale-transporte e auxílio-alimentação dos empregados e cartão ponto	X		
3.3 Verificar se a empresa realizou a retenção da contribuição previdenciária	X		
3.4 Verificar se a empresa realizou o recolhimento dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço	X		
4. COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DO FGTS POR MEIO DE:			
4.1 Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	X		
4.2 Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	X		
4.3 Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)	X		
4.4 Cópia da relação de Tomadores/Obras (RET)	X		
5. COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS POR MEIO DE:			
5.1 Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	X		
5.2 Cópia do comprovante de declaração à Previdência	X		
5.3 Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	X		

9.2				
9.3				
9.4				
9.5				
9.6				
9.7				
9.8				
9.9				
9.10				
9.11				
9.12				
9.13				
9.14				
9.15				
9.16				
9.17				
9.18				
9.19				
9.20				
9.21				
9.22				
9.23				
9.24				
9.25				
9.26				
9.27				
9.28				
9.29				
9.30				
9.31				
9.32				
9.33				
9.34				
9.35				
9.36				
9.37				
9.38				
9.39				
9.40				
9.41				
9.42				
9.43				
9.44				
9.45				
9.46				
9.47				
9.48				
9.49				
9.50				
9.51				
9.52				
9.53				
9.54				
9.55				
9.56				
9.57				
9.58				
9.59				
9.60				
9.61				
9.62				
9.63				
9.64				
9.65				
9.66				
9.67				
9.68				
9.69				
9.70				
9.71				
9.72				
9.73				
9.74				
9.75				
9.76				
9.77				
9.78				
9.79				
9.80				
9.81				
9.82				
9.83				
9.84				
9.85				
9.86				
9.87				
9.88				
9.89				
9.90				
9.91				
9.92				
9.93				
9.94				
9.95				
9.96				
9.97				
9.98				
9.99				
10.00				
10.01				
10.02				
10.03				
10.04				
10.05				
10.06				
10.07				
10.08				
10.09				
10.10				
10.11				
10.12				
10.13				
10.14				
10.15				
10.16				
10.17				
10.18				
10.19				
10.20				
10.21				
10.22				
10.23				
10.24				
10.25				
10.26				
10.27				
10.28				
10.29				
10.30				
10.31				
10.32				
10.33				
10.34				
10.35				
10.36				
10.37				
10.38				
10.39				
10.40				
10.41				
10.42				
10.43				
10.44				
10.45				
10.46				
10.47				
10.48				
10.49				
10.50				
10.51				
10.52				
10.53				
10.54				
10.55				
10.56				
10.57				
10.58				
10.59				
10.60				
10.61				
10.62				
10.63				
10.64				
10.65				
10.66				
10.67				
10.68				
10.69				
10.70				
10.71				
10.72				
10.73				
10.74				
10.75				
10.76				
10.77				
10.78				
10.79				
10.80				
10.81				
10.82				
10.83				
10.84				
10.85				
10.86				
10.87				
10.88				
10.89				
10.90				
10.91				
10.92				
10.93				
10.94				
10.95				
10.96				
10.97				
10.98				
10.99				
11.00				

Simone Bonatti Cardoso
Técnica Judiciária

ATA EMISSAO : 06Set18 TIPO OB: 11 NUMERÓ : 2018OB804328
G/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
AVORECIDO : 03594924/0001-51 - ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
BANCO : 085 AGENCIA : 0106 CONTA CORRENTE : 65072
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2018NP001396 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004656059-9 PROCESSO : CP-9379/2017
VALOR : 103.237,35

DENT. TRANSFER. :

RESERVACAO

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33. REFORMA DO IMÓVEL DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO
DE CANOINHAS. CP-9379/2017. 7A. MEDIÇÃO.

CONTINUA ...


F1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Visto.

Em 10/09/18

Demilson Dagostim

Conformidade de Registro de Gestão - DIGER



ATA EMISSAO : 06Set18 TIPO OB: 11 NUMERO : 2018OB804328
3/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
AVORECIDO : 03594924/0001-51 - ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
BANCO : 085 AGENCIA : 0106 CONTA CORRENTE : 65072

EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
1	401006 2017NE001338400		33903916	103.237,35
2	531814 2017NE001338	213110400	33903916	103.237,35
3	561602 01000000000400C			103.237,35

ANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 06Set18 13:51
F1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

06/09/18 16:18

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 06Set18 TIPO OB: 59

NUMERO : 2018OB804327

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2018NP001396 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004656052-1 PROCESSO : CP-9379/2017

VALOR : 3.528,12

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2018LF000485

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 06/09/18

RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 33 - ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS. PROAD
9379/2017

CONTINUA ...


PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

Visto.

Em 10, 09, 18

Demilson Dagostim

Conformidade de Registro de Gestão - DIGER



ATA EMISSAO : 06Set18 TIPO OB: 59 NUMERO : 2018OB804327
G/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
AVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA

EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	VALOR
1	401006 2017NE001338400		33903916	3.528,12
2	531741 2017NE001338			3.528,12
3	561602 01000000000400C			3.528,12

ANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 06Set18 13:51
F1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

[Faint, illegible text or stamp]

ATA EMISSAO : 06Set18 NUMERO : 2018GP800238
3/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
ECOLHEDOR : 512426990977
CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI
COMPETENCIA : SET18
ECURSO : 3
PROCESSO : CP-9379/2017
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2018NP001396 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 3582 , EM 06/09/18
VALOR INSS : 3.958,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 3.958,55

RESERVACAO


escolhimento de contribuição, retida cfe. Instr. Normativa RFB 971/2009, ref.
pagamento da nota fiscal 33. Reforma do imóvel da nova sede da Vara do Trabalho
de Canoinhas. CP-9379/2017. 7a. Medição.

ENCADENADO POR : 58654976934 - GAMBÁ UG : 080013 06Set18 13:53
F1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Visto.

Em 10/09/18

Demilson Dagostim
Conformidade de Registro de Gestão - DIGER



ATA EMISSAO : 06Set18 VENCIMENTO: 06Set18 NUMERO : 2018DF801018
3/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
ONTRIBUINTE : 03594924/0001-51 - ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
ECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
ROCESSO : CP-9379/2017 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2018NP001396
ERIDO APURACAO : 06Set18 PERCENTUAL :
EFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
ECEITA : 6147
ALORES : BASE DE CALCULO : 117603,84
ECEITA : 6.879,82
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 06/09/18
TOTAL : 6.879,82

BSERVACAO

colhimento de irrf e contribuições, retidas cfe. Instr. Normativa RFB 1234/2
12, ref. Pagamento da nota fiscal 33. Reforma do imóvel da nova sede da Vara
o Trabalho de Canoinhas. CP-9379/2017. 7a. Medição.

ANCADO POR : 58654976934 - GAMBIA UG : 080013 06Set18 13:51
F1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Visto.

Em 10/09/18

Demilson Dagostim
Conformidade de Registro de Gestão - DIGER

