

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

30/11/18

243 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
CM	CM	CM

sexta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contramestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Eletricista	7

Sub Empreiteiros

Nome	Função	Efetivo

Principais Atividades do Dia

Impermeabilização dos boxes dos banheiros com manta líquida.
 Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.
 Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

[Handwritten Signature]
VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057 652-9

TRT

[Handwritten Signature]
ANDRE WAGNER
 Adv. OAB - 11020/11
 Matrícula 4052
 Rua: Frei Caneca, 20 - 068 220-7



ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

29/11/18

242 /365

quinta-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Inst. Steel Frame	8		

Principais Atividades do Dia:

Instalação da fachada em placa cimentícia conforme projeto vigente na fachada Norte (estacionamento do prédio).

Execução de requadros na casa de medição.

Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.

Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.


Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA:

Observações TRT:

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

TRT


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-057.652-9


ANDRE WAGNER
Analista Judiciário
Matrícula: 4767
EPI - OJ/ CREA-SC 088.622-7

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

28/11/18

241 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

quarta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Eriçador	1
Pintor	0	Servante	7

Sub Empreiteiros

Inst. Steel Frame	8		
RD Vidros	2		

Principais Atividades do Dia

- Execução do reforço para fixação de louças e metais nas paredes em gesso acartonado dos banheiros.
- Instalação da fachada em placa cimentícia conforme projeto vigente na fachada Norte (estacionamento do prédio).
- Execução da esquadria de vidro na entrada principal da edificação.
- Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.
- Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.


Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT


VICTOR RAMIREZ PARQUET
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.652-9


ANDRÉ WAGNER
 Eng. de Juízo
 Inscrição: 4267
 Enq. em CREA-SC 088.020-

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

26/11/18

239 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

segunda-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Maestro	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Serveite	7

Sub Empreiteiros

RD Vidros	2		
Inst. Steel Frame	8		

Principais Atividades do Dia

Execução do reforço para fixação de louças e metais nas paredes em gesso acartonado dos banheiros.

Instalação da fachada em placa cimentícia conforme projeto vigente na fachada Norte (estacionamento do prédio).

Execução da casa de medição nos fundos da edificação.

Instalação de esquadrias metálicas no segundo pavimento da edificação.

Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.

Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.

Fixação de vidros nas esquadrias metálicas.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT


VICTOR RAMIREZ PARQUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 057.652-9


ANDRE WAGNER
Enfermeiro
Médico 1202
Eleg. Col. TRT-SC 058.072

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

25/11/18

238 /365

domingo

Mapa de Tempo:

B = Bom

CM = Chuva Moderada

CF = Chuva Forte

NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	0

Sub Empreiteiros

Nome	Função	Efetivo

Principais Atividades do Dia

Não houve atividade em obra.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 067.652-9

TRT:


ANDRÉ WAGNER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 067.652-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

24/11/18

237 /365

sábado

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	0

Sub Empreiteiros

Principais Atividades do Dia

Não houve atividade em obra.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA


 VICTOR RAMIREZ PARQUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.452.9

TRT


 ANDRÉ WAGNER
 ANDRÉ WAGNER
 Matrícula: 4082
 CREA-SC: 099.637

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

23/11/18

236 /365

sexta-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Eletricistas	2		

Principais Atividades do Dia

- Execução do reforço para fixação de louças e metais nas paredes em gesso acartonado dos banheiros.
- Execução do sistema elétrico da edificação, passagem de cabos elétricos.
- Execução da casa de medição nos fundos da edificação.
- Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.
- Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 057.452-9

TRT


ANDRE WAGNER
 Advogado
 OAB/RS 14320
 Rua ...

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

22/11/18

235 /365

quinta-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Eletricistas	2		

Principais Atividades do Dia

- Execução do reforço para fixação de louças e metais nas paredes em gesso acartonado dos banheiros.
- Execução do sistema elétrico da edificação, passagem de cabos elétricos.
- Execução da casa de medição nos fundos da edificação.
- Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.
- Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.


Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIHEZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT


ANDRE WAGNER
Engenheiro Civil
Matrícula 4252
Eltel: Cel 08150.068.522-X

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

21/11/18

234 /365

quarta-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Meatre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros

Inst. de granito	2		
Eletricistas	2		

Principais Atividades do Dia

- Execução do sistema elétrico da edificação, passagem de cabos elétricos.
- Execução da casa de medição nos fundos da edificação.
- Instalação de peitoris em granito nas janelas.
- Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.
- Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.


Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT


ANDRE WAGNER
Analista Judicial
Matrícula - 4202
Eng.º Civil, CREA-SC 765.672

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

20/11/18

233 /365

terça-feira

Mapa de Tempo

B = Sol

CM = Chuva Moderada

CF = Chuva Forte

NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contramestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros

Inst. de granito	2		
Eletricistas	2		

Principais Atividades do Dia

- Execução do sistema elétrico da edificação, passagem de cabos elétricos.
- Execução da casa de medição nos fundos da edificação.
- Instalação dos filetes de granito para execução dos boxes dos banheiros.
- Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.
- Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.

Observações ESPHERA SULEMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMIREZ PARQUE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-057.652-9

TRT

ANDRE WAGNER
Engenheiro Arquiteto
Membro da OAB
Eng. OAB/SC 038.622-2

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

19/11/18

232 /365

segunda-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros

Inst de granito	2		
Eletricistas	2		

Principais Atividades do Dia

- Execução do sistema elétrico da edificação, passagem de cabos elétricos.
- Execução da casa de medição nos fundos da edificação.
- Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.
- Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMIREZ PARQUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-057.652-9

TRT

ANDRE WAGNER
ENFERMEIRO DE ORÇAMENTO
MANTIDA 4062
CREA-SC 00012-0

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

18/11/18

231 /365

domingo

Mapa de Tempo

B = Bora
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Padreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contramestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Serveite	0

Sub Empreiteiros

Nome	Função	Efetivo

Principais Atividades do Dia

Não houve atividade em obra.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA


VICTOR RAMIREZ PARQUI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 057.652-9

TRT


ANDRE WAGNER
Assessor Jurídico
Matrícula 1752
E-mail: OAB12185-0019@trt5.jus.br

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

17/11/18

230 /365

sábado

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	0

Sub Empreiteiros

Inst. de granito	0		

Principais Atividades do Dia

Não houve atividade em obra.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 057.652-9

TRT


ANDRÉ WAGNER
 Analista Arbitral
 - Mat. 411, 412
 Edif. IAP CREA/SC 101 022-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

16/11/18

229 /365

sexta-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Elétricistas	2		

Principais Atividades do Dia

- Limpeza geral na obra.
- Remoção de entulho através de caçamba papa entulho, tanto para resíduos de construção comum quanto para resíduos de gesso.
- Execução do sistema elétrico conforme projeto vigente.
- Execução da casa de medição nos fundos da edificação.
- Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.
- Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

[Handwritten Signature]
VICTOR RAMIREZ PARQUE
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 037.052-9

TRT

[Handwritten Signature]
ANDRE WAGNER
 Analista Judiciário
 Titulo 01/01002
 CNP 005.277.883-01-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA

15/11/18

228 /365

Mapa de Tempo

R = Borr
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

quinta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	0

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Inst. de granito	0		

Principais Atividades do Dia

Feriado nacional.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMIREZ PARQUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT

ANDRE WAGNER
Assessor Técnico
Município de
Canoas - RS

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

14/11/18

227 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

quarta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros

Inst de granito	2		
Eletricistas	2		

Principais Atividades do Dia

- Realização das instalações provisórias de alimentação elétrica.
- Execução do sistema elétrico conforme projeto vigente.
- Instalação de divisórias de granito nos banheiros.
- Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.
- Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER
Mestre de Obras
Múltipla 4202
São Carlos - SP - CEP: 13506-825-2

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

13/11/18

226 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

terça-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros

Inst.de granito	2		
Eletricistas	2		

Principais Atividades do Dia

- Execução do sistema elétrico conforme projeto vigente.
- Instalação de divisórias de granito nos banheiros.
- Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.
- Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.


Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT:


ANJOLE WAGNER
Advogada Juliano
Matrícula: 4737
Rua: TRT-50, 100-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

12/11/18

225 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

segunda-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contramestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Inst. de granito	2		

Principais Atividades do Dia

- Fixação do poste (Kit Postinho CELESC) trifásico para execução da entrada de energia elétrica provisória.
- Instalação de divisórias de granito nos banheiros.
- Arremates nas áreas de granito das fachadas.
- Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.
- Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMALHO - E2 PARQUE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

11/11/18

224 /365

domingo

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub-Empreiteiros

Sub-Empreiteiro	Efetivo		
Inst. de granito	2		

Principais Atividades do Dia

Não houve atividade em obra.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT


ANDRE WAGNER
ANALISTA JURÍDICO
MÁRCIO COSTA
EMP. ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA :

10/11/18

223 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHA	TARDE	NOITE
B	B	B

sábado

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Platao	0	Serveite	7

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Inst. de granito	2		

Principais Atividades do Dia

Não houve atividade em obra.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT


ANDRE WAGNER
Engenheiro de Edificação
Matrícula - 4203
E-mail - andrewagner@trtsc.com.br

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

9/11/18

222 /365

Mapa de Tempo

B = Bom

CM = Chuva Moderada

CF = Chuva Forte

NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
CM	CM	CM

sexta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contramestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servante	7

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Eletricistas	2		

Principais Atividades do Dia

Execução do sistema elétrico da edificação, passagem de cabos elétricos.

Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.

Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.

Observações ESPHERA SULEMP. LTDA.

Observações TRT

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-057.652-9

TRT


ALEXANDRE WAGNER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-057.652-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA

8/11/18

221 /365

quinta-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	5
Contramaestre	0	Encarregado	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Eletricistas	2		

Principais Atividades do Dia

Execução do sistema elétrico da edificação, passagem de cabos elétricos.

Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.

Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA:

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 057.452-9

TRT

ANDRÉ WAGNER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 057.452-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

7/11/18

220 /365

quarta-feira

Mapa de Tempo

B= Bón
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
CM	CM	CM

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Serveite	7

Sub Empreiteiros

Nome	Função	Efetivo


Principais Atividades do Dia

Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.
Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.


Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA:


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT:


ANDRÉ WAGNER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

6/11/18

219 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

terça-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Inst. de granito	2		

Principais Atividades do Dia

- Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.
- Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.
- Execução de arremates nas fachadas em granito.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

ENGENHEIRO CIVIL
CPF - 057.652-9

ANDRÉ WAGNER
ENFERMEIRO
CPF - 057.652-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

5/11/18

218 /365

segunda-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub-Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Inst. de granito	2		

Principais Atividades do Dia

- Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.
- Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.
- Execução de arremates nas fachadas em granito.


Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

TRT


ANDRE WAGNER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 057.652-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

4/11/18

217 /365

domingo

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	0

Sub Empreiteiros

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Inst. de granito	0		

Principais Atividades do Dia

Não houve atividade em obra.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA:


VICTOR RAMIREZ PARQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-057.652-9

TRT:


ANDRE WAGNEY
Advogado
Matrícula: 200
501 - Rua Helena de 160/1620

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

3/11/18

216 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

sábado

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	0	Pedreiro	0
Mestre	0	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	0
Pintor	0	Servente	0

Sub Empreiteiros

Nome	Função	Efetivo

Principais Atividades do Dia

Não houve atividade em obra.

Observações ESPHERA SULEMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PASQUET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER
Assessor Técnico
Sindicato TRT
Emp. 05110/05EA-011.0511.030

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

2/11/18

215 /365

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

sexta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Padreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros

Nome	Função	Efetivo

Principais Atividades do Dia

- Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.
- Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

VICTOR RAMIREZ PAROLE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-057.652-9

TRT

ANDRÉ WAGNER
PROFESSOR DE DIREITO
MAGISTRO DE LEI
CREA-057.652-9

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
 TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

1/11/18

214 /365

Mapa de Tempo

B = Bonif
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

quinta-feira

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contra-mestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servante	7

Sub Empreiteiros

Principais Atividades do Dia

Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.
 Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

TRT

[Handwritten Signature]
RAFAEL RAMIREZ PARQUE
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-457.452-9

[Handwritten Signature]
ANDRÉ WAGNER
 Advogado
 OAB/SC 4962
 ESPHERA SUL EMP. LTDA

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Obra: REFORMA DO PREDIO PARA ABRIGAR A VARA
TRABALHISTA DE CANOINHAS



DIÁRIO DE OBRA

DATA:

31/10/18

213 / 365

quarta-feira

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	2	Pedreiro	2
Mestre	1	Carpinteiro	0
Contramestre	0	Encanador	1
Pintor	0	Servente	7

Sub Empreiteiros

Nome	Função	Efetivo

Principais Atividades do Dia

Execução do revestimento cerâmico em paredes de áreas molhadas.
Aplicação de rejunte em revestimento cerâmico de áreas molhadas.

Observações ESPHERA SUL EMP. LTDA.

Observações TRT

ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.


VICTOR RAMIREZ PARQUE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-057.452-9

TRT


ANDRE WAGNER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-057.452-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Medição: 10

Período: 30/10/2018 a 30/11/2018

Resumo Atividades: Execução de esquadrias metálicas, fixação de divisórias em granito, execução da casa de medição, assentamento de revestimento cerâmico em paredes, aplicação de rejunte em revestimentos de parede, execução do sistema elétrico, execução de revestimento em granito nas fachadas, colocação de vidros em esquadrias metálicas, instalação do sistema de alimentação provisório (poste e cabos), assentamento de filete de granito em box, impermeabilização dos boxes com manta líquida e instalação de esquadria de vidro entrada principal, execução da fachada em placa cimentícia.

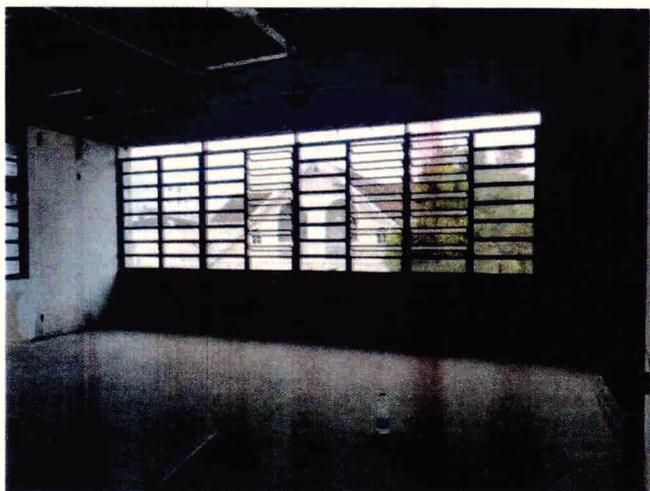
FOTOS ANEXAS

FOTOS	COMENTÁRIOS
	Instalação de esquadria de vidro na entrada principal.
	Execução de revestimento em granito em fachada.





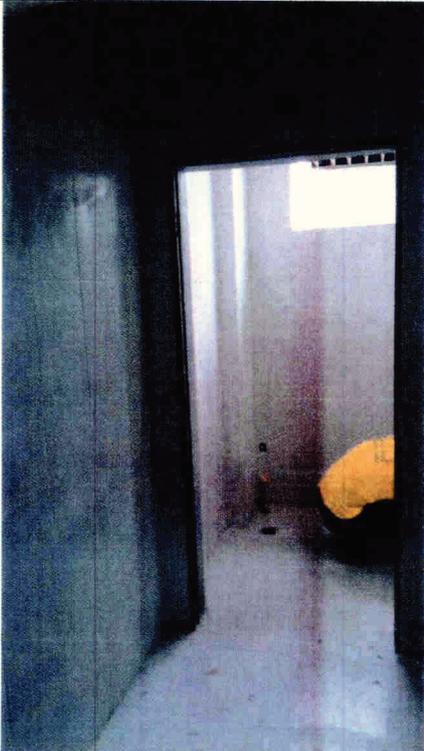
Instalação de divisórias em granito.



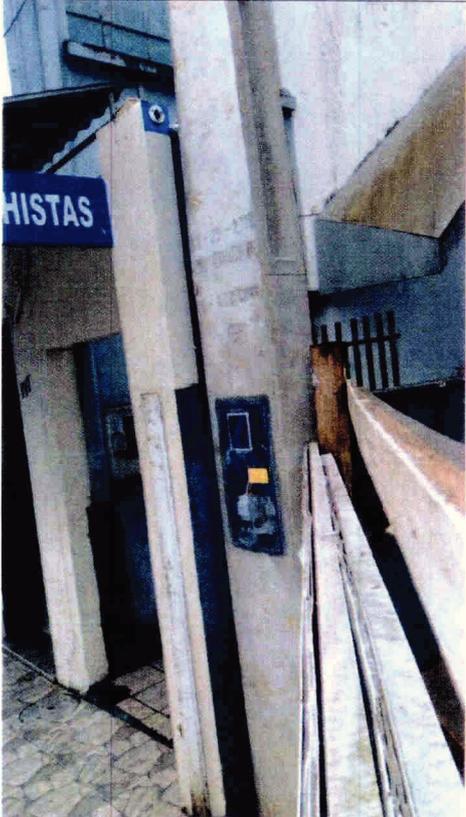
Instalação de esquadrias metálicas.



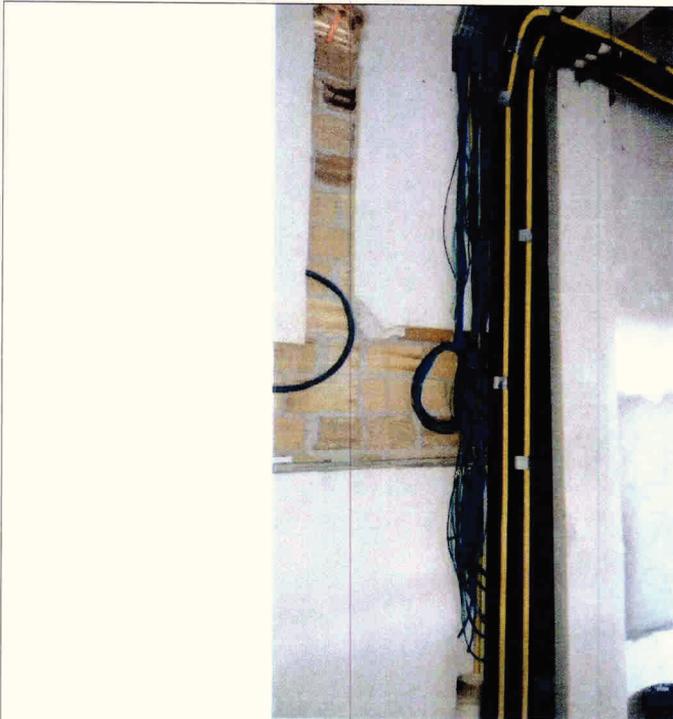
Instalação de filetes de granito para box.

	<p>Instalações elétricas.</p>
	<p>Casa de medição.</p>
	<p>Aplicação de Rejunte em revestimento cerâmico.</p>



	<p>Poste para entrada provisória.</p>
	<p>Cabos da ligação provisória de energia.</p>





Fiação elétrica instalada.



Fachada em Placa Cimentícia

VICTOR RAMIREZ PARQUET
(Diretor Técnico)
Engenheiro Civil
CREA-057.652-9

AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIÃO
Rua Esteves Junior, 395
Centro – Florianópolis – SC
A/C: Eng. André

Ref.: Documentos Medição de obra

N/Ref.: 014/CNH/2018

Florianópolis, 06 de Dezembro de 2.018.

Prezados Senhores,

Vimos por meio deste fazer entrega dos documentos relativo à 10ª medição da obra "reforma do prédio que abrigará a nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas", convencionado pelo contrato número CP 9376/2017-1, no valor total de R\$ 123.022,40 (cento e vinte três mil vinte e dois reais e quarenta centavos), sendo de mão de obra R\$ 37.644,85 e de material R\$ 85.377,55, bem como os documentos requeridos, conforme segue:

- Diário de obra;
- Relatório fotográfico;
- Planilha de medição do período;
- Recibos de salários
- Documentos contábeis competência 10/2018;
- Nota fiscal nº 50
- Ficha de EPI
- Ficha de Treinamento NR18 e NR35

Qualquer dúvida quanto aos documentos entregues, estamos ao inteiro dispor.

Cordialmente,



SANTIAGO RAMIREZ PARQUET
(Diretor Administrativo)
CPF: 041.269.779-37



TATSC				BUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO	EMPREITEIRA	ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA.						
				VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS - SC	OBRA	REFORMA VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS						
				CONTRATO Nº	CP 9379/2017	MEDIÇÃO Nº		10		Período de aferição	31/10/2018 À 30/11/2018	
				VALOR CONTRATO	R\$	2.167.480,19	INICIO CONTRATO	TERMINO CONTRATO		DATA		
							06/03/2018	28/02/2019		28/09/2018		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO COM B.D.I.	VALOR ATUAL	ESTA MEDIÇÃO	ANTERIOR ACUMULADA	ACUMULADA	ESTA MEDIÇÃO	ANTERIOR ACUMULADA	ACUMULADA	
PLANILHA ORÇAMENTARIA REVISÃO: 16 DATA ORÇAMENTO: 7-nov-17 DATA DA IMPRESSÃO: 7-nov-17 B.D.I. EQUIPAMENTOS: 17,00% EMPRESA: Esfera Sul Empreendimentos Ltda. CNPJ: 03.594.924/0151 Responsável Técnico: Eng. Victor Ramirez Parquet - CREA/SC 057.652-9												
OBRA: AREA CONSTRUIDA: 1.000,76												
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				317.710,63				0,00		196.165,14	
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	13.825,00	166.900,00	0,00	8,42	8,42	0,00	116.406,50	116.406,50	
1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5 HORAS SEMANAS	MES	2,00	1.760,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5 HORAS	MES	2,00	1.760,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	ENCARGO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	7.700,00	92.400,00	0,00	8,42	8,42	0,00	64.834,00	64.834,00	
1.5	ART CREA SC	UNID.	10,00	101,91	1.019,10	0,00	10,00	10,00	0,00	1.019,10	1.019,10	
1.6	Taxas, Licenças e despesas administrativas	MES	12,00	187,50	2.250,00	0,00	8,40	8,40	0,00	1.575,00	1.575,00	
1.7	Itens de Consumo Mensal	MES	12,00	687,50	8.250,00	0,00	8,42	8,42	0,00	5.788,75	5.788,75	
1.8	As Built e Data Book	MES	12,00	500,00	6.000,00	0,00	8,42	8,42	0,00	4.210,00	4.210,00	
1.9	Avaliação de Eficiência Energética (Emissão da ENCE por OIA cadastrada no Seguro risco de engenharia - obras, reformas e/ou ampliações)	VB	1,00	32.500,00	32.500,00	0,00	1.000,76	1.000,76	0,00	0,00	0,00	
			1.000,76	2,35	2.351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,79	2.351,79	
2	SERVIÇOS INICIAIS				18.334,99				0,00		17.066,09	
2.1	LIMPEZA DO TERRENO											
2.1.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	260,00	0,40	104,00	0,00	260,00	260,00	0,00	104,00	104,00	
2.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	COMP. SM	150,00	M2	56,41	8.461,50	0,00	150,00	150,00	8.461,50	8.461,50	
2.3	CANTEIRO DE OBRA											
2.3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,40	452,85	2.445,39	0,00	5,40	5,40	0,00	2.445,39	2.445,39	
2.4	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	500,00	1,28	640,00	0,00	120,00	120,00	0,00	153,60	153,60	
2.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME											
2.5.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	MMES	192,00	33,80	6.489,60	0,00	170,00	170,00	0,00	5.746,00	5.746,00	
2.5.2	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	M2	50,00	3,89	194,50	0,00	40,00	40,00	0,00	155,60	155,60	
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				93.494,54				0,00		85.605,10	
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	200,00	75,41	15.082,00	0,00	200,00	200,00	0,00	15.082,00	15.082,00	
3.2	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL OU LAMINADO	M2	100,00	1,95	195,00	0,00	100,00	100,00	0,00	195,00	195,00	
3.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	800,00	9,00	7.200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	7.200,00	7.200,00	
3.4	DEMOLIÇÃO DE CONTRA PISO	M2	655,00	19,55	13.000,75	0,00	655,00	655,00	0,00	13.000,75	13.000,75	
3.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	855,00	13,04	11.149,20	0,00	855,00	855,00	0,00	11.149,20	11.149,20	
3.6	REMOÇÃO DE PISO EM CARPETE	M2	57,51	3,29	189,21	0,00	57,51	57,51	0,00	189,21	189,21	
3.7	REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2	260,00	13,98	3.634,80	0,00	80,00	80,00	0,00	1.118,40	1.118,40	
3.8	REMOÇÃO DE MADEIRA DE PISO INTERTRAVADO	M2	200,00	29,58	5.916,00	0,00	200,00	200,00	0,00	342,96	342,96	
3.9	REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	205,00	49,96	10.241,80	0,00	205,00	205,00	0,00	10.241,80	10.241,80	
3.10	DEMOLIÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACO LATERAL NO CANTEIRO	M3	2,94	339,76	998,89	0,00	2,94	2,94	0,00	998,89	998,89	
3.11	DEMOLIÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACO LATERAL NO CANTEIRO	M3	2,70	339,76	917,35	0,00	2,70	2,70	0,00	917,35	917,35	
3.12	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOÇÃO	M2	10,50	33,50	351,75	0,00	10,50	10,50	0,00	351,75	351,75	
3.13	REMOÇÃO GUARDA CORPO E CORRIMÃO	M	41,70	35,61	1.484,94	0,00	41,70	41,70	0,00	1.484,94	1.484,94	
3.14	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DO TELHADO											
3.14.1	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M2	465,00	10,55	4.905,75	0,00	465,00	465,00	0,00	4.905,75	4.905,75	
3.14.2	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESSOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M2	200,00	20,54	4.108,00	0,00	200,00	200,00	0,00	4.108,00	4.108,00	
3.15	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	20,00	17,60	352,00	0,00	20,00	20,00	0,00	352,00	352,00	
3.16	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS											
3.16.1	RETRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	10,00	20,70	207,00	0,00	10,00	10,00	0,00	207,00	207,00	
3.16.2	REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	10,00	11,73	117,30	0,00	10,00	10,00	0,00	117,30	117,30	
3.17	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS											
3.17.1	REMOÇÃO DE JANELAS EM FERRO E VIDRO	M2	125,00	13,04	1.630,00	0,00	125,00	125,00	0,00	1.630,00	1.630,00	
3.17.2	REMOÇÃO DE PORTAS METÁLICAS E/OU VIDRO	M2	50,00	13,04	652,00	0,00	50,00	50,00	0,00	652,00	652,00	
3.17.3	REMOÇÃO DE JANELA VENEZIANA METÁLICA	M2	10,00	13,04	130,40	0,00	10,00	10,00	0,00	130,40	130,40	
3.17.4	REMOÇÃO DE PORTAS INTERNAS	M2	5,00	13,04	65,20	0,00	5,00	5,00	0,00	65,20	65,20	
3.18	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	880,00	2,64	2.323,20	0,00	880,00	880,00	0,00	2.323,20	2.323,20	
3.19	REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	M	200,00	7,41	1.482,00	0,00	200,00	200,00	0,00	1.482,00	1.482,00	
3.20	REMOÇÃO DE FICHA ELÉTRICA	M	200,00	12,35	2.470,00	0,00	200,00	200,00	0,00	2.470,00	2.470,00	
3.21	RETRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 2 1/2" A 4"	M	200,00	5,25	1.050,00	0,00	200,00	200,00	0,00	1.050,00	1.050,00	
3.22	CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DO ENTULHO	UNID.	20,00	200,00	4.000,00	0,00	20,00	20,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
4	ESTRUTURAL				22.863,04				0,00		22.863,04	
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPa, AF_02/2017	M3	3,00	2252,38	6.757,14	0,00	3,00	3,00	0,00	6.757,14	6.757,14	
4.1.1	Escavação manual para execução da fundação da escada	m³	0,84	68,96	57,96	0,00	0,84	0,84	0,00	68,96	68,96	
4.1.2	Canteira metálica L 6" x 1/2 A36	kg	38,54	8,91	343,43	0,00	38,54	38,54	0,00	343,43	343,43	
4.1.3	Barras rosca 1/2" A193	un.	8	9,85	78,80	0,00	8,00	8,00	0,00	78,80	78,80	
4.1.4	Solda química do tipo sikadur 52 - contato concreto novo x existente	lata	1,00	134,71	134,71	0,00	1,00	1,00	0,00	134,71	134,71	
4.1.5	Solda química do tipo sikadur 32 - armadura da escada na viga superior	lata	0,50	134,72	67,36	0,00	0,50	0,50	0,00	67,36	67,36	
4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE SÓCULOS DE CONCRETO E CANALETAS DE PASSAGEM (CLIMATIZAÇÃO), MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPa, AF_02/2017	M3	4,00	2252,38	9.009,52	0,00	4,00	4,00	0,00	9.009,52	9.009,52	
4.3	FECHAMENTO DA LAJE											
4.3.1	Perfil laminado VM 10"	kg	94,00	8,91	837,54	0,00	94,00	94,00	0,00	837,54	837,54	
4.3.2	Canteira metálica L 6" x 1/2 A36	kg	35,04	8,91	312,21	0,00	35,04	35,04	0,00	312,21	312,21	
4.3.3	Parafuso 1/2" x 20 cm	kg	20,00	9,85	197,00	0,00	20,00	20,00	0,00	197,00	197,00	
4.3.4	Chapa metálica 10 mm com solda em chapa existente	KG	32,49	10,91	353,99	0,00	32,49	32,49	0,00	289,49	289,49	
4.3.5	Parafuso 3/8" x 20 cm	kg	8,49	271,68	2.303,20	0,00	32,00	32,00	0,00	271,68	271,68	
4.3.6	Solda química do tipo sikadur 32 - parafusos no concreto existente	lata	0,50	134,72	67,36	0,00	0,50	0,50	0,00	67,36	67,36	
4.3.7	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTELE, EM MADEIRA, AF_12/2015	M	87,50	6,60	577,50	0,00	87,50	87,50	0,00	577,50	577,50	
4.3.8	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF_12/2015	M2	12,58	98,91	1.243,79	0,00	12,58	12,58	0,00	1.243,79	1.243,79	
4.3.9	POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), TIPO 2F, BLOCO	M3	3,62	376,88	1.364,91	0,00	3,62	3,62	0,00	1.364,91	1.364,91	
4.3.10	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CEMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	M3	2,68	381,14	1.021,76	0,00	2,68	2,68	0,00	1.021,46	1.021,46	
4.3.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	23,00	9,56	219,88	0,00	23,00	23,00	0,00	219,88	219,88	
5	FECHAMENTOS				134.355,53				0,00		70.046,88	
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	50,00	89,60	4.480,00	0,00	50,00	50,00	0,00	4.480,00	4.480,00	
5.2	ENCINHAMENTO	M	50,00	17,28	864,00	0,00	50,00	50,00	0,00	864,00	864,00	
5.3	Peitoris e vergas	m	100,00	17,28	1.728,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1.728,00	1.728,00	
5.4	Fixação de peitoris e vergas em alvenarias e pilares existentes	m	150,00	17,28	2.592,00	0,00	150,00	150,00	0,00	2.592,00	2.592,00	
5.5	GESSO ACARTONADO (ST)	M2	490,00	77,98	38.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1	ISOLAMENTO TÉRMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	M2	310,00	69,29	21.479,90	0,00	146,35	146,35	0,00	10.140,59	10.140,59	
5.6	GESSO ACARTONADO (RU)	M2	197,00	113,49	22.357,53	0,00	197,00	197,00	0,00	22.357,53	22.357,53	
5.6.1	ISOLAMENTO TÉRMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	M2	130,00	69,29	9.007,							

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.										
ADITIVOS													
REMOÇÕES													
	Papa entulhos não previstos - Entulho Comum - Carga, transporte e bota fora de entulho	un.	37,00	200,00	7.400,00	1,00	15,00	16,00	200,00	3.000,00	3.200,00		
	Papa entulhos não previstos - Resíduos de Gesso - Carga, transporte e bota fora de entulho	m³	14,00	750,00	10.500,00	1,00	12,00	13,00	750,00	9.000,00	9.750,00		
	Regularização para Paviflex pavimento terço - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 4CM. AF_06/2014	m²	353,00	31,25	11.066,55	0,00	313,00	313,00	0,00	9.812,55	9.812,55		
	Fechamento com fibrocimento por cima da janela J12 - Incluso Estrutura metálica, transporte horizontal, transporte vertical e acessórios.	m²	5,23	146,44	765,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS													
	Montagem de luminárias em bancada e posterior instalação em estrutura do forro.	un.	182,00	26,06	4.743,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mão de obra das instalações de iluminação de emergência												
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED	0	40,00	6,13	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0	3,00	10,10	30,30	0,00	3,00	3,00	0,00	30,30	30,30		
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0	3,00	10,35	31,05	0,00	3,00	3,00	0,00	31,05	31,05		
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0	278,25	8,18	2.274,69	0,00	278,25	278,25	0,00	2.274,69	2.274,69		
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0	568,50	1,30	739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0	568,50	1,30	739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0	568,50	1,30	739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CONDULETE EM PVC TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	0	44,00	13,09	575,85	0,00	44,00	44,00	0,00	575,85	575,85		
	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	0	47,00	6,41	301,39	0,00	47,00	47,00	0,00	301,39	301,39		
	LULA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	0	94,00	6,39	600,43	0,00	94,00	94,00	0,00	600,43	600,43		
	Entrada provisória de energia - Poste Inicial	Cj	1,00	2.937,50	2.937,50	0,00	1,00	1,00	0,00	2.937,50	2.937,50		
	Haste de aterramento 2,0x3,0"	un.	1,00	45,83	45,83	0,00	1,00	1,00	0,00	45,83	45,83		
	Caixa de aterramento em concreto	un.	2,00	59,04	118,08	0,00	2,00	2,00	0,00	118,08	118,08		
	Cabo multiplexado 3x10 mm² - Neutro para entrada de energia	m	27,00	11,54	311,51	0,00	27,00	27,00	0,00	311,51	311,51		
	Armação com isolador de substação	un.	1,00	68,10	68,10	0,00	1,00	1,00	0,00	68,10	68,10		
	Mão de obra para instalação da substação												
	Instalação de transformador	un.	1,00	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mão de obra para ligação de entrada de energia em poste, passagem de cabos, montagem e ligação da cabina de medição.	vb	1,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CLIMATIZAÇÃO									3.640,00			
	Alimentadores para as evaporadoras - Cabo flexível 750V - isolamento PVC 70 graus - #2.5mm2 cor cinza/preta/azul/verde	m	1.300,00	2,80	3.640,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3.640,00	0,00	3.640,00		
	Cabo de comunicação entre as evaporadoras e condensadoras - cabo shield 2x1.5 mm²	m	420,00	5,31	2.229,42	0,00	420,00	420,00	0,00	2.229,42	2.229,42		
	Válvula de bloqueio para gás refrigerante instalada nas linhas de refrigeração.												
	1/4"	un.	25,00	172,50	4.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3/8"	un.	11,00	177,50	1.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1/2"	un.	29,00	203,75	5.908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3/4"	un.	11,00	208,75	2.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 1/4"	un.	3,00	208,75	626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DRENAGEM DA CLIMATIZAÇÃO.													
	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	124,00	8,86	1.098,95	0,00	124,00	124,00	0,00	1.098,95	1.098,95		
	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	60,00	12,74	764,25	0,00	60,00	60,00	0,00	764,25	764,25		
	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8" (cobrir) ou 3/4" (ferr)	m	60,00	21,50	1.290,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1.290,00	1.290,00		
	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8" (cobrir) ou 3/4" (ferr)	m	124,00	21,50	2.666,00	0,00	124,00	124,00	0,00	2.666,00	2.666,00		
	Fixação das tubulações de drenagem no teto e paredes com fita metálica perfurada de 18 mm - 1 apoio a cada 50 cm	m	184,00	18,78	3.454,60	0,00	184,00	184,00	0,00	3.454,60	3.454,60		
	Gás refrigerante R410a	kg	42,83	98,99	4.239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Andaime para montagem da fachada ventilada	m²	1.148,40	8,08	9.273,33	460,00	0,00	460,00	3.714,50	0,00	3.714,50		
	Andaime fachadeiro - montagem e desmontagem	m²/mês	3.445,20	6,11	21.058,79	460,00	0,00	460,00	2.811,75	0,00	2.811,75		
	Balsão fosco na escada - Assentamento Piso Balsão Fosco 40x40	m²	12,00	158,26	1.899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IMPERMEABILIZAÇÕES													
	Impermeabilização com manilha aluminizada na calha da cobertura e na tampa do reservatório (face superior)	m²	74,67	60,00	4.480,20	0,00	74,67	74,67	0,00	4.480,20	4.480,20		
INSTALAÇÃO PLUVIAL DA COBERTURA													
	Perfuração de laje para execução das descidas >75mm	un.	12,00	158,75	1.905,00	0,00	12,00	12,00	0,00	1.905,00	1.905,00		
	Tubulação de descida e no terreno em PVC 100 mm	m	147,00	26,16	3.845,89	0,00	147,00	147,00	0,00	3.845,89	3.845,89		
	Caixas de inspeção e limpeza em concreto pré-moldado com tampa de concreto	un.	2,00	103,98	207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Caixas de inspeção em PVC	un.	6,00	151,59	909,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Grelha de ferro fundido para caixa de passagem pluvial no estacionamento 30x50 cm	un.	1,00	124,38	124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Escavação de vala	m³	43,20	82,09	3.546,18	0,00	20,00	20,00	0,00	1.641,75	1.641,75		
	Lastro de areia	m²	5,40	91,68	495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relevo de vala	m²	37,09	16,39	607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ruío de aço galvanizado	m	144,50	73,44	10.611,72	0,00	3,50	3,50	0,00	257,03	257,03		
GESSO													
	GESSO ACARTONADO (ST) - 1 FASE	m²	107,81	51,45	5.546,82	0,00	107,81	107,81	0,00	5.546,82	5.546,82		
	GESSO ACARTONADO (RU) - 1 FASE	m²	24,81	69,20	1.716,85	0,00	24,81	24,81	0,00	1.716,85	1.716,85		
	GESSO ACARTONADO - SOMENTE ESTRUTURA SOBRE O FORRO	m²	206,48	24,78	5.115,54	0,00	65,00	65,00	0,00	1.610,38	1.610,38		
ALVENARIAS E REVESTIMENTOS													
	Chapisco em áreas não contabilizadas	m²	165,50	3,61	597,87	0,00	165,50	165,50	0,00	597,87	597,87		
	Reboco em áreas não contabilizadas	m²	138,52	33,10	4.585,01	0,00	138,52	138,52	0,00	4.585,01	4.585,01		
	Requadro	m²	26,79	33,10	886,75	0,00	26,79	26,79	0,00	886,75	886,75		
	Forrocimento e instalação de revestimento com granito flameado padrão arabesco ou similar. Áreas não contabilizadas.	m²	15,83	548,44	8.681,77	0,00	15,83	15,83	0,00	8.681,77	8.681,77		
	TOTAL GERAL				191.098,49					11.116,25			87.482,05

TERMO CIRCUNSTANCIADO													
REMOÇÕES													
	Remoção da estrutura de madeira do forro no pavimento térreo - Inclusive transporte horizontal, vertical e bota fora do entulho gerado.	m²	337,60	29,51	9.963,42	0,00	337,60	337,60	0,00	9.963,42	9.963,42		
	Desmontagem da escada metálica	kg	1.494,91	3,93	5.867,53	0,00	1.494,91	1.494,91	0,00	5.867,53	5.867,53		
	Transporte horizontal de entulho	un.	1,00	540,66	540,66	0,00	1,00	1,00	0,00	540,66	540,66		
	Montagem da escada metálica - Inclusive transporte horizontal	kg	1.195,93	4,04	4.828,57	0,00	1.195,93	1.195,93	0,00	4.828,57	4.828,57		
	Remoção de detritos na cobertura - Inclusive remoção do material presente na cobertura, transporte horizontal, transporte vertical por 2 pavimentos e bota fora do material.	m3	100,00	284,14	28.413,75	0,00	100,00	100,00	0,00	28.413,75	28.413,75		
Contrapiso													
	Contrapiso pavimento superior e inferior - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 4CM. AF_06/2014	m²	59,75	31,35	1.873,16	0,00	59,75	59,75	0,00	1.873,16	1.873,16		
	Regularização do contrapiso para nivelção do seg. pavimento - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 4CM. AF_06/2014 - Item 10.1.1.1 da Planilha Orç	m²	382,60	31,35	11.994,51	0,00	382,60	382,60	0,00	11.994,51	11.994,51		
	Execução de vergas e contra vergas estruturais de apoio para esquadrias e fachada em placa cimentícia. Inclusive corte, dobra e montagem de armaduras, montagem de formas e concretagem.	m³	6,03	2252,38	13.581,82	0,00	6,03	6,03	0,00	13.581,82	13.581,82		
	TOTAL GERAL				77.063,42					77.063,41			77.063,41

SUPRESSÃO													
REMOÇÕES													
	Remoção de Acabado	m²	105,00	R\$39,07	4.136,85	0,00	105,00	105,00	0,00	4.136,85	4.136,85		
	Remoção de piso cerâmico	m²	855,00	R\$3,04	2.591,25	0,00	855,00	855,00	0,00	2.591,25	2.591,25		
	Remoção de contrapiso	m²	0,00	R\$19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Remoção do revestimento de argamassa	m²	800,00	R\$9,80	7.840,00	0,00	800,00	800,00	0,00	7.840,00	7.840,00		
	Demolição de alvenaria	m³	134,00	R\$75,41	10.105,28	0,00	134,00	134,00	0,00	10.105,28	10.105,28		
	DEMOLICÃO DE FORRO DE GESSO (cons. Forro metálico e de fibra)	M²	880,00	R\$2,64	2.322,00	0,00	880,00	880,00	0,00	2.322,00	2.322,00		
Peitoris e Vergas													
	Peitoris e vergas	m	100										

De: Eng. André Wagner - SPO
Para: Diretor do SPO



Assunto: MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA – 10ª MEDIÇÃO – REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A VARA TRABALHISTA DE CANOINHAS

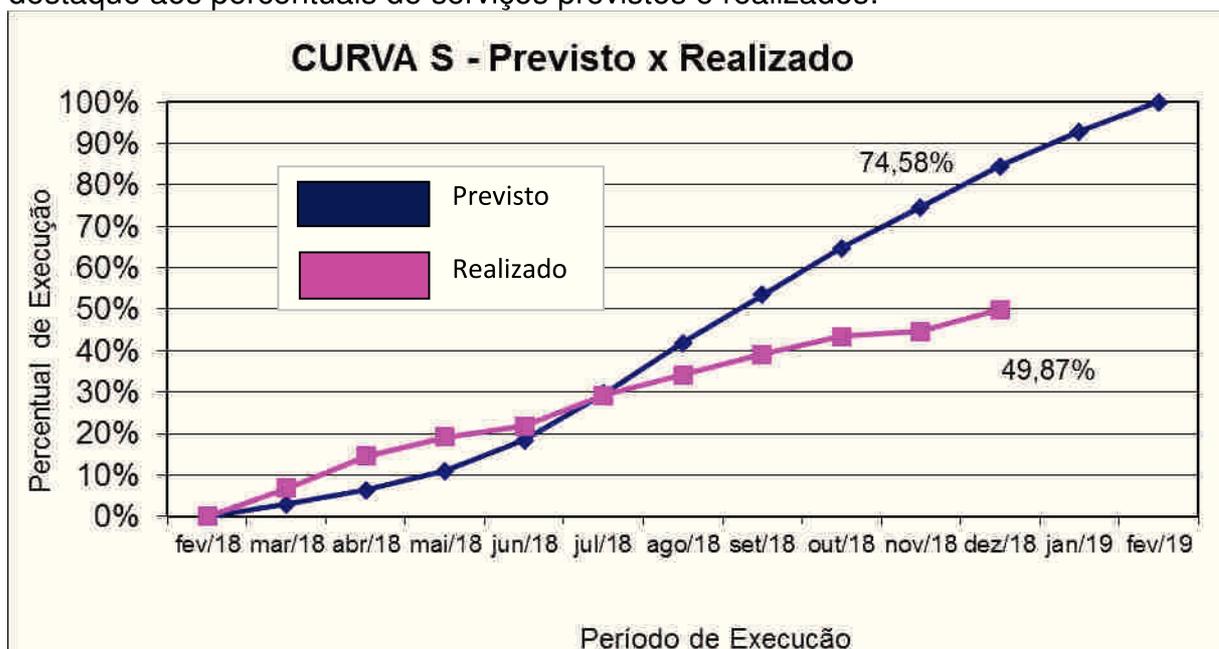
PROAD: CP 9379/2017

Prezado Diretor do SPO,

Pelo presente, junto ao PROAD 9379/2017 a nota fiscal eletrônica nº 50 da empresa **ESPHERA SUL Empreendimentos LTDA - ME**, no valor de **R\$ 123.022,40** correspondente à **10ª medição** do contrato cujo valor original é de R\$ 2.187.480,19. Somado ao 1º Termo Aditivo e ao 1º Termo Circunstanciado, o contrato totaliza agora **R\$ 2.360.441,35**.

Esta medição, com serviços realizados no período de 31/10/2018 a 30/11/2018 totaliza 49,87% do valor do contrato. O valor previsto no Cronograma Físico Financeiro (CFF) para esta 10ª medição não foi atingido, comparando-o com a com o percentual acumulado previsto para o 9º mês de obra (74,58%). A empresa foi notificada e apresentou suas justificativas, considerando que conseguirá recuperar os atrasos nos próximos meses. A fiscalização continuará acompanhando o desenvolvimento da obra sob o aspecto, também, do prazo.

O gráfico a seguir demonstra o andamento da obra segundo o CFF Previsto em comparação ao valor medido na referência Novembro/Dezembro/18, com destaque aos percentuais de serviços previstos e realizados:



Documentos juntados:

- Pedido da empresa;
- Nota Fiscal;
- Relatório fotográfico;
- Planilha da 10ª Medição;
- Recibos de entrega de EPIs;
- Diários de obra.

Atenciosamente,

André Wagner

Analista Judiciário – Especialidade Engenharia Civil
Matrícula 4262 – CREA/SC 068.622-2
Serviço de Projetos e Obras

CP 9379/17

ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RUA PROF WALTER DE BONA CASTELAN, 173,
CORREGO GRANDE - FLORIANOPOLIS - SC - 88.037-300
Telefone: 32046919
CNPJ: 03.594.924/0001-51
CMC: 458.774-0

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 50

Autorização: 035918

Emissão: 06/12/2018

Código de Verificação: A1E2-64EB-4BCF-3E26



ANGELA
TEREZIN
HA
HEIXEIR

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO			CFPS 9205
ENDEREÇO Rua Esteves Júnior, 395 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88.015-905
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 02.482.005/0001-23 CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
4120400	(CONSTRUCAO DE EDIFICIOS) REFERENTE A MÃO DE OBRA DE REFORMA DO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS-SC.	0	0,00	R\$ 37.644,85	1	R\$ 37.644,85
4120400	(CONSTRUCAO DE EDIFICIOS) REFERENTE A MATERIAL DE REFORMA DO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS-SC.	0	0,00	R\$ 85.377,55	1	R\$ 85.377,55

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 123.022,40
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

BANCO CECRED (085). AGÊNCIA: 0106-6. CONTA CORRENTE: 6507-2. CEI: 51.242.69909/77. INSS (11%) R\$ 4.140,93, Pis, Cofins, CS (4,65%) R\$ 5.720,54, IRPJ (1,20%) R\$ 1.476,27. VALOR DA ALÍQUOTA DE ISS É 3,00% (R\$ 3.690,67) NA REGIÃO DE CANOINHAS/SC, RETIDO NA FONTE.

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
SIGNATÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
DATA DO CARIMBO: 06/12/2018 10:49:50


A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A1E264EB4BCF3E26 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 4587740

Documento 293 do PROAD 9379/2017. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2018.NKYD.TLXM:
<https://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento>



Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 07/12/18


ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário
Matrícula: 4262
Eng.º Civil CREA-SC 068.622-2


Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

TERMO DE LIQUIDAÇÃO

Liquida-se o presente documento de
acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64.
O documento refere-se ao original da
1ª via, arquivado neste Setor.

Em 11/12/18.


Simone Bonatelli Cardoso
Técnico Judiciário

17NE1338 -R.T.

39-16

CP 9379/17

ANEXO – V

ATESTADO DE CONFORMIDADE PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL			
CONTRATO/PROAD Nº: 9379/17	UNIDADE:		
EMPRESA CONTRATADA:	Esphora Sul		
PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:	14/06/2019		
RESPONSÁVEL:			
	SIM	NÃO	Não se aplica
1. NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
1.1 Houve anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social			X
1.2 Abertura de conta-depósito vinculada			X
1.3 Apresentação da garantia contratual			X
1.4 Relação de todos os empregados que prestarão serviço			X
1.5 Houve o encaminhamento dos exames admissionais dos empregados			X
1.6 Outros documentos exigidos no edital/contrato			X
2. NA LIQUIDAÇÃO MENSAL DA NOTA FISCAL:			
2.1 O Fiscal de Contrato atestou a conformidade na prestação dos serviços (Caso afirmativo informar o número do marcador do referido documento do respectivo proad)	X		
2.2 Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal			X
2.3 Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho)	X		
2.4 Período da prestação de serviços está correto (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura)			X
2.5 Caso haja falta informada pelo Fiscal do Contrato, verificar se houve desconto respectivo na Nota Fiscal			X
3. A CONTRATADA FORNECEU TODA A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA DA MÃO DE OBRA DIRETAMENTE ENVOLVIDA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:			
3.1 Aviso de férias e os respectivos comprovantes de quitação ao trabalhador			X
3.2 Comprovantes de pagamento dos salários, vale-transporte e auxílio-alimentação dos empregados e cartão ponto	X		
3.3 Verificar se a empresa realizou a retenção da contribuição previdenciária	X		
3.4 Verificar se a empresa realizou o recolhimento dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço	X		
4. COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DO FGTS POR MEIO DE:			
4.1 Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	X		
4.2 Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	X		
4.3 Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)	X		
4.4 Cópia da relação de Tomadores/Obras (RET)	X		
5. COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS POR MEIO DE:			
5.1 Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	X		
5.2 Cópia do comprovante de declaração à Previdência	X		
5.3 Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	X		

5.4	Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)	X		
5.5	Cópia da relação de Tomadores/Obras (RET)	X		
6. NA ADMISSÃO/SUBSTITUIÇÃO DE TRABALHADORES:				
6.1	Houve anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social?			X
6.2	Houve encaminhamento dos exames admissionais dos empregados?			X
7. NA DISPENSA DE TRABALHADORES:				
7.1	Termo de rescisão de contrato de trabalho, devidamente homologado pelo Sindicato da categoria profissional do trabalhador			X
7.2	Comprovante das verbas rescisórias devidamente assinado			X
7.3	Exames médicos demissionais dos empregados			X
7.4	Notificação de aviso prévio			X
8. VALIDADE DAS CERTIDÕES NEGATIVAS:				
8.1	Certidão negativa de débitos trabalhistas	X		
8.2	GPS (INSS)	X		
8.3	GRF (GFTS)	X		
8.4	Certidão conjunta de débitos relativos as Tributos Federais	X		
8.5	Certidão Dívida Ativa da União	X		
8.6	Certidão Negativa de Débitos Salariais	X		
8.7	Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	X		
8.8	Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	X		
9. OUTROS ITENS PREVISTOS NO EDITAL/CONTRATO				
9.1				
9.2				
9.3				
9.4				
9.5				
9.6				


Simone Gonatelli Cardoso
 Técnico Judiciário



Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.594.924/0001-51
Razão Social: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: ESPHERA SUL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/02/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/03/2019
FGTS	Validade:	17/12/2018
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/06/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/12/2017 (*)
Receita Municipal	Validade:	17/01/2018 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ/CPF: **03.594.924/0001-51**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	180140119861050
Data de emissão:	11/12/2018 13:13:59
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	09/02/2019

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos
CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

EMPREGADOR: ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA (ESPHERA SUL)

CNPJ: 03.594.924/0001-51

DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/12/2018, às 13h14

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **2kHswsO**.

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais e Dívida Ativa do Município

CMC	CNPJ	Nome
4587740	03.594.924/0001-51	ESPHERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da(s) pessoa(s) acima identificada(s) que vieram a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) e a inscrições em Dívida Ativa do Município. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/receita>>, Serviços - Serviços on-line - link Verificação de Documentos Eletrônicos, passando o número do documento 1740388 e o código FDF92E31

Certidão Número 7120218

Emitida 03/10/2018 13:37:44

Válida até 01/01/2019 conforme o Art. 194 Lei Complementar 4823 de 02 de janeiro de 1996.

Florianópolis (SC) 03 de outubro de 2018
Secretaria Municipal da Fazenda

Assinatura Digital: FDF92E310C7149C5BD379B97E4345E6F1C1C9D25
Data: 03/10/2018 13:37:44 - Protocolo: 16208878 - Documento: 1740388
Documento autenticado digitalmente



ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Rua Tenente Silveira 60, Centro - Florianópolis - SC 0**48 3251 6400 - CEP 88010-300.
<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/receita>, link Serviços - Serviços on-line -Verificação de Documentos Eletrônicos.

12/12/18 16:37

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 12Dez18 TIPO OB: 11 NUMERO : 2018OB806220
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 03594924/0001-51 - ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
BANCO : 085 AGENCIA : 0106 CONTA CORRENTE : 65072
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2018NP002032 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006979153-8 PROCESSO : CP-9379/2017
VALOR : 107.993,99

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 50 - REFORMA DO IMÓVEL DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABAL
HO DE CANOINHAS. 10A. MEDIÇÃO. PROAD 9379/2017. RETIDO R\$ 3.690,67 REF. ISS

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Documento 294 do PROAD 9379/2017. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2018.TKBN.MQTZ:
<https://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento>

12/12/18 16:38

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 12Dez18 TIPO OB: 11

NUMERO : 2018OB806220

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 03594924/0001-51 - ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

BANCO : 085 AGENCIA : 0106 CONTA CORRENTE : 65072

VALOR : 107.993,99

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401006	2017NE001338400		33903916	
----	--------	-----------------	--	----------	--

107.993,99

02	531814	2017NE001338	213110400	33903916	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

107.993,99

03	561602	01000000000400C			
----	--------	-----------------	--	--	--

107.993,99

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 12Dez18 16:08

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

12/12/18 16:38

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 12Dez18 VENCIMENTO: 12Dez18 NUMERO : 2018DF801482
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
CONTRIBUINTE : 03594924/0001-51 - ESFERA SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : CP-9379/2017 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2018NP002032
PERIODO APURACAO : 12Dez18 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES : BASE DE CALCULO : 123022,40
RECEITA : 7.196,81
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 12/12/18
TOTAL : 7.196,81

OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuições, retidas cfe. Instr. Normativa RFB 1234/2012, ref. Pagamento da nota fiscal 50 - Reforma do imóvel da nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas. 10a. medição. proad 9379/2017.

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 12Dez18 16:08

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

12/12/18 16:38

USUARIO : GAMB

DATA EMISSAO : 12Dez18

NUMERO : 2018GP800329

UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO

RECOLHEDOR : 512426990977

CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI

COMPETENCIA : DEZ18

RECURSO : 3

PROCESSO : CP-9379/2017

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2018NP002032 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 3582 , EM 12/12/18

VALOR INSS : 4.140,93

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 4.140,93

OBSERVACAO

Recolhimento de contribuição, retida cfe. Instr. Normativa RFB 971/2009, ref. Pagamento da nota fiscal 50 - Reforma do imóvel da nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas. 10a. medição. proad 9379/2017. Retido R\$ 3.690,67 ref. ISS

LANCADO POR : 58654976934 - GAMB UG : 080013 12Dez18 16:08

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
