

**ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES**  
**Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE**



ANDRE WAGNER

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA : **12-Nov-19** | **\_246\_ /263**

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
 CM = Chuva Moderada  
 CF = Chuva Forte  
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

**TERÇA**

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

**Sub Empreiteiros**

Eletricista	2		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	3		
Instalador de paredes de gesso			
Instalador paviflex			

**Principais Atividades do Dia**

- Instalação dos ventokits.
- Instalação de máquinas ar-condicionado.
- Limpeza diária da obra.
- Execução da massa corrida e pintura.
- Fixação de tubulação e fiação elétrica.
- Assentamento de revestimento cerâmico - parede e pisos.
- Instalações hidráulicas.

**Observações Engaste Projetos**

---

---

---

---

---

**Observações TRT**

---

---

---

---

---

**ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES**

**TRT**



Documento 301 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.FBVP.YNMH:  
<https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

**ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES**  
**Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE**



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA : **13-Nov-19** | **\_247\_ /263**

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

**QUARTA**

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

**Sub Empreiteiros**

Eletricista	3		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	3		
Instalador de paredes de gesso			
Instalador paviflex			

**Principais Atividades do Dia**

- Estrutura metálica elevador.
  - Instalação de tomadas e interruptores.
  - Limpeza diária da obra.
  - Execução da massa corrida e pintura.
  - Fixação de tubulação e fiação elétrica.
- .....  
.....  
.....  
.....

**Observações Engaste Projetos**

.....  
.....  
.....  
.....

**Observações TRT**

.....  
.....  
.....  
.....

**ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES**

**TRT**

**ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES**  
**Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE**



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA : **14-Nov-19** | **\_248\_ /263**

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

**QUINTA**

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

**Sub Empreiteiros**

Eletricista	3		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	3		
Instalador de paredes de gesso			
Instalador paviflex			

**Principais Atividades do Dia**

- Estrutura metálica elevador.
  - Instalação de tomadas e interruptores.
  - Limpeza diária da obra.
  - Execução da massa corrida e pintura.
  - Fixação de tubulação e fiação elétrica.
- .....  
.....  
.....  
.....

**Observações Engaste Projetos**

.....  
.....  
.....  
.....

**Observações TRT**

.....  
.....  
.....  
.....

**ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES**

**TRT**

**ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES**  
**Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE**



## **DIÁRIO DE OBRA**

DATA : 15-Nov-19 \_249\_ /263

## Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
B	B	B

SEXTA

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mestre		Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	

Sub Empreiteiros

Eletrista			
Técnico de Ar Cond.			
Pintores			
Instalador de paredes de gesso			
Instalador paviflex			

## **Principais Atividades do Dia**

**SEM EXPEDIENTE.**

## **Observações Engaste Projetos**

## **Observações TRT**

#### **ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES**

TRT

# **ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES**

## **Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE**



## DIÁRIO DE OBRA

DATA : 16-Nov-19 \_250\_ /263

## Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	CM	B

SÁBADO

## Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mestre		Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	

**Sub Empreiteiros**

Eletrista			
Técnico de Ar Cond.			
Pintores			
Instalador de paredes de gesso			
Instalador paviflex			

## **Principais Atividades do Dia**

**Sem expediente.**

## **Observações Engaste Projetos**

## **Observações TRT**

**ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES**

TRT

# **ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES**

## **Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE**



## **DIÁRIO DE OBRA**

DATA : 17-Nov-19 \_251\_ /263

## Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	CM	B

DOMINGO

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mestre		Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	

Sub Empreiteiros

Eletricista			
Técnico de Ar Cond.			
Pintores			
Instalador de paredes de gesso			
Instalador paviflex			

## **Principais Atividades do Dia**

**SEM EXPEDIENTE.**

## **Observações Engaste Projetos**

## **Observações TRT**

**ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES**

TRT

**ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES**  
**Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE**



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA : **18-Nov-19** | **\_252\_ /263**

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>NB</b>	<b>CM</b>	<b>B</b>

**SEGUNDA**

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

**Sub Empreiteiros**

Eletricista	3		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	3		
Instalador de paredes de gesso			
Instalador paviflex			

**Principais Atividades do Dia**

- Estrutura metálica elevador.
  - Instalação de tomadas e interruptores.
  - Limpeza diária da obra.
  - Execução da massa corrida e pintura.
  - Fixação de tubulação e fiação elétrica.
- .....
- .....
- .....

**Observações Engaste Projetos**

.....

.....

.....

**Observações TRT**

.....

.....

.....

.....

**ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES**

**TRT**

**ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES**  
**Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE**



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA : **19-Nov-19** | **\_253\_ /263**

**TERÇA**

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>NB</b>	<b>CM</b>	<b>B</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

**Sub Empreiteiros**

Eletricista	3		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	3		
Instalador de paredes de gesso			
Instalador paviflex			

**Principais Atividades do Dia**

- Estrutura metálica elevador.
- Instalação de tomadas e interruptores.
- Limpeza diária da obra.
- Execução da massa corrida e pintura.
- Fixação de tubulação e fiação elétrica.

**Observações Engaste Projetos**

---



---



---



---

**Observações TRT**

---



---



---



---

**ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES**

**TRT**

**ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES**  
**Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE**



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA : **20-Nov-19** | **\_254\_ /263**

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>NB</b>	<b>CM</b>	<b>B</b>

**QUARTA**

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

**Sub Empreiteiros**

Eletricista	3		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	3		
Instalador de paredes de gesso			
Instalador paviflex			
Instalador Fachada de ACM	4		

**Principais Atividades do Dia**

Instalação da fachada ventilada em ACM.

Instalação de tomadas e interruptores.

Limpeza diária da obra.

Execução da massa corrida e pintura.

Fixação de tubulação e fiação elétrica.

**Observações Engaste Projetos**

**Observações TRT**

**ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES**

**TRT**

**ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES**  
**Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE**



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA : **21-Nov-19** | **\_255\_ /263**

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>NB</b>	<b>CM</b>	<b>B</b>

**QUINTA**

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

**Sub Empreiteiros**

Eletricista	3		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	3		
Instalador de paredes de gesso			
Instalador paviflex			
Instalador Fachada de ACM	4		

**Principais Atividades do Dia**

Instalação da fachada ventilada em ACM.

Instalação de tomadas e interruptores.

Limpeza diária da obra.

Execução da massa corrida e pintura.

Fixação de tubulação e fiação elétrica.

**Observações Engaste Projetos**

**Observações TRT**

**ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES**

**TRT**

**ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES**  
**Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE**



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA : **22-Nov-19** | **\_256\_ /263**

**SEXTA**

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>NB</b>	<b>CM</b>	<b>B</b>

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

**Sub Empreiteiros**

Eletricista	3		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	3		
Instalador de paredes de gesso			
Instalador paviflex			
Instalador Fachada de ACM	4		

**Principais Atividades do Dia**

Instalação da fachada ventilada em ACM.

Instalação de tomadas e interruptores.

Limpeza diária da obra.

Execução da massa corrida e pintura.

Fixação de tubulação e fiação elétrica.

**Observações Engaste Projetos**

**Observações TRT**

**ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES**

**TRT**

# **ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES**

## **Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE**



## DIÁRIO DE OBRA

**DATA :** 23-Nov-19 \_257\_/263

## Mapa de Tempo

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	CM	B

SÁBADO

## Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mestre		Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	

Sub Empreiteiros

Eletrista			
Técnico de Ar Cond.			
Pintores			
Instalador de paredes de gesso			
Instalador paviflex			

## **Principais Atividades do Dia**

**SEM EXPEDIENTE.**

## **Observações Engaste Projetos**

## **Observações TRT**

#### **ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES**

TRT

**ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES**  
**Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE**



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA : **24-Nov-19** | **\_258\_ /263**

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>NB</b>	<b>CM</b>	<b>B</b>

**DOMINGO**

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mestre		Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	

**Sub Empreiteiros**

Eletricista			
Técnico de Ar Cond.			
Pintores			
Instalador de paredes de gesso			
Instalador paviflex			

**Principais Atividades do Dia**

**SEM EXPEDIENTE.**

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

**Observações Engaste Projetos**

---



---



---



---



---



---



---



---



---

**Observações TRT**

---



---



---



---



---



---



---



---

**ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES**

**TRT**

---

**ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES**  
**Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE**



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA : **25-Nov-19** | **\_259\_ /263**

**Mapa de Tempo**

B = Bom  
CM = Chuva Moderada  
CF = Chuva Forte  
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
<b>NB</b>	<b>CM</b>	<b>B</b>

**SEGUNDA**

**Efetivo do Dia**

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

**Sub Empreiteiros**

Eletricista	3		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	3		
Instalador de paredes de gesso			
Instalador paviflex			
Instalador Fachada de ACM	4		

**Principais Atividades do Dia**

Instalação da fachada ventilada em ACM.

Instalação de tomadas e interruptores.

Limpeza diária da obra.

Execução da massa corrida e pintura.

Fixação de tubulação e fiação elétrica.

**Observações Engaste Projetos**

**Observações TRT** Fiscalização do SPO/TRT realizada pelo Eng. André Wagner, Alexandre K. S. Thiago e Dilcionir José Furlan. Realizada medição. Reiterada a necessidade de impermeabilização do poço do elevador. Informou-se que as placas de saída com indicação dupla no projeto se referem à placas com duas faces. Solicita-se que as luminárias menores que as peças de forro sejam dispostas apoiadas em perfis e forma a não pesar na peça do forro. É importante verificar com o fabricante dos anéis de concreto do sistema de tratamento de esgoto se foi utilizado impermeabilizante no traço do concreto. Nas soldas dos gradis, solicita-se a aplicação de galvanização fria. Na parede da recepção, mover as instalações aparentes para as laterais, dando espaço para a colocação de painéis decorativos (3 x 1,4m de largura mais 20cm).

**ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES**

**TRT**

# FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE/SC


## Projeto de Reforma

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SEGUNDA MEDIDA DO MÊS DE NOVEMBRO

O presente relatório é com relação da segunda medida do mês de novembro que ocorreu no dia 25 do mês. Os serviços executados foram:

- Revestimento cerâmico;
- Acabamento: textura e pintura;
- Elétrica: Instalação tomadas e interruptores;
- Instalação da fachada ventilada em ACM.

Figura 1 – Instalação de tomadas e interruptores no 1º pavimento

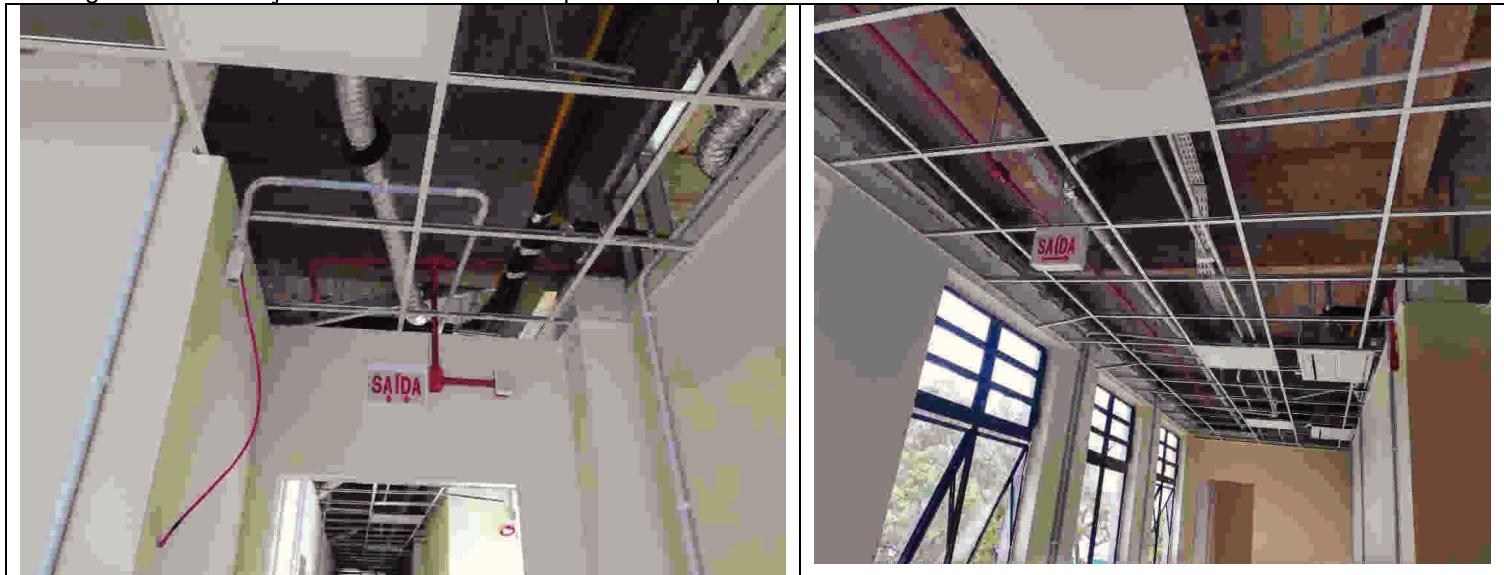

Na Figura 1, são as imagens da instalação elétrica com interruptores e tomadas no 1º pavimento. Na Figura 2, são fotos da instalação das tomadas, interruptores e pintura no 2º pavimento.

Figura 2 – Instalação de tomadas e interruptores no 2º pavimento

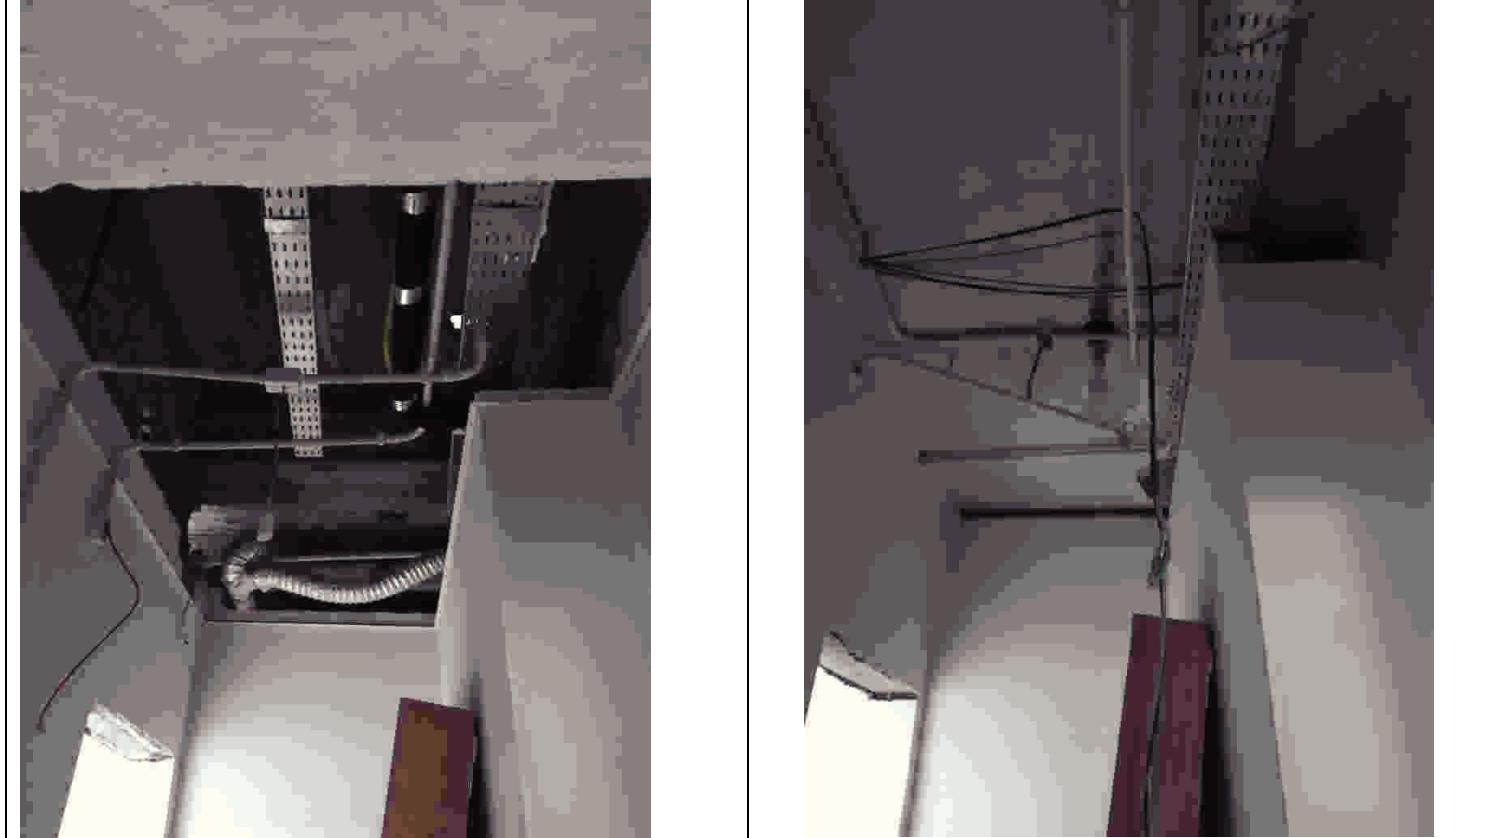


Figura 3 – Acabamento – pintura no pavimento térreo.



Na Figura 3, execução do acabamento com textura e pintura no pavimento térreo. Na Figura 4, são imagens da instalação da fachada ventilada em ACM. Na Figura 5, são fotos da instalação de tomadas e interruptores no pavimento térreo.

Figura 4 – Instalação da fachada em ACM



Figura 5 – Instalação de tomadas e interruptores no pavimento térreo.





## OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

Ofício N.º 10

Brusque/25/11/2019.

A fiscalização,

A empresa Engaste Projetos Construções e Incorporações Ltda vem solicitar a nome medição da obra de Reforma do novo Fórum trabalhista de Brusque).

O valor solicitado nessa medição é de R\$ 407.270,12 (quatrocentos e sete mil e duzentos e setenta reais e doze centavos.

Atenciosamente,



Daniel Barbieri

---

Engaste Projetos, Construções e Incorporações Ltda.  
Rua Anita Garibaldi, 270 – Sala 34 – Concórdia / SC - CEP: 89700-000  
Fone: 49 3425-9203 E-mail: engaste@engasteconstrucoes.com.br

Documento 295 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia,  
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.XGCC.BRNS:  
<https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>





ANDRE  
WAGN  
ER

• 31 •

**CLIENTE:** Instituto Regional de Francia s/n 123 850  
**DIRECCIÓN:** Avenida North Castle 333 - Loma  
**MUNICIPIO:** Barranquilla  
**OBRA:** Segundo Piso Trabajos de Encapado  
**CONTRATISTA:** INGENIERIA  
**PERÍODO:** 11/2010 al 02/2011

Documento 297 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.QWFK.MRRL:  
<https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



23



ANDRE  
WAGNER

Documento 298 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.KQZZ.BHRC:  
<https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

16.1.26	VIGEDEZ ALTA E BAIXA PARA TUBO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	789,40	2.60%	R\$			R\$	+	0,00%	R\$	
16.1.27	REFRIGERANTE PARA TUBO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	1.451,73	4,00%	R\$			R\$	+	0,00%	R\$	
16.1.28	TELEFONETICA PARA TUBO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	2.000,00	10,00%	R\$	2.000,00		R\$	+	100,00%	R\$	2.000,00
16.1.29	LED PARA LAMPADA CONTINUA FLUORESCENTE 10W 12VDC 1000LM 3000K 12VDC 10W 12VDC 1000LM 3000K	R\$	1.027,23	3,00%	R\$	1.027,23		R\$	+	100,00%	R\$	1.027,23
16.1.30	CABO DE BURACHA FORTINADA MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	1.322,20	2,00%	R\$			R\$	+	5,20%	R\$	
<b>TOTAL MATERIAIS SUPERIOR</b>												
16.2.00	MATERIAIS INFRAESTRUTURA											
16.2.01	ABRACADABRA ENCAIXE AMARRADOR DE CABO DE PVC COM 1,10MT X 0,40MM X 0,05MM	R\$	1.227,43	90,00%	R\$	1.227,43		R\$	+	100,00%	R\$	1.227,43
16.2.02	DATA DE PASSAGEM MEDIDA EM BORBOREMA TAMBOR FORMULADA 10MM X 10MM X 10MM	R\$	145,19	100,00%	R\$	145,19		R\$	+	100,00%	R\$	145,19
16.2.03	LAMA DE PASSAGEM ENVOLVENTE PARA ESTRUTURA DE CONCRETO E PAREDE DE MATERIAIS	R\$	1.257,41	100,00%	R\$	1.257,41		R\$	+	100,00%	R\$	1.257,41
16.2.04	COLUNAS DE VIDRO E ALUMÍNIO COR BRANCA 10X10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	2.077,41	1,00%	R\$			R\$	+	0,00%	R\$	
16.2.05	EFEROLARTE DECORATIVO CENTRAL ADASANHO COBRE BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	74,40	100,00%	R\$	74,40		R\$	+	100,00%	R\$	74,40
16.2.06	PAPEL DE SEDA EM PVC PERTINAZ 100% PVA 100GR/M² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	1.129,40	100,00%	R\$	1.129,40		R\$	+	100,00%	R\$	1.129,40
16.2.07	COMPONENTE PVC RIBBED 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	1.021,40	100,00%	R\$	1.021,40		R\$	+	100,00%	R\$	1.021,40
16.2.08	CONCRETO DE BLOCO E ARAMELA DE ALUMÍNIO 10X10X100MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	7,83	100,00%	R\$	7,83		R\$	+	100,00%	R\$	7,83
16.2.09	CONJUNTO DE BLOCO E ARAMELA DE ALUMÍNIO 10X10X100MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	27,91	100,00%	R\$	27,91		R\$	+	100,00%	R\$	27,91
16.2.10	CONCRETO BLOCO E ARAMELA DE ALUMÍNIO 10X10X100MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	10,20	100,00%	R\$	10,20		R\$	+	100,00%	R\$	10,20
16.2.11	COMPONENTE PVC 100% TEIXIDO 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	19,55	100,00%	R\$	19,55		R\$	+	100,00%	R\$	19,55
16.2.12	TRINCULINHO MULTIFUNCIONAL 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	1.102,34	100,00%	R\$	1.102,34		R\$	+	100,00%	R\$	1.102,34
16.2.13	PAPEL DE SEDA EMPILHADO 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	2.870,20	100,00%	R\$	2.870,20		R\$	+	100,00%	R\$	2.870,20
16.2.14	BUROLINHO CERD PARA CONDUZETES PVC DIAMETRO 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	500,00	100,00%	R\$			R\$	+	100,00%	R\$	
16.2.15	GRUPO INTEGRAL PARA ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	205,40	100,00%	R\$	205,40		R\$	+	100,00%	R\$	205,40
16.2.16	GRUPO INTEGRAL PARA ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	20,30	100,00%	R\$	20,30		R\$	+	100,00%	R\$	20,30
16.2.17	GRUPO INTEGRAL PARA ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	70,00	100,00%	R\$	70,00		R\$	+	100,00%	R\$	70,00
16.2.18	GRUPO INTEGRAL PARA ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	128,00	100,00%	R\$	128,00		R\$	+	100,00%	R\$	128,00
16.2.19	ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	2.557,70	100,00%	R\$	2.557,70		R\$	+	100,00%	R\$	2.557,70
16.2.20	ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	2.662,00	100,00%	R\$	2.662,00		R\$	+	100,00%	R\$	2.662,00
16.2.21	ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	65,40	100,00%	R\$	65,40		R\$	+	100,00%	R\$	65,40
16.2.22	ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	227,20	100,00%	R\$	227,20		R\$	+	100,00%	R\$	227,20
16.2.23	ELETROVALVULA PVC 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	4.387,20	100,00%	R\$	4.387,20		R\$	+	100,00%	R\$	4.387,20
16.2.24	ELETROVALVULA PVC FLEXIVEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	1.211,00	100,00%	R\$	1.211,00		R\$	+	100,00%	R\$	1.211,00
16.2.25	ESTRUTURA CIRCUITO TRIPLEX RETANGULAR 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	508,00	0,00%	R\$			R\$	+	100,00%	R\$	
16.2.26	ESTRUTURA CIRCUITO TRIPLEX RETANGULAR 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	32,94	100,00%	R\$			R\$	+	100,00%	R\$	
16.2.27	VERGALHÃO ROSA TOTAL 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	131,10	100,00%	R\$	131,10		R\$	+	100,00%	R\$	131,10
16.2.28	LIMA EM PVC RIGIDA ROSA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	1.020,30	100,00%	R\$	1.020,30		R\$	+	100,00%	R\$	1.020,30
16.2.29	LIMA EM PVC RIGIDA ROSA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	14,50	100,00%	R\$	14,50		R\$	+	100,00%	R\$	14,50
16.2.30	LIMA PARA ESTRUTURA PVC 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	1.210,00	100,00%	R\$	1.210,00		R\$	+	100,00%	R\$	1.210,00
16.2.31	LIMA PARA ESTRUTURA PVC 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	33,30	100,00%	R\$	33,30		R\$	+	100,00%	R\$	33,30
16.2.32	LIMA RIGIDA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	4.455,30	100,00%	R\$	4.455,30		R\$	+	100,00%	R\$	4.455,30
16.2.33	LIMA DE INVERSOR 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	60,20	100,00%	R\$	60,20		R\$	+	100,00%	R\$	60,20
16.2.34	ELETROVALVULA PVC 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	1.000,14	100,00%	R\$	1.000,14		R\$	+	100,00%	R\$	1.000,14
16.2.35	ELETROVALVULA PVC 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	600,72	100,00%	R\$	600,72		R\$	+	100,00%	R\$	600,72
16.2.36	TAMPA DE IMPRESSAO PARA ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	100,20	100,00%	R\$	100,20		R\$	+	100,00%	R\$	100,20
16.2.37	TAMPA DE ENCHIMENTO PARA ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	99,92	100,00%	R\$	99,92		R\$	+	100,00%	R\$	99,92
16.2.38	PERFORADOR CRISTAL 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	151,80	100,00%	R\$	151,80		R\$	+	100,00%	R\$	151,80
16.2.39	PERFORADOR CRISTAL 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	25,56	100,00%	R\$	25,56		R\$	+	100,00%	R\$	25,56
16.2.40	PERFORADOR CRISTAL 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	542,29	100,00%	R\$	542,29		R\$	+	100,00%	R\$	542,29
16.2.41	PERFORADOR CRISTAL 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	21,72	100,00%	R\$	21,72		R\$	+	100,00%	R\$	21,72
16.2.42	DRILLER VERTICAL PARA PERFORAR 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	41,10	100,00%	R\$	41,10		R\$	+	100,00%	R\$	41,10
16.2.43	BABA HORIZONTAL PARA ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	410,82	100,00%	R\$	410,82		R\$	+	100,00%	R\$	410,82
16.2.44	BABA HORIZONTAL PARA ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	15,30	100,00%	R\$	15,30		R\$	+	100,00%	R\$	15,30
16.2.45	PAPEL HORIZONTAL PARA ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	29,02	100,00%	R\$	29,02		R\$	+	100,00%	R\$	29,02
16.2.46	PUNTE DE PAPEL PARA ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	92,20	100,00%	R\$	92,20		R\$	+	100,00%	R\$	92,20
16.2.47	PAPEL PARA ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	16,76	100,00%	R\$	16,76		R\$	+	100,00%	R\$	16,76
16.2.48	SUporte horizontal para eletrovalvula 10mm x 10mm x 10mm forneccimento e instalação	R\$	90,72	100,00%	R\$	90,72		R\$	+	100,00%	R\$	90,72
16.2.49	SUporte horizontal para eletrovalvula 10mm x 10mm x 10mm forneccimento e instalação	R\$	70,00	100,00%	R\$	70,00		R\$	+	100,00%	R\$	70,00
16.2.50	SUporte horizontal para eletrovalvula 10mm x 10mm x 10mm forneccimento e instalação	R\$	100,00	100,00%	R\$	100,00		R\$	+	100,00%	R\$	100,00
16.2.51	RENUVO CENTRAL PARA ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	932,00	100,00%	R\$	932,00		R\$	+	100,00%	R\$	932,00
16.2.52	RENUVO CENTRAL PARA ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	31,99	100,00%	R\$	31,99		R\$	+	100,00%	R\$	31,99
16.2.53	TERMO ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	45,76	100,00%	R\$	45,76		R\$	+	100,00%	R\$	45,76
16.2.54	TELEFONE TELEFONICO 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	61,12	100,00%	R\$	61,12		R\$	+	100,00%	R\$	61,12
16.2.55	TELEFONE TELEFONICO 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	33,26	100,00%	R\$	33,26		R\$	+	100,00%	R\$	33,26
16.2.56	ACOPLAMENTO PARA ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	11,87	100,00%	R\$	11,87		R\$	+	100,00%	R\$	11,87
16.2.57	LIMA PARA ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	42,20	100,00%	R\$	42,20		R\$	+	100,00%	R\$	42,20
16.2.58	LIMA PARA ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	5,81	100,00%	R\$	5,81		R\$	+	100,00%	R\$	5,81
16.2.59	LIMA PARA ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	8,88	100,00%	R\$	8,88		R\$	+	100,00%	R\$	8,88
16.2.60	LIMA PARA ELETROVALVULA 10MM X 10MM X 10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	1.051,00	100,00%	R\$	1.051,00		R\$	+	100,00%	R\$	1.051,00
16.2.61	Comando de vapor 10mm x 10mm x 10mm forneccimento e instalação	R\$	1.041,40	100,00%	R\$	1.041,40		R\$	+	100,00%	R\$	1.041,40
16.2.62	Comando de vapor 10mm x 10mm x 10mm forneccimento e instalação	R\$	104,65	100,00%	R\$	104,65		R\$	+	100,00%	R\$	104,65
16.2.63	Comando de vapor 10mm x 10mm x 10mm forneccimento e instalação	R\$	30,83	100,00%	R\$	30,83		R\$	+	100,00%	R\$	30,83
16.2.64	Comando de vapor 10mm x 10mm x 10mm forneccimento e instalação	R\$	60,74	100,00%	R\$	60,74		R\$	+	100,00%	R\$	60,74
16.2.65	Comando de vapor 10mm x 10mm x 10mm forneccimento e instalação	R\$	178,00	100,00%	R\$	178,00		R\$	+	100,00%	R\$	178,00
16.2.66	Comando de vapor 10mm x 10mm x 10mm forneccimento e instalação	R\$	90,54	100,00%	R\$	90,54		R\$	+	100,00%	R\$	90,54
16.2.67	Comando de vapor 10mm x 10mm x 10mm forneccimento e instalação	R\$	287,22	100,00%	R\$	287,22		R\$	+	100,00%	R\$	287,22

DB

20B



ANDRE  
WAGNER



3





ANDRE  
WAGNER

Documento 300 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.LTSR.RRRQ:  
<https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Da D. Bl  
Eng Civil Executar  
Engenheiro Projetos e Construções  
CREA SC 081.218-1

De: Eng. André Wagner - SPO  
Para: Diretor do SPO



**Assunto: MEDIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA – 10ª MEDIDAÇÃO – REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE**

**PROAD: CP 8056/2018**


Prezado Diretor do SPO,

Pelo presente, junto ao PROAD 8056/2018 a nota fiscal eletrônica nº 656 da empresa **Engaste Projetos, Construções e Incorporações Ltda.**, no valor de **R\$ 407.270,11** correspondente à 10ª medidação do contrato.

Esta medidação representa 11,76% do valor do contrato que, acumulada com as medidações anteriores, resulta em 77,22% da obra já executada, considerando o valor do contrato e os aditivos de valor. O valor acumulado previsto no Cronograma Físico Financeiro (CFF) para este mês de obra não foi atingido, quando era esperado inicialmente que a obra estivesse concluída no final deste mês.

Verifica-se na obra que esta tem sido bem administrada e os serviços tem sido iniciados e executados com empenho e qualidade. Apesar de ser o mês em que se previa sua conclusão, está em análise, um aditivo de valor ao contrato que resultará em aditivo de prazo. Com informações da própria contratada, estima-se que até o final do ano, esta deverá estar com 94% de serviços concluídos.

O gráfico a seguir demonstra o andamento da obra segundo o CFF Previsto em comparação ao valor medido na referência novembro/19, com destaque aos percentuais de serviços previstos e realizados:

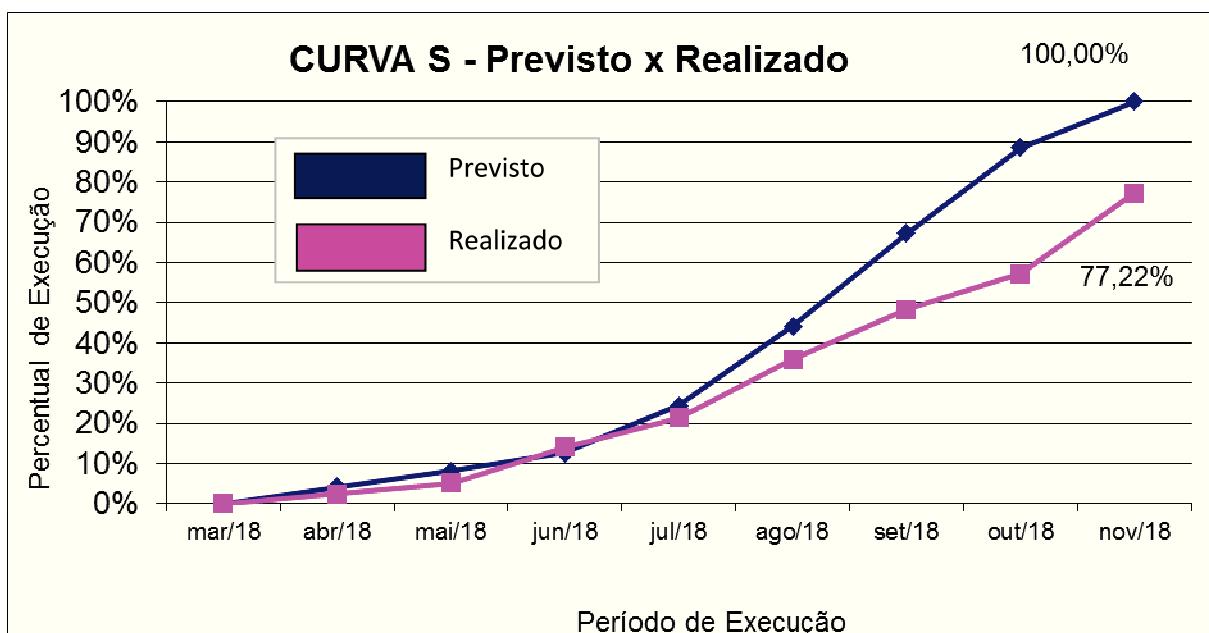

Documentos juntados:



- Pedido da empresa;
- Nota Fiscal;
- Diários de obra;
- Relatório fotográfico
- Planilha da 10<sup>a</sup> Medição.

Atenciosamente,

**André Wagner**

Analista Judiciário – Especialidade Engenharia Civil  
Matrícula 4262 – CREA/SC 068.622-2  
Serviço de Projetos e Obras

CP 80561/18

<b>ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA</b> CNPJ: 08.578.161/0001-79 RUA ANITA GARIBALDI, 270 - LOJA 301 CEP: 89700-126 - Bairro: CENTRO Município: CONCORDIA - SC Telefone: (49) 34412744 Celular: (499) 84025618 Email: engaste@engasteconstrucoes.com.br Insc. Municipal: 23148      Insc. Estadual: 255318553		Número da NFS-e <b>656</b>  Situação <b>Emitido</b>	
--	--	---	--

<b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e</b>			
 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Autenticidade		
	<b>0180830040506078</b>		
	Data Emissão <b>25/11/2019</b>	Hora Emissão <b>13:01:15</b>	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>			
Razão Social <b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO</b>			
CPF/CNPJ <b>02.482.005/0001-23</b>		IE <b>0</b>	
Endereço <b>RUA ESTEVES JUNIOR</b>		Número <b>395</b>	Complemento
Bairro <b>CENTRO</b>		CEP <b>88015-905</b>	Cidade - Estado <b>FLORIANOPOLIS - SC</b>

<b>Descrição dos serviços prestados.</b>									
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>702</b>	1,00	UN	407.270,1100	8055	2,00 %	TRBCRF	407.270,11	238.049,38	3.384,41

**Descrição do Serviço:** MEDICAÇÃO 10<sup>a</sup> - CONTRATO NUMERO 8056/2018. MATRICULA CEI 90.000.21974/72 OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE . SENDO APLICADO R\$238.049,38 DE MATERIAL E R\$169.220,73 DE MÃO DE OBRA APLICADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$407.270,11. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI (748), AGENCIA 0217, CONTA 811910.

Base de Cálculo 169.220,73	Valor ISSQN 3.384,41	Valor ISSRF 3.384,41	Desconto 0,00	Valor Total <b>407.270,11</b>
IR 4.887,24	INSS 18.614,28	CSLL 4.072,70	COFINS 12.218,10	PIS 2.647,26

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)	
Legenda do local da prestação do serviço 8055 - BRUSQUE - SC	
Outras Informações TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com Imposto sobre serviços retido na fonte (702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 86/2011 de 23/12/2011. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/12/2019. A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <a href="http://www.concordia.sc.gov.br">www.concordia.sc.gov.br</a> >> Portal de Serviços On Line >> Consulta Autenticidade de NFS-e. Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 54.777,83 (13,45%), Estaduais R\$ 0,00 (0,00%), Municipais R\$ 12.829,01 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT. MEDICAÇÃO 10 <sup>a</sup> - CONTRATO NUMERO 8056/2018. MATRICULA CEI 90.000.21974/72 OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE . SENDO APLICADO R\$238.049,38 DE MATERIAL E R\$169.220,73 DE MÃO DE OBRA APLICADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$407.270,11. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI (748), AGENCIA 0217, CONTA 811910.	

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.



Declaro que os serviços/materiais  
especificados na presente nota/fatura  
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 26/11/19

**ANDRÉ WAGNER**

Analista Judiciário

Matrícula: 4262

Engº Civil CREA-SC 068.622-2

Alexandre Koenig S. Thilago

Dir. de Admin.

Obs: Documentação e documentos no marcador nº 291.

**TERMO DE LIQUIDAÇÃO**

Liquidado o presente documento de  
acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64.  
O documento refere-se ao original da  
1ª via, arquivado neste Setor.

Em 26/11/19

Simone Bonatelli Cardoso

Técnico Judiciário

18 NE 1262-R.P

39-16

CP 8056/18

27/11/19 16:15 USUARIO : HELOISA  
DATA EMISSAO : 27Nov19 VENCIMENTO: 27Nov19 NUMERO : 2019DF801262  
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI  
CONTRIBUINTE : 08578161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPO  
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO  
PROCESSO : CP-8056/2018 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2019NP001790  
PERIODO APURACAO : 27Nov19 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6147  
VALORES BASE DE CALCULO : 407270,11  
RECEITA : 23.825,30  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 27/11/19  
TOTAL : 23.825,30  
OBSERVACAO  
Recolhimento de IRRF e contribuições, retidas cfe. Instr. Normativa RFB 1234/2  
012, ref. Pagamento da Nota Fiscal 656 - Reforma do prédio que abrigará a nova  
sede do Fórum de Brusque. 10a. Medição. Proroad-8056/2018.  
LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 27Nov19 14:39  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Documento 307 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia,  
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.QGNW.PFCF:  
<https://www.trt12.jus.br/proroad/pages/consultadocumento.xhtml>

27/11/19 16:16  
DATA EMISSAO : 27Nov19  
UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO  
RECOLHEDOR : 900002197472  
CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI  
COMPETENCIA : NOV19  
RECURSO : 3  
PROCESSO : CP-8056/2018  
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2019NP001790 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02  
009/ 3582 , EM 27/11/19  
VALOR INSS : 18.614,28  
VALOR OUTRAS ENTIDADES :  
VALOR ATM/MULTA/JUROS :  
TOTAL : 18.614,28

OBSERVACAO

Recolhimento de contribuição, retida cfe. Instr. Normativa RFB 971/2009, ref.  
Pagamento da Nota Fiscal 656 - Reforma do prédio que abrigará a nova sede do Fórum de Brusque. 10a. Medição. Proad-8056/2018.

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 27Nov19 14:39

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

27/11/19 16:16 USUARIO : HELOISA  
DATA EMISSAO : 27Nov19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB805617  
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI  
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 08578161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPO  
BANCO : 748 AGENCIA : 0217 CONTA CORRENTE : 811910  
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2019NP001790 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 006020868-6 PROCESSO : CP-8056/2018  
VALOR : 361.446,12

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 27/11/19  
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 656 - REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DO F  
ÓRUM DE BRUSQUE. 10A. MEDIDA. PROAD-8056/2018. RETIDO R\$ 3.384,41 REF. ISS.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

27/11/19 16:16 USUARIO : HELOISA  
DATA EMISSAO : 27Nov19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB805617  
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI  
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 08578161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPO  
BANCO : 748 AGENCIA : 0217 CONTA CORRENTE : 811910  
VALOR : 361.446,12  
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR  
01 401006 2018NE001262400 33903916 361.446,12  
02 531814 2018NE001262 213110400 33903916 361.446,12  
03 561602 0100000000400C 361.446,12  
  
LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 27Nov19 15:28  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA
