

De: Arq. Kristina Natália Cancelier – Fiscal do Contrato
Para: Diretor do SPO – Gestor do Contrato

Assunto: 17ª MEDIÇÃO DO CONTRATO INICIAL, 11ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 1, 4ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 2, 1ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 3, SUPRESSÃO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO ANEXO SEDE.


PROAD: CP 8848/2013

Prezado Senhor Diretor,

Encaminho as seguintes notas fiscais eletrônicas da empresa **CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA.:**

- número 198, no valor de **R\$ 37.953,81 (trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos)** correspondente à **17ª medição do contrato original;**
- número 191, no valor de **R\$ 2.474,49 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)** correspondente à **medição do reajuste do contrato original;**
- número 193, no valor de **R\$ 1.032,44 (um mil, trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos)** correspondente à **11ª medição do 1º Termo Aditivo;**
- número 194, no valor de **R\$ 68,80 (sessenta e oito reais e oitenta centavos)** correspondente à **medição do reajuste do 1º Termo Aditivo;**
- número 195, no valor de **R\$ 6.232,31 (seis mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos)** correspondente à **4ª medição do 2º Termo Aditivo;**
- número 196, no valor de **R\$ 72.959,21 (setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos)** correspondente à **1ª medição (única) do 3º Termo Aditivo;**
- número 199, no valor de **R\$ 58.732,76 (cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos)** correspondente à **medição do saldo do reajuste,** autorizado do 1º Termo de Apostilamento (doc. 274), conforme cálculo do reajuste elaborado pelo SELAD (doc. 271).

Estas medições, que totalizam R\$ 179.453,82 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), todas no período de 13/08/2015 a 27/08/2015, equivalem juntas a **5,35%** do valor total contratado, acumulando 99,80% medido. O gráfico a seguir mostra um comparativo entre o previsto e o efetivamente executado, numa projeção do que estava previsto com o que foi realizado.

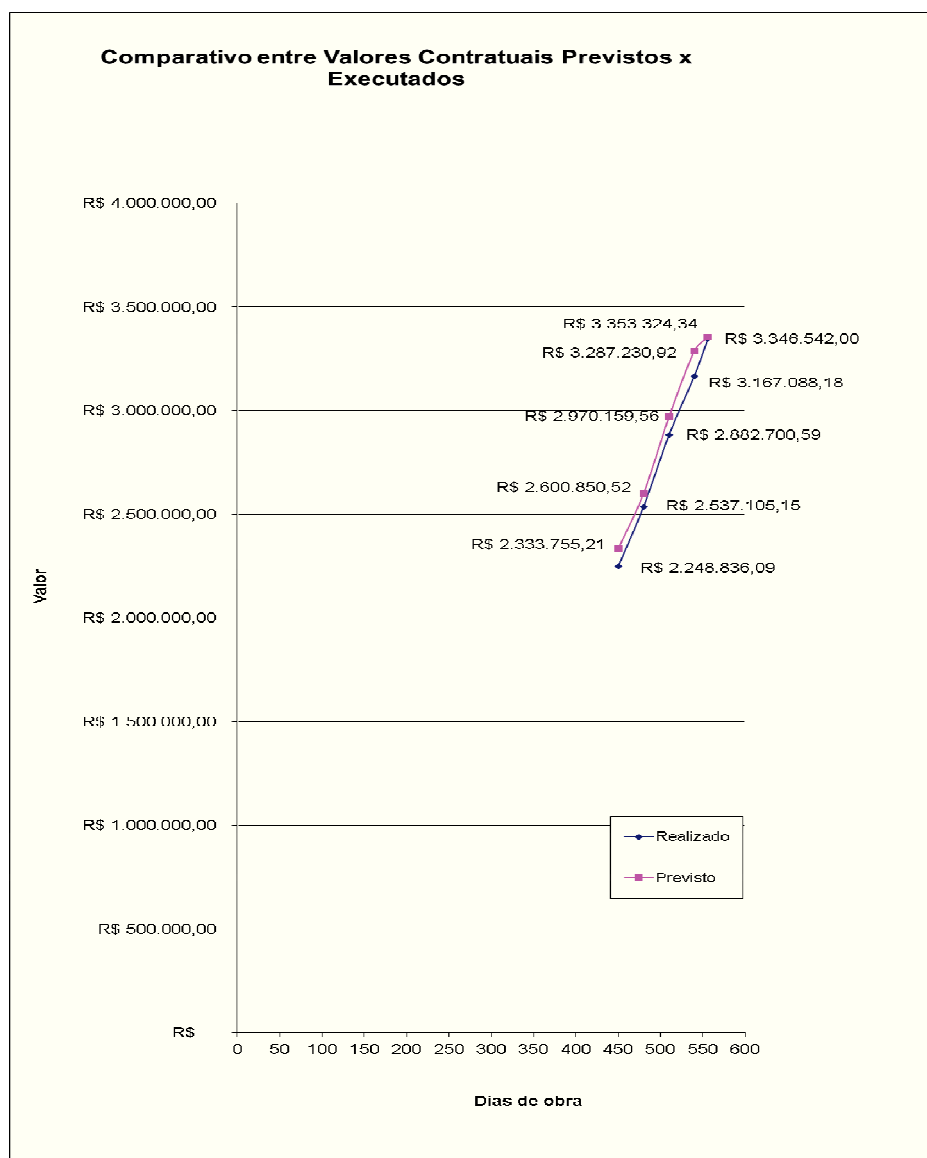

Comparativo entre previsto x executado

Cabe ressaltar que esta medição final não completa 100% do valor contratual tendo em vista o valor do Alvará de Construção (item 01.01.01 da planilha do contrato) a ser suprimido, pois não houve a necessidade deste procedimento junto à Prefeitura. Assim, a Fiscalização apresenta a seguinte planilha geral de acompanhamento dos valores contratuais:

LEVANTAMENTO FINAL DE VALORES - CONTRATO 8848/2013 - CONTROLE FISCALIZAÇÃO				
	Supressões	Acréscimos	Valor Acrescido ao Contrato	Valor Total Atualizado
Valor Contrato Inicial (doc. 86)				R\$ 2.633.333,90
Valor Termo Aditivo 1 (doc. 166)	R\$ 85.540,73	R\$ 402.359,49	R\$ 316.818,76	R\$ 2.950.152,66
Valor Reajuste (1º Termo de Apostilamento - docs 271 e 274)			R\$ 116.854,77	R\$ 3.067.007,43
Valor Termo Aditivo 2 (doc. 309)	R\$ 97.183,06	R\$ 317.406,55	R\$ 220.223,49	R\$ 3.287.230,92
Valor Termo Aditivo 3 (doc. 393)	R\$ 6.865,79	R\$ 72.959,21	R\$ 66.093,42	R\$ 3.353.324,34
Valor a Suprimir (Alvará de Construção - item 01.01.01 da planilha)	R\$ 1.399,53		-R\$ 1.399,53	R\$ 3.351.924,81

Até a terceira alteração contratual que ocorreu em agosto de 2015, o contrato havia sido aditado em 22,9%. A supressão do Alvará de Construção (item 01.01.01 da planilha) repercute em 0,0531% do valor original do contrato, estando dentro dos limites estabelecidos pela lei 8.666/93.

Sobre a necessidade e justificativa da supressão solicitada, cabe ressaltar que a reforma executada se enquadra no art. 21 do Código de Obras de Florianópolis, em anexo, uma vez que não foram instalados andaimes ou tapumes, apenas “cadeirinha” e tela de proteção e a reforma não previa alteração ou modificação dos elementos geométricos da construção. Assim, a reforma pôde ser executada independentemente da licença da Prefeitura, conforme dispõe o Código de Obras desta capital.

Além disso, ficará retido o valor referente ao Habite-se (Sanitário e Bombeiros), até a emissão final dos referidos documentos. A seguir, apresento o controle da Fiscalização referente aos pagamentos finais realizados e a serem efetuados:

PAGAMENTOS FINAIS - CONTRATO 8848/2013 - CONTROLE FISCALIZAÇÃO	
Valores pagos até a 16ª Medição (agosto/2015)	R\$ 3.167.088,18
Valor Medição 17	R\$ 179.453,82
Valor Total até a 17ª Medição	R\$ 3.346.542,00
Saldo Contratual (após o pagamento da 17ª Medição e Supressão do Alvará)	R\$ 5.382,81
Valor a Reter (Habite-se Sanitário e Bombeiro - item 32.04 da planilha contratual)	-R\$ 5.382,80

O Habite-se Sanitário e dos Bombeiros devem ser emitidos em até 60 dias, possivelmente. A vistoria da Vigilância Sanitária quanto aos aspectos da obra já ocorreu na semana passada, sem solicitação de ajustes ou correções. Nos próximos dias, o Habite-se Sanitário já deve estar disponível. Quanto à vistoria dos Bombeiros, esta ainda não ocorreu, mas estamos aguardando para que ocorra no mês de outubro.

Como Fiscalização, informo que os serviços foram concluídos a contento, sofrendo alguns dias de atraso em função das condições climáticas, pois os trabalhos finais estavam sendo realizados em área externa (passarela de interligação entre os prédios), que dependiam de tempo seco para finalização das vedações e impermeabilizações. Por outro lado, as chuvas favoreceram os testes de estanqueidade, essenciais para a correção de possíveis vazamentos. Assim, considero que isso não prejudicou nem a mudança dos usuários às instalações, nem a inauguração do prédio, prevista para o dia 16/10, ou seja, não houve prejuízos ao Tribunal. E ainda, a empresa manteve equipe técnica no local, por alguns dias, após a conclusão dos serviços, buscando atender aos usuários nos ajustes finais de instalações, etc.

Com relação ao saldo do valor devido a título de reajuste, apresento o seguinte controle de pagamentos:

REAJUSTES	
1º Termo Apostilamento (doc 271 e 274): Diferença = Vlr Reajustado - Vlr Remanescente	R\$ 116.854,77
Reaj. Medição 12	R\$ 6.617,48
Reaj. Med 6 TA01	R\$ 3.631,91
Reaj. Medição 13	R\$ 2.809,08
Reaj. Med 7 TA01	R\$ 4.599,95
Reaj. Medição 14	R\$ 7.717,50
Reaj. Med 8 TA01	R\$ 1.871,14
Reaj. Medição 15	R\$ 12.757,95
Reaj. Med 9 TA01	R\$ 2.052,15
Reaj. Medição 16	R\$ 11.609,02
Reaj. Med 10 TA01	R\$ 1.912,54
Reaj. Med 17	R\$ 2.474,49
Reaj. Med 11 TA01	R\$ 68,80
Somatório Reajustes Pagos (reajustes med 17 e med 11 TA01 ainda não pagos)	R\$ 58.122,01
Saldo Reajustes a Pagar	R\$ 58.732,76

Com a obra concluída, os serviços foram verificados, testados, alguns corrigidos e, então, foi emitido o Termo de Recebimento Provisório.

Em anexo:

- Relação de Documentos entregues na Medição 17 (e reajuste) e Informações da Conta para Pagamento;
- Relação de Documentos entregues na Medição 11 do 1º Termo Aditivo (e reajuste) e Informações da Conta para Pagamento;
- Relação de Documentos entregues na Medição 4 do 2º Termo Aditivo e Informações da Conta para Pagamento;
- Relação de Documentos entregues na Medição 1 do 3º Termo Aditivo e Informações da Conta para Pagamento
- Planilha da Medição 17;
- Planilha da Medição 11 do 1º Termo Aditivo;
- Planilha da Medição 4 do 2º Termo Aditivo;
- Planilha da Medição 1 do 3º Termo Aditivo;
- Relatório da Medição 17, Medição 11 do 1º Termo Aditivo, Medição 4 do 2º Termo Aditivo e Medição 1 do 3º Termo Aditivo;
- Ofício Concretil solicitando vistoria para emissão do Termo de Recebimento Provisório;
- Termo de Recebimento Provisório;
- Código de Obras de Florianópolis (até o art. 21).

Solicito providências ao **pagamento** dos valores medidos e **supressão** do valor referente ao Alvará de Construção (R\$ 1.399,53).

Atenciosamente,

Kristina Natália Cancelier

Fiscal do Contrato
Analista Judiciário – Especialidade Arquitetura
Assistente do Serviço de Projetos e Obras

Descrição: Reforma do prédio Anexo do TRT, antigo Fórum Trabalhista de Florianópolis

BDI: 24,00%

DATA: 28/10/2013

ADITIVO									R\$	72.959,21			
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LOCAL DA INTERVENÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITARIO			PREÇO		Esta medição		
						MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	
	03	MANUTENÇÃO DA OBRA										R\$	2.184,64
	03.01	Remoção de Entulhos			-	-		-	-				
	03.01.01	Limpeza, e remoção de entulhos durante a execução da obra.		MES	0,50	-	204,39	204,39	253,44	126,72	100%		126,72
	03.02	Máquinas e Equipamentos							-	-			
COMP.ARQ.143	03.02.01	Aluguel de guincho de coluna 220 V, monofásico, com caçamba com capacidade para 200 Kg de carga vertical, incluindo instalação e remoção.	Para instalação das máquinas externas de Ar Condicionado	mês	3,00	360,80	37,67	398,47	494,10	1.482,30	100%		1482,3
COMP.ARQ.017	10.06.04	Contra rufo em chapa de alumínio espessura 0,8 mm e largura 0,50 m com fundo prime epóxi e duas demãos de tinta epóxi, instalados sobre junto à alvenaria sobre a cobertura, sendo que 5 cm serão embutidos na mesma, incluindo selante de silicone, conforme p	Telhado acima sala 01 no ático	M	7,75	37,04	22,86	59,90	74,27	575,62	100%		575,62 0
	05	SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E RETIRADAS										R\$	209,32
COMP.ARQ.1008	05.01.18	Remoção de portas, forras e vistas de madeira existentes na edificação para reaproveitamento e transportar para novo destino a ser definido pela fiscalização do TRT, incluindo carga, descarga e trasnporte até 15 Km.	Porta bwc 1º pavimento já estava instalada e solicitaram trocar lugar	UN	1,00	4,74	22,78	27,52	34,13	34,13	100%		34,13
COMP.ARQ.1009	05.01.19	Remoção de portas metálicas existentes na edificação para reaproveitamento e transportar para novo destino a ser definido pela fiscalização do TRT, incluindo carga, descarga e transporte até 15 Km.	Porta casa de gases já estava instalada, e solicitaram a construção de uma nova na frente	UN	1,00	2,63	10,44	13,08	16,21	16,22	100%		16,22
	05.01.58	Demolição de piso sem reproveitamento	Placas concreto calçada	m²	14,49	-	8,85	8,85	10,97	158,97	100%		158,97
	08	CASA DO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO										R\$	29.691,21
	08.01	CASA DE ABRIGO PARA BOMBA A VACUO											
25005	08.01	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	Casa para abrigo de bomba de ar medicinal acrescentada no projeto arquitetônico em 03/03/2015	m³	0,15	51,91	16,35	68,26	84,65	12,70	100%		12,7
73404U	08.02	FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP-2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.	Casa para abrigo de bomba de ar medicinal acrescentada no projeto arquitetônico em 03/03/2016	m²	3,15	13,69	24,31	38,00	47,12	148,43	100%		148,43
73942/002U	08.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Casa para abrigo de bomba de ar medicinal acrescentada no projeto arquitetônico em 03/03/2017	Kg	20,24	4,49	2,49	6,98	8,66	175,14	100%		175,14
337	08.04	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	Casa para abrigo de bomba de ar medicinal acrescentada no projeto arquitetônico em 03/03/2018	KG	0,40	6,75	-	6,75	8,37	3,39	100%		3,39
74138/003U	08.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	Casa para abrigo de bomba de ar medicinal acrescentada no projeto arquitetônico em 03/03/2019	m³	0,46	321,06	41,13	362,19	449,12	204,80	100%		204,8
73979/004U	08.06	DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M	Casa para abrigo de bomba de ar medicinal acrescentada no projeto arquitetônico em 03/03/2020	m²	2,85	-	10,43	10,43	12,93	36,86	100%		36,86
73998/002U	08.07	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO TIPO CANALETA 14X19X39CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	Casa para abrigo de bomba de ar medicinal acrescentada no projeto arquitetônico em 03/03/2021	m²	10,23	42,66	17,30	59,96	74,35	760,61	100%		760,61
73928/002U	08.08	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	Casa para abrigo de bomba de ar medicinal acrescentada no projeto arquitetônico em 03/03/2022	m²	20,46	1,42	2,81	4,23	5,25	107,32	100%		107,32
74201/001U	08.09	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM. PREPARO MECANICO	Casa para abrigo de bomba de ar medicinal acrescentada no projeto arquitetônico em 03/03/2023	m²	20,46	4,77	15,09	19,86	24,63	503,86	100%		503,86
74233/001U	08.10	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMA0	Casa para abrigo de bomba de ar medicinal acrescentada no projeto arquitetônico em 03/03/2024	m²	20,46	1,08	2,97	4,05	5,02	102,76	100%		102,76
73954/001U	08.11	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	Casa para abrigo de bomba de ar medicinal acrescentada no projeto arquitetônico em 03/03/2025	m²	20,46	5,21	11,74	16,95	21,02	430,03	100%		430,03
73753/001U	08.12	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA	Casa para abrigo de bomba de ar medicinal acrescentada no projeto arquitetônico em 03/03/2026	m²	3,40	31,02	24,94	55,96	69,39	235,93	100%		235,93
COMP.ARQ.085		(P22) - Porta de Alumínio Venezianado preto - de abrir, 1,20 x 1,80, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico.	Casa para abrigo de bomba de ar medicinal acrescentada no projeto arquitetônico em 03/03/2027	m²	2,16	351,24	48,51	399,75	495,69	1.070,70	100%		1070,7
	16.01.01	Revestimento de parede e teto com manta Sonex, modelo Nova Fórmula, 1000 x 1000 mm, 50 mm de espessura, cor natural.	Casa para abrigo de bomba de ar medicinal acrescentada no projeto arquitetônico em 03/03/2028	m²	23,04	120,56	12,34	132,90	164,80	3.796,97	100%		3796,97
		EQUIPAMENTOS											

COMP.GAS.001		Central de vácuo contendo uma bomba de vácuo que atende até 7 consultórios (longa distância), acionamento por Relê Contatora, com vácuo máximo de 520 l/min. Potência de 1,5 CV, consumo de água de 0,5 l/min. Dimensão (LxAxC) 230x450x470mm e peso de 26 Kg. REF.: SCHUSTER SUCTION PREMIUM										
COMP.GAS.002		Central de ar medicinal contendo um compressor isento de óleo, com dessecamento teórico de 556 l/min; 20pcm. Diâmetro de saída de 1/2". Pressão de operação de 80-120	Cj	1	3.678,00	250,00	3.928,00	4.870,72	4.870,72	100%	4870,72	
COMP.GAS.003		Conjunto portátil de Oxigênio, vazão de 15 l/min. Conjunto contendo: 01 Cilindro de Alumínio 01 regulador Mini Simille 2, 01 Cânula Nasal, 01 Máscara de Oxigenação, 01 Kit de Nebulização e 01 Carrinho para transporte. REF.: OXYMED	Cj	1	5.970,00	400,00	6.370,00	7.898,80	7.898,80	100%	7898,8	
			Cj	2	1.583,00	52,74	1.635,74	2.028,32	4.056,64	100%	4056,64	
		TUBULAÇÕES PPR										
COMP.GAS.004		Tubo PPR PN20 Ø25	m	130	6,36	5,83	12,19	15,12	1.965,03	100%	1965,03	
COMP.GAS.005		Luva PPR PN20 Ø25	m	44	1,63	2,62	4,25	5,27	231,88	100%	231,88	
COMP.GAS.006		Joelho 90º PPR PN20 Ø25	m	40	2,13	2,62	4,75	5,89	235,60	100%	235,6	
COMP.GAS.007		Tê Normal PPR PN20 Ø25	m	6	2,57	3,94	6,51	8,07	48,44	100%	48,44	
		FIXAÇÃO										
COMP.GAS.008		Calha metálica perfurada 75 x 75 mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 zincado por imersão em zinco fundido, Ref: Mopa ou similar, incluindo fixação e emendas.	m	21	17,63	2,64	20,27	25,13	527,84	100%	527,84	
COMP.GAS.009		Curva 90º para eletrocalha metálica 75 x 75 mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, Ref: Mopa ou similar.	unid.	24	13,70	4,83	18,53	22,98	551,46	100%	551,46	
		ACESSÓRIOS										
COMP.GAS.010		Válvula de esfera Ø 1" em liga e haste estendida, aço galvanizado	unid.	10	37,80	15,69	53,49	66,33	663,28	100%	663,28	
COMP.GAS.011		Filtro Trio contendo Filtro Regulador de Pressão, Filtro Coalescente e Filtro de Carvão Ativado.	unid.	3	215,57	67,23	282,80	350,67	1.052,02	100%	1052,02	
	12	IMPERMEABILIZAÇÕES			-	-		-		100%	R\$ 6.075,02	
COMP. CONCRETIL		Impermeabilização para paredes externas com impermeabilizante acrílico flexível com 4 demãos	Impermeabilização das paredes externas da edificação onde infiltra água no pavimento atico	m²	109,62	19,25	25,45	44,69	55,42	6.075,02	100%	6075,02
											0	
	14	ESQUADRIAS								100%	R\$ 6.890,25	
COTAÇÃO CONCRETIL		Grade em aço galvanizado instalada e pintado na cor chumbo	Térreo	m²	5,25	322,50	-	322,50	399,90	2.099,48	100%	2099,48
COTAÇÃO CONCRETIL		Portão em aço galvanizado pintado na cor respectiva h 1,35cm l 80cm	Térreo	un	1,00	380,00	-	380,00	471,20	471,20	100%	471,2
COTAÇÃO CONCRETIL		Guarda corpo em aço galvanizado conforme existente e pintado na cor respectiva	Térreo	m	3,30	271,12	66,31	337,43	418,41	1.380,77	100%	1380,77
COTAÇÃO CONCRETIL		Janela em estrutura de alumínio anodizado, com um módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 1,60x2,10 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação Padrão Existente	Fechamento onde está ma porta de vidro temperado térreo	un	1,00	1.500,00	870,00	2.370,00	2.938,80	2.938,80	100%	2938,8
	17	PAVIMENTAÇÕES, RODAMEIO E RODAPÉ									R\$ 2.049,33	
SINAPI 85406	03.01.09	Remoção manual de pavimentação de lajota em concreto assentada em argamassa	Calçada área externa	m²	14,38	-	34,46	34,46	42,73	614,47	100%	614,47
COMP. CONCRETIL		Lajota piso tátil direcional em concreto na cor vermelha 45x45	Calçada área externa	un	80,00	10,64	3,83	14,46	17,94	1.434,86	100%	1434,86
	19	FORROS									R\$ 620,03	
COMP.ARQ.036A	19.02.01	Forro modular em fibra mineral em placas de 625 x 625 mm ou 625x1250mm incluindo perfis metálicos	Sala no break	m²	5,22	65,79	30,00	95,79	118,78	620,03	100%	620,03
	26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 11.680,00	
COM.ELE.303	26.02.20	Tomada 2P+T - 20A/250Vca - c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	Tomadas de Ar Condicionado 20A	un	67,00	9,73	4,73	14,46	17,93	1.201,34	100%	1201,34
COTAÇÃO CONCRETIL		Cabo blindado Multisom, Espaguetado - 12 pares Cod. 2489	Cabo utilizado para dimerização nas lâmpadas do Estúdio (Salvador)	m	62,00	22,50	4,49	26,99	33,47	2.075,00	100%	2075
	26.05	QUADROS, DINJUTOR E ACESSORIOS										
COM.ELE.009	26.05.02	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x20A - lcc=Ics=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma Nbr NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	Quadro pavto Ático que sofreu alteração no projeto elétrico	un	5	8,87	3,46	12,33	15,29	76,45	100%	76,45
COM.ELE.028	26.05.13	Interruptor tetrapolar tipo DR 25A – 30mA, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref GE ou similar), fornecimento e instalação	Quadro pavto Ático que sofreu alteração no projeto elétrico	un	3	116,98	3,46	120,44	149,35	448,04	100%	448,04
COM.ELE.020	26.05.24	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x32A - lcc=Ics=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	Quadro pavto Ático que sofreu alteração no projeto elétrico	un	2	48,82	3,46	52,28	64,83	129,66	100%	129,66
COM.ELE.050a	26.04.23	Cabo # 120,0 mm² - 1kV- 90º - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - A	Cabo ligação Quadro Geral (2x)	m	140	30,14	14,50	44,64	55,35	7.749,51	100%	7749,51

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SETOR DE LIQUIDAÇÃO E ANÁLISE DA DESPESA

TERMO DE LIQUIDAÇÃO SOF/SELAD



Liquida(m)-se o(s) documento(s) abaixo relacionado(s) conforme Nota de Empenho, classificação da despesa e valor(es) informado(s) e em conformidade com o contrato próprio, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320 de 17/03/1964.

Processo: CP-8848/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO ANEXO DA SEDE DO TRT (ANTIGO FÓRUM TRABALHISTA DE FLORIANÓPOLIS).

Fornecedor: CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA. (95.827.697/0001-85)

Classificação: 339039-16 (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS)

Nota de Empenho	Ano	Data da Liquidação	Observação	Competência	Documento	Unidade	Valor
797	2015	09/10/15	1ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO (VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 72.959,21-LIQUIDADO PARCIALMENTE ATRAVÉS DA 14NE1539, E 15NE1276)	09/2015	NFE. 196	SPO	52.690,67
1276	2015	09/10/15	SALDO REAJUSTE	09/2015	NFE. 202	SPO	4.905,86
1276	2015	09/10/15	17ª MEDIÇÃO	09/2015	NFE. 198	SPO	37.953,81
1276	2015	09/10/15	1ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO (VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 72.959,21-LIQUIDADO PARCIALMENTE ATRAVÉS DA 15NE797 E 14NE1539)	09/2015	NFE. 196	SPO	13.976,92
1276	2015	09/10/15	REAJUSTE 17ª MEDIÇÃO	09/2015	NFE. 191	SPO	2.474,49
1539	2014	09/10/15	4ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO	09/2015	NFE. 195	SPO	6.232,31
1539	2014	09/10/15	11ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO	09/2015	NFE. 193	SPO	1.032,44
1539	2014	09/10/15	REAJUSTE 11ª MEDIÇÃO	09/2015	NFE. 194	SPO	68,80
1539	2014	09/10/15	1ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO (VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 72.959,21-LIQUIDADO PARCIALMENTE ATRAVÉS DA 15NE797 E 15NE1276)	09/2015	NFE. 196	SPO	6.291,62

Sub-Total: 125.626,92
Total: 125.626,92

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SETOR DE LIQUIDAÇÃO E ANÁLISE DA DESPESA

TERMO DE LIQUIDAÇÃO SOF/SELAD

Liquida(m)-se o(s) documento(s) abaixo relacionado(s) conforme Nota de Empenho, classificação da despesa e valor(es) informado(s) e em conformidade com o contrato próprio, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320 de 17/03/1964,

Processo: CP-8848/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO ANEXO DA SEDE DO TRT (ANTIGO FÓRUM TRABALHISTA DE FLORIANÓPOLIS).

Certifico que, referente a competência da(s) liquidação(ões) acima relacionada(s), os documentos exigidos em contrato encontram-se atualizados, mantidas as condições de habilitação da licitação.

Florianópolis-SC, 09 de October de 2015.


SIMONE BONATELLI CARDOSO
Técnico Judiciário



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número e Série da NFS-e
00000000193 / A1

Data e Hora da Emissão
25/09/2015 11:09:18

Código de Verificação
308E-8399



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 95.827.697/0001-85 Inscrição Municipal: 271598

Nome: CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: MANOEL DONO MORGADO, 57

CEP: 88301462 Bairro: FAZENDA

Município: ITAJAÍ UF: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23

Nome: 1705 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO

Endereço: ESTEVES JUNIOR, 395

CEP: 88015-130 Bairro: CENTRO

Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Décima primeira medição do primeiro aditivo ref. reforma do prédio anexo do TRT.

Contrato nº CP 8848/2013
CEI: 5122344491/73

Material: R\$619,47
Mão de Obra: R\$412,97

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.032,44

Código do Serviço:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Natureza de Operação

201 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.032,44	1.032,44	3,00 %	30,97	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	6,71	30,97	45,43
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
12,39	10,32	0,00	0,00	895,65

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)


- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Serviço prestado em outro município: FLORIANÓPOLIS/SC

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 05/10/15



Kristina Natalia Cancelier
Assistente-Administrativa SPO



Alexandre Koenig S. Thlago
Diretor do SPO

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eNúmero e Série da NFS-e
00000000194 / A1Data e Hora da Emissão
25/09/2015 11:15:52Código de Verificação
EE05-7120**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 95.827.697/0001-85 Inscrição Municipal: 271598
Nome: CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: MANOEL DONO MORGADO, 57
CEP: 88301462 Bairro: FAZENDA
Município: ITAJAÍ UF: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23
Nome: 1705 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
Endereço: ESTEVES JUNIOR, 395
CEP: 88015-130 Bairro: CENTRO
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Reajuste décima primeira medição do primeiro aditivo ref. reforma do prédio anexo do TRT.

Contrato nº CP 8848/2013
CEI: 5122344491/73

Material: R\$41,28
Mão de Obra: R\$27,52

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 68,80

Código do Serviço:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Natureza de Operação

201 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço


Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
68,80	68,80	3,00 %	2,06	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,45	2,06	3,03
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,83	0,39	0,00	0,00	59,98

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)


- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Serviço prestado em outro município: FLORIANÓPOLIS/SC

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 05/10/15



Kristina Natalia Cancelier
Assistente-Administrativa SPO



Alexandre Koenig S. Thago
Diretor do SPO



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número e Série da NFS-e
00000000195 / A1
Data e Hora da Emissão
25/09/2015 11:24:08
Código de Verificação
C57C-6156



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **95.827.697/0001-85** Inscrição Municipal: **271598**
Nome: **CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA**
Endereço: **MANOEL DONO MORGADO, 57**
CEP: **88301462** Bairro: **FAZENDA**
Município: **ITAJAÍ** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.482.005/0001-23**
Nome: **1705 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO**
Endereço: **ESTEVES JUNIOR, 395**
CEP: **88015-130** Bairro: **CENTRO**
Município: **FLORIANÓPOLIS** UF: **SC**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quarta medição do segundo aditivo ref. reforma do prédio anexo do TRT.

Contrato nº CP 8848/2013
CEI: 5122344491/73

Material: R\$3.739,39
Mão de Obra: R\$2.492,92

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 6.232,31

Código do Serviço:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Natureza de Operação

201 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
6.232,31	6.232,31	3,00 %	186,97	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	40,51	186,97	274,22
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
74,79	62,32	0,00	0,00	5.406,53

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Serviço prestado em outro município: FLORIANÓPOLIS/SC

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 08/10/15



Kristina Natalia Cancelier
Assistente-Administrativa SPO



Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eNúmero e Série da NFS-e
00000000196 / A1Data e Hora da Emissão
25/09/2015 11:39:18Código de Verificação
E7DE-FB50**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 95.827.697/0001-85 Inscrição Municipal: 271598
Nome: CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: MANOEL DONO MORGADO, 57
CEP: 88301462 Bairro: FAZENDA
Município: ITAJAÍ UF: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23
Nome: 1705 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
Endereço: ESTEVES JUNIOR, 395
CEP: 88015-130 Bairro: CENTRO
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Primeira medição do terceiro aditivo ref. reforma do prédio anexo do TRT.

Contrato nº CP 8848/2013
CEI: 5122344491/73

Material: R\$43.775,53
Mão de Obra: R\$29.183,68

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 72.959,21

Código do Serviço:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Natureza de Operação

201 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
72.959,21	72.959,21	3,00 %	2.188,78	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	474,23	2.188,78	3.210,20
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
875,51	729,59	0,00	0,00	63.292,12

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Serviço prestado em outro município: FLORIANÓPOLIS/SC

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 05/12/15



Kristina Natalia Cancelier
Assistente-Administrativa SPO



Alexandre Koenig S. Thlago
Diretor do SPO



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número e Série da NFS-e
00000000198 / A1

Data e Hora da Emissão
30/09/2015 11:00:49

Código de Verificação
3315-BEEB



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **95.827.697/0001-85** Inscrição Municipal: **271598**
Nome: **CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA**
Endereço: **MANOEL DONO MORGADO, 57**
CEP: **88301462** Bairro: **FAZENDA**
Município: **ITAJAÍ** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.482.005/0001-23**
Nome: **1705 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO**
Endereço: **ESTEVES JUNIOR, 395**
CEP: **88015-130** Bairro: **CENTRO**
Município: **FLORIANÓPOLIS** UF: **SC**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Décima sétima medição ref. reforma do prédio anexo do TRT.

Contrato nº CP 8848/2013
CEI: 5122344491/73

Material: R\$22.772,29
Mão de Obra: R\$15.181,52

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 37.953,81

Código do Serviço:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive condagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Natureza de Operação

201 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço


Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
37.953,81	37.953,81	3,00 %	1.138,61	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	246,70	1.138,61	1.669,97
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
455,45	379,54	0,00	0,00	32.924,93

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Serviço prestado em outro município: **FLORIANÓPOLIS/SC**

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 05 / 10 / 15



Kristina Natalla Cancelier
Assistente Administrativa SPO



Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eNúmero e Série da NFS-e
00000000191 / A1Data e Hora da Emissão
25/09/2015 10:56:19Código de Verificação
6AD8-ADA4**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 95.827.697/0001-85 Inscrição Municipal: 271598
Nome: CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: MANOEL DONO MORGADO, 57
CEP: 88301462 Bairro: FAZENDA
Município: ITAJAÍ UF: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23
Nome: 1705 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
Endereço: ESTEVES JUNIOR, 395
CEP: 88015-130 Bairro: CENTRO
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Reajuste décima sétima medição ref. reforma do prédio anexo do TRT.

Contrato nº CP8848/2013
CEI: 5122344491/73

Material: R\$1.484,70
Mão de Obra: R\$989,79

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 2.474,49

Código do Serviço:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Natureza de Operação

201 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço


Valor Serviços 2.474,49	Base de Cálculo 2.474,49	Alíquota ISS 3,00 %	Valor ISS retido 74,23	Valor ISS 0,00
Desconto incondicional 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 16,08	Valor COFINS 74,23	Valor INSS 108,88
Valor IR 29,69	Valor CSLL 24,74	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor líquido da NFS-e 2.146,64

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Serviço prestado em outro município: FLORIANÓPOLIS/SC

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 05/10/15



Kristina Natalia Cancellor
Assistente-Administrativa SPO



Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número e Série da NFS-e
00000000202 / A1
Data e Hora da Emissão
08/10/2015 14:32:45
Código de Verificação
4378-95B7



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **95.827.697/0001-85** Inscrição Municipal: **271598**
Nome: **CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA**
Endereço: **MANOEL DONO MORGADO, 57**
CEP: **88301462** Bairro: **FAZENDA**
Município: **ITAJAÍ** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **02.482.005/0001-23**
Nome: **1705 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO**
Endereço: **ESTEVES JUNIOR, 395**
CEP: **88015-130** Bairro: **CENTRO**
Município: **FLORIANÓPOLIS** UF: **SC**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Saldo reajuste ref. reforma do prédio anexo do TRT.

Contrato nº CP 8848/2013
CEI: 5122344491/73

Material: R\$2.943,52
Mão de Obra: R\$1.962,34

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 4.905,86

Código do Serviço:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Natureza de Operação

201 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
4.905,86	4.905,86	3,00 %	147,18	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	31,89	147,18	215,86
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
58,87	49,06	0,00	0,00	4.255,82

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Serviço prestado em outro município: **FLORIANÓPOLIS/SC**

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 07 / 10 / 2015



Kristina Natalia Cancelier
Assistente-Administrativa SPO



Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

13/10/15 15:48 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 13Out15 TIPO OB: 12 NUMERO : 2015OB805824
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 95827697/0001-85 - CONCRETIL CONSTRUcoes LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 0305 CONTA CORRENTE : 456349
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP001802 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004856362-5 PROCESSO : CP-8848/2013
VALOR : 108.981,36

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 191, 193 A 196, 198 E 202 - REFORMA DO PRÉDIO QUE
ABRIGAVA O FÓRUM TRABALHISTA DE FLORIANÓPOLIS. 17A. MEDIÇÃO, 11A. MEDIÇÃO DO P
RIMEIRO TERMO ADITIVO, 4A. MEDIÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO, 1A. MEDIÇÃO DO TERCEIRO
ADITIVO E REAJUSTES. PROAD 8848/2013

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

13/10/15 15:49 USUARIO : GAMBA
 DATA EMISSAO : 13Out15 TIPO OB: 12 NUMERO : 2015OB805824
 UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
 BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 95827697/0001-85 - CONCRETIL CONSTRUCOES LTDA
 BANCO : 001 AGENCIA : 0305 CONTA CORRENTE : 456349
 VALOR : 108.981,36
 L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
 01 401003 2015NE000797400 33903916 36.045,11
 02 401003 2015NE001276400 33903916 59.311,08
 03 401006 2014NE001539400 33903916 13.625,17
 04 531814 2014NE001539 213110400 33903916 13.625,17
 05 531814 2015NE000797 213110400 33903916 36.045,11
 06 531814 2015NE001276 213110400 33903916 59.311,08
 LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 13Out15 15:42
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

13/10/15 15:49	USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 13Out15 TIPO OB: 12	NUMERO : 2015OB805824
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI	
BANCO : 001 AGENCIA : 3582	CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 95827697/0001-85 - CONCRETIL CONSTRUcoes LTDA	
BANCO : 001 AGENCIA : 0305	CONTA CORRENTE : 456349
	VALOR : 108.981,36
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB	VALOR
07 561602 0100000000400C	
	49.670,28
08 561602 0181151130400C	
	59.311,08

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 13Out15 15:42
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

13/10/15 15:49

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 13Out15 TIPO OB: 11

NUMERO : 2015OB805825

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 82892282/0001-43 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS

BANCO : 104 AGENCIA : 1877 CONTA CORRENTE : 5860

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP001802 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004856366-8

PROCESSO : CP-8848/2013

VALOR : 3.768,80

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NF 191, 193 A 196, 198 E 202 - CONCRETEL CONSTRUÇÃO
S

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

13/10/15 15:49

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 13Out15 VENCIMENTO: 13Out15 NUMERO : 2015DF801429
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
CONTRIBUINTE : 95827697/0001-85 - CONCRETIL CONSTRUcoes LTDA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : CP-8848/2013 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2015NP001802
PERIODO APURACAO : 13Out15 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES : BASE DE CALCULO : 125626,92
RECEITA : 7.349,17
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 13/10/15
TOTAL : 7.349,17

OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuicoes sociais retidas nf 191, 193 a 196, 198 e 202

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 13Out15 15:43
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

13/10/15 15:49

USUARIO : GAMBÁ

DATA EMISSAO : 13Out15

NUMERO : 2015GP800321

UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO

RECOLHEDOR : 512234449173

CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI

COMPETENCIA : SET15

RECURSO : 3

PROCESSO : CP-8848/2013

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP001802 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 3582 , EM 13/10/15

VALOR INSS : 5.311,73

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 5.311,73

OBSERVACAO

Recolhimento de contribuição retida nf 191, 193 a 196 e 198

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBÁ

UG : 080013 13Out15 15:43

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

13/10/15 15:49

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 13Out15

NUMERO : 2015GP800322

UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO

RECOLHEDOR : 512234449173

CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI

COMPETENCIA : OUT15

RECURSO : 3

PROCESSO : CP-8848/2013

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP001802 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 3582 , EM 13/10/15

VALOR INSS : 215,86

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 215,86

OBSERVACAO

Recolhimento de contribuição retida nf 202

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 13Out15 15:43

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

