




Relatório de 01/05/2014 até 30/05/2014

Dados da Obra

JOAO
CARLOS
GODOY
ILHA

Proposta	CP 9235/2013	Obra	Fórum Trabalhista de Rio do Sul
Data Início	27/01/2014	Data Prev. Término	21/04/2015
Contato	Sálvio	Email	licitacoes@salver.com.br
Telefone	(47) 35331777	Fax	(47) 35331777
Cliente	Rio do Sul	Construtora	Salver Construtora e Incorporadora
Endereço	Rua Esteves Júnior, Centro, Florianópolis - 23		

Andamento da Obra

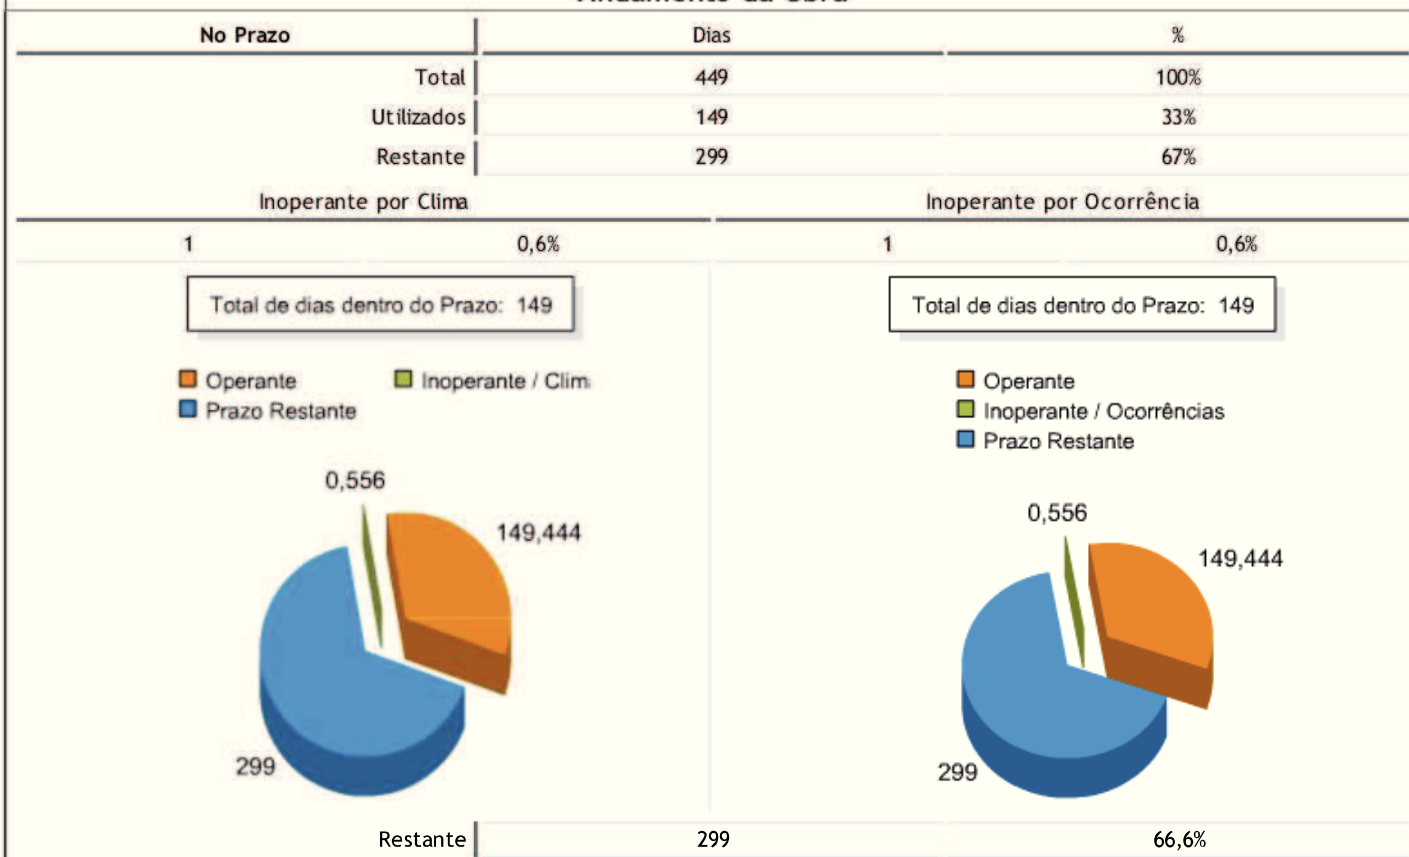

Dados de Pessoal

Número de Pessoal na Obra

296

Dados de Serviço

Data	Hora	Descrição
01/05/2014	07:00 - 08:45	Montagem ferragem Vigas Baldrame; Execução forma (longarinas da laje e muro de contenção); Serviço de Reaterro;
01/05/2014	09:00 - 12:00	Montagem ferragem Vigas Baldrame; Execução forma (longarinas da laje e muro de contenção); Serviço de Reaterro;
01/05/2014	13:00 - 15:45	Montagem ferragem Vigas Baldrame; Execução forma (longarinas da laje e muro de contenção); Serviço de Reaterro;



01/05/2014	16:00 - 18:00	Montagem ferragem Vigas Baldrame; Execução forma (longarinas da laje e muro de contenção); Serviço de Reaterro;
02/05/2014	07:00 - 08:45	Execução formas (longarinas laje); Escoramento da laje; Ferragem Muro de Contenção; Serviço de Reaterro;
02/05/2014	09:00 - 12:00	Execução formas (longarinas laje); Escoramento da laje; Ferragem Muro de Contenção;
02/05/2014	13:00 - 14:00	Execução formas (longarinas laje); Escoramento da laje; Ferragem Muro de Contenção;
05/05/2014	07:00 - 08:45	Montagem da laje treliçada; Execução forma muro de contenção; Execução ferragem muro de contenção;
05/05/2014	09:00 - 12:00	Montagem da laje treliçada; Execução forma muro de contenção; Execução ferragem muro de contenção;
05/05/2014	13:00 - 15:45	Montagem da laje treliçada; Execução forma muro de contenção; Execução ferragem muro de contenção;
05/05/2014	16:00 - 18:00	Montagem da laje treliçada; Execução forma muro de contenção; Execução ferragem muro de contenção;
06/05/2014	07:00 - 08:45	Montagem da laje treliçada; Execução forma muro de contenção; Execução da ferragem muro de contenção;
06/05/2014	09:00 - 12:00	Montagem da laje treliçada; Execução forma muro de contenção; Execução da ferragem muro de contenção;
06/05/2014	13:00 - 15:45	Montagem da laje treliçada; Execução forma muro de contenção; Execução da ferragem muro de contenção;
06/05/2014	16:00 - 18:00	Montagem da laje treliçada; Execução forma muro de contenção; Execução da ferragem muro de contenção;
07/05/2014	07:00 - 08:45	Montagem laje treliçada; Execução forma muro de contenção; Execução ferragem laje (Armadura positiva);
07/05/2014	09:00 - 12:00	Montagem laje treliçada; Execução forma muro de contenção; Execução ferragem laje (Armadura positiva);
07/05/2014	13:00 - 15:45	Montagem laje treliçada; Execução forma muro de contenção; Execução ferragem laje (Armadura positiva); Instalação hidráulica e hidrossanitária do pavimento baldrame;
07/05/2014	16:00 - 18:00	Montagem laje treliçada; Execução forma muro de contenção; Execução ferragem laje (Armadura positiva); Instalação hidráulica e hidrossanitária do pavimento baldrame;
08/05/2014	07:00 - 08:45	Montagem laje treliçada; Execução forma muro de contenção; Execução ferragem laje (Armadura positiva); Instalação hidráulica e hidrossanitária do pavimento baldrame;
08/05/2014	09:00 - 12:00	Montagem laje treliçada; Execução forma muro de contenção; Execução ferragem laje (Armadura positiva); Instalação hidráulica e hidrossanitária do pavimento baldrame;
		Montagem laje treliçada; Execução forma

08/05/2014	13:00 - 15:45	muro de contenção; Execução ferragem laje (Armadura positiva); Instalação hidráulica e hidrossanitária do pavimento baldrame;
08/05/2014	16:00 - 18:00	Montagem laje treliçada; Execução forma muro de contenção; Execução ferragem laje (Armadura positiva); Instalação hidráulica e hidrossanitária do pavimento baldrame;
09/05/2014	07:00 - 08:45	Montagem laje treliçada; Execução ferragem laje (Armadura positiva); Instalação hidráulica e hidrossanitária do pavimento baldrame;
09/05/2014	09:00 - 12:00	Montagem laje treliçada; Execução ferragem laje (Armadura positiva); Instalação hidráulica e hidrossanitária do pavimento baldrame;
09/05/2014	13:00 - 15:45	Instalação hidráulica e hidrossanitária do pavimento baldrame;
09/05/2014	16:00 - 18:00	Instalação hidráulica e hidrossanitária do pavimento baldrame;
12/05/2014	07:00 - 08:45	Montagem da laje treliçada; Execução ferragem da laje; Instalação hidráulica e hidrossanitária do pavimento baldrame; Instalação elétrica, telecomunicações e preventivo de incêndio do pavimento baldrame;
12/05/2014	09:00 - 12:00	Montagem da laje treliçada; Execução ferragem da laje; Instalação hidráulica e hidrossanitária do pavimento baldrame; Instalação elétrica, telecomunicações e preventivo de incêndio do pavimento baldrame;
12/05/2014	13:00 - 15:45	Montagem da laje treliçada; Execução ferragem da laje; Instalação hidráulica e hidrossanitária do pavimento baldrame; Instalação elétrica, telecomunicações e preventivo de incêndio do pavimento baldrame;
12/05/2014	16:00 - 18:00	Montagem da laje treliçada; Execução ferragem da laje; Instalação hidráulica e hidrossanitária do pavimento baldrame; Instalação elétrica, telecomunicações e preventivo de incêndio do pavimento baldrame;
13/05/2014	07:00 - 08:45	Montagem da laje treliçada; Execução ferragem da laje; Instalação elétrica, telecomunicações e preventivo de incêndio do pavimento baldrame;
13/05/2014	09:00 - 12:00	Montagem da laje treliçada; Execução ferragem da laje; Instalação elétrica, telecomunicações e preventivo de incêndio do pavimento baldrame;
13/05/2014	13:00 - 15:45	Montagem da laje treliçada; Execução ferragem da laje; Instalação elétrica, telecomunicações e preventivo de incêndio do pavimento baldrame;
13/05/2014	16:00 - 18:00	Montagem da laje treliçada; Execução ferragem da laje; Instalação elétrica, telecomunicações e preventivo de incêndio do pavimento baldrame;
14/05/2014	08:00 - 08:45	Concretagem laje, muro de contenção, vigas e pilaretes pavimento baldrame;
14/05/2014	09:00 - 12:00	Concretagem laje, muro de contenção, vigas e pilaretes pavimento baldrame;

		e pilares pavimento baldrame;
14/05/2014	13:00 - 15:45	Concretagem laje, muro de contenção, vigas e pilares pavimento baldrame;
14/05/2014	16:00 - 20:00	Concretagem laje, muro de contenção, vigas e pilares pavimento baldrame;
15/05/2014	07:00 - 08:45	Concretagem laje, muro e viga baldrame;
15/05/2014	09:00 - 12:00	Limpeza canteiro de obra; Execução formas do pilares térreo; Cura do concreto (Laje pavimento Baldrame);
15/05/2014	13:00 - 15:45	Limpeza canteiro de obra; Execução formas do pilares térreo; Cura do concreto (Laje pavimento Baldrame);
15/05/2014	16:00 - 18:00	Limpeza canteiro de obra; Execução formas do pilares térreo; Cura do concreto (Laje pavimento Baldrame);
16/05/2014	07:00 - 08:45	Execução forma (Pilares Térreo); Cura concreto (Laje Pavimento Baldrame);
16/05/2014	09:00 - 12:00	Execução forma (Pilares Térreo); Cura concreto (Laje Pavimento Baldrame);
19/05/2014	07:00 - 08:45	Execução forma (Pilares Térreo); Locação pilares; Execução ferragem (Pilares Térreo); Cura Concreto (Laje pavimento baldrame);
19/05/2014	09:00 - 12:00	Execução forma (Pilares Térreo); Locação pilares; Execução ferragem (Pilares Térreo); Cura Concreto (Laje pavimento baldrame);
19/05/2014	13:00 - 15:45	Execução forma (Pilares Térreo); Locação pilares; Execução ferragem (Pilares Térreo); Cura Concreto (Laje pavimento baldrame);
19/05/2014	16:00 - 18:00	Execução forma (Pilares Térreo); Locação pilares; Execução ferragem (Pilares Térreo); Cura Concreto (Laje pavimento baldrame);
20/05/2014	07:00 - 08:45	Execução forma (Pilares Térreo); Execução ferragem (Pilares Térreo); Cura Concreto (Laje pavimento baldrame);
20/05/2014	09:00 - 12:00	Execução forma (Pilares Térreo); Execução ferragem (Pilares Térreo); Cura Concreto (Laje pavimento baldrame);
20/05/2014	13:00 - 15:45	Execução forma (Pilares Térreo); Execução ferragem (Pilares Térreo); Cura Concreto (Laje pavimento baldrame);
20/05/2014	16:00 - 18:00	Execução forma (Pilares Térreo); Execução ferragem (Pilares Térreo); Cura Concreto (Laje pavimento baldrame);
21/05/2014	07:00 - 08:45	Execução forma (Pilares Térreo); Execução ferragem (Pilares Térreo); Cura Concreto (Laje pavimento baldrame);
21/05/2014	09:00 - 12:00	Execução forma (Pilares Térreo); Execução ferragem (Pilares Térreo); Cura Concreto (Laje pavimento baldrame);
21/05/2014	13:00 - 15:45	Execução forma (Pilares Térreo); Execução ferragem (Pilares Térreo); Cura Concreto (Laje pavimento baldrame);
21/05/2014	16:00 - 18:00	Execução forma (Pilares Térreo); Execução ferragem (Pilares Térreo); Cura Concreto (Laje pavimento baldrame);
22/05/2014	13:00 - 15:45	Execução forma pilares térreo; Execução ferragem pilares térreo;
22/05/2014	16:00 - 18:00	Execução forma pilares térreo; Execução ferragem pilares térreo;

23/05/2014	07:00 - 08:45	Execução forma pilares térreo; Execução ferragem pilares térreo;
23/05/2014	09:00 - 12:00	Execução forma pilares térreo; Execução ferragem pilares térreo;
26/05/2014	07:00 - 08:45	Execução Forma (Pilares e Vigas Térreo); Execução Ferragem (Pilares Térreo);
26/05/2014	09:00 - 12:00	Execução Forma (Pilares e Vigas Térreo); Execução Ferragem (Pilares Térreo);
26/05/2014	13:00 - 15:45	Execução Forma (Pilares e Vigas Térreo); Execução Ferragem (Pilares Térreo);
26/05/2014	16:00 - 18:00	Execução Forma (Pilares e Vigas Térreo); Execução Ferragem (Pilares Térreo);
27/05/2014	07:00 - 08:45	Execução Forma (Pilares e Vigas Térreo); Execução Ferragem (Pilares Térreo);
27/05/2014	09:00 - 12:00	Execução Forma (Pilares e Vigas Térreo); Execução Ferragem (Pilares Térreo);
27/05/2014	13:00 - 15:45	Execução Forma (Pilares e Vigas Térreo); Execução Ferragem (Pilares Térreo);
27/05/2014	16:00 - 18:00	Execução Forma (Pilares e Vigas Térreo); Execução Ferragem (Pilares Térreo);
28/05/2014	07:00 - 08:45	Execução Forma (Pilares e Vigas Térreo); Execução Ferragem (Pilares Térreo);
28/05/2014	09:00 - 12:00	Execução Forma (Pilares e Vigas Térreo); Execução Ferragem (Pilares Térreo);
28/05/2014	13:00 - 15:45	Execução Forma (Pilares e Vigas Térreo); Execução Ferragem (Pilares Térreo);
28/05/2014	16:00 - 18:00	Execução Forma (Pilares e Vigas Térreo); Execução Ferragem (Pilares Térreo);
29/05/2014	07:00 - 08:45	Execução Forma (Pilares e Vigas Térreo); Execução Ferragem (Pilares Térreo);
29/05/2014	09:00 - 12:00	Execução Forma (Pilares e Vigas Térreo); Execução Ferragem (Pilares Térreo);
29/05/2014	13:00 - 15:45	Execução Forma (Pilares e Vigas Térreo); Execução Ferragem (Pilares Térreo);
29/05/2014	16:00 - 18:00	Execução Forma (Pilares e Vigas Térreo); Execução Ferragem (Pilares Térreo);
30/05/2014	07:00 - 08:45	Execução Ferragem (Pilares Térreo); Execução Formas (Pilares e Vigas Térreo);
30/05/2014	09:00 - 12:00	Execução Ferragem (Pilares Térreo); Execução Formas (Pilares e Vigas Térreo);

Dados de Ocorrências		
Data	Hora	Descrição
15/05/2014	08:00 - 09:00	Vistoria da fiscalização dias 14 e 15. faltou cerca de um caminhão de concreto na noite anterior. Concretagem interrompida 1h da manhã pela policia, face a reclamação de barulho dos vizinhos.
22/05/2014	07:00 - 12:00	Inoperante devido a chuva;

Clima					
Ícone	Data	Hora	Clima	Descrição	Operante
	01/05/2014	O dia todo	Nublado	Tempo nublado dia todo;	Sim
	02/05/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	05/05/2014	O dia todo	Nublado	Tempo dia todo nublado;	Sim
	06/05/2014	07:00 - 12:00	Nublado	Manhã tempo nublado;	Sim
	06/05/2014	13:00 - 18:00	Ensolarado	Tarde tempo bom;	Sim

	06/05/2014	12:00 - 18:00	Ensolarado	Tarde tempo bom;	Sim
	07/05/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	08/05/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	09/05/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	12/05/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	13/05/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	14/05/2014	O dia todo	Nublado	Tempo nublado dia todo;	Sim
	15/05/2014	O dia todo	Nublado	Tempo nublado dia todo;	Sim
	16/05/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	19/05/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	20/05/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	21/05/2014	O dia todo	Nublado	Tempo nublado dia todo;	Sim
	22/05/2014	07:00 - 12:00	Chuvoso	Tempo chuvoso pela manhã;	Não
	22/05/2014	12:00 - 18:00	Nublado	Tempo nublado a tarde;	Sim
	23/05/2014	O dia todo	Nublado	Tempo nublado dia todo;	Sim
	26/05/2014	O dia todo	Nublado	Tempo nublado dia todo;	Sim
	27/05/2014	07:00 - 12:00	Nublado	Manhã tempo nublado;	Sim
	27/05/2014	12:00 - 18:00	Ensolarado	Tarde tempo bom;	Sim
	28/05/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	29/05/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim
	30/05/2014	O dia todo	Ensolarado	Tempo bom dia todo;	Sim

Comentários de Aprovação dos Dias

Dia	Data Realizada	Ação	Comentário	Usuário
05/05/2014	13/05/2014	Aprovado	visto à distância	JOAO CARLOS GODOY ILHA
08/05/2014	13/05/2014	Aprovado	visto virtual	JOAO CARLOS GODOY ILHA
09/05/2014	13/05/2014	Aprovado	visto virtual	JOAO CARLOS GODOY ILHA
22/05/2014	02/06/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
26/05/2014	02/06/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
27/05/2014	02/06/2014	Aprovado	visto virtual	JOAO CARLOS GODOY ILHA
28/05/2014	02/06/2014	Aprovado	visto virtual	JOAO CARLOS GODOY ILHA
29/05/2014	02/06/2014	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA

Fotos

01/05/2014 - Serviço de Reaterro



Reaterro da Cisterna;


05/05/2014 - Laje Treliçada

01/05/2014 - Ferragem



Montagem da ferragem;

06/05/2014 - Laje Treliçada





Montagem da Laje;

08/05/2014 - Laje Treliçada



Montagem;

08/05/2014 - Laje Treliçada




Montagem da laje e execução da ferragem;

09/05/2014 - Laje Baldrame




Nervura Transversal;

09/05/2014 - Laje Baldrame

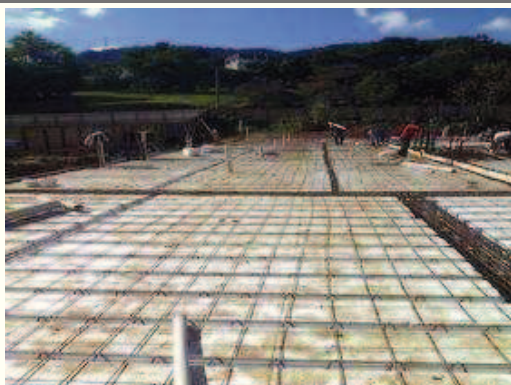


Montagem laje treliçada; Instalação hidráulica e hidrossanitária;

12/05/2014 - Laje Treliçada

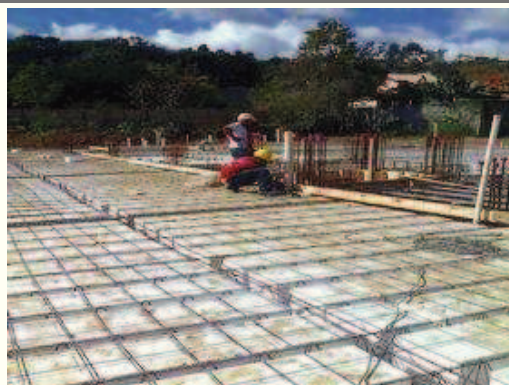

Instalação hidráulica e hidrossanitária;

14/05/2014 - Concretagem

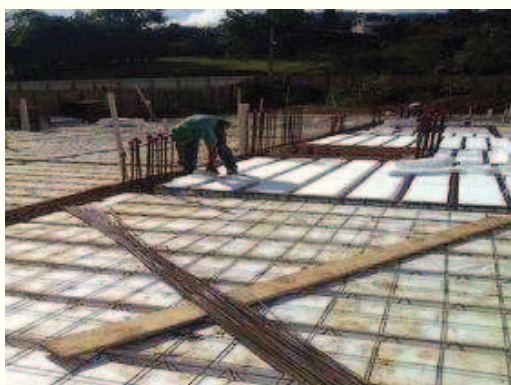

Montagem da laje;



Laje, muro de contenção, vigas e pilaretes do pavimento baldrame;

14/05/2014 - Concretagem



Laje, muro de contenção, vigas e pilaretes do pavimento baldrame;

15/05/2014 - Cura

15/05/2014 - Cura



Concreto laje pavimento baldrame;

22/05/2014 - Forma



Concreto laje pavimento baldrame;

22/05/2014 - Ferragem



Pilares Térreo;

26/05/2014 - Forma



Pilares Térreo;

27/05/2014 - Ferragem



Pilares e Vigas Térreo;

27/05/2014 - Forma





Pilares Térreo;

28/05/2014 - Ferragem



Pilares Térreo;

28/05/2014 - Forma



Espaçadores nos pilares Térreo;

30/05/2014 - Forma



Vigas e pilares Térreo;



Pilares e Vigas Térreo;



Relatório gerado por Gerenciador de Obras e Projetos | www.obra24horas.com.br

[Salvar Relatório](#)



SALVER

Construtora e Incorporadora

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777
E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 - Bairro Vila Nova
CEP 88.400-000 - Ituporanga - Santa Catarina
CNPJ: 00.521.113/0001-32

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SANTA CATARINA

Objeto: Construção do Imóvel destinado a nova sede do Fórum Trabalhista de Rito do Sul

Data: 12/11/2013

BDI: 22,00%

BDI Equipamentos: 13,00%

Planilha Orçamentária

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT	MATL	MOD	Total	%
DESPESAS ADMINISTRACÃO OBRA	01					343.979,53					
DESPESAS TÉCNICAS INICIAIS	01.01					7.316,96					
	01.01.01	Alvará de Construção	m²	1.970,20	0,62	1.212,40					
	01.01.02	Despesas com as Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao CREA-SC.	m²	1.970,20	0,62	1.212,40					
	01.01.03	Taxas e licenças juntos aos órgãos competentes para liberação de documentos da obra.	Un	1,00	508,86	508,87					
	01.01.04	Seguro da Obra	m²	1.970,20	2,22	4.383,29					
DESPESAS DE CONSUMO MENSAIS	01.02					14.070,16					
	01.02.01	Cópias, documentos e plotagens	m²	55,44	11,70	648,82					
	01.02.02	Consumo de Água	Mês	12,00	455,06	5.460,78	1	455,06	-	455,06	33%
	01.02.03	Consumo de Energia Elétrica	Mês	12,00	379,36	4.552,36	1	379,36	-	379,36	33%
	01.02.04	Consumo telefone	mês	12,00	142,01	1.704,10	1	142,01	-	142,01	33%
	01.02.05	Material de Limpeza	Mês	12,00	112,42	1.349,08	1	112,42	-	112,42	33%
	01.02.06	Consumo internet - obrigatório no canteiro de obras	mês	12,00	29,59	355,02	1	29,59	-	29,59	33%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	01.03					259.247,79					
	01.03.01	MESTRE DE OBRAS	H	2.112,00	39,08	82.528,24	176	-	6.877,35	6.877,35	33%
	01.03.02	VIGIA NOTURNO	H	2.112,00	10,27	21.694,28	176	-	1.807,86	1.807,86	33%
	01.03.03	ALMOXARIFE	H	2.112,00	12,72	26.867,92	176	-	2.238,99	2.238,99	33%

MEIO: 12/11/2013

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.521.113/0001-32
SALVO PEDRO MACHADO
GÉCIO GERENTE




GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT	MATL	MOD	Total	%
	01.03.04	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS	H	528,00	55,94	29.535,96	44	-	2.461,33	2.461,33	33%
	01.03.05	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRAS	H	132,00	55,94	7.383,99	-	-	-	-	0%
	01.03.06	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DE OBRAS	H	264,00	55,94	14.767,98	22	-	1.230,66	1.230,66	33%
	01.03.07	ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRAS	H	88,00	55,94	4.922,66	-	-	-	-	0%
	01.03.08	OPERADOR DE GUINCHO	H	1.452,00	17,02	24.709,11	-	-	-	-	0%
	01.03.09	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA	H	2.112,00	22,18	46.837,65	176	-	3.903,14	3.903,14	33%
DESPESAS											
ADMINISTRAÇÃO											
DA OBRA	01.04					63.344,62		-	-	-	
	01.04.01	Mobilização do canteiro de obras	Un	1,00	1.062,26	1.062,26	-	-	-	-	100%
	01.04.02	Desmobilizações do canteiro de obras	Un	1,00	1.062,26	1.062,26	-	-	-	-	0%
	01.04.03	Alimentação de funcionários	MÊS	12,00	3.749,01	44.988,14	1	-	3.749,01	3.749,01	33%
	01.04.04	Transporte de funcionários	MÊS	12,00	1.041,39	12.496,71	1	-	1.041,39	1.041,39	33%
	01.04.05	Equipamento obrigatório individual para funcionários (EPI)	CI	1,00	1.327,03	1.327,03	-	-	-	-	100%
	01.04.06	Equipamentos, computadores, impressoras e mobiliário escritório de obra.	CI	1,00	2.408,22	2.408,22	-	-	-	-	100%
	02.01.06	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00	265,53	1.062,13	-	-	-	-	100%
	02.01.07	Materiais e mão de obra para sinalização e proteção contra acidentes dentro do canteiro de obras conforme exigências da NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil, incluindo sinalizações de áreas de risco, proteções de	mês	12,00	188,31	2.259,72	1	133,72	54,59	188,31	33%
							-	-	-	-	
							-	-	-	-	
MANUTENÇÃO DA OBRA	03					20.176,20		-	-	-	0%
	03.01	ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	M3	873,03	13,02	11.364,59	50	-	650,87	650,87	17%
	03.02	Limpeza, e remoção de entulhos durante a execução da obra.	MÊS	12,00	255,02	3.060,28	1	-	255,02	255,02	33%
	03.03	Caixa de remoção e transporte de entulhos para fora. (Caixa de 5 m³)	Cx	36,00	159,76	5.751,33	3	479,28	-	479,28	39%
							-	-	-	-	
BALDRAME: VIGAS, PILARES E LAJES - EDIFÍCIO	08.01.03					325.100,39		-	-	-	
	08.01.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	M3	216,75	33,16	7.187,19		-	-	-	100%

SALVEM CONSTRUTORA E
 INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 00.521.380/001-32
 SALVO PEDRO MACHADO
 SÓCIO GERENTE

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT	MATL	MOD	Total	%
	08.01.03.02	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	120,00	14,61	1.753,80	120	866,25	887,55	1.753,80	100%
	08.01.03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	M3	96,75	14,93	1.444,92	96,75	1.289,20	155,71	1.444,91	100%
	08.01.03.04	LASTRO DE BRITA, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL	M3	41,62	114,56	4.768,20		-	-	-	100%
	08.01.03.05	FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.	M2	844,14	41,05	34.653,76	444,14	7.184,89	11.048,01	18.232,90	100%
	08.01.03.06	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.499,75	7,86	27.500,26	999,75	5.312,14	2.543,67	7.855,81	100%
	08.01.03.07	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.270,02	7,38	24.147,19	1270,02	6.041,83	3.336,53	9.378,36	100%
	08.01.03.08	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	4.348,47	6,43	27.942,67	1348,47	6.175,67	2.489,42	8.665,08	100%
	08.01.03.09	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/GM	KG	222,36	7,99	1.776,21	82,36	657,89	-	657,89	100%
	08.01.03.10	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL, INCLUINDO VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA,ESCORAMENTO, H=25 CM.	M2	78,00	136,78	10.668,64	39	3.736,05	1.598,26	5.334,32	100%
	08.01.03.11	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL, INCLUINDO VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA,ESCORAMENTO, H=35 CM.	M2	523,55	153,25	80.234,20	262,55	27.344,85	12.891,01	40.235,87	100%
	08.01.03.12	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	220,73	425,92	94.012,77	205,73	78.964,10	8.659,90	87.624,01	100%
	08.01.03.13	DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=3,50M	M2	844,14	10,67	9.010,58	801,14	-	8.551,58	8.551,58	100%
SUPRA ESTRUTURA	08.02					843.895,16		-	-	-	
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - EDIFÍCIO	08.02.01					843.895,16		-	-	-	
	08.02.01.05	FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.	M2	2.542,77	41,05	104.386,17	254,93	4.124,02	6.641,40	10.465,42	10%

GRUPO	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT	MATL	MOD	Total	%
	08.02.01.06	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6.810,15	7,86	53.512,64	726,2	3.858,64	1.847,68	5.706,32	11%
	08.02.01.07	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	11.284,42	7,38	83.328,86		-	-	-	0%
	08.02.01.08	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	14.891,60	6,43	95.691,37	3359,6	15.386,15	6.202,17	21.588,33	23%
	08.02.01.09	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	KG	659,72	7,99	5.269,84	140	1.118,31	-	1.118,31	21%
	08.03.05.01	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	M3	312,32	33,16	10.356,18	80	-	2.652,71	2.652,71	47%
	08.03.05.02	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	78,08	14,61	1.141,14	20	144,37	147,93	292,30	47%
	08.03.05.03	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	M3	234,24	14,93	3.498,26		-	-	-	22%
	08.03.05.04	LASTRO DE BRITA, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL	M3	1,55	114,56	177,58	0,35	32,96	7,14	40,10	45%
	08.03.05.05	FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.	M2	406,30	41,05	16.679,49	95	1.536,82	2.363,13	3.899,95	45%
	08.03.05.06	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.262,40	7,38	24.090,92	780	3.710,67	2.049,18	5.759,84	46%
	08.03.05.07	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	KG	65,25	7,99	521,22	17	135,80	-	135,80	49%
	08.03.05.08	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	68,42	425,92	29.141,28	17	6.525,01	715,59	7.240,60	47%
	08.03.05.09	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	74,75	68,21	5.098,79		-	-	-	0%
	08.03.05.10	DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=3,50M	M2	406,30	10,67	4.336,96	200	-	2.134,85	2.134,85	49%
IMPERMEABILIZAÇÕES	10					63.566,46		-	-	-	
baldrame	10.01	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES	M2	91,37	8,47	774,20	42,4	201,71	157,55	359,26	46%


 SALVEZ CONSTRUTORA
 INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 00.891.138/0001-32
 SALTÃO PEDRO MACHADO
 SÓCIO GERENTE

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT	MATL	MOD	Total	%
reservatório	10.02	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM INEL INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M2	73,08	13,95	1.019,64		-	-	-	0%
lajes impermeabilizadas	10.03	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 4MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA	m²	563,56	68,50	38.601,27		-	-	-	0%
banheiros	10.04	CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRILICA, TRES DEMAOS	M2	163,52	58,93	9.636,78		-	-	-	0%
caixa água	10.05	Impermeabilização para caixa de água em 7 demãos sendo 2 demãos de argamassa polimérica impermeabilizante à base de resinas termoplásticas e cimentos aditivados e 5 demãos de argamassa polimérica impermeabilizante flexível à base de resinas termoplásticas	m²	73,08	185,20	13.534,57		-	-	-	0%
INSTALAÇÕES HI DROSSANTÁRIAS						134.451,50		-	-	-	0%
ESCAVAÇÃO E REATERRO	24.01					6.631,13		-	-	-	0%
	24.01.01	Escavação manual até 1,50 m	m³	112,87	23,60	2.663,38		-	-	-	0%
	24.01.02	Reaterro compactado manualmente	m³	107,60	35,41	3.809,96		-	-	-	0%
	24.01.03	Carga e descarga manual de entulho	m³	5,27	25,22	132,79		-	-	-	0%
	24.01.04	Transporte e descarga de terra e entulhos para bota fora (DMT = 5,0 a 10,0 Km)	m³	5,27	4,75	24,99		-	-	-	0%
SISTEMA DE ÁGUA FRIA	24.02					8.875,39		-	-	-	0%
	24.02.01	Tubo PVC Soldável - 25 mm	m	516,66	6,64	3.430,06	96	279,47	357,86	637,33	19%
	24.02.02	Tubo PVC Soldável - 32 mm	m	91,71	10,66	977,82	36	238,15	145,70	383,85	39%
	24.02.03	Tubo PVC Soldável - 40 mm	m	53,26	15,25	812,37	36	325,06	224,09	549,14	68%
	24.02.09	Bucha de redução PVC soldável curta - 32 x 25 mm	Un	16,00	3,93	62,86		-	-	-	0%
	24.02.10	Bucha de redução PVC soldável curta - 40 x 32 mm	Un	5,00	6,47	32,37		-	-	-	0%
	24.02.11	Cap PVC soldável - 25 mm	Un	4,00	3,05	12,21		-	-	-	0%
	24.02.12	Joelho 45° PVC soldável - 25 mm	Un	3,00	7,02	21,05	3	4,26	16,79	21,05	100%
	24.02.13	Joelho 45° PVC soldável - 32 mm	Un	1,00	8,67	8,67		-	-	-	0%
	24.02.14	Joelho 45° PVC soldável - 40 mm	Un	2,00	11,91	23,81		-	-	-	0%
	24.02.15	Joelho 90° PVC soldável - 25 mm	Un	116,00	6,44	746,77	30	25,21	167,92	193,13	26%
	24.02.16	Joelho 90° PVC soldável - 32 mm	Un	18,00	7,37	132,71	5	8,88	27,99	36,86	28%
	24.02.17	Joelho 90° PVC soldável - 40 mm	Un	4,00	11,12	44,50	4	14,63	29,87	44,50	100%


SALVEX CONSTRUTORA E
 INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 00.521.110/0001-32
 SALVIO PEDRO MACHADO
 SÓCIO GERENTE

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT	MATL	MOD	Total	%
	24.02.25	Têe PVC soldável - 25 mm	Un	49,00	6,86	336,32	15	18,99	83,96	102,96	31%
SISTEMA DE ESGOTO	24.04					23.757,37		-	-	-	0%
	24.04.01	Tubo PVC esgoto - Ø 40 mm	m	65,53	11,12	728,96	36	121,42	279,05	400,46	55%
	24.04.02	Tubo PVC esgoto - Ø 50 mm	m	106,82	15,61	1.667,30	36	213,01	348,91	561,93	34%
	24.04.03	Tubo PVC esgoto - Ø 75 mm	m	40,65	23,02	935,54	36	270,10	558,52	828,62	89%
	24.04.04	Tubo PVC esgoto - Ø 100 mm	m	215,61	26,01	5.608,18	72	662,89	1.209,91	1.872,80	33%
	24.04.05	Tubo PVC esgoto - Ø 150 mm	m	39,81	43,98	1.750,45	24	621,14	434,26	1.055,40	60%
	24.04.06	Anel de Borracha - Ø 40 mm	Un	263,00	2,73	718,95		-	-	-	0%
	24.04.07	Anel de Borracha - Ø 50 mm	Un	235,00	3,42	803,71	35	29,41	90,29	119,70	15%
	24.04.08	Anel de Borracha - Ø 75 mm	Un	67,00	5,28	353,62		-	-	-	0%
	24.04.09	Anel de Borracha - Ø 100 mm	Un	190,00	6,71	1.274,88		-	-	-	0%
	24.04.10	Cap PVC esgoto 40 mm	Un	4,00	4,37	17,47		-	-	-	0%
	24.04.11	Joelho 45º PVC esgoto 40 mm	Un	60,00	9,75	585,07	20	39,53	155,50	195,02	33%
	24.04.12	Joelho 45º PVC esgoto 50 mm	Un	15,00	11,57	173,60	15	47,57	126,03	173,60	100%
	24.04.13	Joelho 45º PVC esgoto 100 mm	Un	16,00	20,90	334,38	10	84,61	124,38	208,99	63%
	24.04.14	Joelho 90º PVC esgoto 40 mm	Un	47,00	9,55	448,85	33	58,58	256,57	315,15	70%
	24.04.15	Joelho 90º PVC esgoto 50 mm	Un	45,00	11,06	497,92	33	87,87	277,27	365,14	73%
	24.04.16	Joelho 90º PVC esgoto 75 mm	Un	5,00	16,72	83,61	5	30,71	52,90	83,61	100%
	24.04.17	Joelho 90º PVC esgoto 100 mm	Un	30,00	21,36	640,81	10	89,23	124,38	213,60	33%
	24.04.18	Joelho 90º com Anel PVC esgoto 40 mm	Un	39,00	11,37	443,53		-	-	-	0%
	24.04.19	Junção Simples PVC esgoto - 50 x 50 mm	Un	6,00	13,93	83,57	2	12,31	15,55	27,86	33%
	24.04.20	Junção Simples PVC esgoto - 100 x 100 mm	Un	9,00	30,09	270,84		-	-	-	0%
	24.04.21	Junção com Redução PVC esgoto - 75 x 50 mm	Un	1,00	24,57	24,57		-	-	-	0%
	24.04.22	Junção com Redução PVC esgoto - 100 x 50 mm	Un	12,00	28,83	345,93	12	169,84	176,09	345,93	100%
	24.04.23	Junção com Redução PVC esgoto - 100 x 75 mm	Un	2,00	37,17	74,34		-	-	-	0%
	24.04.24	Junção Dupla PVC esgoto - 100 x 100 x 100 mm	Un	3,00	43,02	129,05		-	-	-	0%
	24.04.25	Luva Simples PVC esgoto - 40 mm	Un	148,00	5,10	754,87		-	-	-	0%
	24.04.26	Luva Simples PVC esgoto - 50 mm	Un	84,00	6,88	577,55	12	30,25	52,26	82,51	14%
	24.04.27	Luva Simples PVC esgoto - 75 mm	Un	35,00	9,60	335,91	6	25,85	31,74	57,58	17%
	24.04.28	Luva Simples PVC esgoto - 100 mm	Un	87,00	12,48	1.086,18		-	-	-	0%
	24.04.29	Redução excêntrica PVC esgoto 75 x 50 mm	Un	14,00	20,14	281,98		-	-	-	0%
	24.04.30	Redução excêntrica PVC esgoto 100 x 50 mm	Un	4,00	22,24	88,94	4	37,25	51,69	88,94	100%
	24.04.31	Têe PVC esgoto 40 x 40 mm	Un	2,00	13,30	26,60	2	7,86	18,75	26,60	100%
	24.04.32	Têe PVC esgoto 50 x 50 mm	Un	18,00	14,88	267,76	8	49,32	69,68	119,00	44%
	24.04.33	Têe PVC esgoto 75 x 75 mm	Un	9,00	24,80	223,24		-	-	-	0%
	24.04.34	Têe PVC esgoto 100 x 100 mm	Un	5,00	28,24	141,18	5	72,78	68,40	141,18	100%
	24.04.35	Têe c/ Redução PVC esgoto 75 x 50 mm	Un	6,00	21,29	127,74		-	-	-	0%
	24.04.36	Têe c/ Redução PVC esgoto 100 x 50 mm	Un	6,00	26,69	160,11		-	-	-	0%
	24.04.37	Dispositivo anti-infiltração de PVC para caixa sifonada - Ø 150 mm	Un	16,00	36,12	577,88		-	-	-	0%


SATELITE CONSTRUTORA E
 INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 00.528.113/0001-32
 SALVIO PEDRO MACHADO
 SÓCIO GERENTE

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT	MATL	MOD	Total	%
	24.04.38	Caixa Sifonada Montada c/ Greiha e Porta Greiha DN 150 x 150 x 50 mm	Un	31,00	34,86	1.080,75	15	289,70	233,25	522,94	48%
	24.04.39	Terminal de ventilação em PVC com Ø 50 mm	Un	1,00	6,44	6,44		-	-	-	0%
	24.04.40	Terminal de ventilação em PVC com Ø 75 mm	Un	3,00	8,37	25,10		-	-	-	0%
SISTEMA PLUVIAL	24.05					28.785,39		-	-	-	0%
	24.05.01	Tubo PVC Soldável - 25 mm	m	2,91	6,64	19,31		-	-	-	0%
	24.05.02	Tubo PVC Soldável - 32 mm	m	20,35	10,66	216,97		-	-	-	0%
	24.05.03	Tubo PVC esgoto - 40 mm	m	50,60	11,12	562,87	12	40,47	93,02	133,49	24%
	24.05.04	Tubo PVC esgoto - 50 mm	m	46,84	15,61	731,14	46,84	277,15	453,98	731,13	100%
	24.05.05	Tubo PVC esgoto - 75 mm	m	23,26	23,02	535,32		-	-	-	0%
	24.05.06	Tubo PVC esgoto - 100 mm	m	368,32	26,01	9.580,39	72	662,89	1.209,91	1.872,80	20%
	24.05.07	Tubo PVC esgoto - 150 mm	m	174,68	43,98	7.681,49		-	-	-	0%
	24.05.08	Anel de Borracha 40 mm	Un	102,00	2,73	278,83		-	-	-	0%
	24.05.09	Anel de Borracha - 50 mm	Un	91,00	3,42	311,22	35	29,41	90,29	119,70	38%
	24.05.10	Anel de Borracha - 75 mm	Un	11,00	5,28	58,06		-	-	-	0%
	24.05.11	Anel de Borracha - 100 mm	Un	204,00	6,71	1.368,82	100	153,84	517,15	670,99	49%
	24.05.12	Anel de Borracha - 150 mm	Un	19,00	11,98	227,54		-	-	-	0%
	24.05.13	Joelho 45º PVC soldável - 25 mm	Un	7,00	7,02	49,12	7	9,94	39,18	49,12	100%
	24.05.14	Joelho 45º PVC soldável - 32 mm	Un	14,00	8,67	121,44	8	24,61	44,78	69,39	57%
	24.05.15	Joelho 45º PVC esgoto 40 mm	Un	26,00	9,75	253,53		-	-	-	0%
	24.05.16	Joelho 45º PVC esgoto 50 mm	Un	11,00	11,57	127,31	1	-	-	-	0%
	24.05.17	Joelho 45º PVC esgoto 75 mm	Un	1,00	17,41	17,41	1	6,83	10,58	17,41	100%
	24.05.18	Joelho 45º PVC esgoto 100 mm	Un	38,00	20,90	794,16	30	253,84	373,13	626,97	79%
	24.05.19	Joelho 45º PVC esgoto 150 mm	Un	2,00	46,42	92,85		-	-	-	0%
	24.05.20	Joelho 90º PVC soldável - 25 mm	Un	4,00	6,44	25,75		-	-	-	0%
	24.05.21	Joelho 90º PVC soldável - 32 mm	Un	9,00	7,37	66,35	9	15,98	50,38	66,35	100%
	24.05.22	Joelho 90º PVC esgoto 40 mm	Un	5,00	9,55	47,75		-	-	-	0%
	24.05.23	Joelho 90º PVC esgoto 50 mm	Un	8,00	11,06	88,52		-	-	-	0%
	24.05.24	Joelho 90º PVC esgoto 75 mm	Un	3,00	16,72	50,16	3	18,43	31,74	50,16	100%
	24.05.25	Joelho 90º PVC esgoto 100 mm	Un	38,00	21,36	811,69	20	178,46	248,75	427,21	53%
	24.05.26	Joelho 90º PVC esgoto 150 mm	Un	2,00	51,42	102,84	2	64,05	38,79	102,84	100%
	24.05.27	Junção Simples PVC esgoto - 40 x 40 mm	Un	2,00	13,19	26,39		-	-	-	0%
	24.05.28	Junção Simples PVC esgoto - 50 x 50 mm	Un	11,00	13,93	153,21	8	49,23	62,20	111,43	73%
	24.05.29	Junção Simples PVC esgoto - 100 x 100 mm	Un	10,00	30,09	300,94	10	176,56	124,38	300,94	100%
	24.05.30	Junção com Redução PVC esgoto - 75 x 50 mm	Un	1,00	24,57	24,57		-	-	-	0%
	24.05.31	Junção com Redução PVC esgoto - 100 x 50 mm	Un	4,00	28,83	115,31		-	-	-	0%
	24.05.32	Junção com Redução PVC esgoto - 150 x 100 mm	Un	4,00	63,05	252,21		-	-	-	0%
	24.05.33	Luva Simples PVC esgoto - 40 mm	Un	50,00	5,10	255,02		-	-	-	0%
	24.05.34	Luva Simples PVC esgoto - 50 mm	Un	47,00	6,88	323,15	8	20,17	34,84	55,00	17%
	24.05.35	Luva Simples PVC esgoto - 75 mm	Un	6,00	9,60	57,58	6	25,85	31,74	57,58	100%
	24.05.36	Luva Simples PVC esgoto - 100 mm	Un	93,00	12,48	1.161,09	30	178,58	199,87	378,45	32%

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT	MATL	MOD	Total	%
	24.05.37	Luva Simples PVC esgoto - 150 mm	Un	11,00	39,08	429,83	5	151,77	43,61	195,38	45%
	24.05.38	Bucha de redução PVC soldável curta - 40 x 32 mm	Un	2,00	6,47	12,95	-	-	-	-	0%
	24.05.39	Bucha de redução PVC esgoto 50 x 40 mm	Un	17,00	12,53	213,05	-	-	-	-	0%
	24.05.40	Redução excêntrica PVC esgoto 75 x 50 mm	Un	1,00	20,14	20,14	-	-	-	-	0%
	24.05.41	Redução excêntrica PVC esgoto 100 x 50 mm	Un	1,00	22,24	22,24	1	9,31	12,92	22,24	100%
	24.05.42	Redução excêntrica PVC esgoto 150 x 100 mm	Un	3,00	37,95	113,85	-	-	-	-	0%
	24.05.43	Têe PVC soldável - 25 mm	Un	2,00	6,86	13,73	-	-	-	-	0%
	24.05.44	Têe PVC soldável - 32 mm	Un	9,00	8,82	79,35	8	23,29	47,24	70,53	89%
	24.05.45	Têe PVC esgoto 100 x 100 mm	Un	2,00	28,24	56,47	1	14,56	13,68	28,24	50%
DRENOS	DE										
CLIMATIZAÇÃO	24.07					6.361,34		-	-	-	0%
	24.07.01	Tubo PVC Soldável - 25 mm	m	15,05	6,64	99,89	-	-	-	-	0%
	24.07.02	Tubo PVC Soldável - 32 mm	m	137,19	10,66	1.462,81	36	238,15	145,70	383,85	26%
	24.07.03	Tubo PVC Soldável - 40 mm	m	127,81	15,25	1.949,56	-	-	-	-	0%
	24.07.04	Tubo PVC Soldável - 50 mm	m	2,90	18,07	52,37	-	-	-	-	0%
	24.07.05	Bucha de redução PVC soldável curta - 32 x 25 mm	Un	20,00	3,93	78,58	-	-	-	-	0%
	24.07.06	Bucha de redução PVC soldável curta - 40 x 32 mm	Un	33,00	6,47	213,62	-	-	-	-	0%
	24.07.07	Bucha de redução PVC soldável curta - 50 x 40 mm	Un	4,00	8,25	32,99	-	-	-	-	0%
	24.07.08	Bucha de redução PVC soldável longa - 50 x 32 mm	Un	1,00	8,91	8,91	-	-	-	-	0%
	24.07.09	Joelho 45° PVC soldável - 25 mm	Un	8,00	7,02	56,14	2	2,39	11,64	14,04	25%
CAIXA D'ÁGUA	24.14					4.906,80		-	-	-	0%
	24.14.01	Caixa d'água em fibra de vidro com capacidade para 15.000 litros	Un	1,00	4.840,50	4.840,50	1	4.556,09	284,41	4.840,50	100%
	24.14.02	Torneira bóia para caixa d'água com balão de plástico - 3/4"	Un	1,00	66,31	66,31	-	-	-	-	0%
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - PÁRA-RAIO	25.06					17.928,20		-	-	-	0%
	25.06.01	Cabo cobre nú 35mm²	m	30,61	21,57	660,36	-	-	-	-	0%
	25.06.02	Cabo cobre nú 50mm²	m	202,00	29,11	5.880,55	-	-	-	-	0%
	25.06.03	Barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" x 3 m - (70 mm²) - 3 metros, incluindo parafusos de fixação	Br	77,00	77,92	5.999,46	20	968,02	590,28	1.558,30	26%
Eletrodutos, Perfisados, Cabos e Acessórios	26.03					182.698,37		-	-	-	0%
	26.03.38	Curva 90° roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1,1/2", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzol ou similar)	Un	2,00	11,06	22,13	2	19,48	2,65	22,13	100%


SALVO ROBERTO DE ALMEIDA
 CNPJ: 00.531.113/0001-02
 SALVO PEDRO WACHADZ
 SÓCIO GERENTE

GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT	MATL	MOD	Total	%
	26.03.51	Eletroduto rígido Ø1,1/2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	br	8,00	29,55	236,40	8	183,57	52,83	236,40	100%
	26.03.53	Eletroduto rígido Ø3", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	br	2,00	72,44	144,88	2	131,67	13,21	144,87	100%
	26.03.56	Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø1,1/4", conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, (Ref: Kanaflex ou similar)	m	486,00	10,02	4.871,38	100	210,65	791,69	1.002,34	21%
	26.03.58	Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø3", conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, (Ref: Kanaflex ou similar)	m	35,00	18,95	663,12	35	386,03	277,09	663,12	100%
	26.03.59	Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø4", conforme norma: NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão, (Ref: Kanaflex ou similar)	m	55,00	28,53	1.569,25	50	1.030,74	395,85	1.426,59	91%
	26.03.60	Chave boia reguladora de nível - 15A / 250V grau de proteção IPX8	Un	2,00	47,51	95,03		-	-	-	0%
	27.01.59	Curva 90° roscável, raio longo. Diâmetro de Ø2", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	4,00	20,83	83,32		-	-	-	0%
	27.01.60	Curva 90° roscável, raio longo. Diâmetro de Ø3", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	1,00	62,18	62,18	1	60,78	1,40	62,18	100%
PREÇO TOTAL					5.787,777,77			90,217,38	113,195,44	903,413,12	100%
CUSTO TOTAL					4.744,080,14						


 SALVIO B. DE OLIVEIRA
 SALVIO B. DE OLIVEIRA
 CNPJ: 00.811.113/001-32
 SALVIO B. DE OLIVEIRA
 RUA DE FRENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	695
Data da emissão da nota	13/06/2014 11:15:26
Data do fato gerador	13/06/2014 11:15:26
Código de verificação	E8TKFQBGX

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA
 Nome/Razão social: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CPF/CNPJ: 00.521.113/0001-32 Inscrição municipal: 285
 Endereço: ROD SC 350- KM 001 / 100 Número: 2030 Bairro: VILA NOVA CEP: 88400-000
 Complemento:
 Município: Ituporanga UF: SC
 E-mail: departamentopessoal@salver.com.br Site:

Inscrição estadual: 253067871

Telefone:

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
 Nome/Razão social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
 CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23 Inscrição municipal:
 Inscrição estadual:
 Endereço: RUA ESTEVES JUNIOR Número: 395 Bairro: CENTRO CEP: 88015-905
 Complemento:
 Município: Florianópolis UF: SC
 E-mail: nfe@trt12.jus.br Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FORUM TRABALHISTA DE RIO DO SUL, CONFORME CONTRATO Nº CP 9235/2013.	303.413,1200	1,0000	303.413,1200	113.195,74x3,00=	3.395,87

VALOR MATERIAL: R\$ 190.217,38
 VALOR SERVIÇO : R\$ 113.195,74

MATRICULA RETENÇÃO INSS: CEI Nº 51.223.13906-79

12.451,53

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.961,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pgto à vista	Valor bruto = R\$ 303.413,12	Valor líquido = R\$ 296.055,40			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

21

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	190.217,38	113.195,74	3.395,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Rio do Sul

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 19.684,74 - (17,39%) - Fonte: IBPT

5,24% da obra
 20,36% a. municipal



Verificar autenticidade

NP 1164




Documento 141 do PROAD 9235/2013. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2014.RGMG.NMNV: KEIRA
<http://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento>

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 27/06/2014


JOÃO C. GODOY ILHA
Engenheiro CREA/SC 28.978-2
TRT 12ª Região - N.P. Obras


ALEXANDRE KOENIG S. THIAGO
Diretor do SEROM

ESTA MEDIÇÃO ESTÁ SENDO
ENVIADA FÍSICAMENTE, PARA
PAGAMENTO, VEZ QUE O PARAD
ESTÁ TRAMITANDO COM ADITIVA.

TERMO DE LIQUIDAÇÃO

Liquida-se o presente documento de
acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64.
O documento refere-se ao original da
1ª via, arquivado neste Setor.

Em 09/07/14


SIMONE BONATELLI CARDOSO
Técnico Judiciário

13061752

51-91

CP 9235/2013


ANGELA TEREZINHA TEIXEIRA
Assistente-Chefe do Setor de Liquidação
• Análise de Despesas



SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 - Bairro Vila Nova

CEP 88.400-000 - Ituporanga - Santa Catarina

CNPJ: 00.521.113/0001-32

Ituporanga – SC, 13 de junho de 2014

AO

TRIBUNAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Rua Esteves Junior, 395 - Centro

FLORIANÓPOLIS – SC

Ref.: Solicitação de Pagamento

Servimo-nos da presente para solicitar o Pagamento da Nota Fiscal nº 0695 em anexo, no valor de R\$ 303.413,12 (Trezentos e três mil, quatrocentos e treze reais e doze centavos) referente a 4ª medição da obra de Construção do imóvel destinado ao Fórum Trabalhista de Rio do Sul, conforme Contrato nº CP 9235/2013 firmado com este Tribunal.

Dados para depósito:

Caixa Econômica Federal


Agência: 1102 – Conta Corrente nº 60-6

Banco do Brasil

Agência : 1389-7 Conta Corrente nº 14.772-9

Sem mais para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente


SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.521.113/0001-32
SALVO PEDRO MACHADO
SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Salvo Pedro Machado
Sócio Gerente



237-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					15/07/2014	
Convênio					Agência/Código do cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL					ISSQN RETIDO 06/2014	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/07/2014		3447	CARNÊ	N	11/07/2014	47000344700
Processo/Ano		Cart.	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
988/2014		06	R\$			6.068,26
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto	
Original 6.068,26 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Retirar					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Correção 0,00 nova guia atualizada na prefeitura ou					(+/-) Correção/Multa/Juros	
Multa 0,00 através do site www.riodosul.sc.gov.br					(+/-) Outros Acréscimos	
Juros 0,00					(=) Valor Cobrado	
TOTAL 6.068,26						

Sacado:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (Cadastro: 17667)
RUA COELHO NETO, 35
Bairro: CENTRO
RIO DO SUL - SC CEP: 89160-155

2ª Via Internet
CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Destacar aqui



237-0

23790.36706 64700.034479 00009.000001 3 61250000606826

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					15/07/2014	
Convênio					Agência/Código do cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL					ISSQN RETIDO 06/2014	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/07/2014		3447	CARNÊ	N	11/07/2014	47000344700
Processo/Ano		Cart.	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
988/2014		06	R\$			6.068,26
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto	
Original 6.068,26 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Retirar					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Correção 0,00 nova guia atualizada na prefeitura ou					(+/-) Correção/Multa/Juros	
Multa 0,00 através do site www.riodosul.sc.gov.br					(+/-) Outros Acréscimos	
Juros 0,00					(=) Valor Cobrado	
TOTAL 6.068,26						

Sacado:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (Cadastro: 17667)
RUA COELHO NETO, 35
Bairro: CENTRO
RIO DO SUL - SC CEP: 89160-155

2ª Via Internet
CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Destacar aqui

LF 377

SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

11/07/14 13:27 NS - MES NORMAL USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 11Jul14 VALORIZACAO : 11Jul14 NUMERO : 2014NS003341
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
FAVORECIDO : 00521113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2014NP001164 DATA VENCIMENTO : 11Jul14
INVERTE SALDO : NAO
OBSERVACAO

Pagamento da nota fiscal 595 - Construção do prédio que abrigará o Fórum de Ri
o do Sul. Quarta medição representa 5,24 pp da obra, acumulado 20,36 pp - Códig
o do Projeto 11FF.- CP-9235/2013

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
591700	00521113000132		199720200		303.413,12
611060	2013NE001752	IM0080095	344905191	142119100	303.413,12
521244	2013NE001752		344905191		303.413,12
521462	2013NE001752	6147			17.749,66
531244	2013NE001752				36.269,45
521467	2013NE001752	2682	344905191		12.451,53
521472	2013NE001752				6.068,26

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 11Jul14 13:26
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

11/07/14 13:31

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 11Jul14 TIPO OB: 12

NUMERO : 2014OB803423

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00521113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BANCO : 001 AGENCIA : 1389 CONTA CORRENTE : 147729

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2014NP001164 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003568290-6 PROCESSO : CP-9235/2013

INVERTE SALDO : NAO VALOR : 267.143,67

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 695 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O FÓRUM DE RIO DO SUL. QUARTA MEDIÇÃO REPRESENTA 5,24 PP DA OBRA, ACUMULADO 20,36 PP - CÓDIGO DO PROJETO 11FF - CP-9235/2013

EVENTO INSCRIÇÃO 1	INSCRIÇÃO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	VALOR
--------------------	-------------	-----------	-----------	-------

531814 2013NE001752		344905191		267.143,67
---------------------	--	-----------	--	------------

561602 01000000000400D				267.143,67
------------------------	--	--	--	------------

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 11Jul14 13:28

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

11/07/14 13:30

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 11Jul14 TIPO OB: 59

NUMERO : 20140B803422

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2014NP001164 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003568288-4 PROCESSO : CP-9235/2013

INVERTE SALDO : NAO. VALOR : 6.068,26

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2014LF000377

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NF 695 - SALVER CONSTRUTORA

EVENTO INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1 CLASSIF:2	VALOR
531741 2013NE001752		344905191	6.068,26
541329 2013NE001752		344905191	6.068,26
561602 0100000000400D			6.068,26

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 11Jul14 13:28

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA
