

De: Eng. Adalberto Knoth
Para: Alexandre Koenig S. Thiago - Diretor do SPO

Assunto: ENCAMINHAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO DA OBRA (MEDIÇÃO FINAL) E DO REAJUSTE SOBRE A 18ª MEDIÇÃO

Processo: PROAD – CP 9235/2013

Prezado Diretor,

A empresa Salver apresentou as notas fiscais nº 501 e 537 referentes, respectivamente, a 18ª medição do contrato a medição do reajuste sobre a 18ª medição.

A 18ª medição contratual, corresponde à última medição dos serviços da obra, está sendo encaminhada somente agora pois estava pendente a complementação de informações, por parte da Salver, sobre a manutenção do elevador. Sendo que essas informações complementares foram entregues nessa semana.

Apesar de ser a última medição da obra, ainda resta um saldo de R\$ 22.900,11 para a Salver medir, pois esse valor é referente a reajuste contratual incidente sobre o Aditivo 02, sobre o Termo Circunstanciado 02 e sobre o Aditivo 03, sendo que esses reajustes foram formalizados recentemente.

O valor total da 18ª medição (nota fiscal nº 501) é de **R\$ 145.575,21 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos)**.

Já o valor total da medição do reajuste da 18ª medição da obra é de **R\$ 9.753,54 (nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)**, conforme nota fiscal nº 537.

Em anexo a esta medição foram incluídos os seguintes documentos no proad:

- Termo de recebimento provisório da obra (doc. 544);
- Planilha da 18ª medição (doc. 545).

Solicita-se providências aos setores competentes no sentido da conferência dos demais documentos entregues fisicamente, exigidos no contrato, bem como o encaminhamento ao pagamento do valor medido.

À sua consideração,

ADALBERTO KNOTH
Eng. Civil – CREA 124.968-3
Serviço de Projetos e Obras – SPO



Relatório de 12/09/2015 até 30/09/2015


Dados da Obra

Proposta	CP 9235/2013	Obra	Fórum Trabalhista de Rio do Sul
Data Início	27/01/2014	Data Prev. Término	16/10/2015
Contato	Sálvio	Email	licitacoes@salver.com.br
Telefone	(47) 35331777	Fax	(47) 35331777
Cliente	Fórum Trabalhista de Rio do Sul	Construtora	Salver Construtora e Incorporadora
Endereço	Rua Esteves Júnior, Centro, Florianópolis - 23		

Andamento da Obra

Total de Dias	627	100%
---------------	-----	------


Prazo Total da Obra



● Dentro do Prazo


No Prazo	Dias	%
Total	627	100,0%
Inoperante por Clima	0	0,0%
Inoperante por Ocorrência	0	0,0%

Inoperantes por Clima (No Prazo)



● Operante

Inoperantes por Ocorrência (No Prazo)



● Operante

Após Prazo	Dias	%
Pós-término:	0	0,0%
Inoperante por Clima (Após Prazo)	0	0,0%
Inoperante por Ocorrência (Após Prazo)	0	0,0%

Inoperantes por Clima (Apos Prazo)

Inoperantes por Clima (Apos Prazo)

15/09/2015	O dia todo	Dos 14 pedreiros anotados 2 são marceneiros, 9 são pavimentação e 2 são serralheiros Colocação do rodapé Colocação do rodapé de granito nas escadas internas Execução da entrada de energia (Ligação Elétrica pela CELESC) Execução da pavimentação externa com lajotas de concreto Execução das divisórias de vidro Execução da pintura interna e externa
16/09/2015	O dia todo	Dos 15 pedreiros anotados 4 são serralheiros, 9 são da pavimentação. Execução do sistema preventivo Execução do guarda corpo de inox escada e rampa de acesso principal Colocação de barro nos canteiros Instalação da luminárias Execução da pavimentação externa com lajotas de concreto
17/09/2015	O dia todo	Dos 15 pedreiros anotados 9 são da pavimentação, 4 são serralheiros. Execução do sistema preventivo contra incêndio Colocação de grama nos jardins, colocação dos postes externos no pátio Execução da pavimentação externa com lajotas de concreto Execução das divisórias de vidro
18/09/2015	O dia todo	Dos 15 pedreiros anotados 9 são da pavimentação, 4 são serralheiros Execução dos sistemas de prevenção contra incêndio. Execução do guarda corpo de inox. Execução da iluminação externa Enchimento dos canteiros com solo e plantio de grama Execução da pavimentação com paver Execução da pintura interna e externa
21/09/2015	O dia todo	Dos 15 pedreiros anotados 8 são da pavimentação, 3 são serralheiros, e dois são da informatica. Execução do sistema de prevenção contra incêndio Execução da pavimentação de lajotas e paver Execução do plantio de grama Execução da informatica Execução da pintura interna e externa
22/09/2015	O dia todo	Dos 15 pedreiros anotados 8 são da pavimentação, 3 são serralheiros, e dois são da informatica. Execução do sistema de prevenção contra incêndio Execução da pavimentação Execução do guarda corpo da rampa e escada frontal, Execução do plantio de grama Execução do rack de informatica Execução da pintura interna e externa
23/09/2015	O dia todo	Dos 15 pedreiros anotados são da pavimentação, 3 são serralheiros, 2 são da informatica. Execução dos quadros eletricos, Execução de acabamentos eletricos, Execução do sistema de prevenção contra incêndio Execução da pavimentação. Execução do guarda corpo da rampa e escada frontal execução do plantio de grama, Execução da pintura interna e externa
24/09/2015	O dia todo	Dos 15 pedreiros anotados 8 são da pavimentação, 3 são serralheiros, e dois da informatica, Execução dos quadros elétricos Execução de acabamentos elétricos, execução do sistema de prevenção contra incêndio, Execução da pavimentação, com lajotas e paver Execução do plantio de grama, Execução do rodapé da escada interna Execução do rack de informatica
25/09/2015	O dia todo	Execução do sistema de prevenção contra incêndio Execução do rack de informatica Execução do guarda corpo escada frontal Execução do plantio de grama Execução do rodapé escada interna execução das divisórias de vidro Execução de limpeza da obra
28/09/2015	O dia todo	Dos 15 pedreiros anotados, 8 são pavimentação, 3 são serralheiros, e dois informatica. Execução do rodapé de EPS Execução da pintura das portas Execução parte elétrica elevador Execução pintura paredes interna e externa Execução do corrimão interno Limpeza da obra Execução sistema preventivo
29/09/2015	O dia todo	Dos 16 pedreiros anotados: 8 são da pavimentação, 3 são serralheiros, 2 da informatica e 1 do elevador. Execução da instalação do elevador Execução da pintura interna e externa Execução do rack de informatica Execução do corrimão escada interna Execução da limpeza da obra Execução do sistema preventivo contra incêndio
30/09/2015	O dia todo	Dos 15 pedreiros anotados: 8 são da pavimentação, 3 são serralheiros, 2 são da informatica Execução da pintura interna e externa Execução da iluminação externa Execução do corrimão interno e externo Execução da pavimentação externa Execução do sistema preventivo contra incêndio Execução do canteiro frontal da obra Execução do gradil lateral Execução do rack de informatica

Clima

Ícone	Data	Hora	Clima	Descrição	Operante
☀️	14/09/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado	Sim
☀️	15/09/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo bom e praticavel	Sim
☀️	16/09/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo bom e praticavel	Sim
☁️	17/09/2015	O dia todo	Chuvoso	Pela manha chuva bem fraca, a tarde chuva forte, manha praticavel, a tarde impraticavel	Sim
☀️	18/09/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo bom noite chuva	Sim
☀️	22/09/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo bom e chuva a noite	Sim
☁️	23/09/2015	O dia todo	Chuvoso	Chuva fraca pela manha e a tarde tempo bom	Sim
☀️	24/09/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo bom	Sim
☁️	25/09/2015	O dia todo	Nublado	Nublado com intervalos de garoa	Sim
☀️	28/09/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo bom e praticável	Sim
☀️	29/09/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado e praticavel	Sim
☀️	30/09/2015	O dia todo	Ensolarado	Bom e praticável todo o dia	Sim

Fotos

14/09/2015 - Pavimentação



e

14/09/2015 - Pavimentação



Execução da pavimentação externa

15/09/2015 - Rodapés



e

15/09/2015 - Rodapés



Execução dos rodapés

15/09/2015 - Rodapés

16/09/2015 - Preventivo



Execução dos rodapés de granito nas escadas internas

16/09/2015 - Preventivo



E

16/09/2015 - Pavimentação



Execução do sistema preventivo contra incêndio

17/09/2015 - Grama



Execução da pavimentação

17/09/2015 - Grama



v

18/09/2015 - Grama



Plantiu da grama nos jardins

18/09/2015 - Grama



Plantio de grama nos jardins

18/09/2015 - Guarda corpo



Plantio de grama nos jardins

21/09/2015 - Informatica



Execução do guarda corpo da rampa e escada

21/09/2015 - Informatica



Execução do rack de informatica

22/09/2015 - Grama



Execução do rack de informatica

22/09/2015 - Grama



Plantio de grama

23/09/2015 - Escada



Plantio de grama
24/09/2015 - Rodapé



E

25/09/2015 - divisória

Execução dos corrimão e guarda corpo frontal
24/09/2015 - Rodapé



Execução do rodapé escada interna

25/09/2015 - divisória



d

28/09/2015 - c



Execução de divisórias de vidro

28/09/2015 - Corrimão



c



Execução do corrimão escadas interna

29/09/2015 - c



c

30/09/2015 - Pavimentação

29/09/2015 - Elevador



Montagem das partes mecânica e elétrica do elevador

30/09/2015 - Pavimentação



d



Pavimentação externa compactação do pátio frontal



Relatório gerado por Gerenciador de Obras e Projetos | www.obra24horas.com.br

Salvar Relatório



Relatório de 11/08/2015 até 07/10/2015

Dados da Obra


Proposta	CP 9235/2013	Obra	Fórum Trabalhista de Rio do Sul
Data Início	27/01/2014	Data Prev. Término	16/10/2015
Contato	Sálvio	Email	licitacoes@salver.com.br
Telefone	(47) 35331777	Fax	(47) 35331777
Cliente	Fórum Trabalhista de Rio do Sul	Construtora	Salver Construtora e Incorporadora
Endereço	Rua Esteves Júnior, Centro, Florianópolis - 23		

Andamento da Obra


No Prazo	Dias	%
Total	627	100%
Utilizados	618	99%
Restante	8	1%

Inoperante por Clima	Inoperante por Ocorrência
0	0
0,0%	0,0%

Inoperantes por Clima (No Prazo)



Inoperantes por Ocorrência (No Prazo)



Restante	8	1,3%
----------	---	------

Dados de Pessoal

Número de Pessoal na Obra

735

Dados de Serviço

Data	Hora	Descrição
11/08/2015	O dia todo	Execução viga frontal para gradil Execução e colocação de aparelhos de ar condicionado Execução e colocação cubas banheiros Execução e colocação de disjuntores e acabamento na subestação
12/08/2015	O dia todo	Execução de meio fio das calçadas e canteiros externos Execução da base de pavimentação com pó de brita Execução de reparos da pintura paredes de dry wall Instalação dos aparelhos de ar condicionado
13/08/2015	O dia todo	Execução do meio fio das calçadas externas Execução da base da pavimentação com pó de brita Execução da passagem de fios no pavto térreo Execução do trilho do portão da entrada frontal Execução de reparos na pintura das paredes de dry wall
14/08/2015	O dia todo	Execução do meio fio das calçadas Execução da base de pavimentação com pó de brita Execução pintura das portas de madeira Execução da instalação dos aparelhos de ar condicionado pavto térreo
17/08/2015	O dia todo	Execução do meio fio das calçadas e canteiros externos Execução da base para pavimentação externa Execução de reparos na pintura paredes de dry wall Instalação aparelhos ar condicionado pavto térreo
18/08/2015	O dia todo	Dos 6 pedreiros anotados 2 são calçeteiros. Execução dos meios fios calçadas e canteiros externos Execução de pintura portas de madeira Execução de limpeza canteiro de obras Execução da base para pavimentação externa
20/08/2015	O dia todo	Dos 10 pedreiros anotados 5 são serralheiros/divisória, 4 são da pavimentação. Execução do meio fio das calçadas do pátio externo, Execução da instalação dos aparelhos de renovação de ar Execução da regularização do terreno com pó de brita Execução da colocação da forra e vista e

		fundo elevador Execução da colocação da estrutura para fixação das divisórias de vidro Execução da pintura interna e externa
21/08/2015	O dia todo	Execução de meio fio calçadas do pátio externo Execução estrutura das divisórias de vidro pavto térreo Execução do nivelamento do terreno Execução maquinas de ar condicionado Execução pintura externa e interna
24/08/2015	O dia todo	Dos 8 pedreiros anotados 5 são da pavimentação, 2 são serralheiros. Execução do meio fio das calçadas execução da pintura interna e esterna Execução do revestimento de granito na rampa de entrada Execução da passagem dos cabos elétricos. Foi decidido em uma visita do engº Alexandre que as aletas da grelha de insulfamento de ar poderia ser coladas com cola de contato, foram adaptadas para ser utilizadas as grelhas que estavam no canteiro de obras
25/08/2015	O dia todo	Dos 11 pedreiros anotados 7 são da pavimentação, 3 são serralheiros. Execução do nivelamento do pátio com pó de brita Execução da pavimentação com paver e lajota Execução da passagem de cabos elétricos Execução das divisórias de vidro
26/08/2015	O dia todo	Dos 10 pedreiros anotados 7 são pavimentação , 2 serralheiros. Execução do nivelamento mecânico com pó de brita Execução do pavimento das calçadas de acesso com paver Execução da passagem de cabos de entrada eletrica Execução divisórias de vidro Execução da pintura interna e externa Execução montagem das louças sanitárias nos banheiros
27/08/2015	O dia todo	Dos 10 pedreiros anotados 2 são serralheiros, 7 pavimentação Execução e regularização com pó de brita e colocação de paver Execução da instalação dos aparelhos de ar condicionado Execução da colocação de divisórias de vidro Execução da pintura interna das escadas Execução da colocação dos mictórios e vasos sanitários Execução da passagem de fios da entrada de energia.
28/08/2015	O dia todo	Dos 13 pedreiros anotados 4 são serralheiros, 2 comunicação visual, 5 colocadores de forro dry wall. Execução da colocação do totem e letreiro da fachada Execução dos reparos da caixas de agua pluviais Execução das divisórias de vidro do térreo. Execução de pavimentação com paver e lajota Montagem das louças nos banheiros. Pintura nas escadas
31/08/2015	O dia todo	Dos 12 pedreiros anotados, 5 são pavimentação, 5 colocadores de forro dry wall. Execução do forro de gesso nos banheiros Execução da pavimentação com paver e lajota Execução sanitárias e conjunto para especiais Nivelamento da base para colocação do pavimento externo
01/09/2015	O dia todo	Dos 13 pedreiros anotados 5 são pavimentação, 5 colocadores de forro de dry wall. Execução do forro de gesso acartonado das banheiros do térreo Execução da pavimentação com paver e lajotas Execução da colocação de toalheiros e louça sanitários Execução do cobrimento do forro com lâ de vidro
02/09/2015	O dia todo	Dos 11 pedreiros anotados 5 são colocadores de forro de dry wall, 4 pavimentação. Execução do forro das varandas Execução do pavto com paver garagem Execução de pavto com lajota patio Execução da instalação dos cassetes Espalhamento de terra nos canteiros Colocação dos extintores Montagem das maquinas de ar condicionado
03/09/2015	O dia todo	Execução de gesso acartonado e fibromineral Execução da pavimentação do pétió com lajotas Execução da pintura interna Execução da passagem de cabos Execução dos chumbadores da porta automática Execução nivelamento das caixas de passagem junto as calçadas
04/09/2015	O dia todo	Dos 15 pedreiros anotados 8 são da pavimentação e 5 de forro. Execução da pavimentação com lajotas Execução dos ralos e contrapiso da floreira externa Execução do forro de pvc nos depósitos de ar condicionado Execução da pintura interna
08/09/2015	O dia todo	Dos 11 pedreiros anotados 5 são calceteiros, 4 são colocadores de piso vinilico. Execução do piso vinilico Execução da pavimentação de lajotas Execução da instalação dos aparelhos de ar condicionado Execução da pintura interna Execução da limpeza da obra
09/09/2015	O dia todo	Dos 17 pedreiros anotados 9 são calceteiros, 4 são serralheiros, 2 colocadores de piso vinilico Execução da instalação dos aparelhos de ar condicionado Execução de acabamento do forro da marquize metálica frontal Execução do piso vinilico Execução do gradil lateral Colocação do guarda corpo escada frontal Execução da fiação elétrica pavto térreo
10/09/2015	O dia todo	Dos 11 pedreiros anotados 9 são colocadores de lajota de concreto. Execução da instalação dos aparelhos de ar condicionado no térreo Execução da pavimentação externa com lajotas de concreto Execução de luminarias nas escadas Colocação das vista nas portas Execução da pintura interna Colocação dos mastros
11/09/2015	O dia todo	Dos 11 pedreiros anotados 9 são colocadores de lajotas. Execução da passagem dos cabos de lógica nos 3 pavtos Execução da instalação dis sífãos e limpeza dos bwcs Execução da pavimentação com lajotas Execução da pintura externa Colocação das vista nas portas interna Fixação do gradil de extrema
15/09/2015	O dia todo	Dos 14 pedreiros anotados 2 são marceneiros, 9 são pavimentação e 2 são serralheiros Colocação do rodapé Colocação do rodapé de granito nas escadas internas Execução da entrada de energia (Ligação Elétrica pela CELESC) Execução da pavimentação externa com lajotas de concreto Execução das divisórias de vidro Execução da pintura interna e externa
16/09/2015	O dia todo	Dos 15 pedreiros anotados 4 são serralheiros, 9 são da pavimentação. Execução do sistema preventivo Execução do guarda corpo de inox escada e rampa de acesso principal Colocação de barro nos canteiros Instalação da luminárias Execução da pavimentação externa com lajotas de

		concreto
17/09/2015	O dia todo	Dos 15 pedreiros anotados 9 são da pavimentação, 4 são serralheiros. Execução do sistema preventivo contra incêndio Colocação de grama nos jardins, colocação dos postes externos no pátio Execução da pavimentação externa com lajotas de concreto Execução das divisórias de vidro

Clima					
Ícone	Data	Hora	Clima	Descrição	Operante
	11/08/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado, e praticavel	Sim
	12/08/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo bom e praticável	Sim
	13/08/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado e praticável	Sim
	14/08/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado e praticável	Sim
	17/08/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado e praticável	Sim
	18/08/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado e praticável	Sim
	19/08/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado e praticavel	Sim
	20/08/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo bom e praticavel	Sim
	21/08/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo bom e praticável	Sim
	24/08/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo bom e praticável	Sim
	25/08/2015	O dia todo	Ensolarado	Das todo bom e praticável	Sim
	26/08/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo bom e praticável	Sim
	27/08/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo nublado e praticável	Sim
	28/08/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo bom e praticável	Sim
	31/08/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo bom e paraticável	Sim
	01/09/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo bom e praticável	Sim
	02/09/2015	O dia todo	Ensolarado	Pela manha bom a tarde chuva modera impraticavel	Sim
	03/09/2015	O dia todo	Chuvoso	Dia todo chuva moderada	Sim
	04/09/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo bom e praticável	Sim
	08/09/2015	O dia todo	Nublado	Dia todo nublado noite chuva forte	Sim
	10/09/2015	O dia todo	Nublado	Dia todo nublado	Sim
	11/09/2015	O dia todo	Nublado	Dia todo nublado	Sim
	14/09/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo ensolarado	Sim
	15/09/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo bom e praticavel	Sim
	16/09/2015	O dia todo	Ensolarado	Dia todo bom e praticavel	Sim
	17/09/2015	O dia todo	Chuvoso	Pela manha chuva bem fraca, a tarde chuva forte, manha praticavel, a tarde impraticavel	Sim

Comentários de Aprovação dos Dias				
Dia	Data Realizada	Ação	Comentário	Usuário
11/08/2015	18/08/2015	Aprovado	visto	JOAO CARLOS GODOY ILHA
12/08/2015	18/08/2015	Aprovado	observar a colocação de brita junto ao prédio para evitar umidade ascendente do solo para o reboco!	JOAO CARLOS GODOY ILHA
13/08/2015	18/08/2015	Aprovado	visto	JOAO CARLOS GODOY ILHA
14/08/2015	18/08/2015	Aprovado	visto	JOAO CARLOS GODOY ILHA
17/08/2015	03/09/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
18/08/2015	03/09/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
19/08/2015	03/09/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
20/08/2015	03/09/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
21/08/2015	03/09/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
24/08/2015	21/09/2015	Aprovado	consta observação quanto a alteração das grelhas de insuflamento	JOAO CARLOS GODOY ILHA
25/08/2015	21/09/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
26/08/2015	21/09/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
27/08/2015	21/09/2015	Aprovado	vistoria de obra, anotacoes no diário físico	JOAO CARLOS GODOY ILHA
28/08/2015	21/09/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
31/08/2015	21/09/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
01/09/2015	21/09/2015	Aprovado	visto virtual	JOAO CARLOS GODOY ILHA
02/09/2015	21/09/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
03/09/2015	21/09/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
04/09/2015	21/09/2015	Aprovado	observar as legendas e fotos repetidas. Grato	JOAO CARLOS GODOY ILHA

08/09/2015	21/09/2015	Aprovado	visto virtual	JOAO CARLOS GODOY ILHA
09/09/2015	21/09/2015	Aprovado	visto, boas fotos!	JOAO CARLOS GODOY ILHA
10/09/2015	21/09/2015	Aprovado	ok visto virtual	JOAO CARLOS GODOY ILHA

Fotos

11/08/2015 - Banheiros



Colocação do granito BWCs, bem como divisórias

11/08/2015 - Banheiros



Colocação do granito BWCs, bem como divisórias

12/08/2015 - meio Fio



Execução de maeio fio calçadas

13/08/2015 - Meio fio

12/08/2015 - meio Fio



Execução de maeio fio calçadas

14/08/2015 - Ar



Execução de meio fio

14/08/2015 - Ar



Montagem de aparelhos de ar condicionado

17/08/2015 - Meio fio



Montagem de aparelhos de ar condicionado

17/08/2015 - Meio fio



E

17/08/2015 - Base



Execução de meio fio calçadas

19/08/2015 - Nivelamento terreno



Execução da base para pavimentação

19/08/2015 - Nivelamento terreno



n

20/08/2015 - Forra



Nivelamento do terreno com pó de brita

20/08/2015 - Forra



Colocação das forras do elevador

21/08/2015 - Maquinas



Colocação das forras do elevador

21/08/2015 - Maquinas



colocação de maquinas de ar condicionado

24/08/2015 - f



f

25/08/2015 - f

colocação de maquinas de ar condicionado

24/08/2015 - Revestimento da Rampa



Revestimento de granito rampa de acesso

25/08/2015 - Pavimentação



f

26/08/2015 - h



Pavimentação com paver calçadas de acesso

26/08/2015 - divisórias de vidro



h

27/08/2015 - m



Execução das divisórias de vidro pavto térreo

27/08/2015 - ar condicionado



m

28/08/2015 - Meio fio



Execução e montagem dos aparelhos de ar condicionado

28/08/2015 - Pintura



m

31/08/2015 - Nivelamento



Pintura interna escadas

31/08/2015 - Lajotas



Nivelamento cancha para pavimento

01/09/2015 - m



Execução pavimento com lajotas

01/09/2015 - Gesso



m

02/09/2015 - Forro



Execução de forro de gesso acartonado banheiros

02/09/2015 - Pavimentação



m

03/09/2015 - m



Execução do pavimento de paver garagem

03/09/2015 - Forro



m

03/09/2015 - Pavimentação



Execução de forro fibromineral

04/09/2015 - m



Execução de pavimentação com lajotas

04/09/2015 - Forro



Execução do forro de pvc garagem

08/09/2015 - Piso



Execução piso vinílico

09/09/2015 - Guarda Corpo



Colocação do guarda corpo

10/09/2015 - c

m

08/09/2015 - Piso



Execução piso vinílico

09/09/2015 - Piso



Colocação piso vinílico

09/09/2015 - Guarda Corpo



Colocação do guarda corpo

10/09/2015 - Pavimentação



c

11/09/2015 - Gradil



Execução da pavimentação externa

14/09/2015 - Pavimentação



Fixação gradil extrema lateral

14/09/2015 - Pavimentação



e

15/09/2015 - Rodapés



Execução da pavimentação externa

15/09/2015 - Rodapés



e

15/09/2015 - Rodapés



Execução dos rodapés

16/09/2015 - Preventivo



Execução dos rodapés de granito nas escadas internas

16/09/2015 - Preventivo




E

16/09/2015 - Pavimentação



Execução do sistema preventivo contra incêndio

17/09/2015 - Grama

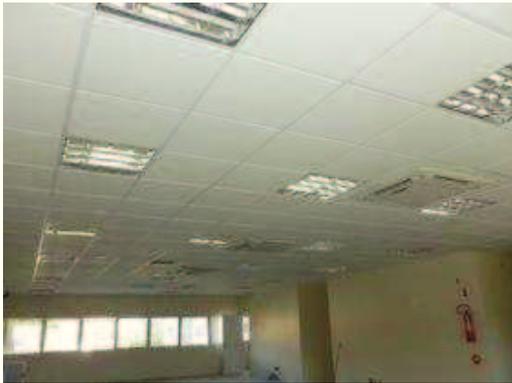

Execução da pavimentação

17/09/2015 - Grama



v



Plantiu da grama nos jardins



Relatório gerado por Gerenciador de Obras e Projetos | www.obra24horas.com.br

Salvar Relatório



SALVER

Construtora e Incorporadora

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777

E-mail: licitacoes@salver.com.br

Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 - Bairro Vila Nova
CEP 88.400-000 - Ituporanga - Santa Catarina
CNPJ: 00.521.113/0001-32

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SANTA CATARINA

Objeto: Construção do Imóvel destinado a nova sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul

Data: 12/11/2013

BDI: 22,00%

Planilha Orçamentária


BDI Equipamentos: 13,00%

Planilha Orçamentária

19ª MEDIÇÃO - 25/02/2016													
GRUPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	Quantidade	Material	Material c/ BDI	Mão de Obra	Mão de Obra c/ BDI	Total	%
Portas Galvanizado	12.02.05	(P17) - Portão de correr, 01 folha em aço galvanizado 4,00 x 2,00 m, com perfil metálico quadrado 2", pintura eletrostática com tela soldada, fixada em cantoneira metálica 50 x 50 mm, roldanas com dois rolamentos, cava "U" com suporte, trilhos em aço ga	m ²	8,40	582,41	4.892,25	8,40	2.441,39	2.978,49	1.617,17	1.972,94	4.892,25	100%
	12.02.05.01	(P19) - Portão de correr, 01 folha em aço galvanizado, 3,50 x 2,00 m, com perfil metálico quadrado 2", pintura eletrostática com tela soldada, fixada em cantoneira metálica 50 x 50 mm, roldanas com dois rolamentos, cava "U" com suporte, trilhos em aço ga	m ²	7,00	582,41	4.076,88	7,00	2.034,49	2.482,07	1.347,64	1.644,12	4.076,87	100%
	12.02.05.02	(P20) - Portão de correr, 01 folha em aço galvanizado, 1,70 x 2,00 m, com perfil metálico quadrado 2", pintura eletrostática com tela soldada, fixada em cantoneira metálica 50 x 50 mm, roldanas com dois rolamentos, cava "U" com suporte e trilhos em aço ga	m ²	3,40	582,41	1.980,20	3,40	988,18	1.205,58	654,57	798,57	1.980,20	100%
FERRAGENS	E												#DIV/0!
ACESSÓRIOS	12.03					9.358,65							0%
FECHADURAS	12.03.01					5.131,71							0%
	12.03.01.01	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	38,00	99,10	3.765,73	2,00	109,09	133,09	55,02	67,12	198,20	100%


	21.01.03	Anel em textura em borracha flexível preto para corrimão até 2 1/2", instalado 1,00 antes das extremidades do mesmo.	Un	12,00	39,77	477,29	12,00	264,34	322,50	130,80	159,58	477,29	100% #DIV/0!
REVESTIMENTO RESISTENTE IMPACTOS	21.03					462,42							0%
	21.03.01	Proteção das portas com chapa de aço inox esp. 2 mm, instalada até a altura de 40 cm, incluindo fixação e pintura com 01 demão de zarcão e 02 demãos de esmate sintético na cor branco gelo	m²	3,84	120,42	462,42	3,84	259,88	317,05	122,84	149,87	462,42	100% #DIV/0!
	21.04					8.971,35							0%
PISO TÁTIL	21.04.01	Piso tátil direcional em placas de borracha 25 x 25 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, cor azul, assentado sobrepostas ao piso existente,	m²	12,50	134,06	1.675,69	6,50	97,79	119,30	635,51	775,32	871,36	100%
	21.04.02	Piso tátil alerta em placas de borracha 25 x 25 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, cor azul, assentado sobrepostas ao piso existente,	m²	10,25	134,06	1.374,07	5,25	78,98	96,36	513,29	626,22	703,79	100% #DIV/0!
						21.277,53							0%
COMUNICAÇÃO VISUAL	22					8.934,67							0%
TOTÊM	22.01												
	22.01.01	Totem com estrutura metálica triangular de 0,60 x 0,60 x 0,62 m, h = 3,61 m, revestido de ACM alumínio composto, com 02 chapas de alumínio de 0,80 x 3,00 m atravessando horizontalmente a estrutura com a inscrição 'FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ' e brasão d	Cj.	1,00	8.934,67	8.934,67	1,00	5.126,45	6.254,27	2.265,00	2.763,30	8.934,67	100% #DIV/0!
													0%
LETREIRO E BRASÃO	22.02					12.342,86							
	22.02.01	Letreiro em caixa em aço galvanizado com pintura na cor preto, com inscrição 'JUSTIÇA DO TRABALHO' 'FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ', altura das letras de 35,0 cm e altura da caixa de 30 mm, incluindo fixação na fachada, conforme projeto e memorial descriti	Cj.	1,00	5.715,82	5.715,82	1,00	3.337,77	4.072,08	1.389,00	1.694,58	5.715,82	100%
	22.02.02	Brasão do TRT de 1,70 x 2,00 m, serigrafado sobre chapa em aço inoxidável com acabamento escovado, incluindo fixação na fachada, conforme projeto e memorial descritivo.	Cj.	1,00	6.627,04	6.627,04	1,00	3.802,40	4.638,93	1.680,00	2.049,60	6.627,04	100% #DIV/0!

25.04.01	Iluminação de emergência autônoma instalada na parede, teto ou forro com lâmpada fluorescente compacta, nível de iluminamento mínimo de 3 lux	Un	74,00	108,27	8.011,93	39,00	3.178,10	3.877,28	291,72	355,90	4.222,50	100%
25.04.02	Iluminação de emergência autônoma instalada na parede ou teto, duas lâmpadas fluorescente 9W, nível de iluminação 5 lux, conforme memorial e detalhes em projeto	Un	6,00	123,10	738,58	3,00	280,93	342,74	22,44	27,38	369,29	100%
25.04.03	Plaqueta autônoma de indicação de "SAÍDA" luminosa de LED na cor vermelha com fundo branco, fixada na parede/porta, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	9,00	63,81	574,28	4,00	175,34	213,91	34,92	42,60	255,24	100%
25.04.04	Plaqueta autônoma de indicação de "SAÍDA" com SETA luminosa de LED na cor vermelha com fundo branco, fixada na parede/porta, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	3,00	63,81	191,43	1,00	43,83	53,48	8,73	10,65	63,81	100%
25.04.05	Plaqueta de indicação de "SAÍDA" luminosa nos dois versos na cor vermelha com fundo branco, instalada no teto através de suporte metálico, autônoma, LED, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	7,00	169,65	1.187,57	4,00	507,85	619,58	49,88	60,85	678,61	100%
25.04.06	Botãoira (quebra vidro/push-button) com led vermelho sistema ativado, led verde em manutenção, botão NF e vidro frontal, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	4,00	105,32	421,29	2,00	158,63	193,53	14,46	17,64	210,65	100%
25.04.07	Detector automático de fumaça óptico, com raio de ação de 60 m ² , conforme projeto e memorial descritivo.	Un	88,00	212,40	18.690,90	44,00	7.351,63	8.968,99	318,12	388,11	9.345,45	100%
25.07.05	Guarda corpo em tubo de aço galvanizado 1.1/2", com longarinas 1/2", incluindo pintura com fundo em supergalvite e 02 demãos de tinta esmalte sintético, incluindo parafusos, suportes e acessórios para instalação, conforme projeto e memorial descritivo	m	4,80	369,49	1.773,57	4,80	805,81	983,09	667,97	814,92	1.773,57	100%
25.08.01	Placa indicativa com o número de pavimento	Un	3,00	31,38	94,16	3,00	75,08	91,60	2,16	2,64	94,15	100%
25.08.02	Placa de PVC rígido fotoluminescente indicando "SAÍDA", dimensão 24,0 x 12,0 cm	Un	3,00	52,85	158,55	3,00	126,00	153,72	4,08	4,98	158,55	100%
Corrimões e Guarda												
Corpos												
0%												
Diversos												
#DIV/0!												
0%												
100%												


SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Valquíria da Cunha
 Engenheira Civil CREA/SC 52.038658-6

	30.01	Plântio de grama sempre verde em placas incluindo fornecimento, terra preta espessura 3 cm e plantio.	m2	468,46	15,27	7.151,45	468,46	4.971,20	6.064,87	918,18	1.120,18	7.151,44	100% #DIV/0!
SERVIÇOS EXTERNOS	31					173.157,39							0%
PAVIMENTAÇÃO LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO	31.01	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	471,17	26,21	12.350,46	230,00	3.667,76	4.474,67	1.313,30	1.602,23	6.028,83	100%
	31.05	Limitadores de vaga em concreto pré-moldado, tipo prisma de concreto bate-roda, com largura de 100 cm, altura de 13 cm, pintados com 03 (três) demãos de tinta Novacor Piso Ultra da Sherwin Williams na cor Amarelo Demarcação.	Un	10,00	40,67	406,74	10,00	236,00	287,92	100,40	122,49	406,73	100%
	31.06	Lastro de brita espessura de 6 cm para estacionamento inclusive transporte	M3	129,66	105,38	13.663,93	7,24	551,83	673,24	75,96	92,68	763,13	100% #DIV/0!
CAIÇADAS EXTERNAS FRENTE PARA RUAS	31.03					3.371,21							0%
	31.03.06	FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.	M2	28,27	41,05	1.160,56	28,27	374,86	457,33	594,24	724,97	1.160,54	100%
	31.03.07	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	4,23	394,26	1.666,79	4,23	1.221,04	1.489,67	150,46	183,56	1.667,73	100%
	31.03.08	DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=3,50M	M2	28,27	10,67	301,77	28,27	-	-	255,00	311,09	301,76	100% #DIV/0!
MUROS, PORTÕES E GRADIL DE FECHAMENTO	31.05					103.981,39							0% #DIV/0!
DESPESAS FINAIS	32					14.339,63							0% #DIV/0!
	32.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.970,20	1,59	3.124,26	1.970,20	248,44	303,10	2.383,94	2.908,41	3.124,26	100%
	32.02	Projeto as built completo de todos os projetos da edificação.	m²	1.970,20	3,88	7.647,44	1.970,20	152,89	186,52	6.304,64	7.691,66	7.647,43	100%

32.03	Habite-se	m³	1.970,20	1,25	2.471,43	1.970,20	2.025,76	2.471,43	-	2.471,43	100%	
	Ligação de esgoto completa, com tubo de PVC											
32.04	branco Ø 100 mm, no eixo	UN	1,00	799,31	799,32						100%	
32.05	Ligação de água a rede pública	UN	1,00	297,18	297,18	1,00	78,25	95,46	170,45	207,95	100%	
	PREÇO TOTAL				5.787.777,77			R\$ 104.987,12		R\$ 40.588,09	R\$ 145.575,21	281%
	CUSTO TOTAL				4.744.080,14							


SANAVIER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Representada por
 Engenheiro Civil CREA/SC 52.048/SC-6

___ SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

11/05/16 19:12

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 11Mai16 TIPO OB: 59

NUMERO : 2016OB801994

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2016NP000789 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002147687-X

PROCESSO : CP-9235/2013

VALOR : 1.493,15

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2016LF000250

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 11/05/16

RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NF 501 E 537 - SALVER CONSTRUTORA - PRINCIPAL R\$ 1.164,60 - MULTA R\$ 219,06 JUROS 23,99 E PRINCIPAL R\$ 78,03 MULTA R\$ 6,69 E JUROS R\$ 0,78

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA



11/05/16 19:12 USUARIO : GAMBA
 DATA EMISSAO : 11Mai16 TIPO OB: 59 NUMERO : 2016OB801994
 UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
 BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
 BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA
 VALOR : 1.493,15
 L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
 01 401006 2015NE002036400 44905191 1.493,15
 02 531741 2015NE002036 1.493,15
 03 561602 0181151130400D 1.493,15

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 11Mai16 14:30
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

11/05/16 19:12 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 11Mai16 TIPO OB: 12 NUMERO : 2016OB801995
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00521113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 1389 CONTA CORRENTE : 147729
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2016NP000789 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002147695-0 PROCESSO : CP-9235/2013
VALOR : 142.172,20

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 501 E 537 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O FÓ-
RUM TRABALHISTA DE RIO DO SUL - . CÓDIGO DO PROJETO 11FF - 18A. MEDIÇÃO. PROAD
9235/2013.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

11/05/16 19:12

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 11Mai16 TIPO OB: 12

NUMERO : 2016OB801995

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00521113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BANCO : 001 AGENCIA : 1389 CONTA CORRENTE : 147729

VALOR : 142.172,20

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401006	2015NE002036400		44905191	
----	--------	-----------------	--	----------	--

142.172,20

02	531814	2015NE002036	213110400	44905191	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

142.172,20

03	561602	0181151130400D			
----	--------	----------------	--	--	--

142.172,20

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 11Mai16 14:31

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

11/05/16 19:12

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 11Mai16 VENCIMENTO: 11Mai16 NUMERO : 2016DF800590
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
CONTRIBUINTE : 00521113/0001-32 - SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : CP-9235/2013 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2016NP000789
PERIODO APURACAO : 11Mai16 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES : BASE DE CALCULO : 155328,75
RECEITA : 9.086,73
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 11/05/16
TOTAL : 9.086,73

OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuições sociais retidas nf 501 e 537

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 11Mai16 14:31

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

11/05/16 19:12

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 11Mai16

NUMERO : 2016GP800126

UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO

RECOLHEDOR : 512231390679

CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI

COMPETENCIA : FEV16

RECURSO : 3

PROCESSO : CP-9235/2013

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2016NP000789 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 3582 , EM 11/05/16

VALOR INSS : 2.038,05

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS : 391,70

TOTAL : 2.429,75

OBSERVACAO

Recolhimento de contribuição previdenciária retida nf 501

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 11Mai16 14:31

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

11/05/16 19:13

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 11Mai16

NUMERO : 2016GP800127

UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO

RECOLHEDOR : 512231390679

CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI

COMPETENCIA : MAR16

RECURSO : 3

PROCESSO : CP-9235/2013

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2016NP000789 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 3582 , EM 11/05/16

VALOR INSS : 136,55

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS : 10,37

TOTAL : 146,92

OBSERVACAO

Recolhimento de contribuição previdenciária retida nf 537

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 11Mai16 14:31

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SETOR DE LIQUIDAÇÃO E ANÁLISE DA DESPESA



TERMO DE LIQUIDAÇÃO SELCO/SELAD

Liquida(m)-se o(s) documento(s) abaixo relacionado(s) conforme Nota de Empenho, classificação da despesa e valor(es) informado(s) e em conformidade com o contrato próprio, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320 de 17/03/1964.

Processo: CP-9235/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE RIO DO SUL.

Fornecedor: SALVER EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA (00.521.113/0001-32)

Classificação: 449051-91 (OBRAS EM ANDAMENTO)

Nota de Empenho	Ano	Data da Liquidação	Observação	Competência	Documento	Unidade	Valor
2036	2015	10/05/16	REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE 18ª MEDIÇÃO	12/2015	NFE. 537	FTRSUL	9.753,54
2036	2015	10/05/16	18ª MEDIÇÃO	12/2015	NFE. 501	FTRSUL	145.575,21
Sub-Total:							155.328,75
Total:							155.328,75

Certifico que, referente a competência da(s) liquidação(ões) acima relacionada(s), os documentos exigidos em contrato encontram-se atualizados, mantidas as condições de habilitação da licitação.

Florianópolis-SC, 10 de May de 2016.


SÉRGIO BONATELLI CARDOSO
Técnico Judiciário



Documento 551 do PROAD 9235/2013. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2016.MPBP.PLMP:
<http://www.trt12.jus.br/proad/f/t/consultardocumento>



SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

CNPJ: 00.521.113/0001-32

RUA LEONEL THIESEN, 2030 Bairro: Vila Nova

ITUPORANGA - SC CEP: 88400-000

Fone: 35331274 Fax: 35331777

Email: licitacoes@salver.com.br Insc. Municipal: 285 Insc. Estadual: 253.067.871

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e

Data Emissão:
24/02/2016Hora:
10:19:22Número:
501Situação:
EmitidoAutenticidade:
018167000827410

TOMADOR DO SERVIÇO

RAZÃO SOCIAL:	TRT 12 REGIAO - SANTA CATARINA	CPF/CNPJ:	02.482.005/0001-23
ENDEREÇO:	RUA: ESTEVES JUNIOR	Nº:	395
BAIRRO:	CENTRO	CEP:	89160-155
CIDADE:	FLORIANOPOLIS	UF:	SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço:	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702 - VALOR REFERENTE A 18ª MEDICÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FORUM TRABALHISTA DE RIO DO SUL, CONFORME CONTRATO Nº CP 9235/2013. VALOR MATERIAL: R\$ 87.345,13 VALOR SERVIÇO : R\$ 58.230,08 MATRÍCULA DE RETENÇÃO INSS: CEI Nº 51.223.13906-79. ALÍQUOTA DE RETENÇÃO DO INSS 3,5% CFE ART 7º DA LEI Nº 12546 E LEI Nº 12844/2013	8291	2.00 %	TRBCRF	145.575,21	87.345,13	1.164,60

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota
58.230,08	1.164,60	1.164,60	0,00	145.575,21
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	2.038,05	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e

NFs-e emitida através da Internet, administrada por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:

- 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço:

8291 - RIO DO SUL - SC

Outras Informações:

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF.

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 68/2014 de 02/10/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/03/2016.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 19.579,87 (13,45%), Estaduais R\$ 0,00 (0,00%), Municipais R\$ 4.585,62 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

BASE DE CALCULO DO ISS É VALOR DOS SERVIÇOS DESTACADOS NO CORPO DA NOTA FISCAL CFE LIMINAR PROCESSO Nº 0302535-27.2014.8.24.0054

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Certifico que os serviços/materiais especificados na presente nota/fatura foram efetivamente prestados/entregues.

Em 06/05/2016

Adalberto Knuth

Adalberto Knuth

Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC: 124.938-3

Alexandre Koenig S. Thiago
Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

TERMO DE LIQUIDAÇÃO

Liquida-se o presente documento de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64. O documento refere-se ao original da 1ª via, arquivado neste Setor.

Em 10/05/16

Sebastião Donatelli Cardoso
SEBASTIÃO DONATELLI CARDOSO
Téc. de Apoio Judiciário

		SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CNPJ: 00.521.113/0001-32 RUA LEONEL THIESEN, 2030 Bairro: Vila Nova ITUPORANGA - SC CEP: 88400-000 Fone: 35331274 Fax: 35331777 Email: licitacoes@salver.com.br Insc. Municipal: 285 Insc. Estadual: 253.067.871				
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e						
Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:		
22/03/2016	16:30:39	537	Emitido	0181670000877950		
TOMADOR DO SERVIÇO						
RAZÃO SOCIAL:	TRT 12 REGIAO - SANTA CATARINA			CPF/CNPJ:	02.482.005/0001-23	
ENDEREÇO:	RUA: ESTEVES JUNIOR			Nº:	395	
BAIRRO:	CENTRO			CEP:	89160-155	
CIDADE:	FLORIANÓPOLIS			UF:	SC	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço:	Local Prest.	Aliquota	Sit.Trnb.	Vlr.Trib.	Dedução	Vlr.ISSRF
702 - VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº CP 9235/2013. REAJUSTE MATERIAL: R\$ 5.852,12 REAJUSTE SERVIÇO : R\$ 3.901,42 MATRÍCULA RETENÇÃO INSS: CEI Nº 51.223.13906-79	8291	2,00 %	TRBCRF	9.753,54	5.852,12	78,03
Base de Cálculo		Valor.ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota	
3.901,42		78,03	78,03	0,00	9.753,54	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
0,00	136,55	0,00	0,00	0,00		
 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e NFs-e emitida através da Internet, administrada por: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA			
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:						
702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).						
Legenda do local da prestação do serviço:						
8291 - RIO DO SUL - SC						
Outras informações:						
TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF.						
(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.						
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 68/2014 de 02/10/2014.						
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/04/2016.						
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net						
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 1.311,85 (13,45%), Estaduais R\$ 0,00 (0,00%), Municipais R\$ 307,24 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.						
BASE DE CALCULO DO ISS E O VALOR DOS SERVIÇOS DESTACADOS NO CORPO DA NOTA FISCAL CFE LIMINAR PROCESSO Nº 0302535-27.2014.8.24.0054.						

Documento seguro, emitido com geração automática no servidor de banco de dados do Município.

6,7%

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 31/03/2016

Adalberto Knoth
Adalberto Knoth
Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC 124.968-3

Alexandre Koenig S. Thiago
Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

TERMO DE LIQUIDAÇÃO

Liquidou-se o presente documento de
acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64
O documento refere-se ao original da
1ª via, arquivado neste Setor.

Em 10/05/16


Silvane Bonafelli Cardoso
SILVANE BONAFELLI CARDOSO
Técnico Judiciário



SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777
E-mail: licitacoes@salver.com.br
Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 - Bairro Vila Nova
CEP 88.400-000 - Ituporanga - Santa Catarina
CNPJ: 00.521.113/0001-32

Ituporanga – SC, 24 de fevereiro de 2016

AO
TRIBUNAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
Rua Esteves Junior, 395 - Centro
FLORIANÓPOLIS – SC



Ref.: Solicitação de Pagamento

Servimo-nos da presente para solicitar o Pagamento da Nota Fiscal nº 0501 em anexo, no valor de R\$ 145.575,21 (Cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos) referente a 18ª medição da obra de Construção do imóvel destinado ao Fórum Trabalhista de Rio do Sul, conforme Contrato nº CP 9235/2013 firmado com este Tribunal.

Dados para depósito:
Caixa Econômica Federal
Agência: 1102 – Conta Corrente nº 60-6

Banco do Brasil
Agência : 1389-7 Conta Corrente nº 14.772-9

Sem mais para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente



SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ/00.521.113/0001-32
SALVIO PEDRO MACHADO
SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Salvio Pedro Machado
Socio Gerente



SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Fone/Fax: (47) 3533.1274 / Fone: (47) 3533.1777
E-mail: licitacoes@salver.com.br
Rua Leonel Thiesen, Nº 2030 - Bairro Vila Nova
CEP 88.400-000 - Ituporanga - Santa Catarina
CNPJ: 00.521.113/0001-32

Ituporanga - SC, 24 de fevereiro de 2016

AO
TRIBUNAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
Rua Esteves Junior, 395 - Centro
FLORIANÓPOLIS - SC



Ref.: Solicitação de Pagamento


Servimo-nos da presente para solicitar o Pagamento das Notas Fiscais nº 0503 em anexo, no valor de R\$ 26.180,08 (Vinte e seis mil, cento e oitenta reais e oito centavos) referente ao Primeiro Termo de Apostilamento de Reajuste da 18ª medição ao Contrato nº CP 9235/2013 firmado com este Tribunal.

Dados para depósito:
Caixa Econômica Federal
Agência: 1102 - Conta Corrente nº 60-6

Banco do Brasil
Agência : 1389-7 Conta Corrente nº 14.772-9

Sem mais para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente


SALVER CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 00.521.113/0001-32
SALVIO PEDRO MACHADO
SÓCIO GERENTE
SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Salvio Pedro Machado
Sócio Gerente
