


De: Arq. Kristina Natália Cancelier – Fiscal do Contrato
Para: Diretor do SPO – Gestor do Contrato



Assunto: 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO INICIAL, 8ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 1 E 1ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 2 DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO ANEXO SEDE

PROAD: CP 8848/2013

Prezado Senhor Diretor,


Encaminho as seguintes notas fiscais eletrônicas da empresa **CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA.:**

- número 164, no valor de **R\$ 115.826,26 (cento e quinze mil, oitocentos e vinte seis reais e vinte e seis centavos)** correspondente à **14ª medição do contrato original** de R\$ 2.633.333,90 (dois milhões, seiscentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e noventa centavos);
- número 167, no valor de **R\$ 7.717,50 (sete mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos)** correspondente à **medição do reajuste do contrato original**;
- número 163, no valor de **R\$ 28.082,55 (vinte e oito mil, oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)** correspondente à **8ª medição do 1º Termo Aditivo** de R\$ 316.818,76 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e seis centavos);
- número 166, no valor de **R\$ 1.871,14 (um mil, oitocentos e setenta e um e catorze centavos)** correspondente à **medição do reajuste do 1º Termo Aditivo**;
- número 165, no valor de **R\$ 134.771,61 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos)** correspondente à **1ª medição do 2º Termo Aditivo** de R\$ 220.223,49 (duzentos e vinte mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos).

Estas medições, que totalizam R\$ 288.269,06 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e seis centavos), todas no período de 20/05/2015 a 15/06/2015, equivalem juntas a **8,77%** do valor total contratado, acumulando 77,18% medido, já considerando o segundo aditivo (doc. 309). Ressalta-se que, conforme cronograma atualizado (doc. 278), neste período, os valores previstos de realização acumulada do contrato, correspondem a um percentual de 79,12%, conforme controle interno da Fiscalização. Nota-se que a atualização do cronograma no segundo aditivo adequou o contrato às realizações de acordo com os aditivos.

O gráfico a seguir mostra um comparativo entre o previsto e o efetivamente executado, numa projeção para os meses finais da obra.

**Comparativo entre Valores Contratuais Previstos x Executados
(conforme cronograma do segundo aditivo)**

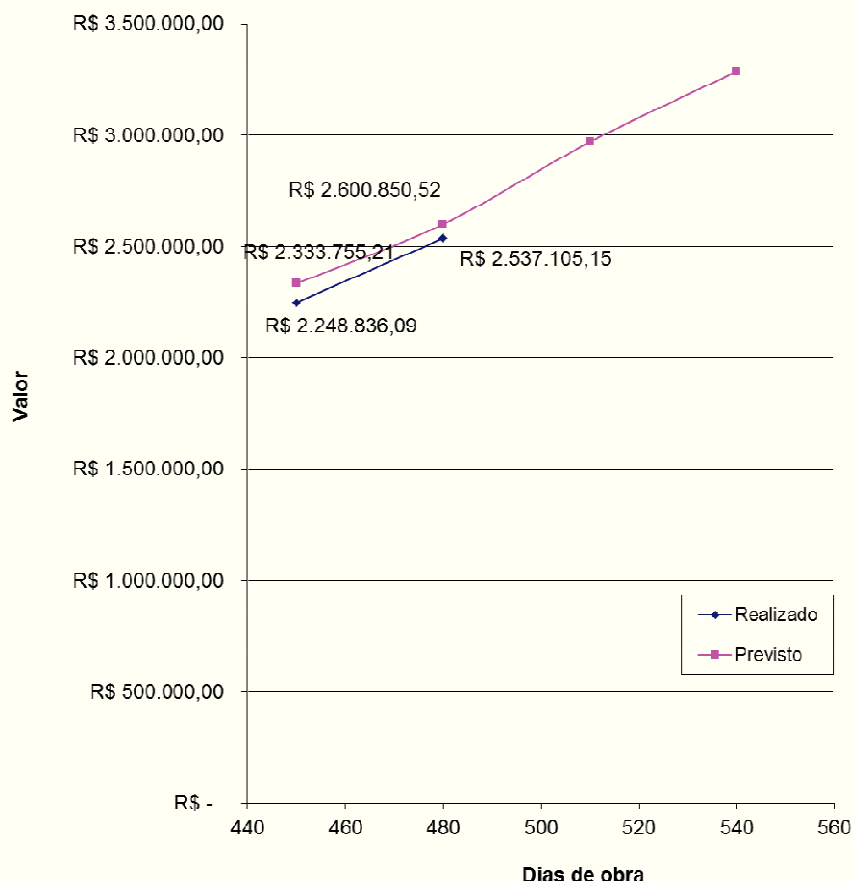

Comparativo entre previsto x executado

Basicamente, conforme planilha com o Cronograma Resumo do Previsto x Executado (doc.345), a pequena diferença se deve aos seguintes serviços:

- **Rampa externa de acesso ao edifício anexo:** este serviço está cerca de 70% atrasado, tendo em vista dificuldades de logística e liberação do térreo, na área da recepção, que dependia da mudança das instalações do balcão da recepção, cujo serviço foi realizado pela manutenção do TRT e terceirizada da informática.
- **Forros:** este serviço está cerca de 25% atrasado, porém deve estar concluído até a próxima medição;
- **Instalações de Climatização:** este serviço está cerca de 20% atrasado, considerando a necessidade de ajustes de nivelamento na instalação dos equipamentos, porém deve estar concluído até a próxima medição.

Em contrapartida, os serviços de **esquadrias estão adiantadas 10%**, **pavimentações estão adiantadas 20%**, **instalações hidrossanitárias estão adiantadas 5%**, **instalações preventivas contra incêndio estão adiantadas 15%** e **instalações elétricas também estão adiantadas 15%**.

Ainda que a variação do realizado com o previsto seja pequena, as próximas medições devem seguir mais rigorosamente o cronograma previsto.

Como Fiscalização, esclareço que atualmente a obra não apresenta atrasos significativos em sua execução, salvo com relação à rampa externa de acesso ao prédio anexo.

A título de informação, cabe adiantar que está em elaboração um terceiro aditivo contratual, tendo em vista a necessidade de complementação do sistema de ar comprimido do SASER, adicionando-se mais uma bomba a vácuo. Neste momento, está em análise, também, a prorrogação do prazo até o dia 28/08/2015, motivada, especialmente, pelos contratempos ocorridos na recepção do térreo, que levou ao atraso na instalação da rampa externa de interligação entre os prédios, no térreo, como já mencionado acima. Entretanto, essa possível prorrogação não afetaria o planejamento com relação às ações visando a mudança dos setores envolvidos (prevista para ocorrer em setembro) e a inauguração das novas instalações (prevista para ocorrer no início de outubro). Todavia, provavelmente não incluiremos na planilha (terceiro aditivo em análise) valores referentes às despesas administrativas relativas a este período. A solicitação deste terceiro aditivo deve ser encaminhada à Administração pela Fiscalização nos próximos dias.

Os valores da Planilha de Medição 14, e Medição 8 do 1º Termo Aditivo e Medição 1 do 2º Termo Aditivo foram conferidos e conforme Relatório das medições e verificações no local, conclui-se que os serviços vem sendo realizados a contento.

Em anexo:

- Relação de Documentos entregues na Medição 14 (e reajuste) e Informações da Conta para Pagamento (doc. 342);
- Relação de Documentos entregues na Medição 8 do 1º Termo Aditivo (e reajuste) e Informações da Conta para Pagamento (doc. 343);
- Relação de Documentos entregues na Medição 1 do 2º Termo Aditivo e Informações da Conta para Pagamento (doc. 344);
- Cronograma Resumo Previsto x Realizado, referente à Medição 14, Medição 8 do 1º Termo Aditivo e Medição 1 do 2º Termo Aditivo (doc. 345);
- Planilha da Medição 14 (doc. 346);
- Planilha da Medição 8 do 1º Termo Aditivo (doc. 351);
- Planilha da Medição 1 do 2º Termo Aditivo (doc. 352);
- Relatório da Medição 14, Medição 8 do 1º Termo Aditivo e Medição 1 do 2º Termo Aditivo (doc. 353).

Solicito providências dos setores competentes no sentido da conferência dos demais documentos entregues, exigidos no contrato, bem como o encaminhamento ao pagamento do valor medido.

Atenciosamente,

Kristina Natália Cancelier

Fiscal do Contrato

Analista Judiciário – Especialidade Arquitetura

Assistente do Serviço de Projetos e Obras

Relatório de 20/05/2015 até 15/06/2015

Dados da Obra

Proposta	CP 8848/2013	Obra	Reforma do Prédio Anexo
Data Início	17/02/2014	Data Prev. Término	11/08/2015
Contato	Mauricio Goulart	Email	licitacao@concretil.com.br
Telefone	(47) 33481642	Fax	(47) 33481642
Cliente	Tribunal Regional do Trabalho	Construtora	Concretil Construções Ltda
Endereço	Rua Esteves Júnior, Centro, Florianópolis - 23		

Andamento da Obra

No Prazo		Dias	%
Total		540	100%
Utilizados		499	92%
Restante		40	7%
Inoperante por Clima		Inoperante por Ocorrência	
0	0,0%	0	0,0%
Restante		40	7,4%

Dados de Pessoal

Número de Pessoal na Obra

133

Dados de Serviço

Data	Hora	Descrição
20/05/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Desmontagem de quadros elétricos antigos; 6. Instalações de Quadros elétricos; 7. Instalação de porta papéis, toalheiro e saboneteira banheiros; 8. Lavação das escadarias.
21/05/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Instalações de Quadros elétricos; 6. Lavação das escadarias.
22/05/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Instalações de Quadros elétricos; 6. Lavação das escadarias.
25/05/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de pisos geral; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Instalação de Quadros elétricos; 6. Início estrutura passarela acesso prédio principal.
26/05/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de pisos geral; 3. Instalação de piso vinílico; 4. Pintura; 5. Instalação de Quadros elétricos; 6. Início estrutura passarela acesso prédio principal.
27/05/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de pisos vinílico em placas e manta; 4. Pintura; 5. Estrutura da passarela de acesso.
28/05/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de pisos vinílico em placas e manta; 4. Pintura; 5. Estrutura da passarela de acesso.
29/05/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de pisos vinílico em placas e manta; 4. Pintura; 5. Estrutura da passarela de acesso.
01/06/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de pisos vinílico em placas e manta; 4. Pintura; 5. Estrutura da passarela de acesso.
02/06/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de pisos vinílico em placas e manta; 4. Pintura; 5. Estrutura da passarela de acesso.
03/06/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de pisos vinílico em placas e manta; 4. Pintura; 5. Estrutura da passarela de acesso.
05/06/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de pisos vinílico em placas e manta; 4. Pintura; 5. Estrutura da passarela de acesso.
08/06/2015	O dia todo	1. Instalações elétricas gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de pisos vinílico em placas e manta; 4. Pintura; 5. Estrutura da passarela de acesso.

Kelp


09/06/2015	O dia todo	1. Instalação elétrica gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de pisos vinílico em placas e manta; 4. Pintura; 5. Estrutura da passarela de acesso.
10/06/2015	O dia todo	1. Instalação elétrica gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de pisos vinílico em placas e manta; 4. Pintura; 5. Estrutura da passarela de acesso.
11/06/2015	O dia todo	1. Instalação elétrica gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de pisos vinílico em placas e manta; 4. Pintura; 5. Estrutura da passarela de acesso.
12/06/2015	O dia todo	1. Instalação elétrica gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de pisos vinílico em placas e manta; 4. Pintura; 5. Estrutura da passarela de acesso.
15/06/2015	O dia todo	1. Instalação elétrica gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico em placas e manta; 4. Pintura; 5. Estrutura da passarela de acesso; 6. Estrutura da fachada lateral do edifício principal; 7. Instalação de aparelhos de ar condicionado; 8. Retirada de bandejas de proteção;
16/06/2015	O dia todo	1. Instalação elétrica gerais; 2. Regularização de piso; 3. Instalação de piso vinílico em placas e manta; 4. Pintura; 5. Estrutura da passarela de acesso; 6. Estrutura da fachada lateral do edifício principal; 7. Instalação de aparelhos de ar condicionado; 8. Retirada de bandejas de proteção;

Comentários de Aprovação dos Dias

Dia	Data Realizada	Ação	Comentário	Usuário
20/05/2015	30/06/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
21/05/2015	30/06/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
22/05/2015	30/06/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
25/05/2015	30/06/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
26/05/2015	30/06/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
27/05/2015	30/06/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
28/05/2015	01/07/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
29/05/2015	01/07/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
01/06/2015	30/06/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
02/06/2015	01/07/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
03/06/2015	01/07/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
05/06/2015	01/07/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
08/06/2015	01/07/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
09/06/2015	01/07/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
10/06/2015	01/07/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
11/06/2015	01/07/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
12/06/2015	01/07/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
15/06/2015	01/07/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier
16/06/2015	01/07/2015	Aprovado		Kristina Natália Cancelier


Fotos

20/05/2015 - Passagem de fiação 120mm²

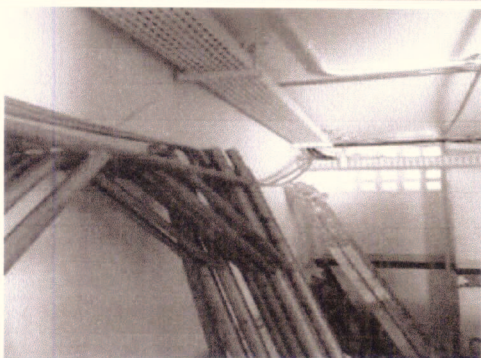

Passagem de fiação 120mm² para ligação do Quadro Nobreak

21/05/2015 - Reinstalação Quadro Nobreak

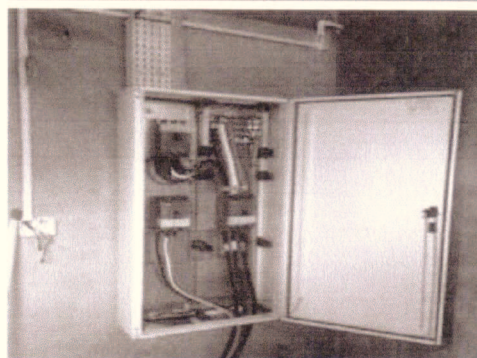


Reposicionamento de Quadro elétrico no break

22/05/2015 - Instalação quadro elétrico térreo


25/05/2015 - Estrutura passarela

Kopf

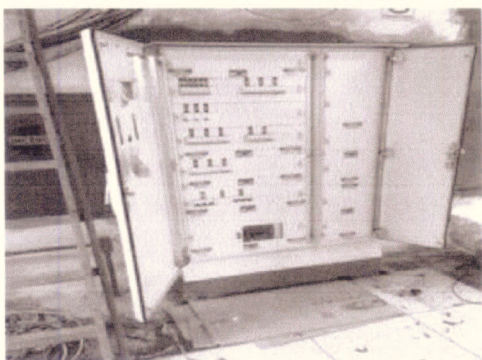

Instalação quadro elétrico térreo

26/05/2015 - Instalação de rodapé

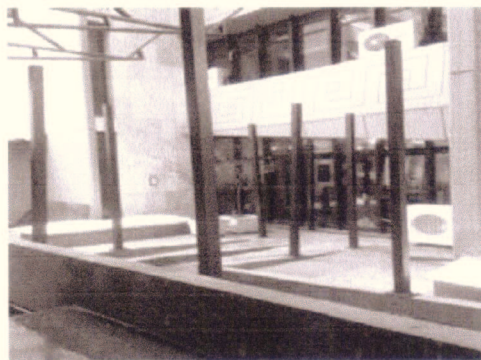


Início estrutura passarela

27/05/2015 - Instalação de piso



Instalação de rodapé

28/05/2015 - Instalação de piso vinílico



Instalação de piso em manta nos consultórios

29/05/2015 - Instalação de rodapé



Instalação de piso vinílico em placas

01/06/2015 - Instalações elétricas




Instalação de rodapé

02/06/2015 - Instalações elétricas



Instalações luminárias 1º pavimento

03/06/2015 - Instalação de piso

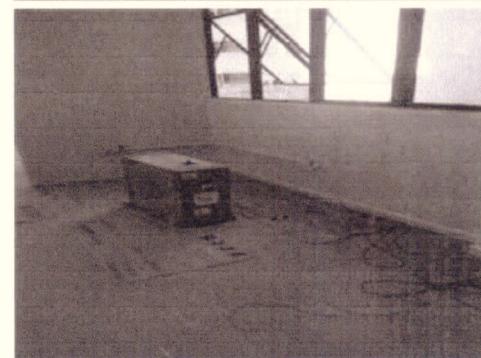

Instalações elétricas

05/06/2015 - Arremate azulejo

Koly




Instalação de piso vinílico

08/06/2015 - Instalações de Ar condicionado



Arremate azulejo atrás vaso sanitário

09/06/2015 - Instalação das películas



Instalações da condensadora

10/06/2015 - Móveis




Instalação das películas 6º pvto

11/06/2015 - Instalação de piso




Montagem de móveis

12/06/2015 - Estrutura passarela



Instalação de piso vinílico manta

15/06/2015 - Instalação piso em placas

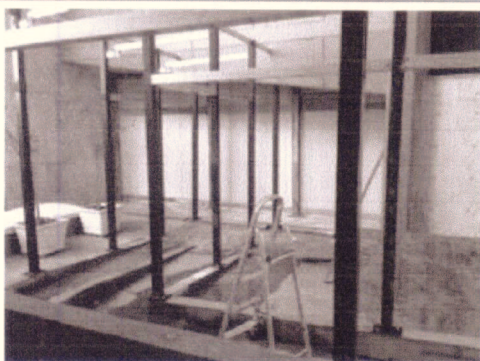


Estrutura passarela de acesso entre o Edifício principal e o Saeser

16/06/2015 - Retirada de bandejas



Instalação do piso vinílico em placas ático

KJP

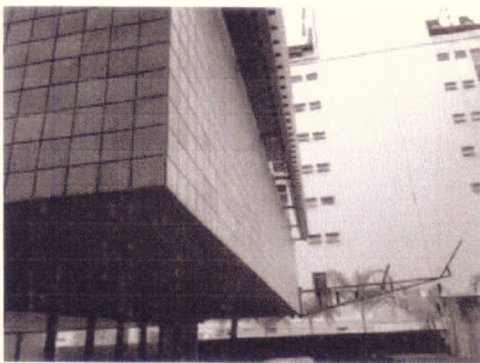

Retirada das bandejas nas faces frente e fundos do prédio e recuperação das pastilhas cerâmicas.



Relatório gerado por Gerenciador de Obras e Projetos | www.obra24horas.com.br

Concreti Construções Ltda
Ketery Fernanda Laurindo
Eng^a Civil - CREA 126836-8

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
01	DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO OBRA							331.081,28	0,00%	0,00	99,44%	329.241,96
01.01	DESPESAS TÉCNICAS INICIAIS											0,00
01.01.01	Alvará de Construção	m²	2.170,48	0,52	-	0,52	0,64	1.399,53		0,00	0,00%	0,00
01.01.02	Despesas com as Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao CREA-SC.	m²	2.170,48	0,18	-	0,18	0,22	484,46		0,00	100,00%	484,46
01.01.03	Taxas e licenças juntos aos órgão competentes para liberação de documentos da obra.	Un	1,00	480,00	-	480,00	595,20	595,20		0,00	100,00%	595,20
01.01.04	Seguro da Obra	m²	2.170,48	1,88	-	1,88	2,33	5.059,83		0,00	100,00%	5.059,83
											0,00%	0,00
01.02	DESPESAS DE CONSUMO MENSAIS										0,00%	0,00
01.02.01	Cópias, documentos e plotagens	m²	39,96	9,52	-	9,52	11,80	471,75		0,00	100,00%	471,75
01.02.02	Consumo telefone	mês	12,00	85,00	-	85,00	105,40	1.264,80		0,00	100,00%	1.264,80
01.02.03	Material de Limpeza	Mês	12,00	75,00	-	75,00	93,00	1.116,00		0,00	100,00%	1.116,00
01.02.04	Consumo internet - obrigatório no canteiro de obras	mês	12,00	25,00	-	25,00	31,00	372,00		0,00	100,00%	372,00
											0,00%	0,00
01.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA										0,00%	0,00
01.03.01	MESTRE DE OBRAS	H	2.112,00	-	34,36	34,36	42,61	89.989,96		0,00	100,00%	89.989,96
01.03.02	ALMOXARIFE	H	2.112,00	-	11,19	11,19	13,87	29.297,42		0,00	100,00%	29.297,42
01.03.03	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS	H	792,00	-	47,12	47,12	58,42	46.270,70		0,00	100,00%	46.270,70
01.03.04	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRAS	H	528,00	-	47,12	47,12	58,42	30.847,14		0,00	100,00%	30.847,14
01.03.05	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DE OBRAS	H	264,00	-	47,12	47,12	58,42	15.423,57		0,00	100,00%	15.423,57
01.03.06	AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA	H	2.112,00	-	19,52	19,52	24,21	51.123,16		0,00	100,00%	51.123,16
											0,00%	0,00
01.04	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA										0,00%	0,00
01.04.01	Mobilização do canteiro de obras	Un	1,00	142,78	211,89	354,67	439,79	439,79		0,00	100,00%	439,79
01.04.02	Desmobilizações do canteiro de obras	Un	1,00	142,78	211,89	354,67	439,79	439,79		0,00	0,00%	0,00
01.04.03	Alimentação de funcionários	MÊS	12,00	-	2.640,00	2.640,00	3.273,60	39.283,20		0,00	100,00%	39.283,20
01.04.04	Trasporte de funcionários	MÊS	12,00	-	924,00	924,00	1.145,76	13.749,12		0,00	100,00%	13.749,12
01.04.05	Equipamento obrigatório individual para funcionários (EPI)	CJ	1,00	1.121,37	-	1.121,37	1.390,50	1.390,50		0,00	100,00%	1.390,50
01.04.06	Equipamentos, computadores, impressoras e mobiliário escritório de obra.	CJ	1,00	1.664,00	-	1.664,00	2.063,36	2.063,36		0,00	100,00%	2.063,36
											0,00%	0,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES							59.850,21	0,00%	0,00	100,00%	59.850,21
02.01	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO										0,00%	0,00
02.01.01		m²	53,11	44,07	33,26	77,33	95,89	5.092,58		0,00	100,00%	5.092,58
02.01.02	Proteção dos muro em vidro temperado e estrutura da fachada para execução dos serviços com chapa de madeirit 8 mm estruturado com madeira de pinho 2,5 x 10 cm com altura de 2,20 em todo o perímetro.	m²	25,04	18,76	6,64	25,40	31,49	788,64		0,00	100,00%	788,64
02.01.03	Plataforma (bandeja) de proteção para pedestres e aparta lixo, instalada no 1º pavimento, com piso em madeira compensada do tipo "chapa resinada" de cola fenólica com espessura de 18 mm, piso apoiado em madeira Pinus com 2,5 x 15 cm de largura, espaçada a	m	68,40	183,33	35,98	219,31	271,94	18.600,95		0,00	100,00%	18.600,95
02.01.04	PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO.	m²	1.778,40	7,10	7,09	14,19	17,60	31.292,02		0,00	100,00%	31.292,02
02.01.05	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,00	195,25	33,72	228,97	283,92	1.135,70		0,00	100,00%	1.135,70
02.01.06	Materiais e mão de obra para sinalização e proteção contra acidentes dentro do canteiro de obras conforme exigências da NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da Construção Civil, incluindo sinalizações de áreas de risco, proteções de	mês	12,00	115,00	45,00	160,00	198,40	2.380,80		0,00	100,00%	2.380,80

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados											115.826,26	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
02.01.07	Rampa em madeira com largura de 1,25 m, estruturada com perna de serra 6 x 12 cm com 3 fio, assoalho de madeira de pinos com capacidade de carga de 180 Kg/m², incluindo guarda corpo e travessas antiderrapante no piso para facilitar o transporte de materia	M	3,50	63,13	22,56	85,68	106,25	371,87		0,00	100,00%	371,87
02.02	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA										0,00%	0,00
02.02.01	Execução de divisória para barraco onde vai acomodar materiais e equipamentos para execução dos serviços, no subsolo parte da frente com a Rua Esteves Junior, com aproximadamente 99 m² de área, executado fechamento com portas e divisórias retirada dos pav	m	4,50	4,13	29,50	33,63	41,70	187,65		0,00	100,00%	187,65
				-	-	-	-	-			0,00%	0,00
03	MANUTENÇÃO DA OBRA			-	-	-	-	22.823,83	0,00%	0,00	100,00%	22.823,83
03.01	Remoção de Entulhos			-	-	-	-	-			0,00%	0,00
03.01.01	Limpeza, e remoção de entulhos durante a execução da obra.	MÊS	12,00	-	204,39	204,39	253,44	3.041,25		0,00	100,00%	2.787,91
											0,00%	0,00
03.02	Máquinas e Equipamentos										0,00%	0,00
03.02.01	Aluguel de guincho de coluna 220 V, monofásico, com caçamba com capacidade para 200 Kg de carga vertical, incluindo instalação e remoção.	mês	6,00	360,80	37,67	398,47	494,10	2.964,59		0,00	100,00%	2.964,59
03.02.02	Aluguel de andaime tubular para execução dos serviços, incluindo instalação e remoção.	m	108,00	28,99	4,75	33,73	41,83	4.517,70		0,00	100,00%	4.517,70
03.02.03	Aluguel de 15 metros de andaime suspenso para execução dos serviço de recuperação e pintura das fachadas, incluindo material de base e travamento completo, segurança conforme NR-18, capacidade de carga de 500 kg, cabo com 45 m, conforme projeto e memorial	MÊS	4,00	1.644,64	835,25	2.479,90	3.075,07	12.300,29		0,00	100,00%	12.300,29
											0,00%	0,00
04	TRANSPORTES			-	-	-	-	1.435,92	0,00%	0,00	100,00%	1.435,92
04.01	CARGA E TRANSPORTES										0,00%	0,00
04.01.01	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM - remoção de móveis	m³	120,00	9,57	0,08	9,65	11,97	1.435,92		0,00	100,00%	1.435,92
				-	-	-	-	-			0,00%	0,00
05	SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E RETIRADAS			-	-	-	-	113.013,56	2,22%	2.513,27	92,81%	107.129,07
05.01.01	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m³	360,00	23,78	9,81	33,59	41,65	14.994,80		0,00	100,00%	14.994,80
05.01.02	Revestimento da cabine do elevador para transporte de entulhos para o pav. Térreo com chapa de poliestireno (isopor) 10 mm e sobrepor chapa resinada plastificada espessura 10 mm em todas as paredes piso e teto de forma fazer uma completa proteção contra d	Un	2,00	242,84	85,68	328,52	407,37	814,74		0,00	100,00%	814,74
05.01.03	Remoção das persianas com suporte e acessórios existentes na edificação sem reaproveitamento e transportar para caixa de entulhos.	m²	641,33	-	0,98	0,98	1,22	780,18		0,00	100,00%	780,18
05.01.04	Remoção dos GUARDA CORPO de madeira das escada interna, para reaproveitamento.	M	49,50	-	7,97	7,97	9,89	489,38		0,00	100,00%	489,38
05.01.05	Remoção das louças e metais e acessórios dos BWC"s, sem reaproveitamento.	CJ	24,00	-	33,58	33,58	41,64	999,32		0,00	100,00%	999,32
05.01.06	RELOCAÇÃO DA CONDENSADORA ONDE VAI SER INSTALADA A RAMPA DE ACESSO AO EDIFÍCIO SASER/ASCON.	Un	1,00	72,49	138,64	211,13	261,80	261,81		0,00	100,00%	261,81
05.01.07	REMOÇÃO DOS CORRIMÕES DA ESCADA ENCLAUSURADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	48,16	-	15,19	15,19	18,83	906,91		0,00	100,00%	906,91
05.01.08	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,35	-	89,93	89,93	111,51	39,03		0,00	100,00%	39,03
05.01.09	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	m³	0,65	-	163,51	163,51	202,75	131,79		0,00	100,00%	131,79
05.01.10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO para raio subsolo	m³	6,54	-	163,51	163,51	202,75	1.325,69		0,00	100,00%	1.325,69

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
05.01.11	Recomposição do piso do subsolo onde foi demolido para execução do para raio.	m²	47,22	83,09	27,34	110,43	136,93	6.466,34		0,00	100,00%	6.466,34
05.01.12	DEMOLIÇÃO UMA CAMADA DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA	Un	329,97	-	2,93	2,93	3,64	1.200,33		0,00	100,00%	1.200,33
05.01.13	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m²	18,73	-	56,44	56,44	69,99	1.310,77		0,00	100,00%	1.310,77
05.01.14	DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	m³	0,31	-	129,61	129,61	160,72	49,99		0,00	100,00%	49,99
05.01.15	Remoção de divisórias laminadas, estrutura e acessórios existentes na edificação para reaproveitamento e transportar para novo destino a ser definido pela fiscalização do TRT, incluindo carga, descarga e transporte até 15 Km.	m²	313,71	1,88	11,39	13,27	16,46	5.162,70		0,00	100,00%	5.162,70
05.01.16	Remoção de portas das divisórias laminadas existentes na edificação para reaproveitamento e transportar para novo destino a ser definido pela fiscalização do TRT, incluindo carga, descarga e transporte até 15 Km.	UN	43,00	3,16	3,42	6,58	8,16	350,79		0,00	100,00%	350,79
05.01.17	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MEDIA DE 30MM	m²	329,97	-	4,09	4,09	5,07	1.672,53		0,00	100,00%	1.672,53
05.01.18	Remoção de portas, forras e vistas de madeira existentes na edificação para reaproveitamento e transportar para novo destino a ser definido pela fiscalização do TRT, incluindo carga, descarga e transporte até 15 Km.	UN	93,00	4,74	22,78	27,52	34,13	3.173,88		0,00	100,00%	3.173,88
05.01.19	Remoção de portas metálicas existentes na edificação para reaproveitamento e transportar para novo destino a ser definido pela fiscalização do TRT, incluindo carga, descarga e transporte até 15 Km.	UN	4,00	2,63	10,44	13,08	16,21	64,86		0,00	100,00%	64,86
05.01.20	Remoção de portas em vidro temperado existentes na edificação para reaproveitamento e transportar para novo destino a ser definido pela fiscalização do TRT, incluindo carga, descarga e transporte até 15 Km.	UN	5,00	5,43	42,71	48,15	59,70	298,51		0,00	100,00%	298,51
05.01.21	Remoção das janelas e acessórios existentes na edificação para reaproveitamento e transportar para novo destino a ser definido pela fiscalização do TRT, incluindo carga, descarga e transporte até 15 Km.	m²	598,91	2,35	14,14	16,49	20,45	12.246,96		0,00	100,00%	12.246,96
05.01.22	Remoção das grades de ventilação do poço da ante-câmara para galvanização e pintura com fundo e duas demãos de esmalte sintético e recolocação, conforme memorial descritivo.	m²	14,40	22,65	17,33	39,98	49,58	713,98		0,00	100,00%	713,98
05.01.23	Remoção dos portão de acesso lateral e grades de aço para galvanização e pintura com fundo e duas demãos de esmalte sintético e recolocação, conforme memorial descritivo.	m²	14,24	23,47	17,33	40,80	50,60	720,49		0,00	100,00%	720,49
05.01.24	Remoção das escada de acesso a caixa d'agua e terraços, guarda corpos da fachada principal, sem reaproveitamento, conforme memorial descritivo.	M	24,50	-	8,54	8,54	10,59	259,52		0,00	100,00%	259,52
05.01.25	Limpeza e manutenção e revisão das fixações e comandos de abertura dos brises da fachada de fundos, incluindo limpeza, lubrificação, recuperação troca de peças danificadas e pintura com uma demão fundo preparador e três demão de tinta esmalte sintético na	m²	96,46	26,34	44,21	70,55	87,48	8.438,77		0,00	50,00%	4.219,39
05.01.26	Remoção da abertura em madeira tipo veneziana onde acomoda a instalação de gás GLP na cozinha, sem reaproveitamento.	Un	9,00	-	22,85	22,85	28,33	255,00		0,00	100,00%	255,00
05.01.27	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO	UN	2,00	-	81,77	81,77	101,40	202,80		0,00	100,00%	202,80
05.01.28	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	85,20	-	5,11	5,11	6,34	539,93		0,00	100,00%	539,93
05.01.29	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 1,5MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	5.684,70	-	0,12	0,12	0,15	864,61		0,00	100,00%	864,61
05.01.30	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 2,5MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	10.214,40	-	0,13	0,13	0,16	1.683,00		0,00	100,00%	1.683,00
05.01.31	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 4,0MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	182,00	-	0,15	0,15	0,19	34,61		0,00	100,00%	34,61

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
05.01.32	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 6,0MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	2.057,30	-	0,17	0,17	0,22	443,28		0,00	100,00%	443,28
05.01.33	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 10,0MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	614,60	-	0,18	0,18	0,23	140,22		0,00	100,00%	140,22
05.01.34	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 16,0MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	631,40	-	0,20	0,20	0,25	160,06		0,00	100,00%	160,06
05.01.35	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 25,0MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	140,00	-	0,25	0,25	0,30	42,59		0,00	100,00%	42,59
05.01.36	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 35,0MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	45,00	-	0,28	0,28	0,34	15,40		0,00	100,00%	15,40
05.01.37	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 70,0MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	29,40	-	0,33	0,33	0,41	11,93		0,00	100,00%	11,93
05.01.38	RETIRADA DE CABO OU FIO EMBUTIDO - 120,0MM2, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	126,00	-	0,65	0,65	0,81	102,21		0,00	100,00%	102,21
05.01.39	RETIRADA DE CALHA METÁLICA ELÉTRICA SOBRE O TETO, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	M	263,90	-	2,15	2,15	2,66	702,41		0,00	100,00%	702,41
05.01.40	RETIRADA DE LUMINÁRIA ELÉTRICA SOBRE O TETO, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	Un	353,00	-	7,15	7,15	8,87	3.131,85		0,00	100,00%	3.131,85
05.01.41	RETIRADA DE LUMINÁRIA ELÉTRICA SOBRE PAREDE, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	Un	52,00	-	3,68	3,68	4,56	237,27		0,00	100,00%	237,27
05.01.42	RETIRADA DE TOMADAS ELÉTRICA DE PISO, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	Un	320,00	-	1,43	1,43	1,77	567,82		0,00	100,00%	567,82
05.01.43	RETIRADA DE TOMADAS E INTERRUPTOR DE PAREDE, SEM REAPROVEITAMENTO INCLUSO O BOTA FORA.	Un	226,00	-	0,82	0,82	1,01	229,16		0,00	100,00%	229,16
05.01.44	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	30,00	-	20,44	20,44	25,35	760,47		0,00	100,00%	760,47
05.01.45	Demolição de acessórios da instalação elétrica existente para execução de nova instalação, sem reaproveitamento.	CJ	1,00	-	2.714,95	2.714,95	3.366,54	3.366,55		0,00	100,00%	3.366,55
05.01.46	REMOÇÃO DE AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	4,00	-	12,27	12,27	15,21	60,84		0,00	100,00%	60,84
05.01.47	Remoção de tubulação de gás e acessórios existente na edificação sem reaproveitamento, incluindo fechamento dos pontos sobre as paredes.	m	13,50	2,05	2,87	4,92	6,10	82,36		0,00	100,00%	82,36
05.01.48	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	82,00	-	1,35	1,35	1,68	137,58		0,00	100,00%	137,58
05.01.49	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS fundos edificação	M	35,00	-	6,12	6,12	7,58	265,40		0,00	100,00%	265,40
05.01.50	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	119,24	-	4,99	4,99	6,19	737,83		0,00	100,00%	737,83
05.01.51	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	m²	555,82	-	7,24	7,24	8,97	4.987,04		0,00	100,00%	4.987,04
05.01.52	Apicoamento e regularização de paredes onde foi retirado revestimento cerâmico para assentamento de novas cerâmicas, conforme projeto.	m²	555,82	3,73	3,26	6,99	8,66	4.815,68		0,00	100,00%	4.815,68
05.01.53	Recuperação das pastilhas das fachadas incluindo troca de cerâmica e rejunte danificados, conforme memorial descritivo.	m	699,30	3,31	3,42	6,73	8,34	5.832,01	30,00%	1.749,60	80,00%	4.665,61
05.01.54	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	12,00	2,10	14,86	16,96	21,03	252,38		0,00	100,00%	252,38
05.01.55	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	m²	119,24	3,98	19,54	23,52	29,16	3.477,53		0,00	100,00%	3.477,53
05.01.56	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	m²	6,50	0,95	11,01	11,96	14,84	96,43		0,00	100,00%	96,43
05.01.57	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	90,88	-	4,73	4,73	5,87	533,03		0,00	100,00%	533,03
05.01.58	Demolição de piso ardózia sem reaproveitamento	m²	206,81	-	8,85	8,85	10,97	2.268,87		0,00	100,00%	2.268,87
05.01.59				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
05.01.60	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	423,82	-	1,20	1,20	1,49	632,38		0,00	100,00%	632,38
05.01.61	Regularização de pisos para assentamento de piso vinílico sobre piso cerâmico existente, conforme projeto.	m²	1.058,07	1,70	2,18	3,88	4,81	5.091,12	15,00%	763,67	100,00%	5.091,12

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
05.01.62	Limpeza e manutenção da cobertura da sala 01 e terraço do ático, conforme memorial descritivo.	m²	53,50	1,97	3,68	5,65	7,00	374,66		0,00	100,00%	374,66
05.01.63	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROLATEAMENTO, SEM RELUNTAMENTO	m²	973,66	0,83	-	0,83	1,03	1.006,10		0,00	100,00%	1.006,10
05.01.64	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROLATEAMENTO COM RELUNTAMENTO	m²	699,30	2,42	0,41	2,83	3,51	2.457,19		0,00	100,00%	2.457,19
05.01.65	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROLATEAMENTO	m²	1.598,44	0,83	-	0,83	1,03	1.651,69		0,00	100,00%	1.651,69
05.01.66	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROLATEAMENTO	m²	63,09	0,83	-	0,83	1,03	65,20		0,00	100,00%	65,20
05.01.67	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	12,00	-	2,45	2,45	3,04	36,50		0,00	100,00%	36,50
05.01.68	RETIRADA DE EXAUSTOR	UN	13,00	-	18,38	18,38	22,79	296,31		0,00	100,00%	296,31
05.01.69	Revisão de todas as portas corta fogo incluindo as fechaduras, dobradiças, sistema de abertura e fechamento, lubrificação com material de alta qualidade, garantido um perfeito funcionamentos.	UN	12,00	17,94	15,57	33,51	41,56	498,70		0,00	0,00%	0,00
05.01.70	Readequação das instalações de para raio com reaproveitamento e reinstalação, conforme existente.	CJ	1,00	-	707,89	707,89	877,78	877,79		0,00	100,00%	877,79
05.01.71	Remoção de escada marinho fixadas no acesso a caixa de água, sem reaproveitamento.	m	8,05	-	11,39	11,39	14,12	113,70		0,00	100,00%	113,70
											0,00%	0,00
06	SERVIÇOS EM CONCRETO			-	-		-	1.837,32	0,00%	0,00	100,00%	1.837,32
06.01	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	13,50	4,02	2,57	6,59	8,17	110,32		0,00	100,00%	110,32
06.02	FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.	m²	4,06	13,69	24,31	38,00	47,12	191,31		0,00	100,00%	191,31
06.03	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	KG	0,27	6,75	-	6,75	8,37	2,26		0,00	100,00%	2,26
06.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	m³	0,43	321,06	41,13	362,19	449,12	194,02		0,00	100,00%	194,02
06.05	FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.	m²	6,00	13,69	24,31	38,00	47,12	282,72		0,00	100,00%	282,72
06.06	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	36,72	4,02	2,57	6,59	8,17	300,07		0,00	100,00%	300,07
06.07	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	KG	0,73	6,75	-	6,75	8,37	6,15		0,00	100,00%	6,15
06.08	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	m³	0,61	321,06	41,13	362,19	449,12	274,86		0,00	100,00%	274,86
06.09	DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M	m²	6,00	-	10,43	10,43	12,93	77,60		0,00	100,00%	77,60
06.10	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL, INCLUINDO VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA,ESCORAMENTO, H=12 CM.	m²	4,08	45,83	32,84	78,67	97,55	398,01		0,00	100,00%	398,01
											0,00%	0,00
07	LIXEIRA 01			-	-		-	11.336,46	0,00%	0,00	100,00%	11.336,46
07.01	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,18	51,91	16,35	68,26	84,65	15,57		0,00	100,00%	15,57
07.02	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	m³	0,74	103,83	32,70	136,53	169,30	124,50		0,00	100,00%	124,50
07.03	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	m³	1,15	-	32,40	32,40	40,18	46,17		0,00	100,00%	46,17
07.04	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	0,23	5,71	7,34	13,05	16,18	3,72		0,00	100,00%	3,72
07.05	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	m³	0,92	11,17	1,58	12,75	15,81	14,54		0,00	100,00%	14,54

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
07.06	FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.	m²	16,39	13,69	24,31	38,00	47,12	772,40		0,00	100,00%	772,40
07.07	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	101,52	4,49	2,49	6,98	8,66	878,72		0,00	100,00%	878,72
07.08	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	KG	2,03	6,75	-	6,75	8,37	17,00		0,00	100,00%	17,00
07.09	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	m³	2,21	321,06	41,13	362,19	449,12	994,49		0,00	100,00%	994,49
07.10	DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M	m²	16,39	-	10,43	10,43	12,93	212,01		0,00	100,00%	212,01
07.11	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL, INCLUINDO VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA,ESCORAMENTO, H=12 CM.	m²	6,18	45,83	32,84	78,67	97,55	602,86		0,00	100,00%	602,86
07.12	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA 14X19X39CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	30,05	42,66	17,30	59,96	74,35	2.234,38		0,00	100,00%	2.234,38
07.13	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	67,76	1,42	2,81	4,23	5,25	355,44		0,00	100,00%	355,44
07.14	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	m²	67,76	4,77	15,09	19,86	24,63	1.668,79		0,00	100,00%	1.668,79
07.15	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMA0	m²	41,32	1,08	2,97	4,05	5,02	207,51		0,00	100,00%	207,51
07.16	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMA0S	m²	41,32	5,21	11,74	16,95	21,02	868,44		0,00	100,00%	868,44
07.17	Azulejo cerâmico dimensões de 20 x 20 cm, modelo "Forma Slim Branco Acetinado" da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante AC-II e devidamente rejuntado, conforme projeto.	m²	40,00	22,62	10,98	33,60	41,66	1.666,47		0,00	100,00%	1.666,47
07.18	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA	m²	9,42	31,02	24,94	55,96	69,39	653,45		0,00	100,00%	653,45
08	CASA DO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO			-	-	-	-	3.778,40	0,00%	0,00	100,00%	3.778,40
08.01	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,15	51,91	16,35	68,26	84,65	12,70		0,00	100,00%	12,70
08.02	FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.	m²	2,85	13,69	24,31	38,00	47,12	134,30		0,00	100,00%	134,30
08.03	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	20,24	4,49	2,49	6,98	8,66	175,14		0,00	100,00%	175,14
08.04	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	KG	0,40	6,75	-	6,75	8,37	3,39		0,00	100,00%	3,39
08.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	m³	0,46	321,06	41,13	362,19	449,12	204,80		0,00	100,00%	204,80
08.06	DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M	m²	2,85	-	10,43	10,43	12,93	36,86		0,00	100,00%	36,86
08.07	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA 14X19X39CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	10,23	42,66	17,30	59,96	74,35	760,61		0,00	100,00%	760,61
08.08	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	20,46	1,42	2,81	4,23	5,25	107,32		0,00	100,00%	107,32
08.09	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	m²	20,46	4,77	15,09	19,86	24,63	503,86		0,00	100,00%	503,86
08.10	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMA0	m²	20,46	1,08	2,97	4,05	5,02	102,76		0,00	100,00%	102,76

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados											115.826,26	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
08.11	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	m²	20,46	5,21	11,74	16,95	21,02	430,03		0,00	100,00%	430,03
08.12	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA	m²	3,40	31,02	24,94	55,96	69,39	235,93		0,00	100,00%	235,93
	(P22) - Porta de Alumínio Venezianado preto - de abrir, 1,20 x 1,80, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico.	m²	2,16	351,24	48,51	399,75	495,69	1.070,70		0,00	100,00%	1.070,70
											0,00%	0,00
											0,00%	0,00
10	RAMPA EXTERNA DE ACESSO AO EDIFICIO SASER			-	-		-	70.374,36	10,23%	7.202,03	13,11%	9.229,32
10.01	DEMOLIÇÕES, ADEQUAÇÕES E RESTAURAÇÕES			-	-		-	-			0,00%	0,00
10.01	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO - schaft	m³	0,77	103,83	32,70	136,53	169,30	131,04		0,00	100,00%	131,04
10.02	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 A 2,00M - entrada rampa	M	9,00	-	20,44	20,44	25,34	228,10		0,00	100,00%	228,10
				-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
10.02	BASE DA RAMPA EM BLOCOS DE CONCRETO GRAUTEADOS			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
10.02.01	MARCAÇAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA BLOCO 10X20X40, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	39,75	3,84	4,31	8,15	10,11	401,72		0,00	100,00%	401,72
10.02.02	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL	m³	0,73	243,29	99,70	342,99	425,31	312,22		0,00	100,00%	312,22
10.02.03	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	11,93	44,91	19,62	64,53	80,02	954,21		0,00	100,00%	954,21
											0,00%	0,00
10.03	ESTRUTURA METÁLICA DA RAMPA										0,00%	0,00
10.03.01	Estrutura metálica para sustentação da rampa de acesso ao edifício SASER/ASCON, incluindo fabricação da estrutura, pintura eletrostática e montagem na opbra, conforme detalhes em projeto.	CJ	1,00	5.137,33	3.159,94	8.297,27	10.288,61	10.288,62	70,00%	7.202,03	70,00%	7.202,03
											0,00%	0,00
10.04	PISOS										0,00%	0,00
10.04.01	PISO VINÍLICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha ABSOLUTE, mod. TOTALSAFE 2 x 20 m, esp. 2,0 mm ref. 9250930.	m²	21,80	74,35	7,02	81,37	100,90	2.199,60		0,00	0,00%	0,00
10.04.02	PISO EM PAINEL WALL esp. 40mm APOIADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO .	m²	21,80	211,49	21,26	232,75	288,61	6.291,66		0,00	0,00%	0,00
				-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
10.05	FORRO			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
10.05.01	Forro modular em fibra mineral em placas de 625 x 625 mm com 14 mm de espessura, linha "Polaris" da Hunter Douglas.	m²	21,80	55,79	16,43	72,23	89,56	1.952,42		0,00	0,00%	0,00
											0,00%	0,00
10.06	COBERTURA										0,00%	0,00
10.06.01	Telha de Aço térmica termozip em EPS face superio em aço zincado pintado na cor branca RAL 9003,, com acessórios para telha de aço (cumeeira estampada, rufo de topo, rufo lateral de alvenaria, espigão, pingadeira, parafusos para fixação) Incluso frete a	m²	23,02	112,15	21,95	134,10	166,28	3.827,86		0,00	0,00%	0,00
10.06.02	Calha em chapa de alumínio espessura 0,8 mm e largura 33 cm, com fundo prime epóxi e duas demãos de tinta epóxi, conforme projeto.	M	13,61	45,66	29,90	75,56	93,70	1.275,21		0,00	0,00%	0,00
10.06.03	Rufo em chapa de alumínio espessura 0,8 mm e largura 0,25 m com pingadeira em ambos os lados, fundo prime epóxi e duas demãos de tinta epóxi, instalados sobre a platibanda, incluindo selante de silicone, conforme projeto.	M	12,46	21,20	20,24	41,44	51,39	640,27		0,00	0,00%	0,00

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
10.06.04	Contra rufo em chapa de alumínio espessura 0,8 mm e largura 0,50 m com fundo prime epóxi e duas demãos de tinta epóxi, instalados sobre junto à alvenaria sobre a cobertura, sendo que 5 cm serão embutidos na mesma, incluindo selante de silicone, conforme p	M	14,46	37,04	22,86	59,90	74,27	1.073,99		0,00	0,00%	0,00
10.07	REVESTIMENTOS										0,00%	0,00
10.07.01	Revestimento em painel de alumínio composto (ACM) 3mm na cor tec bond preto fosco, formado por duas chapas de alumínio pintado com um núcleo de plástico polietileno, produzido com a mais alta tecnologia. Sendo de painel de POLIESTER, instalado em uma estr	m²	37,70	285,83	122,50	408,33	506,33	19.088,62		0,00	0,00%	0,00
10.08	VIDRO TEMPERADO										0,00%	0,00
10.08.01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, PERFIS DE ALUMINIO E BAGUETES DE BORRACHA.	m²	78,45	130,17	28,46	158,63	196,70	15.431,05		0,00	0,00%	0,00
10.08	CORRIMÃO DE AÇO INOX										0,00%	0,00
09.10.01	Corrimão da rampa de acesso ao edifício SASER ASCON em aço inox com diâmetro de 1.1/2" em perfis tubulares instalados a 0,70 e 0,92 m de altura do piso acabado fixado ao piso através de parafusos em aço inox, conforme detalhe do projeto e memorial descrit	m	19,71	229,08	27,78	256,86	318,51	6.277,77		0,00	0,00%	0,00
11	PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR P.N.E.			-	-		-	65.565,75	0,00%	0,00	100,00%	65.565,75
11.01	DEMOLIÇÕES, ADEQUAÇÕES E RESTAURAÇÕES										0,00%	0,00
11.01.01	Remoção da base existente dos mastros das bandeiras com rearroveitamento dos mastros, e confecção de uma nova, com concreto armado fck 20 MPa espessura de 35 cm, incluindo pintura com 2 demãos de esmalte sintético, pintura da base nova de concreto com 2 de	Un	1,00	276,48	270,39	546,87	678,11	678,12		0,00	100,00%	678,12
11.01.02	DESMATAMENTO DE ARVORES ENTRE 0,15M E 0,30M DE DIAMETRO INCLUSIVE DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS. (ENCARREGADO INCLUSO)	Un	5,00	3,06	0,53	3,59	4,45	22,26		0,00	100,00%	22,26
11.01.03	DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS D<=30CM	Un	5,00	25,80	2,08	27,88	34,57	172,86		0,00	100,00%	172,86
11.01.04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	m³	0,24	-	199,40	199,40	247,26	59,35		0,00	100,00%	59,35
11.02	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
11.02.01	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	m³	4,77	-	32,40	32,40	40,18	191,47		0,00	100,00%	191,47
11.02.02	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	2,45	5,71	7,34	13,05	16,18	39,65		0,00	100,00%	39,65
11.02.03	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	m³	2,32	11,17	1,58	12,75	15,81	36,68		0,00	100,00%	36,68
11.02.04	FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUIDO DESMOLDANTE	m²	39,15	26,37	31,17	57,54	71,35	2.793,34		0,00	100,00%	2.793,34
11.02.05	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	36,58	4,49	2,49	6,98	8,66	316,61		0,00	100,00%	316,61
11.02.06	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	149,69	4,02	2,57	6,59	8,17	1.223,21		0,00	100,00%	1.223,21
11.02.07	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	KG	3,72	6,50	-	6,50	8,06	29,99		0,00	100,00%	29,99
11.02.08	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	m³	3,71	321,06	41,13	362,19	449,12	1.666,22		0,00	100,00%	1.666,22
11.02.09	DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M	m²	39,15	-	10,43	10,43	12,93	506,34		0,00	100,00%	506,34
	Lastró de pedra britada sobre solo para base e sub-base.	m³	0,16	55,94	19,07	75,01	93,01	14,89		0,00	100,00%	14,89

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados										115.826,26		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
11.03	GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO										0,00%	0,00
	Guarda corpo em vidro temperado com espessura de 10 mm, h = 1,10 m, incluindo perfis em alumínio anodizado na cor natural (prata fosco), incluindo instalação.										0,00%	0,00
11.03.01		m	30,32	74,56	223,69	298,25	369,83	11.213,25		0,00	100,00%	11.213,25
											0,00%	0,00
11.04	PISOS										0,00%	0,00
11.04.01	Piso em granito branco dallas flameado para piso, conforme projeto.	m²	22,98	278,13	9,49	287,62	356,65	8.197,18		0,00	100,00%	8.197,18
											0,00%	0,00
11.05	ELEVADOR P.N.E.										0,00%	0,00
	Plataforma Elevatória Daiken modelo AC02, com enclausuramento em vidro temperado e dimensões 0,90 x 1,40 m, Piso antiderrapante, Travamento das portas durante o movimento da plataforma, Abertura das portas somente com a plataforma nivelada ao piso, Sens	Un	1,00	29.862,00	-	29.862,00	37.028,88	37.028,88		0,00	100,00%	37.028,88
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
11.06	CHAPISCO E REBOCO INTERNO										0,00%	0,00
11.06.01	Paredes Internas			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
11.06.01.01	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	10,63	1,42	2,81	4,23	5,25	55,74		0,00	100,00%	55,74
11.06.01.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	m²	10,63	4,77	15,09	19,86	24,63	261,69		0,00	100,00%	261,69
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
11.07	PINTURA EXTERNA										0,00%	0,00
	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAIO	m²	40,63	1,08	2,97	4,05	5,02	204,05		0,00	100,00%	204,05
11.07.02	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	m²	40,63	5,21	11,74	16,95	21,02	853,97		0,00	100,00%	853,97
											0,00%	0,00
12	IMPERMEABILIZAÇÕES			-	-	-	-	32.320,87	0,00%	0,00	100,00%	32.320,87
12.01	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM INEL INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA - caixa dagua e cisterna	m²	91,45	5,90	6,70	12,60	15,62	1.428,85		0,00	100,00%	1.428,85
12.02	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 4MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA - coberturas	m²	182,01	26,60	24,12	50,72	62,89	11.447,41		0,00	100,00%	11.447,41
12.03	CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRILICA, TRES DEMAOS - subsolo	m²	66,43	15,12	39,54	54,66	67,78	4.502,61		0,00	100,00%	4.502,61
12.04	Impermeabilização para caixa de água em 7 demãos sendo 2 demãos de argamassa polimérica impermeabilizante à base de resinas termoplásticas e cimentos aditivados e 5 demãos de argamassa polimérica impermeabilizante flexível à base de resinas termoplásticas	m²	56,50	106,33	25,44	131,76	163,39	9.231,65		0,00	100,00%	9.231,65
12.05	Impermeabilização para caixa de água em 7 demãos sendo 2 demãos de argamassa polimérica impermeabilizante à base de resinas termoplásticas e cimentos aditivados e 5 demãos de argamassa polimérica impermeabilizante flexível à base de resinas termoplásticas - cisterna	m²	34,95	106,33	25,44	131,76	163,39	5.710,35		0,00	100,00%	5.710,35
											0,00%	0,00
13	VEDAÇÕES			-	-	-	-	77.768,34	0,00%	0,00	100,00%	77.768,34
13.01	ALVENARIAS INTERNAS										0,00%	0,00
13.01.01	Tijolos Cerâmicos Furado			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
13.01.01.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	13,00	14,62	19,18	33,80	41,91	544,86		0,00	100,00%	544,86
				-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
13.02	Serviço Sobre Alvenaria			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
13.02.01	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM	m	13,00	0,55	3,81	4,36	5,41	70,29		0,00	100,00%	70,29
13.02.02	VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3).	m³	0,06	749,24	299,59	1.048,83	1.300,55	81,94		0,00	100,00%	81,94
13.02.03	Execução de mucheta de alvenaria para passagem de tubulações, incluindo tela PVC de amarração e reforço, conforme projeto.	m²	17,94	26,07	33,70	59,77	74,12	1.329,63		0,00	100,00%	1.329,63
											0,00%	0,00
13.03	DIVISÓRIAS										0,00%	0,00
13.03.01	GESSO ACARTONADO (DRYWALL)										0,00%	0,00
12.03.01.01	Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de aço galvanizado a fogo com montantes a cada 60 cm, incluindo fita, massa, parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação, Ref. Knauf ou similar, conforme projeto.	m²	492,33	43,39	25,87	69,26	85,88	42.282,38		0,00	100,00%	42.282,38
12.03.01.02	Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de aço galvanizado a fogo reforçado a cada 40 cm para receber revestimento, incluindo fita, massa, parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação, Ref. Knauf ou similar,	m²	53,32	50,59	27,40	77,98	96,70	5.156,22		0,00	100,00%	5.156,22
12.03.01.03	Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de aço galvanizado a fogo, recheado com lã de rocha para isolamento térmico acústico, incluindo fita, massa, parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação, Ref. Knauf ou	m²	46,73	61,98	29,13	91,12	112,99	5.279,58		0,00	100,00%	5.279,58
12.03.01.04	Parede de fechamento um lado em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de aço galvanizado a fogo, recheado com lã de rocha para isolamento térmico acústico, incluindo fita, massa, parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação, R	m²	95,88	50,49	18,05	68,53	84,98	8.148,03		0,00	100,00%	8.148,03
12.03.01.05	Parede de gesso acartonado (RU) (drywall) para áreas úmidas, estruturado com perfis de aço galvanizado a fogo, recheado com lã de rocha para isolamento térmico acústico, incluindo fita, massa, parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação,	m²	77,64	54,15	25,87	80,02	99,23	7.703,94		0,00	100,00%	7.703,94
											0,00%	0,00
13.03.02	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO										0,00%	0,00
13.03.02.01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, PERFIS DE ALUMINIO E BAGUETES DE BORRACHA.	m²	36,46	130,17	28,46	158,63	196,70	7.171,47		0,00	100,00%	7.171,47
											0,00%	0,00
14	ESQUADRIAS			-	-		-	344.942,08	6,96%	24.007,85	99,29%	342.494,03
14.01	JANELAS										0,00%	0,00
14.01.01	Janelas de Alumínio - (Max-Ar-Fixo)										0,00%	0,00
14.01.01.01	(J1) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com cinco módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 3,65 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	3,00	1.418,40	945,60	2.364,00	2.931,36	8.794,08		0,00	100,00%	8.794,08
14.01.01.02	(J2) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com três módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 2,10 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	1,00	816,00	544,00	1.360,00	1.686,40	1.686,40		0,00	100,00%	1.686,40

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
14.01.01.03	(J3) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com três módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 2,05 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	1,00	796,80	531,20	1.328,00	1.646,72	1.646,72		0,00	100,00%	1.646,72
14.01.01.04	(J4) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com dois módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 1,30 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	2,00	505,20	336,80	842,00	1.044,08	2.088,16		0,00	100,00%	2.088,16
14.01.01.05	(J5) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com um módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 0,65 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	2,00	252,60	168,40	421,00	522,04	1.044,08		0,00	100,00%	1.044,08
14.01.01.06	(J8) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com dois módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 1,45 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	1,00	566,70	375,60	942,30	1.168,45	1.168,46		0,00	100,00%	1.168,46
14.01.01.07	(J9) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com cinco módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 3,60 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	1,00	1.398,60	932,40	2.331,00	2.890,44	2.890,44		0,00	100,00%	2.890,44
14.01.01.08	(J10) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com oito módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 5,80 x 1,85 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	1,00	2.253,60	1.502,40	3.756,00	4.657,44	4.657,44		0,00	100,00%	4.657,44
14.01.01.09	(J12) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com quatro módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 2,95 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	8,00	1.053,60	702,40	1.756,00	2.177,44	17.419,52		0,00	100,00%	17.419,52
14.01.01.10	(J13) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com cinco módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 3,65 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	27,00	1.303,20	868,80	2.172,00	2.693,28	72.718,56		0,00	100,00%	72.718,56
14.01.01.11	(J14) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com dois módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 1,45 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	41,00	517,80	345,20	863,00	1.070,12	43.874,92		0,00	100,00%	43.874,92
14.01.01.12	(J15) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com oito módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 6,20 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	7,00	2.213,40	1.475,60	3.689,00	4.574,36	32.020,52		0,00	100,00%	32.020,52
14.01.01.13	(J19) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com dois módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 1,40 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	14,00	499,80	333,20	833,00	1.032,92	14.460,88		0,00	100,00%	14.460,88
14.01.01.14	(J20) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com três módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 2,15 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	6,00	768,00	512,00	1.280,00	1.587,20	9.523,20		0,00	100,00%	9.523,20
14.01.01.15	(J21) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com cinco módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 3,20 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	7,00	1.142,40	761,60	1.904,00	2.360,96	16.526,72		0,00	100,00%	16.526,72
14.01.01.16	(J36) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com quatro módulos Fixos e um Maxi-ar com dimensões de 1,56 x 2,05 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6	un	2,00	982,80	655,20	1.638,00	2.031,12	4.062,24	100,00%	4.062,24	100,00%	4.062,24
14.01.02	Janelas de Alumínio - (Fixa)										0,00%	0,00
											0,00%	0,00
14.01.02.01	(J6) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com dois módulos Fixos com dimensões de 1,30 x 0,30 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	2,00	58,80	39,20	98,00	121,52	243,04		0,00	100,00%	243,04
14.01.02.02	(J7) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com cinco módulos Fixos, com dimensões de 3,30 x 0,30 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	1,00	148,80	99,20	248,00	307,52	307,52		0,00	100,00%	307,52
14.01.02.03	(J23) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com um módulo fixo com dimensões de 4,70 x 1,10 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, vidro temperado 10mm.	un	1,00	775,80	517,20	1.293,00	1.603,32	1.603,32		0,00	100,00%	1.603,32
14.01.02.04	(J37) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com dois módulos Fixos com dimensões de 0,45 x 2,05 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	2,00	202,80	135,20	338,00	419,12	838,24	100,00%	838,24	100,00%	838,24

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
14.01.02.05	(J38) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com dois módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 1,50 x 0,90 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	1,00	202,80	135,20	338,00	419,12	419,12	100,00%	419,12	100,00%	419,12
14.01.02.06	(J39) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com um módulo Fixos com dimensões de 0,78 x 0,90 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	1,00	105,60	70,40	176,00	218,24	218,24	100,00%	218,24	100,00%	218,24
											0,00%	0,00
14.01.03	Janelas de Alumínio - (Max-Ar)										0,00%	0,00
14.01.03.01	(J16) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com um módulo Maxi ar com dimensões de 0,75 x 1,15 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, para instalação de vidro comum 6mm.	un	9,00	181,20	120,80	302,00	374,48	3.370,32		0,00	100,00%	3.370,32
14.01.03.02	(J17) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com um módulo Maxi ar com dimensões de 0,75 x 0,55 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, vidro mini-boreal 4mm.	un	7,00	87,00	58,00	145,00	179,80	1.258,60		0,00	100,00%	1.258,60
14.01.03.03	(J18) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com um módulo Maxi ar com dimensões de 0,65 x 0,55 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha INOVA ou similar, vidro mini-boreal 4mm.	un	24,00	75,60	50,40	126,00	156,24	3.749,76		0,00	100,00%	3.749,76
											0,00%	0,00
14.01.04	Janelas de Alumínio - (Fixo Maxi-ar para vidro duplo)										0,00%	0,00
14.01.04.01	(J24) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com cinco módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 3,65 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha GOLD IV ou similar, para instalação vidro duplo 18mm.	un	2,00	1.861,80	1.241,20	3.103,00	3.847,72	7.695,44		0,00	100,00%	7.695,44
14.01.04.02	(J25) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com dois módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 1,45 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha GOLD IV ou similar, para instalação vidro duplo 18mm.	un	1,00	739,80	493,20	1.233,00	1.528,92	1.528,92		0,00	100,00%	1.528,92
14.01.04.03	(J26) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com três módulos Fixos/Maxi ar com dimensões de 2,15 x 1,70 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha GOLD IV ou similar, para instalação vidro duplo 18mm.	un	1,00	1.096,80	731,20	1.828,00	2.266,72	2.266,72		0,00	100,00%	2.266,72
14.01.04.04	(J27) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com um módulo Fixos com dimensões de 3,90 x 1,10 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha GOLD IV ou similar, para instalação vidro duplo 18mm.	un	1,00	772,20	514,80	1.287,00	1.595,88	1.595,88		0,00	100,00%	1.595,88
14.01.04.05	(J28) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com um módulo Fixos com dimensões de 1,25 x 1,10 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha GOLD IV ou similar, para instalação vidro duplo 18mm.	un	1,00	247,80	165,20	413,00	512,12	512,12		0,00	100,00%	512,12
14.01.04.06	(J29) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com um módulo Fixos com dimensões de 0,95 x 1,10m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha GOLD IV ou similar, para instalação vidro duplo 18mm.	un	1,00	188,40	125,60	314,00	389,36	389,36		0,00	100,00%	389,36
											0,00%	0,00
14.01.05	Janelas de Alumínio - (Basculante)										0,00%	0,00
14.02.05.01	(J30) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com cinco módulos Basculantes com dimensões de 0,75 x 1,35 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha 20 ou similar, para instalação vidro duplo 6mm.	un	2,00	213,00	142,00	355,00	440,20	880,40		0,00	100,00%	880,40
14.02.05.02	(J31) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com cinco módulos Basculantes com dimensões de 0,51 x 1,35 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha 20 ou similar, para instalação vidro duplo 6mm.	un	3,00	144,60	96,40	241,00	298,84	896,52		0,00	100,00%	896,52
14.02.05.03	(J32) - Janela em estrutura de alumínio anodizado, com cinco módulos Basculante com dimensões de 0,51 x 1,35 m na cor preta, incluindo acessórios e ferragens para instalação, da marca Alcoa linha 20 ou similar, para instalação vidro duplo 6mm.	un	3,00	144,60	96,40	241,00	298,84	896,52		0,00	100,00%	896,52
											0,00%	0,00
14.02	PORTAS E PORTÕES										0,00%	0,00
14.02.01	Portas de Madeira Semi-oca Lisa										0,00%	0,00
14.02.01.01	(P1) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,90 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista, e ferragens para aplicação em divisória de gesso acartonado, conforme projeto arquitetônico	UN	32,00	251,40	67,53	318,92	395,46	12.654,83	5,00%	632,74	95,00%	12.022,09

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
14.02.05	Porta Radiológica										0,00%	0,00
14.02.05.01	Porta blindada com 1mm de Pb para proteção radiológica de consultório odontológico, conforme projeto.	m³	3,00	1.599,00	164,94	1.763,94	2.187,28	6.561,85		0,00	100,00%	6.561,85
											0,00%	0,00
14.03	FERRAGENS E ACESSÓRIOS										0,00%	0,00
14.03.01	FECHADURAS										0,00%	0,00
14.03.01.01	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	Un	59,00	56,23	31,81	88,04	109,17	6.441,01	5,00%	322,05	95,00%	6.118,96
14.03.01.02	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	Un	7,00	92,98	31,81	124,79	154,74	1.083,18	5,00%	54,16	95,00%	1.029,02
14.03.01.03	FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	UN	24,00	56,32	26,09	82,40	102,18	2.452,31	5,00%	122,62	95,00%	2.329,69
											0,00%	0,00
14.03.02	DOBRADIÇAS										0,00%	0,00
14.03.02.01	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	Un	27,00	23,11	7,34	30,45	37,76	1.019,47	5,00%	50,97	95,00%	968,50
14.03.02.02	DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2"	Un	225,00	12,40	7,34	19,74	24,48	5.507,46	5,00%	275,37	95,00%	5.232,09
											0,00%	0,00
15	VIDROS			-	-		-	105.005,15	9,53%	10.010,14	76,76%	80.601,05
15.01	VIDROS										0,00%	0,00
15.01.01	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	11,47	38,50	10,42	48,92	60,66	695,63		0,00	100,00%	695,63
15.01.02	VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM	m²	1,20	137,66	10,42	148,08	183,62	219,80		0,00	100,00%	219,80
15.01.03	VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, PERFIS DE ALUMÍNIO E BAGUETES DE BORRACHA.	m²	557,03	78,73	9,49	88,22	109,39	60.936,44		0,00	100,00%	60.936,44
15.01.04	Vidro duplo 6mm + 4mm para isolamento acústico, conforme projeto	m³	25,24	286,17	26,51	312,68	387,72	9.786,16		0,00	89,30%	8.739,04
											0,00%	0,00
15.02	PELÍCULAS										0,00%	0,00
15.02.01	Película Fumê da 3M ou similar.	m²	593,36	4,85	40,50	45,35	56,23	33.367,12	30,00%	10.010,14	30,00%	10.010,14
											0,00%	0,00
16	REVESTIMENTOS			-	-		-	90.288,95	0,00%	0,00	100,00%	90.288,95
16.01	CHAPISCO E REBOCO INTERNO										0,00%	0,00
16.01.01	Paredes Internas										0,00%	0,00
16.01.01.01	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	143,09	1,42	2,81	4,23	5,25	750,54		0,00	100,00%	750,54
16.01.01.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	m²	143,09	4,77	15,09	19,86	24,63	3.523,81		0,00	100,00%	3.523,81
16.01.01.03	Revestimentos com argamassa baritada espessura de 1,5 cm, a ser aplicada em paredes, teto ou piso na, densidade 3,2g/cm³,atenuação linear com fontes radioativas "Am" 241 e "Eu" 152, detector de germânio hiper puro, para energias de 60 kvs e de 80 a 1.300	m²	66,59	108,24	17,46	125,70	155,87	10.379,12		0,00	100,00%	10.379,12
16.01.01.04	Revestimento de parede e teto com manta Sonex, modelo Nova Fórmula, 1000 x 1000 mm, 50 mm de espessura, cor natural.	m²	314,07	120,56	12,34	132,90	164,80	51.759,08		0,00	100,00%	51.759,08
											0,00%	0,00
16.02	REVESTIMENTO CERÂMICO										0,00%	0,00
16.02.01	Azulejo cerâmico dimensões de 30 x 40 cm, modelo "Forma Slim Branco Acetinado" da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante AC-II e devidamente rejuntado, conforme projeto.	m²	586,01	21,88	10,98	32,86	40,74	23.876,40		0,00	100,00%	23.876,40
											0,00%	0,00
17	PAVIMENTAÇÕES, RODAMEIO E RODAPÊ			-	-		-	117.077,07	5,53%	6.477,41	61,86%	72.425,71

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
19.01.01	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 10MM, COMP DE 6,0M.LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	m²	90,88	30,50	-	30,50	37,82	3.437,09		0,00	100,00%	3.437,09
											0,00%	0,00
20	LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS - AREAS MOLHADAS			-	-		-	90.113,43	14,62%	13.172,08	79,15%	71.327,43
20.01	Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada										0,00%	0,00
20.01.01	Vaso sanitário convencional em louça na cor branco gelo, modelo P5 - linha Vogue Plus da Deca ou similar, incluindo parafusos e fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	15,00	244,60	56,25	300,85	373,05	5.595,81	20,00%	1.119,16	80,00%	4.476,65
20.01.02	Anel para vedação de vaso sanitário (Tigre ou similar)	Un	15,00	2,76	5,71	8,47	10,50	157,55	20,00%	31,51	80,00%	126,04
20.01.03	Assento para vaso sanitário plástico da Deca ou similar, incluindo parafusos e fixação.	Un	15,00	73,32	1,99	75,31	93,38	1.400,77	80,00%	1.120,62	80,00%	1.120,62
20.01.04	Conjunto de ligação cromado para vaso sanitário (espude, canopla e tubo)	Un	15,00	13,41	8,19	21,60	26,78	401,76	20,00%	80,35	80,00%	321,41
20.01.05	Tubo de descida para válvula descarga 38 mm com joelho azul	Un	15,00	4,61	8,19	12,80	15,87	238,08	20,00%	47,62	80,00%	190,46
20.01.06	Revisão e manutenção da válvula de descarga, incluindo troca e reparo quando necessário.	Un	15,00	8,73	8,19	16,92	20,98	314,72	20,00%	62,94	80,00%	251,78
20.01.07	Acabamento para válvula de descarga com duplo acionamento, linha Salvágua da Docol ou similar.	Un	15,00	65,62	8,19	73,81	91,52	1.372,87	20,00%	274,57	80,00%	1.098,30
20.01.08	Porta papel higienico em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	15,00	32,91	6,95	39,86	49,43	741,40		0,00	80,00%	593,12
				-	-		-	-			0,00%	0,00
				-	-		-	-			0,00%	0,00
20.02	Vaso Sanitário PNE			-	-		-	-			0,00%	0,00
20.02.01	Vaso sanitário, linha Vogue Plus Confort, cor branco gelo, modelo P510 ou similar, conforme exigências da ABNT NBR 9050:2004, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	8,00	391,60	56,25	447,85	555,33	4.442,68	25,00%	1.110,67	87,50%	3.887,35
20.02.02	Anel para vedação de vaso sanitário (Tigre ou similar)	Un	8,00	2,76	5,71	8,47	10,50	84,03	25,00%	21,01	87,50%	73,53
20.02.03	Assento para vaso sanitário plástico da Deca ou similar, incluindo parafusos e fixação.	Un	8,00	73,32	1,99	75,31	93,38	747,08	87,50%	653,70	87,50%	653,70
20.02.04	Conjunto de ligação cromado para vaso sanitário (espude, canopla e tubo)	Un	8,00	13,41	8,19	21,60	26,78	214,28	25,00%	53,57	87,50%	187,50
20.02.05	Porta papel higienico em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	8,00	32,91	6,95	39,86	49,43	395,42	7,50%	29,66	87,50%	345,99
20.02.06	Caixa Montana com acabamento Montreal	Un	8,00	352,28	28,31	380,59	471,93	3.775,46	25,00%	943,87	87,50%	3.303,53
				-	-		-	-			0,00%	0,00
				-	-		-	-			0,00%	0,00
20.03	Cuba de Louça Semi-encaixe			-	-		-	-			0,00%	0,00
20.03.01	Cuba de semi-encaixe quadrada em louça na cor branco gelo, modelo L830 da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	15,00	525,11	17,75	542,86	673,15	10.097,20		0,00	100,00%	10.097,20
20.03.02	Torneira Pressmatic Compact de mesa (CR17160606) da Docol ou Decamatic (1170C) da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	15,00	178,12	10,92	189,04	234,41	3.516,15		0,00	100,00%	3.516,15
20.03.03	Sifão cromado para lavatório 1.1/2" x 1.1/2"	Un	15,00	106,76	8,19	114,95	142,54	2.138,07		0,00	100,00%	2.138,07
20.03.04	Engate ou rabicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Un	15,00	26,06	5,46	31,52	39,08	586,28		0,00	100,00%	586,28
20.03.05	Válvula de escoamento para cuba/lavatório cromada com tampa cromada, código C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladrão.	Un	15,00	25,27	5,46	30,73	38,11	571,58		0,00	100,00%	571,58
20.03.06	Saboneteira em ABS, modelo Trilha da Copapel ou similar	Un	15,00	35,97	3,29	39,26	48,68	730,24		0,00	100,00%	730,24
20.03.07	Porta Toalha em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	15,00	34,17	3,59	37,76	46,82	702,34		0,00	100,00%	702,34
20.03.08	Bancada de copa e/ou banheiro em granito na cor Cinza Corumbá, incluindo acabamento, roda pia com até 10 cm e instalação.	m	11,25	149,45	64,05	213,50	264,74	2.978,33		0,00	100,00%	2.978,33
20.03.09	Saia da bancada em granito Cinza Corumbá com altura de 15,0 cm	m²	1,98	149,45	64,05	213,50	264,74	524,19		0,00	100,00%	524,19
20.03.10	Espelho com espessura de 4 mm, dimensão de 0,50 x 0,90 m, de alta resistência, com película de segurança no costado do espelho, referência "Espelhos Guardian" ou similar, incluindo botões cromados e fixação.	Un	15,00	167,30	71,70	239,00	296,36	4.445,40		0,00	0,00%	0,00
				-	-		-	-			0,00%	0,00

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
20.04	Lavatório em Louça PNE			-	-	-	-	-			0,00%	0,00
				-	-	-	-	-			0,00%	0,00
20.04.01	Lavatório em louça na cor branco gelo, modelo L76 - linha Vogue Plus da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	8,00	521,01	43,70	564,71	700,24	5.601,93		0,00	100,00%	5.601,93
20.04.02	Torneira Pressmatic Compact de mesa (CR17160606) da Docol ou Decamatic (1170C) da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	8,00	178,12	10,92	189,04	234,41	1.875,28		0,00	100,00%	1.875,28
20.04.03	Sifão cromado para lavatório 1.1/2" x 1.1/2"	Un	8,00	106,76	8,19	114,95	142,54	1.140,31		0,00	100,00%	1.140,31
20.04.04	Engate ou rabicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Un	8,00	26,06	5,46	31,52	39,08	312,68		0,00	100,00%	312,68
20.04.05	Válvula de escoamento para cuba/lavatório cromada com tampa cromada, código C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladrão.	Un	8,00	25,27	5,46	30,73	38,11	304,85		0,00	100,00%	304,85
20.04.06	Saboneteira em ABS, modelo Trilha da Copapel ou similar	Un	8,00	35,97	3,29	39,26	48,68	389,46		0,00	100,00%	389,46
20.04.07	Porta Toalha em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	8,00	34,17	3,59	37,76	46,82	374,58		0,00	100,00%	374,58
20.04.08	Espelho com espessura de 4 mm, dimensão de 0,50 x 0,90 m, de alta resistência, com película de segurança no costado do espelho, referência "Espelhos Guardian" ou similar, incluindo botões cromados e fixação.	Un	8,00	167,30	71,70	239,00	296,36	2.370,88		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
20.05	Cuba de Aço Inox			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
20.05.01	Cuba de embutir em aço inox, linha "Retangular BL" (cód. 94020107) com dimensões de 34 x 40 x 17 cm da marca Tramontina ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	23,00	153,35	76,47	229,82	284,98	6.554,47	30,00%	1.966,34	80,00%	5.243,58
20.05.02	Torneira cromada para pia de cozinha (mesa ou parede) com bica móvel - linha Izy da Deca ou similar	Un	23,00	232,27	38,23	270,50	335,42	7.714,66	23,91%	1.844,58	50,00%	3.857,10
20.05.03	Sifão cromado para pia 1" x 1.1/2"	Un	23,00	105,54	8,19	113,73	141,03	3.243,58	3,91%	126,82	80,00%	2.594,86
20.05.04	Engate ou rabicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Un	23,00	26,06	5,46	31,52	39,08	898,96		0,00	75,00%	674,22
20.05.05	Válvula de escoamento para cuba/lavatório cromada com tampa cromada, código C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladrão.	Un	23,00	25,27	5,46	30,73	38,11	876,42		0,00	75,00%	657,32
20.05.06	Bancada de copa e/ou banheiro em granito na cor Cinza Corumbá, incluindo acabamento, roda pia com até 10 cm e instalação.	m	41,44	149,45	64,05	213,50	264,74	10.970,83	30,00%	3.291,25	80,00%	8.776,66
20.05.07	Saia da bancada em granito Cinza Corumbá com altura de 0,06 cm	m²	4,96	149,45	64,05	213,50	264,74	1.312,85	30,00%	393,86	80,00%	1.050,28
				-	-	-	-	-			0,00%	0,00
				-	-	-	-	-			0,00%	0,00
22	ACESSIBILIDADE			-	-	-	-	53.467,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.01	PLACAS TÁTEIS			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
22.01.01	Placa em Braille de 10,0 x 7,0 cm de aço inox, para acesso a portadores de deficiência visual com a identificação do respectivo ambiente, instalada no batente da porta.	Un	22,00	21,39	2,49	23,88	29,61	651,45		0,00	0,00%	0,00
22.01.02	Placa em Braille de 30,0 x 12,0 cm de aço inox, para acesso a portadores de deficiência visual com a identificação do respectivo ambiente, instalada na parede.	Un	55,00	101,44	2,49	103,93	128,87	7.088,03		0,00	0,00%	0,00
22.01.03	Placa de informação em Braille 30,0 x 20,7 m em aço inox, instalada na parede do elevador indicando instruções de uso, posição de embarque e pavimentos atendidos.	Un	9,00	184,16	3,49	187,65	232,69	2.094,18		0,00	0,00%	0,00
22.01.04	Mapa Tátil em aço inox 45 x 85 cm com a sinalização dos ambientes gravada em alto relevo e Braille na cor preto, incluindo pedestal em aço com pintura eletroestática na cor preto.	Un	1,00	3.861,81	46,30	3.908,11	4.846,06	4.846,06		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
22.02	SINALIZAÇÃO VISUAL DE PISO			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
22.02.01	Placa autoadesiva de piso para sinalização de espaço reservado a cadeirantes com símbolo S.I.A. (cadeirante) de 1,20 x 0,80 m	Un	1,00	250,10	3,47	253,57	314,43	314,43		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados										115.826,26		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
22.03	SINALIZAÇÃO ESCADA			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
22.03.01	Sinalização visual dos degraus das escadas com fita (Total Walk) fotoluminescente na cor amarela, de 3 x 20 cm	Un	324,00	3,97	0,80	4,77	5,91	1.916,40		0,00	0,00%	0,00
22.03.02	Placa tátil em Braille/relevo em chapa de aço inox 10 x 3 m, instalada no corrimão, informando o número do pavimento.	Un	36,00	32,47	14,97	47,44	58,83	2.117,73		0,00	0,00%	0,00
22.03.03	Anel em textura em borracha flexível preto para corrimão até 2.1/2", instalado 1,00 antes das extremidades do mesmo.	Un	36,00	22,71	10,90	33,61	41,68	1.500,36		0,00	0,00%	0,00
				-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
22.04	BARRAS DE APOIO			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
22.04.01	Barra de apoio reta para sanitário acessível em tubo de alumínio com espessura de 2 mm no Ø 31,75 mm, curvatura angular de 54°, no tamanho de 80 cm, incluindo acessórios de instalação e em conformidade com a norma NBR 9050 da ABNT.	Un	16,00	172,15	23,15	195,30	242,17	3.874,76		0,00	0,00%	0,00
22.04.02	Barra de apoio para lavatório acessível em tubo de alumínio com espessura de 2 mm no Ø 31,75 mm, curvatura angular de 180°, para contorno do lavatório de canto, incluindo acessórios de instalação e em conformidade com a norma NBR 9050 da ABNT.	Un	8,00	473,55	46,30	519,85	644,61	5.156,92		0,00	0,00%	0,00
22.04.03	Puxador horizontal reto em tubo de alumínio com espessura de 2 mm no Ø 31,75 mm, curvatura angular de 54°, no tamanho de 40 cm para abertura da porta do banheiro PNE, incluindo acessórios de instalação e em conformidade com a norma NBR 9050 da ABNT.	Un	8,00	143,29	23,15	166,44	206,39	1.651,09		0,00	0,00%	0,00
				-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
22.05	REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
22.05.01	Proteção das portas com chapa de aço inox esp. 2 mm, instalada até a altura de 40 cm, incluindo fixação e pintura com 01 demão de fundo para galvanizados e 02 demãos de esmate sintético na cor branco gelo.	m²	16,00	232,12	8,15	240,27	297,93	4.766,96		0,00	0,00%	0,00
				-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
22.06	PISO TÁTIL			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
22.06.01	Piso tátil alerta em placas de borracha 25 x 25 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, cor azul, assentado sobrepostas ao piso existente,	m²	20,06	176,04	15,51	191,55	237,52	4.765,29		0,00	0,00%	0,00
22.06.02	Piso tátil alerta em aço inox polido, dimensão de 25 x 25 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, parafusado e colado ao piso externo, código TAIC 3010 - PINO/COLA - da Mozaik ou similar, incluindo furação do piso.	Pino	675,00	1,84	2,30	4,14	5,13	3.465,18		0,00	0,00%	0,00
22.06.03	Piso tátil alerta em aço inox polido, dimensão de 25 x 25 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, colado sobre o piso interno existente, código TAICC 3010 - COLA - da Mozaik ou similar.	Pino	150,00	2,07	1,39	3,46	4,29	643,56		0,00	0,00%	0,00
22.06.04	Piso tátil direcional em aço inox polido, dimensão de 25 x 25 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, parafusado e colado ao piso externo, código TDIC 2310 - PINO/COLA - da Mozaik ou similar, incluindo furação do piso.	Pç	375,00	9,12	6,67	15,79	19,58	7.342,35		0,00	0,00%	0,00
22.06.05	Piso tátil direcional em aço inox polido, dimensão de 25 x 25 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, colado sobre o piso interno existente, código TDICC 2310 - COLA - da Mozaik ou similar.	Pç	72,00	9,97	3,47	13,44	16,67	1.199,93		0,00	0,00%	0,00
22.06.06	Piso tátil de direção em placas de concreto 45 x 45 cm, antiderrapante, com superfície de relevos, cor vermelho, assentado com argamassa colante.	m²	1,01	41,59	16,03	57,62	71,45	72,35		0,00	0,00%	0,00
				-	-		-	-			0,00%	0,00
23	COMUNICAÇÃO VISUAL			-	-		-	29.725,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23.01	COMUNICAÇÃO VISUAL			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
23.01.01	Placa de Porta			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
23.01.01.01	(P-PO 100) - Placa de porta confeccionada através de 02 painéis sobrepostos, 01 de 47,0 x 10,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0 cm em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTO e PICTOGRAMA em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessório	Un	102,00	76,50	13,50	90,00	111,60	11.383,20		0,00	0,00%	0,00
23.01.01.02	(P-PO 200) - Placa de porta confeccionada através de 02 painéis sobrepostos, 01 de 47,0 x 17,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0 cm em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTO em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme proje	Un	15,00	80,75	14,25	95,00	117,80	1.767,00		0,00	0,00%	0,00
				-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
23.01.02	Placa de Parede			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
23.01.02.01	(P-PA 100) - Placa de parede confeccionada através de 02 painéis, 01 de 80,0 x 12,0 cm e 01 de 70,0 x 12,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTOS E PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme	Un	8,00	127,50	22,50	150,00	186,00	1.488,00		0,00	0,00%	0,00
23.01.02.02	(P-PA 100) - Placa de parede confeccionada através de 02 painéis, 01 de 90,0 x 12,0 cm e 01 de 70,0 x 12,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTOS E PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme	Un	15,00	127,50	22,50	150,00	186,00	2.790,00		0,00	0,00%	0,00
23.01.02.03	(P-PA 200) - Placa de parede confeccionada através de 02 painéis, 01 de 80,0 x 22,0 cm e 01 de 70,0 x 12,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTOS E PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme	Un	4,00	119,00	21,00	140,00	173,60	694,40		0,00	0,00%	0,00
23.01.02.04	(P-PA 300) - Placa de parede confeccionada através de 01 painel em PVC expandido pintado de 20 x 20 cm, com aplicação de Pictogramas em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	9,00	25,50	4,50	30,00	37,20	334,80		0,00	0,00%	0,00
23.01.02.05	(P-PA 400) - Placa de parede confeccionada através de dois painéis, 01 de 20 x 20 cm e 20 x 7 cm, em PVC expandido pintado com aplicação da Numeração de Pavimento em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessórios, conforme projeto e mem	Un	10,00	25,50	4,50	30,00	37,20	372,00		0,00	0,00%	0,00
				-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
23.01.03	Placa de Teto			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
23.01.03.01	(P-TE 100) - Placa de teto confeccionada através de 02 painéis, 01 de 100,0 x 30,0 cm e 01 de 70,0 x 20,0 cm, em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTOS E PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixação com suporte, conforme projeto e memorial des	Un	11,00	306,00	54,00	360,00	446,40	4.910,40		0,00	0,00%	0,00
				-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
23.02	PELICULAS			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
23.02.01	Película de Porta			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
23.02.01.01	(PL-PO 100) - Película de porta confeccionada através de adesivo de fundo com dimensões de 55,0 x 36,0 cm, com aplicação de textos e pictograma em vinil adesivo, incluindo fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	18,00	68,00	12,00	80,00	99,20	1.785,60		0,00	0,00%	0,00
				-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
23.02.02	Película de Vidro			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
23.02.02.01	(PL-VD 100) - Película de vidro confeccionada de faixa de 100 cm lineares de película jateada com largura de 12,0 cm, com aplicação de TEXTO e PICTOGRAMAS em vinil adesivo, incluindo fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	m	6,00	29,75	5,25	35,00	43,40	260,40		0,00	0,00%	0,00
				-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
23.02.03	Película Lisa			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
23.02.03.01	Película de vidro confeccionada de faixa de 100 cm lineares de película jateada com largura de 12,0 cm, incluindo fixação, conforme projeto e memorial descritivo.	m	3,89	5,88	1,04	6,92	8,58	33,38		0,00	0,00%	0,00
				-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
23.03	PAINEL DE PAREDE			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
23.03.01	(PN-PA 100) - Pannel de parede com fundo de PVC expandido, dimensões de 67,0 x 75,0 cm e 06 painéis de 62,5 x 9,0 cm cada sobrepostos, com aplicação de TEXTOS em vinil adesivo, incluindo fixação através de buchas e parafusos, conforme projeto e memorial	Un	9,00	297,50	52,50	350,00	434,00	3.906,00		0,00	0,00%	0,00
				-	-		-	-			0,00%	0,00
24	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			-	-		-	48.270,19	0,00%	0,00	93,26%	45.016,20
24.01				-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
24.01.01	Perfuração de laje Ø 40 mm	Un	59,00	-	30,00	30,00	37,20	2.194,80		0,00	100,00%	2.194,80
24.01.02	Perfuração de laje Ø 57 mm	Un	37,00	-	30,00	30,00	37,20	1.376,40		0,00	100,00%	1.376,40
24.01.03	Perfuração de laje Ø 112 mm	Un	22,00	-	30,00	30,00	37,20	818,40		0,00	100,00%	818,40
24.01.04	Perfuração de laje Ø 160 mm	Un	14,00	-	30,00	30,00	37,20	520,80		0,00	100,00%	520,80
24.01.05	Mobilização, montagem e desmontagem dos equipamentos de perfuração	Vb	1,00	350,00	-	350,00	434,00	434,00		0,00	100,00%	434,00
24.01.06	Remoção de tubo embutido Ø 25 mm de Água Potável, incluindo conexões	m	28,00	-	5,15	5,15	6,39	178,81		0,00	100,00%	178,81
24.01.07	Remoção de tubo embutido Ø 40 mm de Água Potável, incluindo conexões	m	11,20	-	5,15	5,15	6,39	71,53		0,00	100,00%	71,53
24.01.08	Remoção de tubo embutido Ø 50 mm de Água Potável, incluindo conexões	m	38,08	-	5,15	5,15	6,39	243,18		0,00	100,00%	243,18
24.01.09	Remoção de tubo aparente Ø 60 mm de Água Potável, incluindo conexões	m	22,00	-	3,01	3,01	3,73	82,12		0,00	100,00%	82,12
24.01.10	Remoção de tubo aparente Ø 40 mm de Esgoto, incluindo conexões	m	32,00	-	2,40	2,40	2,98	95,24		0,00	100,00%	95,24
24.01.11	Remoção de tubo aparente Ø 50 mm de Esgoto, incluindo conexões	m	44,00	-	2,40	2,40	2,98	130,95		0,00	100,00%	130,95
24.01.12	Remoção de tubo aparente Ø 100 mm de Esgoto, incluindo conexões	m	44,00	-	3,01	3,01	3,73	164,23		0,00	100,00%	164,23
24.01.13	Remoção de tubo embutido Ø 40 mm de Esgoto, incluindo conexões	m	15,40	-	5,15	5,15	6,39	98,35		0,00	100,00%	98,35
24.01.14	Remoção de tubo embutido Ø 50 mm de Esgoto, incluindo conexões	m	12,60	-	5,15	5,15	6,39	80,47		0,00	100,00%	80,47
24.01.15	Remoção de tubo embutido Ø 100 mm de Esgoto, incluindo conexões	m	16,10	-	7,73	7,73	9,59	154,33		0,00	100,00%	154,33
24.01.16	Cap PVC Soldável - Ø 60 mm	Un	2,00	9,81	1,91	11,72	14,53	29,07		0,00	100,00%	29,07
24.01.17	Cap PVC Esgoto - Ø 100 mm	Un	2,00	8,28	2,89	11,17	13,85	27,71		0,00	100,00%	27,71
24.01.18	Remoção de Caixa Sifonada de 150 x 150 x 50 mm	Un	14,00	-	10,31	10,31	12,78	178,99		0,00	100,00%	178,99
24.01.19	Fechamento do furo da caixa sifonada com argamassa 1:3, incluindo forma de suporte	Un	14,00	1,60	2,11	3,71	4,60	64,41		0,00	100,00%	64,41
24.01.20	Demolição de alvenaria para instalação das caixas montanas com aplicação de tela e, posterior fechamento com argamassa traço 1:3	Un	8,00	31,83	13,15	44,98	55,78	446,21		0,00	100,00%	446,21
24.01.21	Abertura/Fechamento de rasgo na alvenaria para passagem de tubulações com argamassa traço 1:4	m	173,96	-	3,25	3,25	4,03	701,06		0,00	100,00%	701,06
				-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
24.02	Sistema de Água Fria			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
24.02.01	Tubo PVC Soldável - 25 mm	m	252,75	2,42	3,15	5,57	6,91	1.745,68		0,00	100,00%	1.745,68
24.02.02	Tubo PVC Soldável - 32 mm	m	5,10	5,51	3,41	8,92	11,06	56,46		0,00	100,00%	56,46
24.02.03	Tubo PVC Soldável - 50 mm	m	21,62	8,81	6,31	15,12	18,75	405,26		0,00	100,00%	405,26
24.02.04	Tubo PVC Soldável - 60 mm	m	3,65	16,38	7,88	24,26	30,08	109,87		0,00	100,00%	109,87
24.02.05	Adaptador PVC Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro - 25 x 3/4"	Un	42,00	0,80	2,46	3,26	4,04	169,79		0,00	100,00%	169,79
24.02.06	Bucha de redução PVC soldável curta - 32 x 25 mm	Un	1,00	0,86	2,46	3,32	4,12	4,12		0,00	100,00%	4,12
24.02.07	Bucha de redução PVC soldável curta - 60 x 50 mm	Un	2,00	10,60	6,31	16,91	20,97	41,94		0,00	100,00%	41,94
24.02.08	Bucha de redução PVC soldável curta - 75 x 60 mm	Un	1,00	8,73	5,05	13,78	17,09	17,09		0,00	100,00%	17,09
24.02.09	Bucha de redução PVC soldável longa - 50 x 25 mm	Un	7,00	2,58	3,94	6,52	8,08	56,60		0,00	100,00%	56,60
24.02.10	Bucha de redução PVC soldável longa - 50 x 32 mm	Un	1,00	3,59	3,94	7,53	9,34	9,34		0,00	100,00%	9,34
24.02.11	Bucha de redução PVC soldável longa - 75 x 50 mm	Un	2,00	12,01	7,10	19,11	23,70	47,40		0,00	100,00%	47,40
24.02.12	Joelho 45° PVC soldável - 25 mm	Un	12,00	1,19	4,73	5,92	7,34	88,09		0,00	100,00%	88,09

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
24.02.13	Joelho 45º PVC soldável - 32 mm	Un	1,00	2,57	4,73	7,30	9,05	9,06		0,00	100,00%	9,06
24.02.14	Joelho 90º PVC soldável - 25 mm	Un	115,00	0,71	4,73	5,44	6,75	775,75		0,00	100,00%	775,75
24.02.15	Joelho 90º PVC soldável - 32 mm	Un	4,00	1,48	4,73	6,21	7,70	30,81		0,00	100,00%	30,81
24.02.16	Joelho 90º PVC soldável - 50 mm	Un	29,00	3,49	6,57	10,06	12,47	361,76		0,00	100,00%	361,76
24.02.17	Joelho 90º PVC soldável - 60 mm	Un	1,00	15,52	7,62	23,14	28,69	28,70		0,00	100,00%	28,70
24.02.18	Joelho 90º PVC soldável - 75 mm	Un	1,00	48,87	8,41	57,28	71,03	71,03		0,00	100,00%	71,03
24.02.19	Joelho 90º PVC soldável e com bucha de latão - 25 x 3/4"	Un	24,00	6,35	4,92	11,27	13,97	335,40		0,00	100,00%	335,40
24.02.20	Luva PVC soldável - 25 mm	Un	75,00	0,82	2,37	3,19	3,96	296,67		0,00	100,00%	296,67
24.02.21	Luva PVC soldável - 32 mm	Un	2,00	1,34	2,89	4,23	5,25	10,50		0,00	100,00%	10,50
24.02.22	Luva PVC soldável - 50 mm	Un	12,00	2,91	3,68	6,59	8,17	98,06		0,00	100,00%	98,06
24.02.23	Luva PVC soldável - 75 mm	Un	2,00	12,10	4,20	16,30	20,21	40,43		0,00	100,00%	40,43
24.02.24	Têe de redução PVC soldável - 50 x 25 mm	Un	8,00	6,13	7,36	13,49	16,73	133,83		0,00	100,00%	133,83
24.02.25	Têe de redução PVC soldável - 60 x 50 mm	Un	4,00	1,37	9,56	10,93	13,55	54,22		0,00	100,00%	54,22
24.02.26	Têe PVC soldável - 25 mm	Un	29,00	5,78	4,73	10,51	13,03	377,94		0,00	100,00%	377,94
24.02.27	Têe PVC soldável - 50 mm	Un	12,00	5,98	7,10	13,08	16,22	194,64		0,00	100,00%	194,64
24.02.28	Têe PVC soldável - 60 mm	Un	1,00	20,83	7,88	28,71	35,60	35,61		0,00	100,00%	35,61
24.02.29	Têe PVC soldável - 75 mm	Un	3,00	34,07	9,99	44,06	54,63	163,91		0,00	100,00%	163,91
24.02.30	Têe PVC soldável e com bucha de latão na bolsa central - 25mm x 3/4"	Un	8,00	8,34	5,19	13,53	16,78	134,22		0,00	100,00%	134,22
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
24.03	Sistema de Esgoto			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
24.03.01	Tubo PVC esgoto - Ø 40 mm	m	54,95	2,68	6,55	9,23	11,45	628,86		0,00	100,00%	628,86
24.03.02	Tubo PVC esgoto - Ø 50 mm	m	158,95	4,67	8,19	12,86	15,95	2.534,69		0,00	100,00%	2.534,69
24.03.03	Tubo PVC esgoto - Ø 75 mm	m	14,38	5,88	13,11	18,99	23,55	338,55		0,00	100,00%	338,55
24.03.04	Tubo PVC esgoto - Ø 100 mm	m	43,67	7,04	13,11	20,15	24,99	1.091,14		0,00	100,00%	1.091,14
24.03.05	Anel de Borracha - Ø 40 mm	Un	74,00	0,66	1,64	2,30	2,85	211,05		0,00	100,00%	211,05
24.03.06	Anel de Borracha - Ø 50 mm	Un	148,00	0,70	2,18	2,88	3,57	528,54		0,00	100,00%	528,54
24.03.07	Anel de Borracha - Ø 75 mm	Un	8,00	0,90	3,55	4,45	5,52	44,15		0,00	100,00%	44,15
24.03.08	Anel de Borracha - Ø 100 mm	Un	66,00	1,29	4,37	5,66	7,02	463,22		0,00	100,00%	463,22
24.03.09	Luva PVC Esgoto - Ø 40 mm	Un	50,00	1,20	3,15	4,35	5,39	269,70		0,00	100,00%	269,70
24.03.10	Luva PVC Esgoto - Ø 50 mm	Un	110,00	2,20	3,68	5,88	7,29	802,04		0,00	100,00%	802,04
24.03.11	Luva PVC Esgoto - Ø 75 mm	Un	8,00	3,77	4,47	8,24	10,22	81,75		0,00	100,00%	81,75
24.03.12	Luva PVC Esgoto - Ø 100 mm	Un	49,00	5,19	5,52	10,71	13,28	650,74		0,00	100,00%	650,74
24.03.13	Cap PVC esgoto 40 mm	Un	6,00	1,53	1,91	3,44	4,27	25,60		0,00	100,00%	25,60
24.03.14	Cap PVC esgoto 100 mm	Un	6,00	8,28	2,89	11,17	13,85	83,11		0,00	100,00%	83,11
24.03.15	Joelho 45º PVC esgoto 40 mm	Un	16,00	1,66	6,57	8,23	10,21	163,29		0,00	100,00%	163,29
24.03.16	Joelho 45º PVC esgoto 50 mm	Un	21,00	2,66	7,10	9,76	12,10	254,16		0,00	100,00%	254,16
24.03.17	Joelho 45º PVC esgoto 75 mm	Un	3,00	5,71	8,94	14,65	18,17	54,50		0,00	100,00%	54,50
24.03.18	Joelho 45º PVC esgoto 100 mm	Un	5,00	7,09	10,51	17,60	21,82	109,12		0,00	100,00%	109,12
24.03.19	Joelho 90º PVC esgoto 40 mm	Un	29,00	1,48	6,57	8,05	9,98	289,48		0,00	100,00%	289,48
24.03.20	Joelho 90º PVC esgoto 50 mm	Un	40,00	2,23	7,10	9,33	11,57	462,77		0,00	100,00%	462,77
24.03.21	Joelho 90º PVC esgoto 100 mm	Un	18,00	7,46	10,53	17,99	22,31	401,54		0,00	100,00%	401,54
24.03.22	Joelho 90º com Anel PVC esgoto 40 mm	Un	32,00	4,12	5,46	9,58	11,88	380,14		0,00	100,00%	380,14
24.03.23	Junção Simples PVC esgoto - 40 x 40 mm	Un	5,00	3,21	5,46	8,67	10,75	53,76		0,00	100,00%	53,76
24.03.24	Junção Simples PVC esgoto - 50 x 50 mm	Un	3,00	5,14	6,57	11,71	14,52	43,57		0,00	100,00%	43,57
24.03.25	Junção Simples PVC esgoto - 75 x 75 mm	Un	1,00	10,99	8,94	19,93	24,71	24,72		0,00	100,00%	24,72
24.03.26	Junção Simples PVC esgoto - 100 x 100 mm	Un	7,00	14,77	10,51	25,28	31,35	219,44		0,00	100,00%	219,44
24.03.27	Junção com Redução PVC esgoto - 75 x 50 mm	Un	2,00	10,35	10,32	20,67	25,63	51,27		0,00	100,00%	51,27
24.03.28	Junção com Redução PVC esgoto - 100 x 50 mm	Un	7,00	12,10	12,17	24,27	30,09	210,67		0,00	100,00%	210,67
24.03.29	Bucha de Redução PVC esgoto 50 x 40 mm	Un	13,00	1,48	8,74	10,22	12,67	164,75		0,00	100,00%	164,75

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
24.03.30	Redução excêntrica PVC esgoto 75 x 50 mm	Un	1,00	7,19	9,83	17,02	21,10	21,11		0,00	100,00%	21,11
24.03.31	Redução excêntrica PVC esgoto 100 x 50 mm	Un	4,00	7,87	10,92	18,79	23,30	93,20		0,00	100,00%	93,20
24.03.32	Têe PVC esgoto 50 x 50 mm	Un	33,00	5,08	7,36	12,44	15,43	509,05		0,00	100,00%	509,05
24.03.33	Têe PVC esgoto 100 x 100 mm	Un	8,00	11,96	11,56	23,52	29,16	233,32		0,00	100,00%	233,32
24.03.34	Têe c/ Redução PVC esgoto 75 x 50 mm	Un	1,00	7,64	10,10	17,74	22,00	22,00		0,00	100,00%	22,00
24.03.35	Dispositivo anti-infiltração de PVC para caixa sifonada - Ø 150 mm	Un	14,00	22,95	6,83	29,78	36,93	516,99		0,00	100,00%	516,99
24.03.36	Caixa Sifonada Montada c/ Grelha e Porta Grelha DN 150 x 150 x 50 mm	Un	16,00	16,32	13,14	29,46	36,53	584,49		0,00	100,00%	584,49
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
24.04	Sistema Pluvial			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
24.04.01	Tubo PVC esgoto - 75 mm	m	2,56	5,88	13,11	18,99	23,55	60,36		0,00	100,00%	60,36
24.04.02	Anel de Borracha - Ø 50 mm	Un	3,00	0,70	2,18	2,88	3,57	10,72		0,00	100,00%	10,72
24.04.03	Anel de Borracha - Ø 100 mm	Un	3,00	1,29	4,37	5,66	7,02	21,06		0,00	100,00%	21,06
24.04.04	Luva PVC Esgoto - Ø 100 mm	Un	3,00	5,19	5,52	10,71	13,28	39,85		0,00	100,00%	39,85
24.04.05	Junção com Redução PVC esgoto - 100 x 50 mm	Un	3,00	12,10	12,17	24,27	30,09	90,29		0,00	100,00%	90,29
24.04.06	Caixa Sifonada Montada c/ Grelha e Porta Grelha DN 150 x 185 x 75 mm	Un	1,00	16,32	13,14	29,46	36,53	36,54		0,00	100,00%	36,54
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
24.05	Drenos da Climatização			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
24.05.01	Tubo PVC Soldável - 25 mm	m	153,30	2,42	3,15	5,57	6,91	1.058,79		0,00	70,00%	741,15
24.05.02	Tubo PVC Soldável - 32 mm	m	58,52	5,51	3,41	8,92	11,06	647,28		0,00	70,00%	453,10
24.05.03	Tubo PVC Soldável - 40 mm	m	119,00	7,50	5,26	12,76	15,82	1.882,84		0,00	70,00%	1.317,99
24.05.04	Tubo PVC Soldável - 50 mm	m	7,21	8,81	6,31	15,12	18,75	135,18		0,00	70,00%	94,63
24.05.05	Bucha de redução PVC soldável curta - 32 x 25 mm	Un	62,00	0,86	2,46	3,32	4,12	255,25		0,00	70,00%	178,68
24.05.06	Bucha de redução PVC soldável curta - 40 x 32 mm	Un	23,00	1,65	3,82	5,47	6,78	156,01		0,00	70,00%	109,21
24.05.07	Bucha de redução PVC soldável curta - 50 x 40 mm	Un	4,00	2,33	4,64	6,97	8,64	34,58		0,00	70,00%	24,21
24.05.08	Bucha de redução PVC soldável longa - 40 x 25 mm	Un	8,00	2,30	3,15	5,45	6,76	54,07		0,00	70,00%	37,85
24.05.09	Joelho 45º PVC soldável - 25 mm	Un	87,00	1,01	4,92	5,93	7,35	639,73		0,00	70,00%	447,81
24.05.10	Joelho 45º PVC soldável - 32 mm	Un	62,00	1,77	4,92	6,69	8,30	514,33		0,00	70,00%	360,03
24.05.11	Joelho 45º PVC soldável - 40 mm	Un	2,00	3,15	7,65	10,80	13,39	26,79		0,00	70,00%	18,75
24.05.12	Joelho 45º PVC soldável - 50 mm	Un	2,00	6,24	7,65	13,89	17,22	34,45		0,00	70,00%	24,12
24.05.13	Joelho 90º PVC soldável - 25 mm	Un	78,00	1,84	4,92	6,76	8,38	653,83		0,00	70,00%	457,68
24.05.14	Joelho 90º PVC soldável - 40 mm	Un	4,00	6,57	4,92	11,49	14,25	57,00		0,00	70,00%	39,90
24.05.15	Luva PVC soldável - 25 mm	Un	51,00	0,82	2,37	3,19	3,96	201,74		0,00	70,00%	141,22
24.05.16	Luva PVC soldável - 32 mm	Un	21,00	1,34	2,89	4,23	5,25	110,15		0,00	70,00%	77,11
24.05.17	Luva PVC soldável - 40 mm	Un	37,00	2,73	3,42	6,15	7,63	282,17		0,00	70,00%	197,52
24.05.18	Luva PVC soldável - 50 mm	Un	3,00	2,91	3,68	6,59	8,17	24,52		0,00	70,00%	17,16
24.05.19	Têe PVC soldável - 25 mm	Un	2,00	5,78	4,73	10,51	13,03	26,07		0,00	70,00%	18,25
24.05.20	Têe PVC soldável - 32 mm	Un	41,00	2,39	4,99	7,38	9,15	375,20		0,00	70,00%	262,64
24.05.21	Têe PVC soldável - 40 mm	Un	27,00	5,54	6,04	11,58	14,36	387,70		0,00	70,00%	271,39
24.05.22	Têe PVC soldável - 50 mm	Un	1,00	5,98	7,10	13,08	16,22	16,22		0,00	70,00%	11,35
				-	-	-	-	-			0,00%	0,00
				-	-	-	-	-			0,00%	0,00
24.06	Abraçadeiras e Suportes			-	-	-	-	-			0,00%	0,00
24.06.01	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa DN 25 mm (3/4"), incluindo parafusos e buchas	Un	254,00	1,23	3,28	4,51	5,59	1.420,47		0,00	100,00%	1.420,47
24.06.02	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa DN 32 mm (1"), incluindo parafusos e buchas	Un	73,00	1,60	3,82	5,42	6,72	490,62		0,00	100,00%	490,62
24.06.03	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa DN 40 mm (1.1/4"), incluindo parafusos e buchas	Un	63,00	1,56	4,37	5,93	7,35	463,26		0,00	100,00%	463,26

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
24.06.04	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa DN 50 mm (1.1/2"), incluindo parafusos e buchas	Un	47,00	1,68	4,92	6,60	8,18	384,65		0,00	100,00%	384,65
24.06.05	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa DN 75 mm (2.1/2"), incluindo parafusos e buchas	Un	5,00	2,33	6,28	8,61	10,68	53,39		0,00	100,00%	53,39
24.06.06	Abraçadeira em aço galvanizado para tubulação suspensa DN 100 mm ou 110 mm (4"), incluindo parafusos e buchas	Un	15,00	5,53	7,65	13,18	16,34	245,15		0,00	100,00%	245,15
24.06.07	Fita Perfurada 17 mm x 25 m Walsywa para tubulações de 150 mm suspensas, incluindo fixação	m	13,00	1,24	2,18	3,42	4,24	55,14		0,00	100,00%	55,14
				-	-	-	-	-			0,00%	0,00
				-	-	-	-	-			0,00%	0,00
24.07	Registros e Hidrômetros			-	-	-	-	-			0,00%	0,00
24.07.01	Registro de Gaveta Ø 3/4" com acabamento cromado	Un	21,00	58,43	15,73	74,16	91,96	1.931,13		0,00	100,00%	1.931,13
				-	-	-	-	-			0,00%	0,00
				-	-	-	-	-			0,00%	0,00
24.08	Diversos			-	-	-	-	-			0,00%	0,00
27.08.01	Mocheta (duto) de alvenaria para passagem de tubulações, estruturada com tela de nylon, conforme projeto e memorial descritivo.	m²	92,79	26,80	40,99	67,79	84,06	7.800,12		0,00	100,00%	7.800,12
27.08.02	Sanca de gesso com altura de 15 cm, moldada na obra, conforme projeto e memorial descritivo.	m	34,21	2,84	16,21	19,05	23,62	808,09		0,00	0,00%	0,00
27.08.03	Torneira de jardim com registro ¼ volta cromada, linha Standard da Deca, Docol ou similar.	Un	2,00	57,15	12,90	70,05	86,86	173,73		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-			0,00%	0,00
25	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO			-	-	-	-	108.144,18	0,94%	1.017,64	72,08%	77.955,09
25.01	Escavação e Reaterro			-	-	-	-	-			0,00%	0,00
25.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	m³	14,76	-	19,94	19,94	24,73	364,95		0,00	100,00%	364,95
25.01.02	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	14,76	5,71	7,34	13,05	16,18	238,85		0,00	100,00%	238,85
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
25.02	Sistema Hidraulico Preventivo			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
25.02.01	Mangueira Tipo I, de fibra revestida com borracha 1.1/2", comprimento = 15 m	Un	3,00	166,00	5,16	171,16	212,24	636,72		0,00	100,00%	636,72
25.02.02	Mangueira Tipo I, de fibra revestida com borracha 1.1/2", comprimento = 20 m	Un	1,00	196,71	10,31	207,02	256,70	256,71		0,00	100,00%	256,71
25.02.03	Esguicho simples 1 1/2", bocal com requinte 13mm	Un	4,00	183,81	6,45	190,26	235,92	943,69		0,00	100,00%	943,69
25.02.04	Adaptador rosca x Storz 2 1/2" com redução para 1 1/2"	Un	4,00	41,58	9,02	50,60	62,74	250,98		0,00	100,00%	250,98
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
25.03	Extintores			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
25.03.01	Extintor CO2 6kg, fixado na parede a ser instalado, incluindo haste de fixação e sinalização.	Un	1,00	378,45	13,89	392,34	486,50	486,51		0,00	0,00%	0,00
25.03.02	Extintor PQS - ABC 4kg, fixado na parede a ser instalado, incluindo haste de fixação e sinalização.	Un	20,00	135,73	13,89	149,62	185,53	3.710,58		0,00	0,00%	0,00
25.03.03	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	m²	21,00	1,85	7,11	8,96	11,11	233,32		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
25.04	Iluminação de Emergência Autônoma			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
25.04.01	Plaqueta autônoma de indicação de "SAÍDA" luminosa de LED na cor vermelha com fundo branco, fixada na parede/porta, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	25,00	45,19	8,73	53,92	66,86	1.671,52		0,00	50,00%	835,76
25.04.02	Plaqueta de indicação de "SAÍDA" luminosa nos dois versos na cor vermelha com fundo branco, instalada no teto através de suporte metálico, autônoma, LED, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	6,00	48,00	12,47	60,47	74,98	449,90		0,00	50,00%	224,95
25.04.03	Iluminação de emergência autônoma instalada na parede ou teto, LED, nível de iluminamento mínimo de 3 lux	Un	103,00	96,54	7,48	104,02	128,98	13.285,44		0,00	50,00%	6.642,72

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
25.04.04	Iluminação de emergência autônoma instalada na parede ou teto, LED, nível de iluminação 5 lux, conforme memorial e detalhes em projeto	Un	30,00	96,54	7,48	104,02	128,98	3.869,55		0,00	50,00%	1.934,78
25.04.05	Botoeira (quebra vidro/push-button) com led vermelho sistema ativado, led verde em manutenção, botão NF e vidro frontal, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	10,00	81,77	7,23	89,00	110,36	1.103,60		0,00	80,00%	882,88
25.04.06	Detector automático de fumaça óptico, com raio de ação de 60 m², conforme projeto e memorial descritivo.	Un	71,00	172,25	7,23	179,48	222,56	15.801,42		0,00	80,00%	12.641,14
25.04.07	Central de alarme 12 V, com duas baterias para 7 laços endereçável, conforme memorial descritivo e detalhe em projeto	Un	1,00	4.096,90	49,86	4.146,76	5.141,98	5.141,99		0,00	100,00%	5.141,99
25.04.08	Sirene 12V, com pressão sonora 120 dB, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1,00	18,20	15,21	33,41	41,43	41,43		0,00	100,00%	41,43
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
25.05	Alimentação do Sistema de Alarme de Incêndio			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
25.05.01	Eletroduto em aço galvanizado - Ø 3/4"	m	399,29	6,15	7,48	13,63	16,90	6.748,47		0,00	100,00%	6.748,47
25.05.02	Eletroduto em aço galvanizado - Ø 1"	#N/D	15,90	7,23	7,48	14,71	18,24	290,05		0,00	100,00%	290,05
25.05.03	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	134,00	3,18	6,83	10,01	12,41	1.663,27		0,00	100,00%	1.663,27
25.05.04	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	6,00	4,68	7,36	12,04	14,93	89,58		0,00	100,00%	89,58
25.05.05	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	12,00	4,18	9,46	13,64	16,91	202,97		0,00	100,00%	202,97
25.05.06	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	2,00	5,68	9,98	15,66	19,42	38,84		0,00	100,00%	38,84
25.05.07	CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	185,00	8,81	7,48	16,29	20,20	3.736,93		0,00	100,00%	3.736,93
25.05.08	CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	7,00	13,65	7,48	21,13	26,20	183,41		0,00	100,00%	183,41
25.05.09	Abraçadeira para fixação de eletroduto 3/4", metálica tipo cunha, incluindo parafusos e buchas.	Un	168,00	1,22	2,99	4,21	5,22	877,03		0,00	100,00%	877,03
25.05.10	Abraçadeira para fixação de eletroduto 1", metálica tipo cunha, incluindo parafusos e buchas.	Un	11,00	1,60	3,49	5,09	6,31	69,43		0,00	100,00%	69,43
25.05.11	Cabo trançado blindado duplo 2 x #0,75 mm²,	m	588,80	1,30	2,49	3,79	4,70	2.767,13		0,00	100,00%	2.767,13
25.05.12	Cabo trançado blindado duplo 2 x #1,50 mm²,	m	588,80	1,89	2,49	4,38	5,43	3.197,90		0,00	100,00%	3.197,90
25.05.13	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DE MAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	m²	42,85	7,39	3,86	11,25	13,95	597,71		0,00	100,00%	597,71
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
25.06	Para Raio			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
25.06.01	CABO DE COBRE NU 35 MM2	m	345,47	13,28	5,24	18,52	22,96	7.933,75		0,00	60,00%	4.760,25
25.06.02	CABO DE COBRE NU 50 MM2	m	82,80	17,31	7,73	25,04	31,05	2.570,91		0,00	100,00%	2.570,91
25.06.03	Caixa de inspeção de passagem em concreto com diâmetro de 30 cm, incluindo escavação e reaterro	Un	8,00	14,33	14,41	28,74	35,64	285,11		0,00	100,00%	285,11
25.06.04	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	Un	8,00	31,33	9,97	41,30	51,21	409,70		0,00	100,00%	409,70
25.06.05	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	8,00	4,73	9,97	14,70	18,23	145,83		0,00	100,00%	145,83
25.06.06	Execução solda exotérmica barra/condutor conexão lateral	Un	8,00	14,00	2,74	16,74	20,76	166,07		0,00	100,00%	166,07
25.06.07	Cartucho de Selante de Silicone 310 ml	CJ	14,00	43,29	4,61	47,90	59,40	831,55		0,00	100,00%	831,55
25.06.08	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER E INSTALAR	Un	173,00	3,17	4,99	8,16	10,12	1.750,49		0,00	100,00%	1.750,49
25.06.09	Terminal paralelo de cabo # 35 mm²	Un	8,00	4,52	4,99	9,51	11,79	94,34		0,00	100,00%	94,34
25.06.10	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARACABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.	Un	2,00	3,93	1,96	5,89	7,30	14,61		0,00	100,00%	14,61

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
25.06.11	Terminal aéreo h= 60cm, incluindo sistema de fixação, conforme detalhe em projeto	Un	6,00	7,10	12,47	19,57	24,27	145,61		0,00	100,00%	145,61
25.06.12	Parafuso 4,2 x 32 autoatarraxante, incluindo bucha S-6	Un	173,00	0,25	0,70	0,95	1,18	203,80		0,00	100,00%	203,80
25.06.13	Parafuso 3/16" x 60 autoatarraxante, incluindo bucha S-10	Un	12,00	0,95	0,70	1,65	2,05	24,56		0,00	100,00%	24,56
25.06.14	Quadro de equalização do potencial metálico para malha de aterramento, dimensão de 20 x 20 x 10 cm	UN	1,00	207,27	62,33	269,60	334,30	334,31		0,00	100,00%	334,31
25.06.15	LASTRO DE BRITA	m³	14,90	79,57	19,94	99,51	123,39	1.839,05		0,00	100,00%	1.839,05
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
25.07	Tubulações e Conexões de GLP			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
25.07.01	Tubulação em aço galvanizado DIN 2440 sem costura, SCHEDULE 40 Ø 3/4".	m	17,54	18,79	7,73	26,52	32,88	576,80		0,00	0,00%	0,00
25.07.02	Tubulação em aço galvanizado DIN 2440 sem costura, SCHEDULE 40 Ø 1".	m	39,41	21,07	8,51	29,58	36,68	1.445,53		0,00	0,00%	0,00
25.07.03	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	6,00	4,18	9,46	13,64	16,91	101,49		0,00	0,00%	0,00
25.07.04	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	5,00	5,68	9,98	15,66	19,42	97,10		0,00	0,00%	0,00
25.07.05	TE DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	1,00	4,68	10,51	15,19	18,84	18,84		0,00	0,00%	0,00
25.07.06	TE DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	2,00	7,90	11,03	18,93	23,47	46,95		0,00	0,00%	0,00
25.07.07	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	6,00	3,18	6,83	10,01	12,41	74,48		0,00	0,00%	0,00
25.07.08	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	11,00	4,68	7,36	12,04	14,93	164,23		0,00	0,00%	0,00
25.07.09	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	3,00	2,44	6,83	9,27	11,49	34,49		0,00	0,00%	0,00
25.07.10	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	2,00	4,12	7,36	11,48	14,24	28,48		0,00	0,00%	0,00
25.07.11	Bucha de redução em aço galvanizado AGSC, rosca NPT de alta pressão Ø 1" x 3/4"	m	2,00	3,33	7,36	10,69	13,26	26,52		0,00	0,00%	0,00
25.07.12	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	3,00	13,65	9,72	23,37	28,98	86,94		0,00	0,00%	0,00
25.07.13	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	1,00	15,36	10,51	25,87	32,08	32,08		0,00	0,00%	0,00
25.07.14	Cap em aço galvanizado AGSC, rosca NPT de alta pressão Ø 3/4"	m	3,00	2,38	3,42	5,80	7,19	21,58		0,00	0,00%	0,00
25.07.15	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	3,00	35,81	15,76	51,57	63,95	191,85		0,00	0,00%	0,00
25.07.16	Fita veda rosca 18 mm x 50 m	m	12,00	8,42	7,82	16,24	20,14	241,66		0,00	0,00%	0,00
25.07.17	Estrado de madeira para base dos botijões de gás e compressores de ar comprimido, incluindo 2 demãos de verniz.	m²	1,92	37,74	33,39	71,13	88,20	169,35		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
25.08	Corrimões e Guarda Corpos			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
25.08.01	Corrimão de madeira para escada enclausada, conforme projeto	m	49,00	16,15	19,86	36,01	44,65	2.187,97		0,00	0,00%	0,00
25.08.02	Corrimão em tubo de aço galvanizado Ø 1.1/2", pintado com fundo em supergalvite e 02 demãos de tinta esmalte sintético, incluindo parafusos, suportes e acessórios para instalação, conforme projeto e memorial descritivo	m	5,50	37,56	35,40	72,96	90,47	497,59		0,00	0,00%	0,00
25.08.03	Guarda corpo da escada enclausurada do do edifício, fabricado em madeira de 1ª qualidade, incluindo fundo a base óleo e 3 demão de tinta a óleo, conforme detalhe em projeto.	m	48,16	61,93	90,17	152,10	188,60	9.083,17		0,00	80,00%	7.266,54
25.08.04	Reforma do guarda corpo da escada de entrada principal do do edifício, acrescentando 3 longarinas em aço galvanizado na mesma espessura das existentes, incluindo fundo zarcão e 3 demão de tinta esmalte sintético, conforme detalhe em projeto.	m	11,60	110,56	66,31	176,87	219,32	2.544,10	40,00%	1.017,64	90,00%	2.289,69
				-	-	-	-	-				
25.09	Diversos			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
25.09.01	Placa indicativa com o número de pavimento	Un	10,00	25,80	0,83	26,63	33,02	330,22		0,00	0,00%	0,00
25.09.02	Placa em acrílico indicativa de SAIDA.	Un	18,00	26,20	0,83	27,03	33,52	603,31		0,00	0,00%	0,00

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
25.09.03	Escada marinho estruturado com tubos de aço galvanizado 1.1/4", e degraus com tubos de aço galvanizado 1" com largura de 60 cm, gaiola de proteção de diâmetro 80 cm, conforme detalhe em memorial, incluindo aplicação de fundo em super galvite e 2 demão	m	8,05	213,36	119,48	332,84	412,72	3.322,41	0,00	0,00	100,00%	3.322,41
25.09.04	Execução de furos sobre gesso acartonado até 40 mm, conforme projeto.	m²	49,00	-	2,52	2,52	3,13	153,32	0,00	0,00	0,00%	0,00
25.09.05	Execução de furos sobre alvenaria até 40 mm, conforme projeto.	m²	14,00	-	2,83	2,83	3,51	49,08	0,00	0,00	0,00%	0,00
25.09.06	Execução de furos sobre concreto até 100 mm, conforme projeto.	m²	22,00	-	11,55	11,55	14,32	315,07	0,00	0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-			0,00%	0,00
26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			-	-	-	-	375.181,06	12,73%	47.778,40	88,99%	333.880,09
26.01	Iluminação			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
26.01.01	Luminária cilíndrica de sobrepo para 2 lâmpadas fluorescente compacta de 18W base E-27, com corpo e moldura em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, com refletor repuxado em alumínio anodizado e aletas parabólicas em alumínio acetinado, fix	un	47,00	68,01	4,46	72,47	89,86	4.223,56	40,00%	1.689,42	90,00%	3.801,20
26.01.02	Luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 (ø 26 mm) de 32 W de potência. Corpo e refletor com aletas parabólicas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, com rendimento de 77% do conj	un	239,00	220,96	11,15	232,11	287,82	68.788,12	30,00%	20.636,44	90,00%	61.909,31
26.01.03	Luminária de sobrepor tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso interno - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27. Ref: Modelo Hamon	un	3,00	49,49	2,23	51,72	64,13	192,40	66,00%	126,98	66,00%	126,98
26.01.04	Luminária tipo arandela. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro plano temperado jateado, para uso externo - com lâmpada PL - 23W ou incandescente 60W, base E-27 (Ref: Modelo Tatu, Itaim ou similar)	un	52,00	34,49	2,23	36,72	45,53	2.367,71	10,00%	236,77	90,00%	2.130,94
26.01.05	Luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 (ø 26 mm) de 32 W de potência. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, com rendimento de 77% do conjunto óptico. Alojamento	un	22,00	133,66	11,15	144,81	179,56	3.950,42	40,00%	1.580,17	80,00%	3.160,34
26.01.06	Luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 (ø 26 mm) de 32 W de potência, com reator eletrônico DIMERIZÁVEL. Corpo e refletor com aletas parabólicas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor bra	un	51,00	374,84	11,15	385,99	478,63	24.410,01	0,00	0,00	100,00%	24.410,01
26.01.07	Sinalizador de topo para prédio com lâmpada de 60W e fotocélula incorporado. (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	un	1,00	166,90	15,38	182,28	226,03	226,03	0,00	0,00	100,00%	226,03
				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00
				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00
26.02	Tomadas, Interruptores, Acessórios			-	-	-	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00
26.02.01	Adaptador em PVC para condutele Ø3/4", (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	un	1.920,00	0,75	1,12	1,87	2,32	4.452,10	5,00%	222,61	90,00%	4.006,89
26.02.02	Adaptador em PVC para condutele Ø1", (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	un	206,00	0,90	1,11	2,01	2,49	513,44	5,00%	25,67	90,00%	462,10
26.02.03	Bucha de redução para p/ eletroduto Ø1" para Ø3/4" (Ref: Wetzel ou similar) . Fornecimento e instalação.	un	107,00	2,70	1,12	3,82	4,74	506,84	5,00%	25,34	90,00%	456,16
26.02.04	Sensor de Presença de sobrepor 220/127V bivolt, fornecimento e instalação	un	21,00	32,54	6,69	39,23	48,65	1.021,55	10,00%	102,16	90,00%	919,40
26.02.05	Interruptor 1 seção simples + tomada 2P+T - 10A/250Vca, c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	un	25,00	14,03	4,73	18,76	23,26	581,56	10,00%	58,16	90,00%	523,40

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.02.06	Interruptor 1 seção simples - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	un	35,00	6,39	4,73	11,12	13,79	482,61	10,00%	48,26	90,00%	434,35
26.02.07	Interruptor pulsador campainha - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	un	8,00	4,97	4,73	9,70	12,03	96,23	10,00%	9,62	90,00%	86,61
26.02.08	Interruptor 2 seção simples - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	un	35,00	10,56	9,46	20,02	24,82	868,87	10,00%	86,89	90,00%	781,98
26.02.09	Interruptor 1 seção paralelo - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	un	6,00	8,09	4,73	12,82	15,90	95,39	10,00%	9,54	90,00%	85,85
26.02.10	Interruptor 1 seção simples + 1 seção paralelo - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	un	1,00	11,12	4,73	15,85	19,65	19,66		0,00	100,00%	19,66
26.02.11	Campainha tipo cigarra de sobrepor (Ref: Pial Legrand ou similar), fornecimento e instalação	un	8,00	9,55	4,73	14,28	17,71	141,66		0,00	100,00%	141,66
26.02.12	Tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	un	564,00	8,16	4,73	12,89	15,98	9.014,76	15,00%	1.352,21	90,00%	8.113,28
26.02.13	Tomada 2P+T com posto na cor vermelha - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	un	18,00	8,16	4,73	12,89	15,98	287,71	90,00%	258,94	90,00%	258,94
26.02.14	Caixa para condutele em PVC, multiplas opções de instalação - Ø3/4" Cor: branca (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	un	1.394,00	5,95	2,23	8,18	10,14	14.139,63	5,00%	706,98	95,00%	13.432,65
26.02.15	Caixa para condutele em PVC, multiplas opções de instalação - Ø1" Cor: branca (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	un	101,00	7,77	2,23	10,00	12,40	1.252,40	5,00%	62,62	85,00%	1.064,54
26.02.16	Tampa cega para condutele Ø1" em termoplástico, cor Branca, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	un	99,00	2,83	1,69	4,52	5,60	554,88	10,00%	55,49	90,00%	499,39
26.02.17	Tampa cega para condutele Ø3/4" em termoplástico, cor Branca, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	un	601,00	1,89	1,69	3,58	4,44	2.667,96	10,00%	266,80	90,00%	2.401,16
26.02.18	Interruptor 3 seção simples - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	un	27,00	14,87	4,73	19,60	24,30	656,21	10,00%	65,62	90,00%	590,59
26.02.19	Interruptor 2 seção simples + 1 seção paralelo - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou similar), fornecimento e instalação	un	1,00	15,85	4,73	20,58	25,52	25,52		0,00	100,00%	25,52
26.02.20	Tomada 2P+T - 20A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	un	6,00	9,73	4,73	14,46	17,93	107,59	40,00%	43,04	90,00%	96,83
26.02.21	Interruptor 2 seção simples - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel Legrand ou similar),fornecimento e instalação	un	4,00	8,89	4,73	13,62	16,89	67,56	40,00%	27,02	90,00%	60,80
26.02.22	Tomada dupla 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ canaleta metálica tipo D, linha standard (73x25x3000)mm, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Dutotec ou similar),fornecimento e instalação	un	12,00	22,35	4,73	27,08	33,58	402,96	100,00%	402,96	100,00%	402,96

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.02.23	Variador de Luminosidade Rotativo (Dimer), para lâmpada fluorescente com proteção térmica contra sobre carga - 10A/250Vca , c/ tampa e suporte para condutele, cor branca, conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Wetzel ou s	un	8,00	62,48	4,73	67,21	83,34	666,73		0,00	0,00%	0,00
26.02.24	Interruptor simples, 2 seções + tomada 2P+T - 10A/250Vca , c/ tampa p/ caixa 4x2", conforme norma: NBR 14136 - Plugues e tomadas par uso doméstico, (Ref: Pial Legrand ou similar),fornecimento e instalação	un	2,00	13,05	4,73	17,78	22,05	44,10		0,00	0,00%	0,00
26.02.25	Tomada 2P+T com posto na cor vermelha - 10A/250Vca , c/ tampa para caixa metálica galvanizada 4x2" fixada em perfilado, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Percal ou similar)	un	20,00	15,68	11,15	26,83	33,27	665,39		0,00	100,00%	665,39
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
26.03	Eletrodutos, Perfilados, Cabos e Acessórios			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
26.03.01	Eletrocalha metálica perfurada (150x100)mm, em barra de 3000mm, com balancim, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	71,00	58,72	6,69	65,41	81,11	5.758,70	3,00%	172,76	98,00%	5.643,53
26.03.02	Eletrocalha metálica perfurada (200x100)mm, em barra de 3000mm, com balancim, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	4,00	87,99	6,69	94,68	117,40	469,62		0,00	100,00%	469,62
26.03.03	Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada (200x100)mm, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	un	4,00	30,49	4,73	35,22	43,67	174,70		0,00	100,00%	174,70
26.03.04	Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, cor branca, conforme norma Nbr 15465 - Sistema de eletrodutos, , em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	759,00	18,54	4,46	23,00	28,52	21.646,68	5,00%	1.082,33	95,00%	20.564,35
26.03.05	Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, cor branca, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	53,00	26,06	5,58	31,64	39,23	2.079,39	5,00%	103,97	95,00%	1.975,42
26.03.06	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	un	26,00	6,69	1,12	7,81	9,68	251,80	5,00%	12,59	95,00%	239,21
26.03.07	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	un	498,00	6,75	1,12	7,87	9,76	4.859,89	5,00%	242,99	95,00%	4.616,90
26.03.08	Cuva de inversão para eletrocalha perfurada (200x100)mm ,cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	un	1,00	25,01	2,77	27,78	34,45	34,45		0,00	100,00%	34,45
26.03.09	Cuva de inversão para eletrocalha perfurada (150x100)mm ,cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	un	31,00	22,02	2,77	24,79	30,74	952,93		0,00	95,00%	905,28
26.03.10	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x100)mm, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	un	13,00	15,76	4,04	19,80	24,55	319,18		0,00	95,00%	303,22
26.03.11	Redução concêntrica para eletrocalha (200x100mm) p/ eletrocalha (150x100mm), cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar),forneci	un	4,00	22,84	4,46	27,30	33,85	135,41		0,00	100,00%	135,41

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.03.12	Saída vertical, para eletroduto Ø1" em chapa metálica, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar), fornecimento e instalação	un	27,00	3,21	2,77	5,98	7,42	200,22	5,00%	10,01	95,00%	190,21
26.03.13	Saída vertical, para eletroduto Ø3/4" em chapa metálica, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar), fornecimento e instalação	un	141,00	2,79	2,77	5,56	6,89	972,12	5,00%	48,61	95,00%	923,51
26.03.14	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	1.231,00	0,46	1,12	1,58	1,96	2.411,78	20,00%	482,36	90,00%	2.170,60
26.03.15	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	1.687,00	0,46	1,12	1,58	1,96	3.305,18	20,00%	661,04	90,00%	2.974,66
26.03.16	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	1.558,00	0,46	1,12	1,58	1,96	3.052,44	20,00%	610,49	90,00%	2.747,20
26.03.17	Cabo # 1,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	3.093,00	0,46	1,12	1,58	1,96	6.059,81	20,00%	1.211,96	90,00%	5.453,83
26.03.18	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	5.426,00	0,69	1,12	1,81	2,24	12.178,12	10,00%	1.217,81	90,00%	10.960,31
26.03.19	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	4.797,00	0,69	1,12	1,81	2,24	10.766,39	10,00%	1.076,64	90,00%	9.689,75
26.03.20	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	2.982,00	0,69	1,12	1,81	2,24	6.692,81	10,00%	669,28	90,00%	6.023,53
26.03.21	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	285,00	0,69	1,12	1,81	2,24	639,66	10,00%	63,97	90,00%	575,69
26.03.22	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	173,00	1,57	2,23	3,80	4,71	815,18	15,00%	122,28	90,00%	733,66
26.03.23	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	173,00	1,57	2,23	3,80	4,71	815,18	15,00%	122,28	90,00%	733,66
26.03.24	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	173,00	1,57	2,23	3,80	4,71	815,18	15,00%	122,28	90,00%	733,66

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.03.25	Cabo # 16,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - A	m	462,00	4,85	4,46	9,31	11,54	5.333,52	15,00%	800,03	90,00%	4.800,17
26.03.26	Terminal a pressão p/ cabo 16mm², fornecimento e instalação	un	50,00	9,94	0,67	10,61	13,16	657,82		0,00	0,00%	0,00
26.03.27	Vergalhão Ø3/8" x 3m galvanizado eletrolítico, vergalhão rosca total, (Ref: Mitto ou similar), fornecimento e instalação.	Br	37,00	9,46	2,23	11,69	14,50	536,34	15,00%	80,45	95,00%	509,52
26.03.28	Eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	23,00	48,29	6,69	54,98	68,18	1.568,03	5,00%	78,40	95,00%	1.489,63
26.03.29	Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	un	6,00	14,42	4,73	19,15	23,75	142,48	10,00%	14,25	90,00%	128,23
26.03.30	Quadro de comando para motobomba completo em caixa metálica (40x40x20)cm com IP43 - sobrepor, , (Ref: Weg ou similar).	un	2,00	708,59	44,60	753,19	933,96	1.867,92		0,00	0,00%	0,00
26.03.31	Chave boia reguladora de nível - 15A / 250V grau de proteção IPX8	un	2,00	35,42	4,73	40,15	49,79	99,58		0,00	0,00%	0,00
26.03.32	Barramento de equipotencialização principal "BEP", dimensões (50x35x20)cm de embutir, locado 30cm do piso	un	1,00	258,93	38,44	297,37	368,74	368,74		0,00	0,00%	0,00
26.03.33	Caixa de passagem metálica (40x40x20)cm - sobrepor, quadro de comando elevador, (Ref: Cemar ou similar).	un	3,00	73,78	4,46	78,24	97,02	291,06	66,00%	192,10	66,00%	192,10
26.03.34	Cuva de inversão para eletrocalha perfurada (100x50)mm ,cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	un	6,00	11,31	2,77	14,08	17,46	104,76	5,00%	5,24	95,00%	99,52
26.03.35	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	un	6,00	11,32	4,04	15,36	19,05	114,28	5,00%	5,71	95,00%	108,57
26.03.36	Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada (150x100)mm, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	un	31,00	19,91	4,73	24,64	30,55	947,17	5,00%	47,36	95,00%	899,81
26.03.37	Flange 100x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	un	6,00	3,37	2,23	5,60	6,94	41,67		0,00	100,00%	41,67
26.03.38	Redução concêntrica para eletrocalha (150x100mm) p/ eletrocalha (100x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar),fornecimento e insta	un	5,00	20,13	4,46	24,59	30,49	152,46	10,00%	15,25	90,00%	137,21
26.03.39	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AfI	m	120,00	1,05	1,12	2,17	2,69	322,90	10,00%	32,29	90,00%	290,61
26.03.40	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AfI	m	40,00	1,05	1,12	2,17	2,69	107,64	10,00%	10,76	90,00%	96,88
26.03.41	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AfI	m	40,00	1,05	1,12	2,17	2,69	107,64	10,00%	10,76	90,00%	96,88

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.03.42	Flange 150x100mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	un	1,00	4,43	2,23	6,66	8,26	8,26		0,00	100,00%	8,26
26.03.43	Eletrocalha metálica perfurada (50x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	7,00	40,63	6,69	47,32	58,68	410,74		0,00	100,00%	410,74
26.03.44	Redução concêntrica para eletrocalha (150x100mm) p/ eletrocalha (50x50mm), conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, fornecimento e instalação, (Ref: Dispan ou similar),fornecimento e instal	un	4,00	22,84	4,46	27,30	33,85	135,41		0,00	100,00%	135,41
26.03.45	Flange 50x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	un	4,00	6,09	2,23	8,32	10,32	41,27		0,00	100,00%	41,27
26.03.46	Perfil duplo 25 tipo "D ",com tampa branca lisa em alumínio, linha Standard (73x25x3000)mm, (Ref: Dutotec ou similar), fornecimento e instalação	Br	3,00	100,29	6,69	106,98	132,66	397,97		0,00	100,00%	397,97
26.03.47	Coluna de descida em alumínio extrudado, 3m de comprimento e seção quadrada ou retangular aproximadamente 100x100mm com seções separadas para rede elétrica e lógica, cor branca. Ref. Coluna Plus Light DT 762201.01 Dutotec	Un	1,00	421,47	44,60	466,07	577,93	577,93		0,00	100,00%	577,93
26.03.48	Perfilado metálico perfurado (38x38x6000)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. (Ref: Mopa ou similar)	Br	20,00	59,02	6,69	65,71	81,48	1.629,61		0,00	100,00%	1.629,61
26.03.49	Emenda em "T" de descida vertical para eletrocalha metálica perfurada (150x100)mm, cor branca, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	un	1,00	26,96	4,73	31,69	39,30	39,30		0,00	100,00%	39,30
26.03.50	Saída superior de eletrocalha para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	un	26,00	2,46	2,77	5,23	6,49	168,62		0,00	100,00%	168,62
26.03.51	Base c/ 4 furos para fixação externa (38x38mm), fornecimento e instalação. (Ref: Mopa ou similar)	un	12,00	3,68	2,77	6,45	8,00	95,98		0,00	100,00%	95,98
26.03.52	Emenda interna "T" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	un	5,00	3,82	2,23	6,05	7,50	37,51		0,00	100,00%	37,51
26.03.53	Emenda interna "X" para perfilado (38x38)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido,chapa: 16 mm. Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)fornecimento e instalação.	un	3,00	8,78	2,23	11,01	13,65	40,96		0,00	100,00%	40,96
26.03.54	Eletroduto rígido Ø1.1/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	4,00	17,85	11,15	29,00	35,96	143,84		0,00	100,00%	143,84
26.03.55	Curva 90° não rosçável, raio longo, Diâmetro de Ø1.1/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	un	2,00	8,81	1,12	9,93	12,31	24,63		0,00	100,00%	24,63
26.03.56	Cabo # 10,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996 - Af	m	165,00	2,74	3,35	6,09	7,55	1.246,02		0,00	60,00%	747,61
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
26.04	PRUMADA / ALIMENTAÇÃO			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.04.01	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AfI	m	75,00	0,69	1,12	1,81	2,24	168,33	15,00%	25,25	90,00%	151,50
26.04.02	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AfI	m	25,00	0,69	1,12	1,81	2,24	56,11	15,00%	8,42	90,00%	50,50
26.04.03	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AfI	m	25,00	0,69	1,12	1,81	2,24	56,11	15,00%	8,42	90,00%	50,50
26.04.04	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AfI	m	117,00	0,69	1,12	1,81	2,24	262,60	15,00%	39,39	90,00%	236,34
26.04.05	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AfI	m	20,00	1,05	1,12	2,17	2,69	53,82	15,00%	8,07	90,00%	48,44
26.04.06	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AfI	m	20,00	1,05	1,12	2,17	2,69	53,82	15,00%	8,07	90,00%	48,44
26.04.07	Cabo # 4,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AfI	m	20,00	1,05	1,12	2,17	2,69	53,82	15,00%	8,07	90,00%	48,44
26.04.08	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AfI	m	1.424,00	1,57	2,23	3,80	4,71	6.709,89	15,00%	1.006,48	90,00%	6.038,90
26.04.09	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AfI	m	498,00	1,57	2,23	3,80	4,71	2.346,58	15,00%	351,99	90,00%	2.111,92
26.04.10	Cabo # 6,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AfI	m	498,00	1,57	2,23	3,80	4,71	2.346,58	15,00%	351,99	90,00%	2.111,92
26.04.11	Cabo # 10,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AfI	m	427,00	2,74	3,35	6,09	7,55	3.224,54	15,00%	483,68	90,00%	2.902,09
26.04.12	Cabo # 10,0 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AfI	m	143,00	2,74	3,35	6,09	7,55	1.079,88	15,00%	161,98	90,00%	971,89

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.04.13	Cabo # 10,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	143,00	2,74	3,35	6,09	7,55	1.079,88	15,00%	161,98	90,00%	971,89
26.04.14	Cabo # 16,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	264,00	4,85	4,46	9,31	11,54	3.047,73	15,00%	457,16	90,00%	2.742,96
26.04.15	Cabo # 16,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	88,00	4,85	4,46	9,31	11,54	1.015,91	15,00%	152,39	90,00%	914,32
26.04.16	Cabo # 16,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	88,00	4,85	4,46	9,31	11,54	1.015,91	15,00%	152,39	90,00%	914,32
26.04.17	Cabo # 25,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	108,00	6,89	6,69	13,58	16,84	1.818,64	15,00%	272,80	90,00%	1.636,78
26.04.18	Cabo # 25,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	36,00	6,89	6,69	13,58	16,84	606,22	15,00%	90,93	90,00%	545,60
26.04.19	Cabo # 25,0 mm² - 750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	36,00	6,89	6,69	13,58	16,84	606,22	15,00%	90,93	90,00%	545,60
26.04.20	Cabo #25,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	114,00	6,89	6,69	13,58	16,84	1.919,67	15,00%	287,95	90,00%	1.727,70
26.04.21	Cabo #25,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	38,00	6,89	6,69	13,58	16,84	639,89	15,00%	95,98	90,00%	575,90
26.04.22	Cabo #25,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	48,00	6,89	6,69	13,58	16,84	808,29	15,00%	121,24	90,00%	727,46
26.04.23	Cabo # 120,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - A	m	126,00	30,14	14,50	44,64	55,35	6.974,56	0,00	0,00	0,00%	0,00
26.04.24	Cabo # 120,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - A	m	42,00	30,14	14,50	44,64	55,35	2.324,86	0,00	0,00	0,00%	0,00

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.04.25	Cabo # 120,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - A	m	12,00	30,14	14,50	44,64	55,35	664,25		0,00	0,00%	0,00
26.04.26	Cabo # 70,0 mm² - 1kV- 90° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - Af	m	42,00	18,48	12,27	30,75	38,13	1.601,46		0,00	0,00%	0,00
26.04.27	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø1". Fornecimento e instalação.	un	130,00	1,30	2,23	3,53	4,38	569,04		0,00	100,00%	569,04
26.04.28	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø1.1/4". Fornecimento e instalação.	un	68,00	2,00	2,23	4,23	5,25	356,68		0,00	100,00%	356,68
26.04.29	Bucha e arruela em alumínio fundido p/ eletroduto Ø1.1/2". Fornecimento e instalação.	un	7,00	2,03	2,23	4,26	5,28	36,98		0,00	100,00%	36,98
26.04.30	Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, cor branca, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	75,00	26,06	5,58	31,64	39,23	2.942,52		0,00	100,00%	2.942,52
26.04.31	Eletroduto rígido Ø1.1/4", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	40,00	17,85	11,15	29,00	35,96	1.438,40		0,00	100,00%	1.438,40
26.04.32	Eletroduto rígido Ø1.1/2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	5,00	19,39	5,58	24,97	30,96	154,82		0,00	100,00%	154,82
26.04.33	Eletroduto rígido Ø3", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	12,00	55,63	5,58	61,21	75,90	910,81		0,00	100,00%	910,81
26.04.34	Curva 90° roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	un	2,00	44,36	3,35	47,71	59,16	118,33		0,00	100,00%	118,33
26.04.35	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1.1/2", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	un	1,00	8,23	1,12	9,35	11,59	11,60		0,00	100,00%	11,60
26.04.36	Prumada metálica sobrepor, dimensões (60x60x15)cm. (Ref.: Cemar ou similar.)	un	4,00	69,90	11,15	81,05	100,50	402,01		0,00	100,00%	402,01
26.04.37	Prumada metálica sobrepor, dimensões (40x40x15)cm. (Ref.: Cemar ou similar.)	un	4,00	32,00	11,15	43,15	53,51	214,03		0,00	100,00%	214,03
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
26.05	QUADROS, DINJUTOR E ACESSÓRIOS			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
26.05.01	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x16A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma Nbr NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	46,00	8,87	3,46	12,33	15,29	703,31	17,00%	119,56	97,00%	682,21
26.05.02	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x20A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma Nbr NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	126,00	8,87	3,46	12,33	15,29	1.926,44		0,00	98,00%	1.887,91
26.05.03	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x32A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma Nbr NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	12,00	8,87	3,46	12,33	15,29	183,48	7,00%	12,84	97,00%	177,98

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.05.04	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x20A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	17,00	48,82	3,46	52,28	64,83	1.102,07	12,00%	132,25	97,00%	1.069,01
26.05.05	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x32A - lcc=lcs=10,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	34,00	172,07	3,46	175,53	217,66	7.400,35	12,00%	888,04	97,00%	7.178,34
26.05.06	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x40A - lcc=lcs=10,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	2,00	186,93	3,46	190,39	236,08	472,17		0,00	100,00%	472,17
26.05.07	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x50A - lcc=lcs=10,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	8,00	206,90	3,46	210,36	260,85	2.086,78	12,00%	250,41	97,00%	2.024,18
26.05.08	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x63A - lcc=lcs=10,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	6,00	156,32	3,46	159,78	198,13	1.188,77	12,00%	142,65	97,00%	1.153,11
26.05.09	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x80A - lcc=lcs=10,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	2,00	279,37	3,46	282,83	350,71	701,42		0,00	98,00%	687,39
26.05.10	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 3x400A - lcc=lcs=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para	un	2,00	1.858,53	6,93	1.865,46	2.313,17	4.626,35		0,00	98,00%	4.533,82
26.05.11	Interruptor bipolar tipo DR 25A – 30mA, conforme norma Nbr NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref GE ou similar), fornecimento e instalação	un	70,00	90,10	3,46	93,56	116,01	8.121,01	12,00%	974,52	97,00%	7.877,38
26.05.12	Interruptor bipolar tipo DR 40A – 30mA, conforme norma Nbr NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref GE ou similar), fornecimento e instalação	un	8,00	90,10	3,46	93,56	116,01	928,12	12,00%	111,37	97,00%	900,28
26.05.13	Interruptor tetrapolar tipo DR 25A – 30mA, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref GE ou similar), fornecimento e instalação	un	18,00	116,98	3,46	120,44	149,35	2.688,23	12,00%	322,59	97,00%	2.607,58
26.05.14	Base fusível NH 160 A, com fusível NH de 100A, para montagem no Q.D.G. (projetado), (Ref: GE ou similar)	un	8,00	73,99	4,16	78,15	96,91	775,25	12,00%	93,03	97,00%	751,99
26.05.15	Dispositivo de proteção contra surtos eletromagnéticos slim (classe I/II): - tensão nominal: 275Vca, - corrente nominal: 30kA, - corrente máxima: 60kA, - nível de proteção:1.3kV	un	8,00	119,90	2,53	122,43	151,81	1.214,51	12,00%	145,74	97,00%	1.178,07
26.05.16	Quadro de sobrepor tipo TTA(QUIXTRA), 1050x 1024 x 250 mm, lcc 25,0kA, forma 1, proteção IP43, pintado com pintura epóxi a pó, barramentos tipo pente, plaquetas de identificação. Montado e dimensionado de acordo com o diagrama e Nbr IEC 60439-1:2003.	un	1,00	7.594,43	156,10	7.750,53	9.610,66	9.610,66		0,00	98,00%	9.418,45
26.05.17	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x80A - lcc=lcs=25,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	4,00	200,61	3,46	204,07	253,05	1.012,19	20,00%	202,44	95,00%	961,58

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.05.18	Quadro de sobrepor tipo TTA (QUIXTRA), 900x364x250 mm, 80A, lcc=25,0kA, forma 1, proteção IP43, pintado com pintura epóxi a pó, barramentos de cobre, plaquetas de identificação em ABS autodesivo, montado e dimensionado de acordo com o diagrama e NBR IEC 6	un	2,00	3.570,95	156,10	3.727,05	4.621,54	9.243,09		0,00	100,00%	9.243,09
26.05.19	Quadro de sobrepor tipo TTA (Fix-O-Rail), 750x 355 x 150 mm, lcc 10,0kA, forma 1, proteção IP43, pintado com pintura epoxi a pó, barramentos tipo pente, plaquetas de identificação. Montado e dimensionado de acordo com o diagrama e Nbr IEC 60439-1:2003.	un	6,00	414,05	66,90	480,95	596,38	3.578,27		0,00	100,00%	3.578,27
26.05.20	Quadro de sobrepor tipo TTA (Fix-O-Rail), 450x 355 x 150 mm, lcc 10,0kA, forma 1, proteção IP43, pintado com pintura epoxi a pó, barramentos tipo pente, plaquetas de identificação. Montado e dimensionado de acordo com o diagrama e NBR IEC 60439-1:2003.	un	18,00	294,09	66,90	360,99	447,63	8.057,30		0,00	100,00%	8.057,30
26.05.21	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x25A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	2,00	48,82	3,46	52,28	64,83	129,66		0,00	98,00%	127,07
26.05.22	Quadro de sobrepor tipo TTA (QUIXTRA), 750x660x250 mm, 400A, lcc=15,0kA, forma 1, proteção IP43, pintado com pintura epóxi a pó, barramentos de cobre, plaquetas de identificação em ABS autodesivo, montado e dimensionado de acordo com o diagrama e NBR IEC	un	1,00	3.570,95	156,10	3.727,05	4.621,54	4.621,55		0,00	100,00%	4.621,55
26.05.23	Quadro de sobrepor tipo TTA (Fix-O-Rail), 750x 355 x 150 mm, lcc 25,0kA, forma 1, proteção IP43, pintado com pintura epoxi a pó, barramentos tipo pente, plaquetas de identificação. Montado e dimensionado de acordo com o diagrama e NBR IEC 60439-1:2003.	un	2,00	414,00	66,90	480,90	596,32	1.192,64		0,00	98,00%	1.168,79
26.05.24	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x32A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	2,00	48,82	3,46	52,28	64,83	129,66		0,00	98,00%	127,07
26.05.25	Quadro de sobrepor tipo TTA (Fix-O-Rail), 270x 355 x 150 mm, lcc 10,0kA, forma 1, proteção IP43, pintado com pintura epoxi a pó, barramentos tipo pente, plaquetas de identificação. Montado e dimensionado de acordo com o diagrama e NBR IEC 60439-1:2003.	un	3,00	192,58	66,90	259,48	321,76	965,27		0,00	100,00%	965,27
26.05.26	Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 1x25A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	2,00	8,87	3,46	12,33	15,29	30,58		0,00	98,00%	29,97
26.05.27	Interruptor de manobra 16A, monopolar tipo DIN, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação doméstica e similar, (Ref: GE ou similar) fornecimento e instalação.	un	44,00	8,87	2,54	11,41	14,15	622,53		0,00	98,00%	610,08
26.05.28	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x40A - lcc=lcs=5,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente - 25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalação	un	2,00	54,56	3,46	58,02	71,94	143,89		0,00	98,00%	141,01
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
26.06	DIVERSOS			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
26.06.01	Pintura de todas as eletrocalhas, perfilados, eletrodutos em pvc rígido, interruptores, tomadas, caixas, canaletas, condutores e acessórios que estejam aparentes (projetados) na cor branca, aplicada com pistola	m²	100,00	12,86	4,49	17,35	21,51	2.151,40		0,00	100,00%	2.151,40

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
26.06.02	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com a letra "R" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG3/7, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	2,50	3,35	5,85	7,25	326,43	50,00%	163,22	50,00%	163,22
26.06.03	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com a letra "S" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG3/7, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	2,50	3,35	5,85	7,25	326,43	50,00%	163,22	50,00%	163,22
26.06.04	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com a letra "T" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG3/7, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	2,50	3,35	5,85	7,25	326,43	50,00%	163,22	50,00%	163,22
26.06.05	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com a letra "Q" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG3/7, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	2,50	3,35	5,85	7,25	326,43	50,00%	163,22	50,00%	163,22
26.06.06	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com a letra "E" (rede estabilizada) impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG3/7, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	2,50	3,35	5,85	7,25	326,43	50,00%	163,22	50,00%	163,22
26.06.07	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o caracter "-" (rede estabilizada) impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG3/7, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	2,50	3,35	5,85	7,25	326,43	50,00%	163,22	50,00%	163,22
26.06.08	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "0" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	2,50	3,35	5,85	7,25	326,43	50,00%	163,22	50,00%	163,22
26.06.09	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "1" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	2,50	3,35	5,85	7,25	326,43	50,00%	163,22	50,00%	163,22
26.06.10	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "2" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	2,50	3,35	5,85	7,25	326,43	50,00%	163,22	50,00%	163,22
26.06.11	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "3" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	2,50	3,35	5,85	7,25	326,43	50,00%	163,22	50,00%	163,22
26.06.12	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "4" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	2,50	3,35	5,85	7,25	326,43	50,00%	163,22	50,00%	163,22
26.06.13	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "5" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	2,50	3,35	5,85	7,25	326,43	50,00%	163,22	50,00%	163,22
26.06.14	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "6" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	2,50	3,35	5,85	7,25	326,43	50,00%	163,22	50,00%	163,22
26.06.15	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "7" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	2,50	3,35	5,85	7,25	326,43	50,00%	163,22	50,00%	163,22
26.06.16	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "8" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	2,50	3,35	5,85	7,25	326,43	50,00%	163,22	50,00%	163,22
26.06.17	Marcador tipo anilha em PVC flexível, temperatura de utilização -65°C a +105°C flamabilidade UL94V-1 com o numero "9" impresso, embalagem com 50 unidades. Ref: Marcadores Millenium MHG1/3, HELLERMANNTYTON.	pac	45,00	2,50	3,35	5,85	7,25	326,43	50,00%	163,22	50,00%	163,22
				-	-		-	-			0,00%	0,00

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
27	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES			-	-		-	42.578,39	0,00%	0,00	17,42%	9.644,50
				-	-		-	-			0,00%	0,00
27.01	Infraestrutura geral			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
	Adaptador em PVC para condutele Ø1", (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	5,00	0,90	2,23	3,13	3,88	19,41		0,00	100,00%	19,41
27.01.01	Bucha e arruela em alumínio Ø1"	Un	16,00	1,30	0,22	1,52	1,88	30,16		0,00	100,00%	30,16
27.01.02	Bucha e arruela em alumínio Ø2"	Un	52,00	2,91	0,22	3,13	3,88	201,83		0,00	100,00%	201,83
27.01.03	Caixa (15x15x8)cm, de sobrepor, em PVC para passagem de telecom, com tampa parafusada, corpo e tampa em material termoplástico, anti-chama, grau de proteção mínimo IP40, fornecida nas cores Branco/Bege, em conformidade com NBR 15465 e IEC 60670-1. Ref.:	Un	1,00	24,85	2,54	27,39	33,96	33,97		0,00	0,00%	0,00
27.01.04	Caixa (20x20x12)cm, metálica, de sobrepor, com tampa parafusada, para passagem de telecom corpo e tampa em chapa de aço, grau de proteção mínimo IP 44, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor bege, em conformidade com NBR 6808 e 15465. Ref	Un	1,00	79,94	6,69	86,63	107,42	107,43		0,00	100,00%	107,43
27.01.05	Caixa (30x30x12)cm, metálica, de sobrepor, com tampa parafusada, para distribuição de telecom e equipamentos do sistema de controle de acesso, corpo e tampa em chapa de aço, grau de proteção mínimo IP 44, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na	Un	3,00	94,89	6,69	101,58	125,96	377,88		0,00	100,00%	377,88
27.01.06	Caixa (40x40x12)cm, metálica, de sobrepor, para chegada e distribuição de telecom corpo e tampa em chapa de aço, grau de proteção mínimo IP 44, fornecido com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor bege, em conformidade com NBR 6808 e 15465. Ref.: CEMA	Un	4,00	126,51	6,69	133,20	165,17	660,68		0,00	100,00%	660,68
27.01.07	Caixa para condutele em PVC, multiplas opções de instalação - Ø1" Cor: Cinza (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Un	2,00	7,77	2,23	10,00	12,40	24,80		0,00	100,00%	24,80
27.01.08	Cotovelo reto 90° para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	1,00	12,20	3,19	15,39	19,08	19,09		0,00	100,00%	19,09
27.01.09	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	4,00	12,20	3,19	15,39	19,08	76,34		0,00	100,00%	76,34
27.01.10	Curva 90° para eletrocalha metálica perfurada (300x100)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	4,00	35,08	4,46	39,54	49,03	196,12		0,00	100,00%	196,12
27.01.11	Curva de inversão para eletrocalha metálica perfurada (300x100)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00	53,69	4,46	58,15	72,11	144,22		0,00	100,00%	144,22
27.01.12	Curva de inversão para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00	18,24	4,46	22,70	28,15	56,30		0,00	100,00%	56,30
27.01.13	Curva 45° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un		4,63	1,12	5,75	7,13	-		0,00	100,00%	0,00
27.01.14	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø1", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	15,00	4,63	1,12	5,75	7,13	106,95		0,00	100,00%	106,95
27.01.15	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø2", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Un	6,00	16,42	1,12	17,54	21,75	130,50		0,00	100,00%	130,50
27.01.16	Eletrocalha metálica perfurada (300x100)mm, em barra de 3000mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)	Br	11,00	127,03	6,69	133,72	165,81	1.823,95		0,00	100,00%	1.823,95

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
27.01.18	Eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, em barra de 3000mm, com balancim conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Br	5,50	48,91	6,69	55,60	68,94	379,20		0,00	100,00%	379,20
27.01.19	Eletroduto rígido não roscável, Ø1", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	25,00	26,06	5,58	31,64	39,23	980,84		0,00	100,00%	980,84
27.01.20	Eletroduto rígido roscável, Ø2", fabricado em PVC, classe A, conforme norma NBR 15465 - Sistema de eletrodutos, em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Br	31,00	27,21	5,58	32,79	40,66	1.260,45		0,00	100,00%	1.260,45
27.01.21	Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada (300x100)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00	63,48	4,73	68,21	84,58	169,17		0,00	100,00%	169,17
27.01.22	Flange 100x50mm para terminação de eletrocalha , conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido(Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00	3,37	2,23	5,60	6,94	13,89		0,00	100,00%	13,89
27.01.23	Saída horizontal, para eletroduto Ø1" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Un	3,00	3,34	2,77	6,11	7,58	22,73		0,00	100,00%	22,73
27.01.24	Saída horizontal, para eletroduto Ø2" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar) ,fornecimento e instalação	Un	9,00	6,49	2,77	9,26	11,48	103,35		0,00	100,00%	103,35
27.01.25	Saída vertical, para eletroduto Ø1." em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Un	3,00	3,43	2,77	6,20	7,69	23,07		0,00	100,00%	23,07
27.01.26	Saída vertical, para eletroduto Ø2" em chapa metálica, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido. (Ref: Mopa ou similar)	Un	2,00	6,49	2,77	9,26	11,48	22,97		0,00	100,00%	22,97
27.01.27	Tampa cega para condutete Ø1" em termoplástico, instalação e fornecimento (Ref: Wetzel ou similar)	Un	2,00	3,11	1,69	4,80	5,95	11,91		0,00	100,00%	11,91
27.01.28	Te vertical de descida para eletrocalha metálica perfurada (100x50)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	Un	1,00	18,84	4,46	23,30	28,89	28,90		0,00	100,00%	28,90
				-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
27.02	Cabos e acessórios			-	-		-	-		0,00	0,00%	0,00
27.02.01	Cabo # 16,0mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: NBR 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; NBR 13570/1996 - AfI	m	54,00	4,85	4,46	9,31	11,54	623,40		0,00	0,00%	0,00
27.02.02	Cabo Metálico Multipar para Telefonia tipo CI 20 pares, normas aplicáveis: SDT 235-310-702; NBR: 10501, com isolamento termoplástico expandido, constituído por condutores: em cobre eletrolítico estanhado, Diâmetro de 0,50 mm;isolação Interna em composto d	m	300,00	5,84	1,29	7,13	8,84	2.652,36		0,00	100,00%	2.652,36
27.02.03	Caixa (4x4)", de SOBREPOR, sem tampa, fabricada em PVC anti-chama, tipo caixa de luz, com classificação IP 40, conforme norma NBR 15465, cor: preta, Ref.: TIGRE, ou simil	Un	6,00	3,93	2,99	6,92	8,58	51,49		0,00	0,00%	0,00
27.02.04	Tampa para caixa (4x4)", com 03+03 postos Retangulares, para tomada Coaxial de Antena / TV, fabricada em material termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce, ocasionado pela ação de raios ultra-violeta, Ref.: código 618	Un	6,00	6,98	4,46	11,44	14,19	85,12		0,00	0,00%	0,00

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
27.02.05	Tomada (módulo) com saída coaxial para os sinais de TV por assinatura / Antena, para montagem em tampa (espelho) de caixas ou condutores, Ref.: código 6150 33, cor: Branco, linha PIAL PLUS, da PIAL LEGRAND ou similar	Un	6,00	28,33	4,46	32,79	40,66	243,96		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
27.03	Rack Equipamentos e acessórios			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
27.03.01	GUIA DE CABOS FECHADO 19" X 1U PRETO (47 MM) - GCFIM1UPT-47 . REF.: IP METAL ou similar	Un	5,00	12,61	6,69	19,30	23,93	119,66		0,00	0,00%	0,00
27.03.02	GUIA DE CABOS FECHADO ABS 19" X 1U PRETO (87,5MM HD) - GCFIM1UPT-ABSHD - Ref.:IP METAL ou similar	Un	18,00	12,61	6,69	19,30	23,93	430,78		0,00	0,00%	0,00
27.03.03	PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS -conjunto de 100 peças PARS-M516 -Ref.:SOLLAN ou similar	Un	1,00	12,00	11,15	23,15	28,71	28,71		0,00	0,00%	0,00
27.03.04	PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT.6 - CM - T568A - 2.0M - VM. - 35123302 - Ref.: FURUKAWA ou similar	Un	72,00	18,68	1,39	20,07	24,89	1.791,85		0,00	0,00%	0,00
27.03.05	PATCH CORD, RJ45/RJ45-UTP 1P- Cat 3 - 3,00m, para vozCordão de Conexão com 3,00m de comprimento, tipo Patch Cord, RJ45/RJ45-UTP 1P.Fornecido somente na cor padrão: Azul, Ref.: PATCH CORD (VOZ) FISAFLEX RJ-45/RJ-45 1 P da FURUKAWA ou similar	Un	416,00	6,46	1,39	7,85	9,73	4.049,35		0,00	0,00%	0,00
27.03.06	PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICOES Ref.: Patch Panel AMP/TYCO 24 Portas RJ 45 cat 6	Un	11,00	636,80	6,69	643,49	797,93	8.777,21		0,00	0,00%	0,00
27.03.07	PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 48 POSICOES - Ref.:Patch Panel AMP/TYCO 48 Portas RJ 45 cat 6	Un	5,00	1.252,80	6,69	1.259,49	1.561,77	7.808,84		0,00	0,00%	0,00
27.03.08	PORCA GAIOLA M5 METÁLICA (USO PESADO) - PGS-M5 - 100 peças. Ref.: SOLLAN	Un	1,00	34,00	11,15	45,15	55,99	55,99		0,00	0,00%	0,00
27.03.09	RACK de PISO, FECHADO, METÁLICO Alta Padrão 19" 16Ux600mm. Ref.: TRIUNFO, LAN RACK ou similar	Un	1,00	762,50	22,30	784,80	973,15	973,16		0,00	0,00%	0,00
27.03.10	RACK de PISO, FECHADO, METÁLICO Alta Padrão 19" 24Ux600mm. Ref.: TRIUNFO, LAN RACK ou similar	Un	1,00	832,11	22,30	854,41	1.059,47	1.059,47		0,00	0,00%	0,00
27.03.11	Régua de tomadas, calha 19" ABS C/8 TOMADAS 10A NBR 14136 -CTS-1908-N10 - Ref.: IP METAL ou similar	Un	2,00	58,43	4,46	62,89	77,98	155,97		0,00	0,00%	0,00
27.03.12	UNIDADE DE TETO COM 4 VENT. 1000 MM BI-VOLT . 981900313X-02.Ref.: ATTIC ou similar	Un	2,00	211,66	6,69	218,35	270,75	541,51		0,00	0,00%	0,00
27.03.13	VOICE PANEL , 30 portas CAT 3 Ref.: VOICE PANEL 30 PORTAS da FURUKAWA ou similar	Un	9,00	325,66	6,69	332,35	412,11	3.709,03		0,00	0,00%	0,00
27.03.14	VOICE PANEL , 50 portas CAT 3 Ref.: VOICE PANEL 50 PORTAS da FURUKAWA ou similar	Un	4,00	461,92	10,35	472,27	585,61	2.342,46		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
27.04	DIVERSOS			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
27.04.01	Retirada e limpeza dos equipamentos no interior do distribuidor geral de telefonia instalado no Pavto Térreo	Vb	1,00	-	41,90	41,90	51,96	51,96		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-			0,00%	0,00
28	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO			-	-	-	-	94.858,08	-	0,00	1,11%	12.846,70
28.02	TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
28.02.01	Tubo de cobre flexível Ø 1/4"	m	348,00	5,90	8,19	14,09	17,47	6.080,12		0,00	0,00%	0,00
28.02.02	Tubo de cobre flexível Ø 1/2"	m	348,00	12,45	9,01	21,46	26,61	9.260,42		0,00	0,00%	0,00
28.02.03	Tubo de cobre flexível Ø 3/8"	m	71,00	11,04	9,83	20,87	25,88	1.837,40		0,00	0,00%	0,00
28.02.04	Tubo de cobre flexível Ø 5/8"	m	71,00	19,18	12,29	31,47	39,02	2.770,62		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
28.03	ISOLAMENTO			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
28.03.01	Espuma elastomérica para isolamento do tubo de cobre de Ø 1/4" - 9 mm	m	323,00	1,45	2,12	3,57	4,43	1.429,86		0,00	0,00%	0,00
28.03.02	Espuma elastomérica para isolamento do tubo de cobre de Ø 1/2" - 25 mm	m	323,00	11,98	2,12	14,10	17,48	5.647,34		0,00	0,00%	0,00
28.03.03	Espuma elastomérica para isolamento do tubo de cobre de Ø 3/8" - 19 mm	m	66,00	3,78	2,12	5,90	7,32	482,86		0,00	0,00%	0,00

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados
115.826,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
28.03.04	Espuma elastomérica para isolamento do tubo de cobre de Ø 5/8" - 25 mm	m	66,00	12,15	2,12	14,27	17,69	1.167,86		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
28.04	FIXAÇÃO			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
28.04.01	Calha metálica perfurada 75 x 75 mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 zincado por imersão em zinco fundido, Ref: Mopa ou similar, incluindo fixação e emendas.	m	317,00	19,33	2,65	21,98	27,26	8.639,90		0,00	7,57%	654,04
28.04.02	Curva 90° para eletrocalha metálica 75 x 75 mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, Ref: Mopa ou similar.	Un	387,00	18,04	4,81	22,85	28,33	10.965,26		0,00	3,62%	396,68
28.04.03	Calha metálica lisa 75 x 75 mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 zincado por imersão em zinco fundido, Ref: Mopa ou similar, incluindo fixação, emendas e pintura eletrostática na cor preta, para caminhamento de tubulação na área externa do pré	m	102,00	70,44	2,65	73,09	90,63	9.244,43		0,00	0,00%	0,00
28.04.04	Curva 90° para eletrocalha metálica 75 x 75 mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, Ref: Mopa ou similar, incluindo pintura eletrostática na cor preta.	Un	90,00	22,25	4,81	27,06	33,55	3.019,90		0,00	0,00%	0,00
28.04.05	Suportes (02 peças) para unidade evaporadora de teto no formato "C" com largura de 22 cm e altura de 30 cm, fabricado em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor branca	CJ	25,00	80,60	86,23	166,83	206,87	5.171,73		0,00	0,00%	0,00
28.04.06	Suportes (02 peças) para unidade evaporadora de teto no formato "C" com largura de 25 cm e altura de 35 cm, fabricado em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor branca	CJ	8,00	86,23	10,89	97,12	120,43	963,44		0,00	0,00%	0,00
28.04.07	Suportes (02 peças) para unidade condensadora com largura de 38 cm, fabricado em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor preta.	CJ	18,00	48,93	18,51	67,44	83,63	1.505,27		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
28.05	RENOVADORES DE AR			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
28.05.01	Renovador de ar com capacidade de 80 m³/h, modelo Ventokit NM80, incluindo tubo de saída em alumínio, veneziana auto-fechante e fixação através de parafusos.	CJ	32,00	209,56	26,53	236,09	292,75	9.368,06		0,00	100,00%	9.368,06
28.05.02	Renovador de ar com capacidade de 150 m³/h, modelo Ventokit NM150, incluindo tubo de saída em alumínio, veneziana auto-fechante e fixação através de parafusos.	CJ	8,00	218,22	26,53	244,75	303,49	2.427,92		0,00	100,00%	2.427,92
				-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
28.06	DIVERSOS			-	-	-	-	-		0,00	0,00%	0,00
28.06.01	Cabo multipolar 3 x # 4,0 mm² - 1kV- isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogenio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme normas da ABNT, Ref: Tipo Afumex Prysmian ou similar, fornecimento e instalação.	m	438,00	7,01	3,35	10,36	12,85	5.626,73		0,00	0,00%	0,00
28.06.02	Fita aluminizada específica para tubulações de ar condicionado, rolo de 48 mm x 50 m	Rolo	48,00	47,90	11,05	58,95	73,10	3.508,71		0,00	0,00%	0,00
28.06.03	Amortecedor anti vibração para condensadora	UN	18,00	5,30	4,24	9,54	11,83	212,94		0,00	0,00%	0,00
28.06.04	Caixa de espera em PVC	Un	62,00	29,90	13,27	43,17	53,53	3.318,91		0,00	0,00%	0,00
28.06.05	Carga de gás adicional R-22	KG	20,05	35,00	45,00	80,00	99,20	1.988,96		0,00	0,00%	0,00
28.06.06	Furação para passagem das tubulações frigorígenas pela parede, incluindo retirada de entulhos até a caçamba de remoção e recomposição.	Un	16,00	-	11,06	11,06	13,71	219,44		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-			0,00%	0,00
29	MOBILIÁRIO E PROTEÇÃO DAS JANELAS			-	-	-	-	97.320,35	0,00%	0,00	46,40%	45.152,32
29.01	Persianas verticais de alta qualidade, material lavável, controle de luminosidade, em PVC 90 mm, cor de referência Contract Camurça, marca Persipolis	m²	712,58	46,70	12,34	59,04	73,21	52.168,03		0,00	0,00%	0,00

MEDIÇÃO 14 (19 de Junho de 2015) - 16 meses acumulados										115.826,26		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta medição		Acumulado	
				MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
29.02	Balcão da recepção em formato "L" confeccionado em MDF com revestimento em formica marfim claro, incluindo corredeiras telescópicas, excluindo tampo de granito, 5 anos de garantia, conforme projeto.	Un	1,00	7.805,00	1.560,00	9.365,00	11.612,60	11.612,60		0,00	100,00%	11.612,60
29.03	Móvel para copa em MDF 18mm, com corredeiras telescópicas e puxador em alumínio tipo cava. Não incluso granito, cuba, torneira e decoração em geral.	Un	8,00	1.022,00	438,00	1.460,00	1.810,40	14.483,20		0,00	100,00%	14.483,20
29.04	Móvel para banheiro em MDF 18mm, com corredeiras telescópicas e puxador em alumínio tipo cava. Não incluso granito, cuba, torneira e decoração em geral.	Un	15,00	644,00	276,00	920,00	1.140,80	17.112,00		0,00	100,00%	17.112,00
29.05	Tampo em granito BERTIOGA com canto arredondados, conforme projeto.	m²	3,63	320,00	112,00	432,00	535,68	1.944,52		0,00	100,00%	1.944,52
				-	-	-	-	-			0,00%	0,00
30	DIVERSOS			-	-	-	-	6.040,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00
30.01	Bicicletário em aço inox com Ø 2", no modelo "U" invertido nas dimensões de 0,60 x 0,90 m devidamente parafusado em base de concreto com parafusos em aço inox.	Un	6,00	111,32	91,81	203,13	251,88	1.511,31		0,00	0,00%	0,00
30.02	Protetor de parachoques em plástico expandido em todas as vagas para veículos da garagem com dimensões de 400 x 80 x 60 mm, destinado a amortecer impactos produzidos por choques mecânicos, incluindo cola para instalação composta de Solvente Alifático, Sol	Un	12,00	20,09	2,28	22,37	27,74	332,87		0,00	0,00%	0,00
30.03	Protetor de Coluna Cantoneira 10 x 10 x 75 cm em plástico expandido, destinado a amortecer impactos produzidos por choques mecânicos, incluindo cola para instalação composta de Solvente Alifático, Solventes Oxigenados, Resinas Sintéticas, Borrachas Sintét	Un	33,00	22,25	2,28	24,52	30,41	1.003,55		0,00	0,00%	0,00
30.04	Compressor Odontológico Monofásico, Pressão 120lbf/cm 100litros - Isento Óleo 12 pés³/min., Isento de óleo, Ideal para 2 ou 3 consultórios, com Protetor Elétrico, Pintura interna e externa eletrostática a pó, Regulador de Pressão, Acionamento do motor: D	Un	1,00	2.575,00	-	2.575,00	3.193,00	3.193,00		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-			0,00%	0,00
31	PAISAGISMO			-	-	-	-	288,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31.01	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	15,58	8,16	2,99	11,15	13,83	215,41		0,00	0,00%	0,00
31.02	TERRA VEGETAL	m³	0,64	91,80	-	91,80	113,83	72,77		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-			0,00%	0,00
32	DESPESAS FINAIS			-	-	-	-	19.029,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.170,48	0,13	1,40	1,53	1,90	4.117,84		0,00	0,00%	0,00
32.02	Laudo de medição de resistências das alças de ancoragem existentes no edifício.	vb	1,00	-	240,00	240,00	297,60	297,60		0,00	0,00%	0,00
32.03	Projeto as built completo de todos os projetos da edificação.	m²	2.170,48	0,08	3,20	3,28	4,07	8.827,78		0,00	0,00%	0,00
32.04	Habite-se	m³	2.170,48	1,00	1,00	2,00	2,48	5.382,80		0,00	0,00%	0,00
32.05	Abriço para cavalete em alvenaria, dimensões 0,65 x 0,85 x 0,30	UN	1,00	140,32	184,90	325,22	403,27	403,28		0,00	0,00%	0,00
				-	-	-	-	-				
PREÇO TOTAL								2.564.978,40	4,52%	115.826,26	45,61%	1.169.917,87
CUSTO TOTAL								2.068.530,97				
VALOR DO BDI								496.447,43				



Descrição: Reforma do prédio Anexo do TRT, antigo Fórum Trabalhista de Florianópolis
BDI: 0,24

ADITIVO 1 - MEDIÇÃO 8 - 19 DE JUNHO DE 2015										R\$	28.082,55
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----------

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta Medição		Acumulado	
					MATERIAL	M OBR	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
		1 DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO OBRA							R\$ 81.144,52	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 81.144,52
	01.02	DESPESAS DE CONSUMO MENSAIS											
MERCAD	01.02.01	Cópias, documentos e plotagens	m²	80	9,52	0	9,52	11,8048	R\$ 944,39		0	100,00%	R\$ 944,39
Arbitrado	01.02.02	Consumo telefone	mês	3	85	0	85	105,4	R\$ 316,20		0	100,00%	R\$ 316,20
Arbitrado	01.02.03	Material de Limpeza	Mês	3	75	0	75	93	R\$ 279,00		0	100,00%	R\$ 279,00
Arbitrado	01.02.04	Consumo internet - obrigatório no canteiro de obras	mês	3	25	0	25	31	R\$ 93,00		0	100,00%	R\$ 93,00
												0,00%	R\$ 0,00
	01.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA										0,00%	R\$ 0,00
4069	01.03.01	MESTRE DE OBRAS	H	528	0	34,362	34,362	42,60888	R\$ 22.497,49		0	100,00%	R\$ 22.497,49
253	01.03.02	ALMOXARIFE	H	528	0	11,187	11,187	13,87188	R\$ 7.324,36		0	100,00%	R\$ 7.324,36
2706	01.03.03	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS	H	198	0	47,115	47,115	58,4226	R\$ 11.567,68		0	100,00%	R\$ 11.567,68
2706	01.03.04	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRAS	H	132	0	47,115	47,115	58,4226	R\$ 7.711,79		0	100,00%	R\$ 7.711,79
2706	01.03.05	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DE OBRAS	H	66	0	47,115	47,115	58,4226	R\$ 3.855,90		0	100,00%	R\$ 3.855,90
532	01.03.06	AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA	H	528	0	19,521	19,521	24,20604	R\$ 12.780,79		0	100,00%	R\$ 12.780,79
												0,00%	R\$ 0,00
	01.04	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA										0,00%	R\$ 0,00
COMP.A	01.04.03	Alimentação de funcionarios	MÊS	3	0	2640	2640	3273,6	R\$ 9.820,80		0	100,00%	R\$ 9.820,80
COMP.A	01.04.04	Transporte de funcionários	MÊS	3	0	924	924	1145,76	R\$ 3.437,28		0	100,00%	R\$ 3.437,28
COMP.A	01.04.05	Equipamento obrigatório individual para funcionários (EPI)	CJ	0,25	1664	0	1664	2063,36	R\$ 515,84		0	100,00%	R\$ 515,84
												0,00%	R\$ 0,00
		3 MANUTENÇÃO DA OBRA							R\$ 4.067,67	0,00%	0	100,00%	R\$ 4.067,67
	03.01	Remoção de Entulhos									0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.A	03.01.01	Limpeza, e remoção de entulhos durante a execução da obra.	MÊS	3	0	204,385	204,385	253,4374	R\$ 760,32		0	100,00%	R\$ 760,32
											0	0,00%	R\$ 0,00
	03.02	Máquinas e Equipamentos									0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.A	03.02.01	Aluguel de guincho de coluna 220 V, monofásico, com caçamba com capacidade para 200 Kg de carga vertical, incluindo instalação e remoção.	mês	1	360,8	37,6651	398,465	494,0966744	R\$ 494,10		0	100,00%	R\$ 494,10
COMP.A	03.02.02	Aluguel de andaime tubular para execução dos serviços, incluindo instalação e remoção.	m	18	28,989	4,74575	33,7343	41,83050803	R\$ 752,95		0	100,00%	R\$ 752,95

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta Medição		Acumulado	
					MATERIA	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
COMP.A RQ.172	03.02.03	Aluguel de 15 metros de andaime suspenso para execução dos serviço de recuperação e pintura das fachadas, incluindo material de base e travamento completo, segurança conforme NR-18, capacidade de carga de 500 kg, cabo com 45 m, conforme projeto e memorial	MÊS	0,67	1644,6	835,252	2479,9	3075,070618	R\$ 2.060,30		0	100,00%	R\$ 2.060,30
												0,00%	R\$ 0,00
		5 SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E RETIRADAS							R\$ 9.695,47	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.695,47
10107	05.01.01	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m³	45	23,78	9,81	33,59	41,6516	R\$ 1.874,33		0	100,00%	R\$ 1.874,33
73899/00 2U	05.01.13	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m²	30,92	0	56,44	56,44	69,9856	R\$ 2.163,96		0	100,00%	R\$ 2.163,96
CONCRE TIL.005	Não consta	Retirada de aparelhos de ar condicionado de janela e remoção até o pavimento térreo, de onde serão removidos por pessoal do TRT	und	73	0	40,74	40,74	50,5176	R\$ 3.687,79		0	100,00%	R\$ 3.687,79
CONCRE TIL.006	Não consta	Retirada de aparelhos de ar condicionado tipo split e remoção até o pavimento térreo de onde serão removidos por pessoal do TRT	und	19	0	83,59	83,59	103,6516	R\$ 1.969,39		0	100,00%	R\$ 1.969,39
												0,00%	R\$ 0,00
		11 PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR P.N.E.							R\$ 5.055,06	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.055,06
	11.01	DEMOLIÇÕES, ADEQUAÇÕES E RESTAURAÇÕES									0	0,00%	R\$ 0,00
	11.02	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO									0	0,00%	R\$ 0,00
74019/00 1U	11.02.01	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	m³	0,62	0	32,4	32,4	40,176	R\$ 24,91		0	100,00%	R\$ 24,91
74207/00 1U	11.02.03	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	m³	0,62	11,17	1,58	12,75	15,81	R\$ 9,81		0	100,00%	R\$ 9,81
74074/00 4U	11.02.04	FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE	m²	7,2	26,37	31,17	57,54	71,3496	R\$ 513,72		0	100,00%	R\$ 513,72
73942/00 2U	11.02.05	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	9,9	4,49	2,49	6,98	8,6552	R\$ 85,69		0	100,00%	R\$ 85,69
337	11.02.07	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	KG	0,5	6,5	0	6,5	8,06	R\$ 4,03		0	100,00%	R\$ 4,03
74138/00 3U	11.02.08	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	m³	0,62	321,06	41,13	362,19	449,1156	R\$ 278,46		0	100,00%	R\$ 278,46
73979/00 4U	11.02.09	DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M	m²	6,2	0	10,43	10,43	12,9332	R\$ 80,19		0	100,00%	R\$ 80,19
	11.04	PISOS										0,00%	R\$ 0,00
COMP.A RQ.186	11.04.01	Piso em granito branco dallas flameado para piso, conforme projeto.	m²	9,98	278,13	9,4915	287,619	356,6471248	R\$ 3.559,34		0	100,00%	R\$ 3.559,34

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta Medição		Acumulado	
					MATERIAL	M OBR	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
		Soleira em granito cinza corumbá com espessura de 2 cm com largura conforme indicado na planta baixa do projeto arquitetônico assentadascom argamassa colante "Mármore e Granitos Externo Quartzolit" ou produto similar.	m	5,8	62,92	6,45	69,37	86,0188	R\$ 498,91		0	100,00%	R\$ 498,91
												0,00%	R\$ 0,00
	13	VEDAÇÕES							R\$ 57.690,35	0,00%	R\$ 0,00	70,96%	R\$ 40.935,86
	13.01	ALVENARIAS INTERNAS										0,00%	R\$ 0,00
	13.01.01	Tijolos Cerâmicos Furado										0,00%	R\$ 0,00
73982/00 1U	13.01.01.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	75	14,62	19,18	33,8	41,912	R\$ 3.143,40		0	100,00%	R\$ 3.143,40
73988/00 2U	13.02.01	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM	m	22,06	0,55	3,81	4,36	5,4064	R\$ 119,27		0	100,00%	R\$ 119,27
74099/00 1U	13.02.02	VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3).	m³	0,0657	749,24	299,59	1048,83	1300,5492	R\$ 85,45		0	100,00%	R\$ 85,45
												0,00%	R\$ 0,00
	13.02	Serviço Sobre Alvenaria										0,00%	R\$ 0,00
COMP.A RQ.129	13.02.03	Execução de mucheta/requadros onde houve demolições de paredes.	m²	3,02	26,071	33,6997	59,7702	74,11503704	R\$ 223,83		0	100,00%	R\$ 223,83
												0,00%	R\$ 0,00
												0,00%	R\$ 0,00
	13.03	DIVISORIAS										0,00%	R\$ 0,00
	13.03.01	GESSO ACARTONADO (DRYWALL)										0,00%	R\$ 0,00
COMP.A RQ.038A	12.03.01.02	Parede 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfis de aço galvanizado a fogo reforçado a cada 40 cm para receber revestimento, incluindo fita, massa, parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação, Ref. Knauf ou similar,	m²	386,4	50,587	27,3952	77,9818	96,69747664	R\$ 37.363,91		0	100,00%	R\$ 37.363,91
												0,00%	R\$ 0,00
	13.03.02	DIVISORIA LAMINADA COM PERFIL DE ALUMINIO										0,00%	R\$ 0,00
CONCRE TIL.010		Divisória laminada para áreas molhadas,modelo Alcoplac marca neocon, ou similar. Cor marfim claro (L141) com perfil em alumínio, inclusive com instalação	m²	26,39	512	0	512	634,88	R\$ 16.754,49		0	0,00%	R\$ 0,00
												0,00%	R\$ 0,00
												0,00%	R\$ 0,00
	14	ESQUADRIAS							R\$ 8.777,18	0,00%	0	68,14%	R\$ 3.437,28
	14.02	PORTAS E PORTOES									0	0,00%	R\$ 0,00
	14.02.01	Portas de Madeira Semi-oca Lisa									0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.A RQ.077	14.02.01.01	(P1) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,90 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista, e ferragens para aplicação em divisória de gesso acartonado, conforme projeto arquitetônico	und	2	251,4	67,53	318,93	395,4732	R\$ 790,95		0	100,00%	R\$ 790,95

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta Medição		Acumulado	
					MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
COMP.A RQ.076	14.02.01.03	(P3) - Porta de madeira semi - oca, de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo forra, vista, e ferragens para aplicação em divisória de gesso acartonado, conforme projeto arquitetônico	UN	5	241,11	67,1326	308,244	382,223112	R\$ 1.911,12		0	100,00%	R\$ 1.911,12
											0	0,00%	R\$ 0,00
	14.02.03	Portas de Alumínio Veneziana									0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.A RQ.085	14.02.03.01	(P24) - Porta de Alumínio Venezianado preto- de abrir, 0,80 x 2,10, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em parede de alvenaria, conforme projeto arquitetônico	m²	1,68	288,02	39,7743	327,791	406,4606306	R\$ 682,86		0	0,00%	R\$ 0,00
											0	0,00%	R\$ 0,00
	14.02.04	Portas de divisória laminada									0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.A RQ.088	14.02.04.01	(P25) - Porta de divisória laminada, de abrir, 0,60 x 1,65, 01 folha, incluindo ferragens para aplicação em divisória de lâminadas para áreas molhadas, modelo Alcoplac marca neocon, ou similar. Cor marfim claro (L141) conforme projeto arquitetônico com ferragem inclusa e instalação.	UN	6	552,96	0	552,96	685,6704	R\$ 4.114,03		0	0,00%	R\$ 0,00
											0	0,00%	R\$ 0,00
	14.03	FERRAGENS E ACESSORIOS									0	0,00%	R\$ 0,00
	14.03.01	FECHADURAS									0	0,00%	R\$ 0,00
74070/00 4U	14.03.01.01	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	Un	7	56,23	31,81	88,04	109,1696	R\$ 764,19		0	100,00%	R\$ 764,19
											0	0,00%	R\$ 0,00
	14.03.02	DOBRADIÇAS									0	0,00%	R\$ 0,00
74047/00 4U	14.03.02.02	DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2"	Un	21	12,4	7,34	19,74	24,4776	R\$ 514,03		0	100,00%	R\$ 514,03
											0	0,00%	R\$ 0,00
		16 REVESTIMENTOS							R\$ 19.838,94	0,00%	0	100,00%	R\$ 19.838,94
	16.01	CHAPISCO E REBOCO INTERNO									0	0,00%	R\$ 0,00
	16.01.01	Paredes Internas									0	0,00%	R\$ 0,00
73928/00 2U	16.01.01.01	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	170,92	1,42	2,81	4,23	5,2452	R\$ 896,51		0	100,00%	R\$ 896,51
74201/00 1U	16.01.01.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	m²	170,92	4,77	15,09	19,86	24,6264	R\$ 4.209,15		0	100,00%	R\$ 4.209,15
COMP.A RQ.178	16.01.01.03	Revestimentos com argamassa baritada espessura de 1,5 cm, a ser aplicada em paredes, teto ou piso na, densidade 3,2g/cm³,atenuação linear com fontes radioativas "Am" 241 e "Eu" 152, detector de germânio hiper puro, para energias de 60 kvs e de 80 a 1.300	m²	55	108,24	17,46	125,7	155,868	R\$ 8.572,74		0	100,00%	R\$ 8.572,74
											0	0,00%	R\$ 0,00
	16.02	REVESTIMENTO CERAMICO									0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.A RQ.028A	16.02.01	Azulejo cerâmico dimensões de 20 x 20 cm, modelo "Forma Slim Branco Acetinado" da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante AC-II e devidamente rejuntado, conforme projeto.	m²	151,2	21,877	10,981	32,8583	40,74429448	R\$ 6.160,54		0	100,00%	R\$ 6.160,54
											0	0,00%	R\$ 0,00
		17 PAVIMENTAÇÕES, RODAMEIO E RODAPE							R\$ 103.483,11	27,14%	R\$ 28.082,55	91,18%	R\$ 97.108,12

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta Medição		Acumulado	
					MATERIAL	M OBR	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
											0	0,00%	R\$ 0,00
	17.02	PISOS CERAMICOS									0	0,00%	R\$ 0,00
CONCRE TIL.012	17.02.01	Piso cerâmico 30 x 30 cm, da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante AC-III e devidamente rejuntado, para banheiros subsolo	m²	45,83	37,491	10,981	48,4724	60,1058132	R\$ 2.754,65		0	100,00%	R\$ 2.754,65
											0	0,00%	R\$ 0,00
	17.04	PISOS VINILICOS									0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.A RQ.151A	17.04.01	PISO VINILICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha PAVIFLEX NATURAL, mod. CHROMA CONCEPT 300 x 300mm, esp. 2,0 mm ref. 9201912.	m²	37,42	36,5	7,02	43,52	53,9648	R\$ 2.019,37		0	100,00%	R\$ 1.009,69
COMP.A RQ.151B	17.04.02	PISO VINILICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha OPTIMA, mod. CLASSIC COLOURS 2 x 25m, esp. 2,0mm ref. 3242897.	m²	383,65	122,98	7,02	130	161,2	R\$ 61.844,38	25,00%	15461,095	95,00%	R\$ 58.752,16
COMP.A RQ.151C	17.04.03	PISO VINILICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha SQUARE, mod. ACUSTIC 500 x 500mm, esp. 4,7mm ref. 3683032.	m²	59,26	136,33	7,02	143,35	177,754	R\$ 10.533,71		0	100,00%	R\$ 10.533,71
COMP.A RQ.151D	17.04.04	PISO VINILICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha ABSOLUTE, mod. TOTALSAFE 2 x 20 m, esp. 2,0 mm ref. 9250930.	m²	3,4	74,35	7,02	81,37	100,8988	R\$ 343,06		0	0,00%	R\$ 0,00
											0	0,00%	R\$ 0,00
	17.05	RODAPE									0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.A RQ.111	17.05.01	Rodapé em EPS com altura de 7,0 cm na linha Moderna, modelo 446 RP/BR da Santa Luzia Molduras ou similar, incluindo instalação, conforme projeto. (+ 25m² para refeitório subolo)	m	540,89	9,9195	4,46859	14,3881	17,84123036	R\$ 9.650,15	80,00%	7720,12	80,00%	R\$ 7.720,12
CONCRE TIL.008	Não consta	Rodapé em piso vinílico Anti derrapante, marca Tarkett Fademac, linha Optima, modelo Classic Colours, incluindo suporte curvo de parede e arremate superior, conforme memorial descritivo	m	408,42	25,31	6,95	32,26	40,0024	R\$ 16.337,79	30,00%	4901,337	100,00%	R\$ 16.337,79
											0	0,00%	R\$ 0,00
	18	PINTURA							R\$ 67.219,41	0,00%	R\$ -	74,64%	R\$ 50.174,33
	18.01	PINTURA INTERNA									0	0,00%	R\$ 0,00
	18.01.01	Selador em Paredes									0	0,00%	R\$ 0,00
74233/00 1U	18.01.01.01	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE PINTADAS ACRILICO PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	m²	63,78	1,08	2,97	4,05	5,022	R\$ 320,31		0	0,00%	R\$ 0,00
											0	0,00%	R\$ 0,00
	18.01.02	Emassamento em Paredes									0	0,00%	R\$ 0,00
73955/00 2U	18.01.02.01	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	2209,78	3,64	5,95	9,59	11,8916	R\$ 26.277,82		0	75,00%	R\$ 19.708,37
											0	0,00%	R\$ 0,00
	18.01.03	Pintura em Paredes									0	0,00%	R\$ 0,00
73954/00 1U	18.01.03.01	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	m²	1932,69	5,21	11,74	16,95	21,018	R\$ 40.621,28		0	75,00%	R\$ 30.465,96
											0	0,00%	R\$ 0,00
	20	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - AREAS MOLHADAS							R\$ 19.372,59	0,00%	0,00	24,27%	R\$ 4.702,23
	20.01	Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada									0	0,00%	R\$ 0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta Medição		Acumulado	
					MATERIAL	M OBR	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
CONCRE TIL.002		Vaso sanitário convencional em louça na cor branco gelo, modelo P5 - linha Vogue Plus da Deca ou similar, incluindo parafusos e fixação e Caixa acoplada e válvula de descarga.	Un	4	564,6	56,251	620,853	769,85772	R\$ 3.079,44		0	75,00%	R\$ 2.309,58
COMP.HI S.278	20.01.02	Anel para vedação de vaso sanitário (Tigre ou similar)	Un	3	2,76	5,71	8,47	10,5028	R\$ 31,51		0	100,00%	R\$ 31,51
COMP.HI S.327	20.01.03	Assento para vaso sanitário plástico da Deca ou similar, incluindo parafusos e fixação.	Un	3	73,32	1,99	75,31	93,3844	R\$ 280,16		0	100,00%	R\$ 280,16
COMP.HI S.283	20.01.04	Conjunto de ligação cromado para vaso sanitário (espude, canopla e tubo)	Un	3	13,41	8,19	21,6	26,784	R\$ 80,36		0	100,00%	R\$ 80,36
COMP.HI S.284	20.01.05	Tubo de descida para válvula descarga 38 mm com joelho azul	Un	3	4,61	8,19	12,8	15,872	R\$ 47,62		0	100,00%	R\$ 47,62
COMP.HI S.331	20.01.07	Acabamento para válvula de descarga com duplo acionamento, linha Salvágua da Docol ou similar.	Un	3	65,62	8,19	73,81	91,5244	R\$ 274,58		0	100,00%	R\$ 274,58
COMP.HI S.280	20.01.08	Porta papel higienico em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	3	32,91	6,95	39,86	49,4264	R\$ 148,28		0	0,00%	R\$ 0,00
											0	0,00%	R\$ 0,00
CONCRE TIL.001	20.04	Lavatório em Louça com coluna									0	0,00%	R\$ 0,00
		LAVATORIO CONVENCIONAL: MODELO L510 + C510 LINHA VOGUE PLUS DA DECA OU SIMILAR	Un	6	455,95	43,696	499,649	619,5644326	R\$ 3.717,39		0	33,33%	R\$ 1.239,00
COMP.HI S.291	20.03.02	Torneira Pressmatic Compact de mesa (CR17160606) da Docol ou Decamatic (1170C) da Deca ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	6	178,12	10,92	189,04	234,4096	R\$ 1.406,46		0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.HI S.292 - A	20.03.03	Sifão cromado para lavatório 1.1/2" x 1.1/2"	Un	6	106,76	8,19	114,95	142,538	R\$ 855,23		0	33,33%	R\$ 285,05
COMP.HI S.293	20.03.04	Engate ou rabicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Un	6	26,06	5,46	31,52	39,0848	R\$ 234,51		0	33,33%	R\$ 78,16
COMP.HI S.294	20.03.05	Válvula de escoamento para cuba/lavatório cromada com tampa cromada, código C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladrão.	Un	6	25,27	5,46	30,73	38,1052	R\$ 228,64		0	33,33%	R\$ 76,21
COMP.HI S.295	20.03.06	Saboneteira em ABS, modelo Trilha da Copapel ou similar	Un	6	35,97	3,29	39,26	48,6824	R\$ 292,10		0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.HI S.296	20.03.07	Porta Toalha em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	6	34,17	3,59	37,76	46,8224	R\$ 280,94		0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.HI S.280	20.02.05	Porta papel higienico em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	3	32,91	6,95	39,86	49,4264	R\$ 148,28		0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.HI S.326	20.03.10	Espelho com espessura de 4 mm, dimensão de 0,50 x 0,90 m, de alta resistência, com película de segurança no costado do espelho, referência "Espelhos Guardian" ou similar, incluindo botões cromados e fixação.	Un	3	167,3	71,7	239	296,36	R\$ 889,08		0	0,00%	R\$ 0,00
CONCRE TIL.007		Ducha eletrônica optima turbo da Thermosystem ou similar	Un	6	229,17	38,23	267,4	331,576	R\$ 1.989,46		0	0,00%	R\$ 0,00
											0	0,00%	R\$ 0,00
	20.05	Cuba de Aço Inox									0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.HI S.300	20.05.01	Cuba de embutir em aço inox, linha "Retangular BL" (cód. 94020107) com dimensões de 34 x 40 x 17 cm da marca Tramontina ou similar, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1	153,35	76,47	229,82	284,9768	R\$ 284,98		0	0,00%	R\$ 0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta Medição		Acumulado	
					MATERIAL	M OBR	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
COMP.HI S.302	20.05.02	Torneira cromada para pia de cozinha (mesa ou parede) com bica móvel - linha Izy da Deca ou similar	Un	1	232,27	38,23	270,5	335,42	R\$ 335,42		0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.HI S.292 - B	20.05.03	Sifão cromado para pia 1" x 1.1/2"	Un	1	105,54	8,19	113,73	141,0252	R\$ 141,03		0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.HI S.293	20.05.04	Engate ou rabicho flexível cromado 1/2" x 30 cm	Un	1	26,06	5,46	31,52	39,0848	R\$ 39,09		0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.HI S.294	20.05.05	Válvula de escoamento para cuba/lavatório cromada com tampa cromada, código C1602TPCR da Deca ou similar, incluindo ladrão.	Un	1	25,27	5,46	30,73	38,1052	R\$ 38,11		0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.HI S.324	20.05.06	Bancada de copa e/ou banheiro em granito na cor Cinza Corumbá, incluindo acabamento, roda pia com até 10 cm e instalação.	m	2,35	149,45	64,05	213,5	264,74	R\$ 622,14		0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.HI S.325	20.05.07	Saia da bancada em granito Cinza Corumbá com altura de 0,06 cm	m²	0,213	149,45	64,05	213,5	264,74	R\$ 56,39		0	0,00%	R\$ 0,00
CONCRE TIL.003	20.05.01	Torneira elétrica articulável com 4 temperaturas, 220V 5400W marca Corona ou similar	Un	1	298,17	38,234	336,401	417,1371706	R\$ 417,14		0	0,00%	R\$ 0,00
CONCRE TIL.004	20.05.02	Pedal para acionamento de torneira de bica alta Pedalmatic Docol ou similar	Un	3	633,59	38,234	671,824	833,06176	R\$ 2.499,19		0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.HI S.295	20.03.06	Saboneteira em ABS, modelo Trilha da Copapel ou similar	Un	10	35,97	3,29	39,26	48,6824	R\$ 486,83		0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.HI S.296	20.03.07	Porta Toalha em ABS, linha Trilha da Copapel ou similar	Un	10	34,17	3,59	37,76	46,8224	R\$ 468,23		0	0,00%	R\$ 0,00
											0	0,00%	R\$ 0,00
	23	COMUNICAÇÃO VISUAL						R\$ 223,20			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	23.01	PLACAS									0	0,00%	R\$ 0,00
	23.01.01	Placa de Porta									0	0,00%	R\$ 0,00
COMP.C MV.001		(P-PO 100) - Placa de porta confeccionada através de 02 painéis sobrepostos, 01 de de 47,0 x 10,0 cm e 01 de 45,0 x 10,0 cm em PVC expandido pintado, com aplicação de TEXTO e PICTOGRAMA em vinil adesivo, incluindo fixação com fita dupla face e acessório	Un	2	76,5	13,5	90	111,6	R\$ 223,20		0	0,00%	R\$ 0,00
	23.01.01.01										0	0,00%	R\$ 0,00
											0	0,00%	R\$ 0,00
											0	0,00%	R\$ 0,00
	24	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 22.689,52	0,00%	R\$ -	100,00%		R\$ 22.689,52
	24.01										0	0,00%	R\$ 0,00
CONCRE TIL.011		Rasgo (corte) em pisos para passagem de tubulações (planilha só contempla em paredes) e fechamento com argamassa traço 1:4	m	666,96	7,6821	6,32	14,0021	17,3626536	R\$ 11.580,20		0	100,00%	R\$ 11.580,20
	Não consta										0	0,00%	R\$ 0,00
	24.02	Sistema de Água Fria										0,00%	R\$ 0,00
75051/00 2	24.02.01	Tubo PVC Soldável - 25 mm	m	195	2,42	3,15	5,57	6,9068	R\$ 1.346,83		0	100,00%	R\$ 1.346,83
75051/00 3	24.02.02	Tubo PVC Soldável - 32 mm	m	138	5,51	3,41	8,92	11,0608	R\$ 1.526,40		0	100,00%	R\$ 1.526,40
COM.HIS .006	24.02.05	Adaptador PVC Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro - 25 x 3/4"	Un	16	0,8	2,46	3,26	4,0424	R\$ 64,68		0	100,00%	R\$ 64,68
COM.HIS .014	24.02.06	Bucha de redução PVC soldável curta - 32 x 25 mm	Un	12	0,86	2,46	3,32	4,1168	R\$ 49,41		0	100,00%	R\$ 49,41

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta Medição		Acumulado	
					MATERIAL	M OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
	72574	24.02.12	Joelho 45º PVC soldável - 25 mm	Un	20	1,19	4,73	5,92	7,3408	R\$ 146,82	0	100,00%	R\$ 146,82
	72576	24.02.13	Joelho 45º PVC soldável - 32 mm	Un	24	2,57	4,73	7,3	9,052	R\$ 217,25	0	100,00%	R\$ 217,25
	72573	24.02.14	Joelho 90º PVC soldável - 25 mm	Un	63	0,71	4,73	5,44	6,7456	R\$ 424,98	0	100,00%	R\$ 424,98
	72575	24.02.15	Joelho 90º PVC soldável - 32 mm	Un	31	1,48	4,73	6,21	7,7004	R\$ 238,72	0	100,00%	R\$ 238,72
	72643	24.02.20	Luva PVC soldável - 25 mm	Un	14	0,82	2,37	3,19	3,9556	R\$ 55,38	0	100,00%	R\$ 55,38
	72454	24.02.24	Têe de redução PVC soldável - 50 x 25 mm	Un	2	6,13	7,36	13,49	16,7276	R\$ 33,46	0	100,00%	R\$ 33,46
	72439	24.02.26	Têe PVC soldável - 25 mm	Un	19	5,78	4,73	10,51	13,0324	R\$ 247,62	0	100,00%	R\$ 247,62
	72444	24.02.29	Têe PVC soldável - 75 mm	Un		34,07	9,99	44,06	54,6344	R\$ 0,00	0	100,00%	R\$ 0,00
COM.HIS	.058	24.02.30	Têe PVC soldável e com bucha de latão na bolsa central - 25mm x 25mm x 3/4"	Un		8,34	5,19	13,53	16,7772	R\$ 0,00	0	100,00%	R\$ 0,00
												0,00%	R\$ 0,00
												0,00%	R\$ 0,00
	24.03	Sistema de Esgoto						0	R\$ 0,00		0	100,00%	R\$ 0,00
COM.HIS	.186	24.03.01	Tubo PVC esgoto - Ø 40 mm	m	64	2,68	6,55	9,23	11,4452	R\$ 732,50	0	100,00%	R\$ 732,50
COM.HIS	.187	24.03.02	Tubo PVC esgoto - Ø 50 mm	m	36	4,67	8,19	12,86	15,9464	R\$ 574,08	0	100,00%	R\$ 574,08
COM.HIS	.188	24.03.03	Tubo PVC esgoto - Ø 75 mm	m	18	5,88	13,11	18,99	23,5476	R\$ 423,86	0	100,00%	R\$ 423,86
COM.HIS	.189	24.03.04	Tubo PVC esgoto - Ø 100 mm	m	60	7,04	13,11	20,15	24,986	R\$ 1.499,16	0	100,00%	R\$ 1.499,16
	72628	24.03.12	Luva PVC Esgoto - Ø 100 mm	Un	4	5,19	5,52	10,71	13,2804	R\$ 53,13	0	100,00%	R\$ 53,13
	72559	24.03.15	Joelho 45º PVC esgoto 40 mm	Un	10	1,66	6,57	8,23	10,2052	R\$ 102,06	0	100,00%	R\$ 102,06
	72561	24.03.16	Joelho 45º PVC esgoto 50 mm	Un	7	2,66	7,1	9,76	12,1024	R\$ 84,72	0	100,00%	R\$ 84,72
	72564	24.03.17	Joelho 45º PVC esgoto 75 mm	Un	6	5,71	8,94	14,65	18,166	R\$ 109,00	0	100,00%	R\$ 109,00
	72557	24.03.18	Joelho 45º PVC esgoto 100 mm	Un	6	7,09	10,51	17,6	21,824	R\$ 130,95	0	100,00%	R\$ 130,95
	72558	24.03.19	Joelho 90º PVC esgoto 40 mm	Un	18	1,48	6,57	8,05	9,982	R\$ 179,68	0	100,00%	R\$ 179,68
	72560	24.03.20	Joelho 90º PVC esgoto 50 mm	Un	6	2,23	7,1	9,33	11,5692	R\$ 69,42	0	100,00%	R\$ 69,42
	72556	24.03.21	Joelho 90º PVC esgoto 100 mm	Un	6	7,46	10,53	17,99	22,3076	R\$ 133,85	0	100,00%	R\$ 133,85
COM.HIS	.208	24.03.22	Joelho 90º com Anel PVC esgoto 40 mm	Un	2	4,12	5,46	9,58	11,8792	R\$ 23,76	0	100,00%	R\$ 23,76

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO		Esta Medição		Acumulado	
					MATERIAL	M OBR	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Valor	%	Valor
COM.HIS.209	24.03.23	Junção Simples PVC esgoto - 40 x 40 mm	Un	4	3,21	5,46	8,67	10,7508	R\$ 43,01		0	100,00%	R\$ 43,01
72604	24.03.24	Junção Simples PVC esgoto - 50 x 50 mm	Un	4	5,14	6,57	11,71	14,5204	R\$ 58,09		0	100,00%	R\$ 58,09
72603	24.03.26	Junção Simples PVC esgoto - 100 x 100 mm	Un	4	14,77	10,51	25,28	31,3472	R\$ 125,39		0	100,00%	R\$ 125,39
72773	24.03.27	Junção com Redução PVC esgoto - 75 x 50 mm	Un	2	10,35	10,32	20,67	25,6308	R\$ 51,27		0	100,00%	R\$ 51,27
72774	24.03.28	Junção com Redução PVC esgoto - 100 x 50 mm	Un	2	12,1	12,17	24,27	30,0948	R\$ 60,19		0	100,00%	R\$ 60,19
COM.HIS.214	24.03.29	Bucha de Redução PVC esgoto 50 x 40 mm	Un	2	1,48	8,74	10,22	12,6728	R\$ 25,35		0	100,00%	R\$ 25,35
72459	24.03.33	Têe PVC esgoto 100 x 100 mm	Un	5	11,96	11,56	23,52	29,1648	R\$ 145,83		0	100,00%	R\$ 145,83
COM.HIS.227	24.03.35	Dispositivo anti-infiltração de PVC para caixa sifonada - Ø 150 mm	Un	9	22,95	6,83	29,78	36,9272	R\$ 332,35		0	100,00%	R\$ 332,35
40777	24.03.36	Caixa Sifonada Montada c/ Grelha e Porta Grelha DN 150 x 150 x 50 mm	Un	9	16,32	13,14	29,46	36,5304	R\$ 328,78		0	100,00%	R\$ 328,78
	24.07	Registros e Hidrômetros										0,00%	R\$ 0,00
74176/001	24.07.01	Registro de Gaveta Ø 3/4" com acabamento cromado	Un	16	58,43	15,73	74,16	91,9584	R\$ 1.471,34		0	100,00%	R\$ 1.471,34
												0,00%	R\$ 0,00
												0,00%	R\$ 0,00
		25 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO							R\$ 990,75	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00
	25.04	Iluminação de Emergência Autônoma										0,00%	R\$ 0,00
COM.PCI.084	25.04.01	Plaqueta autônoma de indicação de "SAIDA" luminosa de LED na cor vermelha com fundo branco, fixada na parede/porta, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	1	45,19	8,73	53,92	66,8608	R\$ 66,87		0	0,00%	R\$ 0,00
COM.PCI.085	25.04.02	Plaqueta de indicação de "SAIDA" luminosa nos dois versos na cor vermelha com fundo branco, instalada no teto através de suporte metálico, autônoma, LED, conforme projeto e memorial descritivo.	Un	2	48	12,47	60,47	74,9828	R\$ 149,97		0	0,00%	R\$ 0,00
COM.PCI.086	25.04.03	Iluminação de emergência autônoma instalada na parede ou teto, LED, nível de iluminamento mínimo de 3 lux	Un	6	96,54	7,48	104,02	128,9848	R\$ 773,91		0	0,00%	R\$ 0,00
											0	0,00%	R\$ 0,00
											0	0,00%	R\$ 0,00
		30 DIVERSOS			0				R\$ 2.111,72	0,00%	0	0,00%	R\$ 2.111,72
Cotação	30.1	Visor em vidro duplo 50x30 inserido em portas P3	UN	4	425,75	0	425,75	527,93	R\$ 2.111,72		0	100,00%	R\$ 2.111,72
											0	0,00%	R\$ 0,00
					0							0,00%	R\$ 0,00
											R\$	28.082,55	



Descrição: Reforma do prédio Anexo do TRT, antigo Fórum Trabalhista de Florianópolis
BDI: 24,00%
DATA: 13/03/2015

ADITIVO 2 MEDIÇÃO 1 - 19 DE JUNHO DE 2015

R\$

134.771,61

FONTE	CÓDIGO				QUANT.		M OBRA		PREÇO UNITÁRIO		Esta Medição		Acumulado		
											%	Valor	%	Valor	
		1	DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO OBRA							80267,9	32,90%	26410,53	32,90%	R\$ 26.410,53	
	01.01	DESPESAS DE CONSUMO MENSALIS													
MERCADO	01.01.01	Cópias, documentos e plotagens		m²	19,99	9,52	-	9,52	11,80	235,98	33%	77,87	33%	77,8734	
Arbitrado	01.01.02	Consumo telefone		mês	3,00	85,00	-	85,00	105,40	316,20	33%	104,35	33%	104,346	
Arbitrado	01.01.03	Material de Limpeza		Mês	3,00	75,00	-	75,00	93,00	279,00	33%	92,07	33%	92,07	
Arbitrado	01.01.04	Consumo internet - obrigatório no canteiro de obras		mês	3,00	25,00	-	25,00	31,00	93,00	33%	30,69	33%	30,69	
	01.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA													
4069	01.02.01	MESTRE DE OBRAS		H	528,00	-	34,36	34,36	42,61	22.497,49	33%	7424,17	33%	7424,1717	
253	01.02.02	ALMOXARIFE		H	528,00	-	11,19	11,19	13,87	7.324,36	33%	2417,04	33%	2417,0388	
2706	01.02.03	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS		H	198,00	-	47,12	47,12	58,42	11.567,68	33%	3817,33	33%	3817,3344	
2706	01.02.04	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRAS		H	132,00	-	47,12	47,12	58,42	7.711,79	33%	2544,89	33%	2544,8907	
2706	01.02.05	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DE OBRAS		H	66,00	-	47,12	47,12	58,42	3.855,90	33%	1272,45	33%	1272,447	
532	01.02.06	AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA		H	528,00	-	19,52	19,52	24,21	12.780,79	33%	4217,66	33%	4217,6607	
	01.03	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA													
COMP.ADM.031	01.03.01	Alimentação de funcionários		MÊS	3,00	-	2.640,00	2.640,00	3.273,60	9.820,80	33%	3240,86	33%	3240,864	
COMP.ADM.032	01.03.02	Trasnporte de funcionários		MÊS	3,00	-	924,00	924,00	1.145,76	3.437,28	33%	1134,30	33%	1134,3024	
COMP.ADM.033	01.03.03	Equipamento obrigatório individual para funcionários (EPI)		CJ	0,25	1.121,37	-	1.121,37	1.390,50	347,63	33%	114,72	33%	114,7179	
														0	
														0	
		3	MANUTENÇÃO DA OBRA							760,32	33%	250,91	33%	250,9056	
	02.01	Remoção de Entulhos												0	
COMP.ARQ.128	02.01.01	Limpeza, e remoção de entulhos durante a execução da obra.		MÊS	3,00	-	204,39	204,39	253,44	760,32	33%	250,91	33%	250,9056	
														0	
														0	
		5	SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E RETIRADAS							2.658,96	100%	2658,96	100%	R\$ 2.658,96	
10107	03.01.01	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA		Remoção de piso bwc masculino subsolo Saeser e garagem subsolo e eletrocalha ático	m³	25,50	23,78	9,81	33,59	41,65	1.062,14	100%	1062,14	100%	1062,14
25003	03.01.03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES NO BWC FEMININO SUBSOLO EDIFÍCIO SAESER		Piso bwc masculino subsolo Saeser e garagem	m³	0,63	-	89,93	89,93	111,51	70,26	100%	70,26	100%	70,26
Cotação	03.01.04	Recomposição de piso		Bwc masculino subsolo Saeser e garagem	m²	4,15	83,09	27,34	110,43	136,93	568,28	100%	568,28	100%	568,28
115005	03.01.05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR		Piso bwc masculino subsolo Saeser + bwc pavimento 1 (mudança lugar porta)	m²	5,64	-	7,24	7,24	8,97	50,61	100%	50,61	100%	50,61
Cotação Concretil 01	03.01.06	RETIRADA DE FORRO MINERAL, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS		Forro Sala 01 Ático	m²	37,71	-	4,73	4,73	5,87	221,18	100%	221,18	100%	221,18
COMP.ARQ.1023	03.01.08	Regularização de pisos para assentamento de piso vinílico sobre piso cerâmico existente, conforme projeto.		Sala 01 ático	m²	39,70	1,70	2,18	3,88	4,81	191,03	100%	191,03	100%	191,03
SINAPI 85406	03.01.09	Remoção manual de pavimentação de lajota em concreto assentada em argamassa		Calçada área externa	m²	5,06	-	34,46	34,46	42,73	216,22	100%	216,22	100%	216,22
Cotação Concretil 02	03.01.10	Remoção de eletrocalha lisa e acessórios		7º pavimento	m	26,87	-	7,81	7,81	9,68	260,22	100%	260,22	100%	260,22

FONTE	CÓDIGO				QUANT.		M OBRA		PREÇO		Esta Medição		Acumulado	
									UNITÁRIO		%	Valor	%	Valor
SERP 72215		Recorte de parede de alvenaria e demolição para instalação de porta	1º pavimento (mudança local porta)	m³	0,75	-	20,45	20,45	25,36	19,02	100%	19,02	100%	19,02
	11	PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR P.N.E.				-	-		4.939,97	100%	4939,97	100%	R\$ 4.939,97	
						-	-							
	04.01	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO				-	-							
74019/001U	04.01.01	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	Reforço balanço PNE	m³	1,25	-	32,40	32,40	40,18	50,22	100%	50,22	100%	50,22
72920U	04.01.02	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	Reforço balanço PNE	m³	1,25	5,71	7,34	13,05	16,18	20,23	100%	20,23	100%	20,23
74074/004U	04.01.03	FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUIDO DESMOLDANTE	Reforço balanço PNE + estrutura parede que sustentará o elevador	m²	15,36	26,37	31,17	57,54	71,35	1.095,93	100%	1095,93	100%	1095,93
73942/002U	04.01.04	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Reforço balanço PNE + estrutura parede que sustentará o elevador	Kg	21,22	4,49	2,49	6,98	8,66	183,67	100%	183,67	100%	183,67
74254/002U	04.01.05	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Reforço balanço PNE + estrutura parede que sustentará o elevador	Kg	62,35	4,02	2,57	6,59	8,17	509,50	100%	509,50	100%	509,5
337	04.01.06	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	Reforço balanço PNE+ estrutura parede que sustentará o elevador	KG	1,50	6,50	-	6,50	8,06	12,09	100%	12,09	100%	12,09
74138/003U	04.01.07	CONCRETO VIRADO EM OBRA FCK=25MPa, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	Reforço balanço PNE + estrutura parede que sustentará o elevador	m³	1,50	321,06	41,13	362,19	449,12	673,68	100%	673,68	100%	673,68
73979/004U	04.01.08	DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M	Reforço balanço PNE + estrutura parede que sustentará o elevador	m²	15,36	-	10,43	10,43	12,93	198,66	100%	198,66	100%	198,66
Cotação	04.01.09	Sika Grout 250	Reforço balanço PNE	sc	12,00	38,90	4,11	43,01	53,33	639,99	100%	639,99	100%	639,99
Cotação	04.01.10	Compound adesivo	Reforço balanço PNE	Lt	6,00	47,00	4,13	51,13	63,40	380,41	100%	380,41	100%	380,41
										0,00		0%		0
	04.02	Tijolos Cerâmicos Furado				-	-		-	-	100%	0,00	100%	0
Cotação Concretil 03	04.02.01	ALVENARIA EM TUIOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	Estrutura parede que sustentará o elevador	m²	5,08	14,62	19,18	33,80	41,91	212,92	100%	212,92	100%	212,92
Cotação Concretil 04	04.02.02	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM	Estrutura parede que sustentará o elevador	m	3,40	0,55	3,81	4,36	5,41	18,39	100%	18,39	100%	18,39
	04.03	ELEVADOR PNE												
COM.ELE.069a	04.03.01	Cabo # 2,5 mm² -750V- 70° - isolamento com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme norma: Nbr 13248 - Cabos de potência e controle com isolamento sólida extrudada e com baixa emissão de fumaça; Nbr 13570/1996	Ponto de energia para ligação plataforma elevatória	m	175,00	0,69	1,12	1,81	2,24	392,77	100%	392,77	100%	392,77
COM.ELE.084	04.03.02	Eletroduto rígido não roscável, Ø3/4", fabricado em PVC, classe A, cor branca, conforme norma Nbr 15465 - Sistema de eletrodutos, , em barras de 3m, (Ref: Wetzel ou similar) ,fornecimento e instalação	Ponto de energia para ligação plataforma elevatória	Br	7,00	18,54	4,46	23,00	28,52	199,64	100%	199,64	100%	199,64
COM.ELE.088	04.03.03	Curva 90° não roscável, raio longo, Diâmetro de Ø3/4", fabricada em PVC, classe A, atende a nova Norma NBR 15465, (Ref: Wetzel ou similar)	Ponto de energia para ligação plataforma elevatória	un	9,00	6,75	1,12	7,87	9,76	87,83	100%	87,83	100%	87,83
COM.ELE.093	04.03.04	Adaptador em PVC para condutele Ø3/4", (Ref: Wetzel ou similar) instalação e fornecimento.	Ponto de energia para ligação plataforma elevatória	un	20,00	0,75	1,12	1,87	2,32	46,38	100%	46,38	100%	46,38
COM.ELE.261	04.03.05	Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN 3x32A - Icc=Ics=10,0KA, curva de disparo "C", capacidade para 4.000 manobras elétricas, temperatura ambiente -25°C a 55°C, conforme norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre corrente para instalaçã	Ponto de energia para ligação plataforma elevatória	un	1,00	172,07	3,46	175,53	217,66	217,66	100%	217,66	100%	217,66

[illegible]

FONTE	CÓDIGO				QUANT.		M OBRA		PREÇO UNITÁRIO		Esta Medição		Acumulado	
											%	Valor	%	Valor
	08.01.01	Paredes Internas												
COMP.ARQ.178	08.01.02	Revestimentos com argamassa baritada espessura de 1,5 cm, a ser aplicada em paredes, teto ou piso na, densidade 3,2g/cm³,atenuação linear com fontes radioativas "Am" 241 e "Eu" 152, detector de germânio hiper puro, para energias de 60 kvs e de 80 a 1.300	Parede Consultório odontológico 3 modificada em projeto posteriormente a sua execução (2 lados)	m²	17,73	108,24	17,46	125,70	155,87	2.763,64	100%	2763,64	100%	2763,635495
Cotação Concretil 14	08.01.03	Revestimento têxtil acústico de parede e teto, agulhado vertical, composto 100% por fibras de polipropileno e resinas sintéticas, com relevo tipo "loop". Em cor clara.	Ante-camara Estúdio	m²	30,3	191,20	12,34	203,54	252,39	7.647,37		0,00	0%	0
COMP.ARQ.181	16.01.01.04	Revestimento de parede e teto com manta Sonex, modelo Nova Fórmula, 1000 x 1000 mm, 50 mm de espessura, cor natural.	Parede sala master, edição 1, edição 2 e casa do compressor odontológico	m²	36,55	120,56	12,34	132,90	164,80	6.023,40	100%	6023,40	100%	6023,395231
	17	PAVIMENTAÇÕES, RODAMEIO E RODAPÉ								7.103,37	100%	7103,37	100%	R\$ 7.103,37
	09.01	REGULARIZAÇÃO DO PISO BASE												
73920/001U	09.01.01	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL - piso vinílico	Sala 01 ático	m²	86,85	5,66	6,62	12,28	15,23	1.322,49	100%	1322,49	100%	1322,49
	09.02	PISOS CERÂMICOS												
COMP.ARQ.028	09.02.01	Piso cerâmico dimensões de 30 x 30 cm, antiderrapante branco, assentado com argamassa colante AC-II e devidamente rejuntado, conforme projeto.	Bwc masculino subsolo prédio Sede	m²	5,66	22,62	10,98	33,60	41,66	235,82	100%	235,82	100%	235,82
	09.03	PISOS VINÍLICOS												
COMP.ARQ.151A	09.03.01	PISO VINÍLICO ANTI DERRAPANTE, marca TARKETT FADEMAC, linha PAVIFLEX NATURAL, mod. CHROMA CONCEPT 300 x 300mm, esp. 2,0 mm ref. 9201912.	Ático	m²	86,85	36,50	7,02	43,52	53,97	4.686,89	100%	4686,89	100%	4686,89
	17.01	LAJOTA EM CONCRETO												
Cotação Concretil 15	17.01.02	Lajotas em concreto para manutenção de calçada existente.	Calçada área externa + calçada quebrada para passar tubulação da lixeira	m²	14,81	35,75	10,98	46,73	57,95	858,17	100%	858,17	100%	858,17
	19	FORROS								7.593,32	62%	4715,56	62%	R\$ 4.715,56
	19.01	FORRO DE PVC												
Cotação Concretil 16	19.01.01	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 10MM, LISO, COM 2 ALÇAPÕES QUE DÃO ACESSO A PARTE INTERNA DO FORRO (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	Vestiários subsolo	m²	25,30	75,30	16,43	91,73	113,75	2.877,76		0,00	0%	0
	19.02	FORRO FIBROMINERAL												
COMP.ARQ.036A	19.02.01	Forro modular em fibra mineral em placas de 625 x 625 mm ou 625x1250mm incluindo perfis metálicos	Sala 01 ático	m²	39,70	65,79	30,00	95,79	118,78	4.715,56	100%	4715,56	100%	4715,56
	20	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - ÁREAS MOLHADAS								28.777,00	0%	52,14	0%	R\$ 52,14
	20.01	Vaso sanitário e lavatório de coluna								-				
Cotação Concretil 17	20.01.01	Parafusos para fixação vaso sanitário.	Banheiro masculino subsolo Saeser	Un	1,00	11,50	5,71	17,21	21,34	21,35	100%	21,35	100%	21,35
Cotação Concretil 18	20.01.02	Anel para vedação de vaso sanitário (Tigre ou similar)	Banheiro masculino subsolo Saeser	Un	1,00	2,76	5,71	8,47	10,50	10,51	100%	10,51	100%	10,51
Cotação Concretil 19	20.01.01	Parafusos para fixação lavatório de coluna.	Banheiro masculino subsolo Saeser	Un	1,00	10,64	5,71	16,35	20,27	20,28	100%	20,28	100%	20,28
	20.02	Bancadas em aço inox												
Cotação Concretil 20	20.02.01	BANCADA EM "L" CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ESTRUTURA EM CHAPA 18	Sala Limpa	Un.	1,00	7.126,40	-	7.126,40	8.836,74	8.836,74		0,00	0%	0
Cotação Concretil 21	20.02.02	BANCADA EM "L" CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ESTRUTURA EM CHAPA 18	Sala Suja	Un.	1,00	7.304,40	-	7.304,40	9.057,46	9.057,46		0,00	0%	0

FONTE	CÓDIGO				QUANT.		M OBRA		PREÇO UNITÁRIO		Esta Medição		Acumulado	
											%	Valor	%	Valor
COM.TEC.097	27.01.17	Eletrocalha metálica perfurada (300x100)mm, em barra de 3000mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, Cor: Branca (Ref: Mopa ou similar)	7º pavimento	Br	1,00	127,03	6,69	133,72	165,81	165,82	100%	165,82	100%	165,82
COM.TEC.100	27.01.21	Emenda em "T" 90° para eletrocalha metálica perfurada (300x100)mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, (Ref: Mopa ou similar)	7º pavimento	Un	1,00	63,48	4,73	68,21	84,58	84,59	100%	84,59	100%	84,59
	28	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO							85.102,86	35%	30036,22	35%	R\$ 30.036,22	
COMP.CLI.001		Split hi wall inverter 9.000 btu's frio , 01 unidade condensadora e 01 unidade evaporadora.REF.: SAMSUNG		Cj.	8,00	-	371,42	371,42	460,56	3.684,49	100%	3684,49	100%	3684,49
COMP.CLI.002		Split hi wall inverter 12.000 btu's frio , 01 unidade condensadora e 01 unidade evaporadora. REF.: SAMSUNG		Cj.	56,00	-	371,42	371,42	460,56	25.791,41		0,00	0%	0
COMP.CLI.003		Split hi wall inverter 18.000 btu's frio , 01 unidade condensadora e 01 unidade evaporadora. REF.: SAMSUNG		Cj.	3,00	-	371,42	371,42	460,56	1.381,69	100%	1381,69	100%	1381,69
COMP.CLI.005		Tubo de cobre flexível Ø 1/4"		m	261,30	5,90	8,19	14,10	17,48	4.566,96	95%	4338,61	95%	4338,612
COMP.CLI.006		Tubo de cobre flexível Ø 1/2"		m	10,60	12,45	9,01	21,46	26,61	282,11	95%	268,00	95%	268,0045
COMP.CLI.007		Tubo de cobre flexível Ø 3/8"		m	248,60	11,04	9,83	20,87	25,88	6.433,08	95%	6111,43	95%	6111,426
COMP.CLI.008		Espuma elastomérica para isolamento do tubo de cobre de Ø 1/4" - 9 mm		m	261,30	1,45	2,12	3,57	4,43	1.157,51	95%	1099,63	95%	1099,6345
COMP.CLI.009		Espuma elastomérica para isolamento do tubo de cobre de Ø 1/2" - 25 mm		m	10,60	11,98	2,12	14,10	17,49	185,37	95%	176,10	95%	176,1015
COMP.CLI.010		Espuma elastomérica para isolamento do tubo de cobre de Ø 3/8" - 19 mm		m	248,60	3,78	2,12	5,90	7,32	1.819,50	95%	1728,53	95%	1728,525
COMP.CLI.011		Calha metálica perfurada 75 x 75 mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 zincado por imersão em zinco fundido, Ref: Mopa ou similar, incluindo fixação e emendas.		m	25,00	116,37	2,65	119,02	147,59	3.689,74	100%	3689,74	100%	3689,74
COMP.CLI.012		Curva 90° para eletrocalha metálica 75 x 75 mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, Ref: Mopa ou similar.		Un	14,00	29,91	4,81	34,72	43,05	602,74	100%	602,74	100%	602,74
COMP.CLI.013		Calha metálica lisa 150 x 100 mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 zincado por imersão em zinco fundido, Ref: Mopa ou similar, incluindo fixação, emendas e pintura eletrostática na cor preta, para caminhamento de tubulação na área externa do prédio.		m	4,00	139,60	2,65	142,25	176,39	705,58	100%	705,58	100%	705,58
COMP.CLI.014		Curva 90° para eletrocalha metálica 150 x 100 mm, conforme norma: NBR 6323 - Aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono) zincado por imersão em zinco fundido, Ref: Mopa ou similar, incluindo pintura eletrostática na cor preta.		Un	3,00	36,75	4,81	41,56	51,53	154,61	100%	154,61	100%	154,61
COMP.CLI.015		REMOVEDORES DE AR Renovador de ar com capacidade de 80 m³/h, modelo Ventokit NM80, incluindo tubo de saída em alumínio, veneziana auto-fechante e fixação através de parafusos.	Alterações climatização + 1 bwc ático	Cj.	10,00	209,56	26,53	236,09	292,75	2.927,46	50%	1463,73	50%	1463,73
COMP.CLI.016		Renovador de ar com capacidade de 150 m³/h, modelo Ventokit NM150, incluindo tubo de saída em alumínio, veneziana auto-fechante e fixação através de parafusos.		Cj.	4,00	218,22	26,53	244,75	303,48	1.213,94	100%	1213,94	100%	1213,94
COMP.CLI.020		Exaustor Ventibec com Filtro Absoluto e Filtro Bolsa		Cj.	2,00	980,00	212,24	1.192,24	1.478,38	2.956,76		0,00	0%	

FONTE	CÓDIGO				QUANT.				PREÇO		Esta Medição		Acumulado	
							M OBRA		UNITÁRIO		%	Valor	%	Valor
COMP.CLI.004		Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	1.198,56	7,01	3,98	10,98	13,62	16.325,33	10%	1632,53	10%	1632,533	
COMP.CLI.017		Fita aluminizada especifica para tubulações de ar condicionado, rolo de 48 mm x 50 m	Rolo	8,00	47,90	11,05	58,95	73,10	584,83		0,00	0%	0	
COMP.CLI.019		Amortecedor anti vibração para condensadora	UN	268,00	5,30	4,24	9,54	11,84	3.171,93	50%	1585,97	50%	1585,965	
COMP.CLI.018		Caixa de espera em PVC	Un	67,00	29,90	13,27	43,17	53,52	3.586,15		0,00	0%	0	
COMP.CLI.021		Furação para passagem das tubulações frigorigenas pela parede, incluindo retirada de entulhos até a caçamba de remoção e recomposição.	Un	128,00	-	11,92	11,92	14,79	1.892,71		0,00	0%	0	
		Carga de gás adicional R-22	KG	20,05	35,00	45,00	80,00	99,20	1.988,96	10%	198,90	10%	198,896	
	29	MOBILIÁRIO E PROTEÇÃO DAS JANELAS			-	-		-	40.960,92	30%	12114,80	30%	12114,8	
Cotação Concretil 28		Móvel para Consultório Odontológico 1 em MDF 18mm, com corredeiras telescópicas e puxador em alumínio tipo cava. (60x285cm)	5º pavimento	Un	1,00	5.094,00	1.562,00	6.656,00	8.253,44	8.253,44	0,00	0%	0	
Cotação Concretil 29		Móvel para Consultório Odontológico 2 em MDF 18mm, com corredeiras telescópicas e puxador em alumínio tipo cava. (60x260cm)	5º pavimento	Un	1,00	4.878,00	1.562,00	6.440,00	7.985,60	7.985,60	0,00	0%	0	
Cotação Concretil 30		Móvel para Consultório Odontológico 3 em MDF 18mm, com corredeiras telescópicas e puxador em alumínio tipo cava. (60x245cm)	5º pavimento	Un	1,00	4.518,00	1.562,00	6.080,00	7.539,20	7.539,20	0,00	0%	0	
Cotação Concretil 31		Balcão em MDF Pérola Maiorca com duas portas com puxadores tipo gola e aéreo com duas portas de abrir, e duas laterais apoiando no balcã. (60x100cm)	3º pavimento	Un	2,00	1.344,00	345,00	1.689,00	2.094,36	4.188,72	100%	4188,72	100%	4188,72
Cotação Concretil 32		Móvel para Consultório Médico em MDF Pérola Maiorca com duas portas com puxadores tipo gola e aéreo com duas portas de abrir.(60x70)	3º e 4º pavimento	Un	2,00	1.112,00	395,00	1.507,00	1.868,68	3.737,36	100%	3737,36	100%	3737,36
Cotação Concretil 33		Móvel para Consultório Médico em MDF Pérola Maiorca com duas portas com puxadores tipo gola e aéreo com duas portas de abrir	4º pavimento	Un	1,00	1.112,00	395,00	1.507,00	1.868,68	1.868,68	0,00	0%	0	
Cotação Concretil 34		Balcão em MDF Pérola Maiorca com duas portas com puxadores tipo gola e aéreo com duas portas de abrir, e duas laterais apoiando no balcão (60x95cm)	4º pavimento	Un	2,00	1.344,00	345,00	1.689,00	2.094,36	4.188,72	100%	4188,72	100%	4188,72
Cotação Concretil 35		Balcão em MDF Pérola Maiorca + MDF Branco interno com 4 portas e 4 gavetas	Subsolo	Un	1,00	1.935,00	645,00	2.580,00	3.199,20	3.199,20	0,00	0%	0	
											R\$ 134.771,61		R\$ 134.771,61	

MEDIÇÃO 14 (16 MESES ACUMULADOS) MEDIDO EM 15 DE JUNHO DE 2015

LEGENDA

Serviço adiantado em até 50%

Serviço com atraso em até 50%

Serviço com atraso superior a 50%

Serviço	TOTAL GERAL	PREVISTO (acumulado)		REALIZADO (acumulado)		Esta medição
		%	Valor	%	Valor	
1 DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO OBRA	492.493,70	88,98%	438.237,16	88,69%	436.797,01	26.410,53
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	59.850,21	100,00%	59.850,21	100,00%	59.850,21	0,00
3 MANUTENÇÃO DA OBRA	27.651,82	98,17%	27.144,95	98,16%	27.142,41	250,91
4 TRANSPORTES	1.435,92	100,00%	1.435,92	100,00%	1.435,92	0,00
5 SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	125.367,99	92,37%	115.802,27	95,31%	119.483,50	5.172,23
6 SERVIÇOS EM CONCRETO	1.837,32	100,00%	1.837,32	100,00%	1.837,32	0,00
7 LIXEIRA 01	11.336,46	100,00%	11.336,46	100,00%	11.336,46	0,00
8 CASA DO COMPRESSOR	3.778,40	85,90%	3.245,61	100,00%	3.778,40	0,00
9 ACESSO AO PLENARIO	-	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00
10 RAMPA EXTERNA DE ACESSO AO EDIFICIO SASER	70.374,36	48,37%	34.038,62	13,11%	9.229,32	7.202,03
11 PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR P.N.E.	75.560,78	92,80%	70.121,90	100,00%	75.560,78	4.939,97
12 IMPERMEABILIZAÇÕES	32.320,87	100,00%	32.320,87	100,00%	32.320,87	0,00
13 VEDAÇÕES	167.527,78	90,00%	150.773,29	90,00%	150.773,29	32.069,09
14 ESQUADRIAS	358.290,65	89,21%	319.645,43	96,70%	346.474,31	24.007,85
15 VIDROS	104.046,64	78,86%	82.046,64	77,55%	80.689,66	10.098,75
16 REVESTIMENTOS	126.562,29	93,96%	118.915,42	93,96%	118.914,92	8.787,03
17 PAVIMENTAÇÕES, RODAMEIO E RODAPE	196.353,76	68,24%	133.992,05	89,96%	176.637,20	41.663,34
18 PINTURA	215.245,07	86,58%	186.365,14	82,34%	177.226,40	3.647,44
19 FORROS	11.030,41	100,00%	11.030,41	73,91%	8.152,65	4.715,56
20 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - AREAS MOLHADAS	138.263,02	55,26%	76.399,84	55,03%	76.081,80	13.224,22
22 ACESSIBILIDADE	53.467,03	32,71%	17.488,66	0,00%	0,00	0,00
23 COMUNICAÇÃO VISUAL	29.948,38	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00
24 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	72.973,12	91,07%	66.458,64	95,54%	69.719,13	2.013,41
25 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	109.134,93	61,18%	66.766,16	71,43%	77.955,09	1.017,64
26 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	378.995,68	78,89%	298.995,68	88,74%	336.304,75	51.059,00
27 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	42.828,80	23,31%	9.984,81	23,10%	9.894,91	250,41
28 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	97.949,56	56,20%	55.048,27	43,78%	42.882,91	30.036,22
29 MOBILIÁRIO E PROTEÇÃO DAS JANELAS	138.281,27	41,03%	56.736,04	41,41%	57.267,12	12.114,80
30 DIVERSOS	8.152,45	0,00%	-	25,90%	2.111,72	0,00
31 PAISAGISMO	288,18	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00
32 DESPESAS FINAIS	19.029,30	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00
			-		0,00	
TOTAL ACUMULADO		3.170.376,15	2.446.017,77	2.509.858,07	R\$	278.680,42


ESTA MEDIÇÃO

278.680,42

CRONOGRAMA ATUALIZADO COM O SEGUNDO ADITIVO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SETOR DE LIQUIDAÇÃO E ANÁLISE DA DESPESA

TERMO DE LIQUIDAÇÃO SOF/SELAD



Liquida(m)-se o(s) documento(s) abaixo relacionado(s) conforme Nota de Empenho, classificação da despesa e valor(es) informado(s) e em conformidade com o contrato próprio, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320 de 17/03/1964.

Processo: CP-8848/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO ANEXO DA SEDE DO TRT (ANTIGO FÓRUM TRABALHISTA DE FLORIANÓPOLIS).

Fornecedor: CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA. (95.827.697/0001-85)

Classificação: 339039-16 (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS)

Nota de Empenho	Ano	Data da Liquidação	Observação	Competência	Documento	Unidade	Valor
1757	2013	03/07/15	14ª MEDIÇÃO (VALOR DA NOTA: R\$ 115.826,26 - LIQUIDADO PARCIALMENTE NA 2013NE1858: R\$ 95.229,55)	06/2015	NFE. 164	SPO	20.596,71
1858	2013	03/07/15	14ª MEDIÇÃO (VALOR DA NOTA: R\$ 115.826,26 - LIQUIDADO PARCIALMENTE NA 2013NE1757: R\$ 20.596,71)	06/2015	NFE. 164	SPO	95.229,55
1858	2013	03/07/15	REAJUSTE REF. 8ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO	06/2015	NFE. 166	SPO	1.871,14
1858	2013	03/07/15	1ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO	06/2015	NFE. 165	SPO	134.771,61
1858	2013	03/07/15	REAJUSTE REF. 14ª MEDIÇÃO	06/2015	NFE. 167	SPO	7.717,50
1858	2013	03/07/15	8ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO	06/2015	NFE. 163	SPO	28.082,55

Sub-Total: 288.269,06

Total: 288.269,06

Certifico que, referente a competência da(s) liquidação(ões) acima relacionada(s), os documentos exigidos em contrato encontram-se atualizados, mantidas as condições de habilitação da licitação.

Florianópolis-SC, 03 de July de 2015.

SIMONE BONAFELLI CARDOSO
Técnico Judiciário

CP 8848/2013



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número e Série da NFS-e
00000000164 / A1Data e Hora da Emissão
26/06/2015 16:09:21Código de Verificação
BCD6-413F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 95.827.697/0001-85 Inscrição Municipal: 271598
 Nome: CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA
 Endereço: MANOEL DONO MORGADO, 57
 CEP: 88301462 Bairro: FAZENDA
 Município: ITAJAÍ UF: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23
 Nome: 1705 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
 Endereço: ESTEVES JUNIOR, 395
 CEP: 88015-130 Bairro: CENTRO
 Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Décima quarta medição ref. reforma do prédio anexo do TRT.

Contrato nº CP8848/2013

CEI: 5122344491/73

Material: R\$69.495,75

Mão de Obra: R\$46.330,51

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 115.826,26

Código do Serviço:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Natureza de Operação

201 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
115.826,26	115.826,26	3,00 %	3.474,79	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	752,87	3.474,79	5.096,35
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
1.389,91	1.158,26	0,00	0,00	100.479,29

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Serviço prestado em outro município: FLORIANÓPOLIS/SC

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 01 / 07 / 2015

Km.

Kristina Natalia Cancellor
Assistente-Administrativa SPO
FISCAL DO CONTRATO



Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

TERMO DE LIQUIDAÇÃO

Liquida-se o presente documento de
acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64.
O documento refere-se ao original da
1ª via, arquivado neste Setor.

Em 03 / 07 / 15

SIMONE BONAFELLI CARDOSO
Técnico Judiciário

13NE1757 - RP

39-16 —————> RB 20.596,71

13NE1858 - RP

39-16 —————> RB 95.229,55

115.826,26

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eNúmero e Série da NFS-e
00000000167 / A1Data e Hora da Emissão
26/06/2015 16:42:10Código de Verificação
AFA0-58B2

CPF/CNPJ:

95.827.697/0001-85

Inscrição Municipal: 271598

Nome:

CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço:

MANOEL DONO MORGADO, 57

CEP:

88301462

Bairro: FAZENDA

Município:

ITAJAÍ

UF: SC

PRESTADOR DE SERVIÇOS**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

02.482.005/0001-23

Nome:

1705 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Endereço:

ESTEVES JUNIOR, 395

CEP:

88015-130

Bairro: CENTRO

Município:

FLORIANÓPOLIS

UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSReajuste ref. décima quarta medição conforme Apostilamento CP8848/2013.

Contrato nº CP8848/2013

CEI: 5122344491/73

Material: R\$4.630,50

Mão de Obra: R\$3.087,00

6.663,93**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 7.717,50**

Código do Serviço:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Natureza de Operação

201 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
7.717,50	7.717,50	3,00 %	231,53	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	50,16	231,53	339,57
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
92,61	77,17	0,00	0,00	6.694,93

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Serviço prestado em outro município: FLORIANÓPOLIS/SC

**Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.**

Em 01/07/2015

Klu.

Kristina Natalla Cancelier
Assistente-Administrativa SPO
FISCAL DO CONTRATO


Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eNúmero e Série da NFS-e
00000000165 / A1Data e Hora da Emissão
26/06/2015 16:20:12Código de Verificação
E5AE-4368**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 95.827.697/0001-85 Inscrição Municipal: 271598
Nome: CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: MANOEL DONO MORGADO, 57
CEP: 88301462 Bairro: FAZENDA
Município: ITAJAÍ UF: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23
Nome: 1705 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
Endereço: ESTEVES JUNIOR, 395
CEP: 88015-130 Bairro: CENTRO
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Primeira medição do segundo aditivo ref. reforma do prédio anexo do TRT.

Contrato nº CP 8848/2013
CEI: 5122344491/73

Material: R\$80.862,96
Mão de Obra: R\$53.908,65

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 134.771,61

Código do Serviço:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Natureza de Operação

201 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço

Valor Serviços 134.771,61	Base de Cálculo 134.771,61	Alíquota ISS 3,00 %	Valor ISS retido 4.043,15	Valor ISS 0,00
Desconto incondicional 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 876,01	Valor COFINS 4.043,15	Valor INSS 5.929,95
Valor IR 1.617,25	Valor CSLL 1.347,71	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor líquido da NFS-e 116.914,39

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Serviço prestado em outro município: FLORIANÓPOLIS/SC

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 03 / 07 / 2015

Klu.

Kristina Natalia Cancellier
Assistente-Administrativa SPO
FISCAL DO CONTRATO

[Signature]
Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eNúmero e Série da NFS-e
00000000163 / A1Data e Hora da Emissão
26/06/2015 16:01:00Código de Verificação
57A8-E554**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 95.827.697/0001-85 Inscrição Municipal: 271598
Nome: CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: MANOEL DONO MORGADO, 57
CEP: 88301462 Bairro: FAZENDA
Município: ITAJAÍ UF: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23
Nome: 1705 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
Endereço: ESTEVES JUNIOR, 395
CEP: 88015-130 Bairro: CENTRO
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Oitava medição do primeiro aditivo ref. reforma do prédio anexo do TRT.

Contrato nº CP 8848/2013
CEI: 5122344491/73

Material: R\$16.849,53
Mão de Obra: R\$11.233,02

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 28.082,55

Código do Serviço:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Natureza de Operação

201 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço

Valor Serviços 28.082,55	Base de Cálculo 28.082,55	Alíquota ISS 3,00 %	Valor ISS retido 842,48	Valor ISS 0,00
Desconto incondicional 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 182,53	Valor COFINS 842,48	Valor INSS 1.235,63
Valor IR 336,99	Valor CSLL 280,82	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor líquido da NFS-e 24.361,62

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Serviço prestado em outro município: FLORIANÓPOLIS/SC

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 03 / 04 / 2015

Klu.

Kristina Natalia Cancelier
Assistente-Administrativa SPO
FISCAL DO CONTRATO


Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SPO

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eNúmero e Série da NFS-e
00000000166 / A1Data e Hora da Emissão
26/06/2015 16:33:27Código de Verificação
7EA4-7DB5**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 95.827.697/0001-85 Inscrição Municipal: 271598
Nome: CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: MANOEL DONO MORGADO, 57
CEP: 88301462 Bairro: FAZENDA
Município: ITAJAÍ UF: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.482.005/0001-23
Nome: 1705 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
Endereço: ESTEVES JUNIOR, 395
CEP: 88015-130 Bairro: CENTRO
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Reajuste ref. oitava medição do primeiro aditivo conforme Apostilamento CP8848/2013.

Contrato nº CP8848/2013
CEI: 5122344491/73

Material: R\$1.122,68
Mão de Obra: R\$748,46

6.663,14

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.871,14

Código do Serviço:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Natureza de Operação

201 - ISS retido pelo tomador ou intermediário do serviço

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.871,14	1.871,14	3,00 %	56,13	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	12,16	56,13	82,33
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
22,45	18,71	0,00	0,00	1.623,23

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Serviço prestado em outro município: FLORIANÓPOLIS/SC

Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 01/07/2015

Klu

Kristina Natalia Cancellor
Assistente-Administrativa SPO
FISCAL DO CONTINATO


Alexandre Koenig S. V. Magr
Diretor do SPO

07/07/15 18:28

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 06Jul15 TIPO OB: 12

NUMERO : 2015OB803725

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 95827697/0001-85 - CONCRETIL CONSTRUcoes LTDA

BANCO : 001 AGENCIA : 0305 CONTA CORRENTE : 456349

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP001176 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003086240-X RE000218 PROCESSO : CP-8848/2013

VALOR : 250.073,40

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 07/07/15

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 163 A 167 - REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGAVA O FÓRUM
TRABALHISTA DE FLORIANÓPOLIS. 14A. MEDIÇÃO, 8A. MEDIÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADI
TIVO, 1A. MEDIÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO E REAJUSTES. PROAD 8848/2013

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

07/07/15 18:29 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 06Jul15 TIPO OB: 12 NUMERO : 2015OB803725
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 95827697/0001-85 - CONCRETIL CONSTRUcoes LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 0305 CONTA CORRENTE : 456349

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401006	2013NE001858400		33903916	250.073,40
					233.608,13
02	401006	2013NE001858510		33903916	16.465,27
					250.073,40
03	531814	2013NE001858	213110400	33903916	233.608,13
					16.465,27
04	561602	01000000000400C			
05	561602	01000000000510C			

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 06Jul15 16:33
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

07/07/15 18:29 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 06Jul15 TIPO OB: 11 NUMERO : 2015OB803726
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 82892282/0001-43 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
BANCO : 104 AGENCIA : 1877 CONTA CORRENTE : 5860
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP001176 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003086245-0 RE000218 PROCESSO : CP-8848/2013
VALOR : 8.648,08

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 07/07/15
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NF 163 A 167 - CONCRETIL CONSTRUÇÕES

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

07/07/15 18:29

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 06Jul15 VENCIMENTO: 06Jul15 NUMERO : 2015DF800916
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
CONTRIBUINTE : 95827697/0001-85 - CONCRETIL CONSTRUcoes LTDA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : CP-8848/2013 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2015NP001176
PERIODO APURACAO : 06Jul15 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES BASE DE CALCULO : 288269,06
RECEITA : 16.863,74
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 06/07/15
TOTAL : 16.863,74

OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuicoes sociais retidas nf 163 a 167

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 06Jul15 16:33
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

07/07/15 18:29

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 06Jul15

NUMERO : 2015GP800208

UG/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO

RECOLHEDOR : 512234449173

CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI

COMPETENCIA : JUN15

RECURSO : 3

PROCESSO : CP-8848/2013

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP001176 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 3582 , EM 06/07/15

VALOR INSS : 12.683,84

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 12.683,84

OBSERVACAO

Recolhimento de contribuição retida nf 163 A 167

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA

UG : 080013 06Jul15 16:33

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

