

De: Eng. Adalberto Knoth

Para: Alexandre Koenig S. Thiago - Diretor do SPO

**Assunto: 1 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA – 14ª MEDIÇÃO (mensal);
2 - ANÁLISE DO PEDIDO DE REAJUSTE SOBRE O ADITIVO 01;
3 - NOVO PEDIDO DE ADITIVO: ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA**

Processo: PROAD - 8207/2013

Prezado Diretor,

Encaminho a 14ª medição da obra e manifestação acerca do pedido de reajuste sobre o aditivo 01, bem como, informo sobre o novo pedido de aditamento contratual protocolado pela contratada.

1. MEDIÇÃO 14 DA OBRA - ENCAMINHAMENTO

Encaminho a **nota fiscal eletrônica nº 858**, da empresa Oros Engenharia Ltda., no valor de **R\$ 432.359,78** (quatrocentos e trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos). Esta medição, relativa ao período de 21 de maio a 20 de junho de 2015, corresponde a **3,62%** do valor do contrato, sendo que a obra acumula **34,54%** do total de serviços.

Informo que foram incluídos no processo, juntamente com esta medição, os seguintes documentos: carta da contratada acerca do encaminhamento da 14ª medição (doc. 409); relatório do diário de obras eletrônico relativo ao período da medição (doc. 410); e a planilha de serviços executados desta medição (doc. 411).

Solicito providências aos setores competentes no sentido da conferência dos demais documentos entregues fisicamente, exigidos no contrato, bem como o encaminhamento ao pagamento do valor medido.

2. ANÁLISE DO PEDIDO DE REAJUSTE SOBRE O ADITIVO 01

A contratada Oros apresentou solicitação de reajuste sobre os valores do Aditivo 01 (**R\$ 70.544,58**), conforme documento de marcador 412. Esse aditivo foi assinado no dia 20/02/2015, sendo que se refere a duas etapas de serviços, a saber: diferenças de retificação da planilha orçamentária (**R\$ 63.421,58**); e acréscimo de serviços ao objeto contratual (**R\$ 7.123,00**) - conforme documento de marcador 280.

a) Diferenças de retificação da planilha orçamentária

Esse serviço se refere ao consumo, além do previsto no orçamento, de: cimento, areia e a confecção da argamassa usados na execução das estacas da fundação. Esses serviços correspondem ao itens 2.7, 2.8 e 2.9 da planilha do aditivo 01 (documento de marcador 280).

Tem-se que as fundações foram executadas no período de 06/08/2014 a 02/10/2014.

b) Acréscimo de serviços ao objeto contratual

Esse serviço se refere a alteração da viga de baldrame do muro de divisa. Sendo que, para sua execução, foi necessário aumentar o consumo de formas, armadura e concreto (totalizando R\$ 7.123,00, conforme item 3 da planilha do documento de marcador 280).

Tem-se que a execução do muro de divisa foi iniciada somente após o dia 07/10/2014.

Assim sendo, considerando-se o critério adotado no documento de marcador 313 para a definição do adimplemento das parcelas e considerando-se que o período de reajuste se refere a outubro/2013 até outubro/2014, sendo que a incidência do reajuste se dá a partir do dia 07/10/2014 (aniversário da proposta), tem-se que a contratada tem direito, somente, ao reajuste sobre o valor do **item b** acima exposto, ou seja, o reajuste deve incidir somente sobre o montante de **R\$ 7.123,00 (sete mil cento e vinte e três reais)**.

3. SOLICITAÇÃO DE ADITIVO – ESTRUTURA DA COBERTURA

A contratada protocolou novo pedido de aditivo contratual, assim, foram incluídos no proad os documentos 413 e 414 que se referem, respectivamente, ao pedido inicial e ao pedido retificado dessa nova solicitação de aditivo. Essa solicitação de aditivo refere-se à estrutura de sustentação dos telhados do prédio. Contudo, esse pedido ainda está em processo de análise e será encaminhado posteriormente.

À sua consideração,

ADALBERTO KNOTH
Eng. Civil – CREA 124.968-3
Serviço de Projetos e Obras - SPO



Relatório de 21/05/2015 até 20/06/2015

Dados da Obra

Proposta	CP 8207 2013	Obra	Novo Fórum Trabalhista de São José
Data Início	12/02/2014	Data Prev. Término	09/01/2016
Contato	Engº Rodrigo	Email	oros@orosengenharia.com.br
Telefone	(41) 33524500	Fax	(41) 33524500
Cliente	Fórum Trabalhista de São José	Construtora	Oros Engenharia LTDA
Endereço	Rua Esteves Júnior, Centro, Florianópolis - 23		

Andamento da Obra

No Prazo		Dias	%
Total		696	100%
Utilizados		505	73%
Restante		190	27%
Inoperante por Clima		Inoperante por Ocorrência	
0	0,0%	0	0,0%

Inoperantes por Clima (No Prazo)

Operante
Prazo Restante

Inoperantes por Ocorrência (No Prazo)

Operante
Prazo Restante

Restante	190	27,3%
----------	-----	-------

Dados de Pessoal

Número de Pessoal na Obra

708

Dados de Serviço

Data	Hora	Descrição
21/05/2015	07:30 - 17:30	Serviços em execução: - Início da demarcação dos colarinhos dos pilares do pavimento tipo 2; - Preparação da laje térreo (colocação de armaduras de aço, impermeabilização das vigas baldrame com Igel; - Execução do bandeirão secundário; - Execução da alvenaria do 2º e 3º pavimento; - Limpeza geral da obra;
22/05/2015	07:30 - 16:30	-Execução da alvenaria no 2º e 3º pavimento; -Colocação dos espaçadores entre as malhas(armadura) do pavimento térreo; -Execução do 2º bandeirão; -Locação dos pilares. -Limpeza geral da obra;
25/05/2015	07:30 - 17:30	Serviços Executados: -Concretagem da laje do pavimento térreo; -Alisamento do piso da garagem do pavimento térreo; -Alvenaria do 2º e 3º Pavimento. -Concretagem das contra-vergas; -Execução do Bandeirão; -Limpeza geral da obra.
26/05/2015	07:30 - 17:30	Serviços em Execução: -Alvenaria do 2º e 3º Pavimento; -Bandeirão do 3º Pavimento; -Início das caixarias dos pilares; -Limpeza geral da obra; -Baías de separação dos materiais areia e brita.
27/05/2015	07:30 - 17:30	Serviços em Execução: -Alvenaria do 2º e 3º Pavimento; -Baías para separação dos materiais areia e argamassa; -Realização das contra-vergas das portas de acesso a escada enclausurada; -Limpeza da obra.
28/05/2015	07:30 - 17:30	Serviços em Execução: -Alvenaria do 2º e 3º pavimento; -Execução das formas no pavimento tipo 2; -Colocação das ferragens do pavimento tipo 2; -Retirada de uma parte das bandejas no 1º pavimento; -Limpeza da obra.
		Serviços Executados: -Alvenaria do 2º e 3º pavimento; -Forma do pavimento tipo 2; -Ferragem do

29/05/2015	07:30 - 16:30	pavimento tipo 2; -Limpeza geral da obra; -Realização da bandeja secundária;
01/06/2015	07:30 - 17:30	Serviços Executados: -Conferência da ferragens do pavimento tipo 2; -Finalização da colocação das ferragens do pavimento tipo 2; -Alvenaria do 3º pavimento -Início das montagens das vigas (ferragem); -Limpeza geral da obra.
02/06/2015	07:30 - 17:30	Serviços Executados: -Alvenaria do pavimento térreo na escada não enclausurada; -Fechamento das formas dos pilares do pavimento tipo 2; -Conclusão das baias de areia e argamassa; -Alvenaria do 2º pavimento; -Limpeza geral da obra.
03/06/2015	07:30 - 17:30	Serviços Executados: -Alvenaria do 2º Pavimento; -Alvenaria do Pavimento Térreo; -Início das formas das vigas; -Alvenaria do 3º Pavimento; -Limpeza geral da obra.
08/06/2015	07:30 - 17:30	Serviços Executados: -Chegada de caminhão de tijolos de 11,5 x 19 x 19cm; -Alvenaria do pavimento térreo, 2º pavimento e 3º pavimento; -Execução das formas das vigas do pavimento tipo 2; -Montagem da ferragem das vigas do pavimento tipo 2; -Fechamento dos pilares do pavimento tipo 2; -Limpeza geral da obra.
09/06/2015	07:30 - 17:30	Serviços Executados: -Execução das formas das vigas do pavimento tipo 2; -Auditoria do TRT; -Arrumação dos cabos de energia furtados; -Limpeza geral da obra; -Retirada de uma parte da bandeja do 1º pavimento. -Encanamento do 2º pavimento.
10/06/2015	07:30 - 17:30	Serviços Executados: -Bandeja Secundária; -Colocação da concertina no perímetro da obra; -Encanamento do 2º pavimento; -Ferragem das vigas do pavimento tipo 2; -Alvenaria do 2º e 3º pavimento; -Limpeza geral da obra.
10/06/2015	07:30 - 17:30	Serviços Executados: -Execução das formas das vigas do pavimento tipo 2; -Alvenaria do 2º pavimento -Encanamento do 2º Pavimento; -Limpeza Geral da Obra -Desforma do pavimento tipo 1.
11/06/2015	07:30 - 17:30	Serviços Executados: -Execução das formas das vigas do pavimento tipo 2; -Alvenaria do 2º pavimento; -Encanamento do 2º Pavimento; -Limpeza Geral da Obra; -Desforma do pavimento tipo 1.
12/06/2015	07:30 - 16:30	Serviços Executados: -Alvenaria do 2º Pavimento; -Shaft do 1º Pavimento; -Marcação e início da alvenaria do pavimento térreo; -Contra-verga das portas e janelas; -Forma das vigas do pavimento tipo 2; -Chegada das vigotas do pavimento tipo 2; -Limpeza geral da obra; -Colocação das concertinas no perímetro das obra.
15/06/2015	07:30 - 17:30	Serviços Executados: -Retirada de uma parte da bandeja secundária; -Colocação dos caibros para apoio dos vigotes do pavimento tipo 2; -Execução das concertinas no perímetro da obra; -Forma para vigas e pilares entre as paredes do elevador; -Limpeza Geral da Obra; -Ferragem para contra-vergas e vergas do 2º pavimento.
16/06/2015	07:30 - 17:30	Serviços Executados: -Shaft da tubulação hidráulica de esgoto; -Forma das vigas e pilares das paredes internas do entre elevador; -Retirada de uma parte da bandeja primária próxima a entrada da beira-mar; -Montagem da bandeja secundária; -Alvenaria do 2º pavimento; -Limpeza geral da obra.
17/06/2015	07:30 - 17:30	Serviços Executados: -Travamento das formas das vigas e pilares do pavimento tipo 2; -Chapiscamento do pavimento térreo; -Execução da bandeja secundária; -Alvenaria do 2º pavimento; -Desforma do pavimento tipo 1; -Limpeza geral da obra;
18/06/2015	07:30 - 17:30	Serviços Executados: -Desforma do pavimento tipo 1; -Forma do detalhe da fachada do 1º pavimento; -Retirada de uma parte da bandeja primária; -Chegada de areia e argamassa; -Execução da alvenaria do 2º pavimento; -Limpeza geral da obra.
19/06/2015	07:30 - 16:30	Serviços em Execução: -Limpeza geral da obra; -Alvenaria do pavimento térreo; -Chapiscamento do pavimento térreo; -Chegada de isopor para a laje do pavimento tipo 2; -Forma das vigas e pilares para a parede no meio do vão do elevador; -Forma das contra-vergas do 2º pavimento; -Colocação e travamento dos vigotes e isopores do pavimento tipo 2.

Equipamentos			
Dia	Equipamento	Empresa	Utilização
21/05/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
21/05/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
21/05/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
21/05/2015	Furadeira de Impacto	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
22/05/2015	Furadeira de Impacto	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
22/05/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
22/05/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
22/05/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
22/05/2015	Betoneira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
25/05/2015	Betoneira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
25/05/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)

25/05/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
25/05/2015	Lixadeira para piso	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
26/05/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
26/05/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
26/05/2015	Betoneira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
26/05/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
27/05/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
27/05/2015	Betoneira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
27/05/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
27/05/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
28/05/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
28/05/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
28/05/2015	Betoneira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
28/05/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
29/05/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
29/05/2015	Betoneira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
29/05/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
29/05/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
01/06/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
01/06/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
01/06/2015	Betoneira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
01/06/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
02/06/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
02/06/2015	Betoneira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
02/06/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
02/06/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
03/06/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
03/06/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
03/06/2015	Betoneira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
08/06/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
09/06/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
10/06/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
10/06/2015	Betoneira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
10/06/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
10/06/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
11/06/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
11/06/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
11/06/2015	Betoneira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
11/06/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
12/06/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
12/06/2015	Betoneira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
12/06/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
12/06/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
15/06/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
15/06/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
15/06/2015	Betoneira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
15/06/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
16/06/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
16/06/2015	Betoneira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
16/06/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
16/06/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
16/06/2015	Andaime Torre	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
17/06/2015	Andaime Torre	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
17/06/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
17/06/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
17/06/2015	Betoneira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
17/06/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
18/06/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
18/06/2015	Betoneira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
18/06/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
18/06/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
18/06/2015	Andaime Torre	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
19/06/2015	Andaime Torre	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)
19/06/2015	Serra Circular de Mesa	Oros Engenharia Ltda	8 (H)

19/06/2015	Serra Circular Manual	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
19/06/2015	Betoneira	Oros Engenharia Ltda	8 (H)
19/06/2015	Caçamba entulho	Oros Engenharia Ltda	1 (DIA)

Clima					
Ícone	Data	Hora	Clima	Descrição	Operante
	21/05/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	22/05/2015	07:30 - 16:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	25/05/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia Ensolarado	Sim
	26/05/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia Ensolarado.	Sim
	27/05/2015	07:30 - 17:30	Chuvoso	Dia chuvoso.	Sim
	28/05/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	29/05/2015	07:30 - 16:30	Ensolarado	Dia ensolarado.	Sim
	01/06/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia Ensolarado.	Sim
	02/06/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia Ensolarado.	Sim
	03/06/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia Ensolarado	Sim
	09/06/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia Ensolarado.	Sim
	10/06/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia Ensolarado.	Sim
	11/06/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia Ensolarado.	Sim
	12/06/2015	07:30 - 16:30	Ensolarado	Dia Ensolarado.	Sim
	15/06/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia Ensolarado.	Sim
	16/06/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia Ensolarado.	Sim
	17/06/2015	07:30 - 17:30	Ensolarado	Dia Ensolarado.	Sim
	18/06/2015	07:30 - 17:30	Chuvoso	Dia Chuvoso.	Sim
	19/06/2015	07:30 - 16:30	Ensolarado	Dia Ensolarado.	Sim

Comentários de Aprovação dos Dias				
Dia	Data Realizada	Ação	Comentário	Usuário
21/05/2015	08/06/2015	Aprovado	visto virtual (à distância)	JOAO CARLOS GODOY ILHA
22/05/2015	08/06/2015	Aprovado	visto virtual	JOAO CARLOS GODOY ILHA
25/05/2015	08/06/2015	Reaberto	continuidade execução incorreta das alvenarias, sem junta vertical! Corrigir. Fotos repetidas.	JOAO CARLOS GODOY ILHA
26/05/2015	08/06/2015	Aprovado	visto virtual.	JOAO CARLOS GODOY ILHA
27/05/2015	08/06/2015	Aprovado	visto virtual	JOAO CARLOS GODOY ILHA
28/05/2015	08/06/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
29/05/2015	08/06/2015	Aprovado	alvenaria sem junta vertical, justificar como será feita a correção.	JOAO CARLOS GODOY ILHA
01/06/2015	08/06/2015	Aprovado	verificar que o comprimento da verga deve ter/respeitar o transpasse mínimo além do largura da janela.	JOAO CARLOS GODOY ILHA
02/06/2015	08/06/2015	Aprovado	Reitero solicitação de que sejam feitas as juntas verticais com no mínimo 1cm. Pelas fotos é possível constatar a falta de argamassa o que vai prejudicar o desempenho acústico da parede. Solicito solução!	JOAO CARLOS GODOY ILHA
03/06/2015	08/06/2015	Aprovado	sugiro a utilização de escantilhão para garantir a uniformidade da alvenaria (foto 4).	JOAO CARLOS GODOY ILHA
08/06/2015	22/06/2015	Aprovado	verificar a junta vertical da argamassa de assentamento de tijolos, conforme previsto no memorial da obra.	JOAO CARLOS GODOY ILHA
09/06/2015	23/06/2015	Aprovado	obs: feitas anotações encaminhadas por email tais como alvenaria de tijolos s/junta vertical ou inferior ao previsto	JOAO CARLOS GODOY ILHA
11/06/2015	22/06/2015	Aprovado	visto virtual - verificar a execução de junta vertical mínima de 1cm conforme o memorial da obra.	JOAO CARLOS GODOY ILHA
12/06/2015	23/06/2015	Aprovado		JOAO CARLOS GODOY ILHA
15/06/2015	23/06/2015	Aprovado	justificar a retirada da bandeja, visto que não é permitida antes do término da alvenaria	JOAO CARLOS GODOY ILHA
19/06/2015	23/06/2015	Aprovado	verificar a impermeabilização da alvenaria. Na foto 04 nao parece ter a largura equivalente do tijolo.	JOAO CARLOS GODOY ILHA

Fotos	
21/05/2015 - Laje térreo	21/05/2015 - Execução de alvenaria



Preparação da laje térreo, colocação de armaduras de aço positivas e negativas da laje.

22/05/2015 - Laje Pavimento Tipo 2




Execução de alvenaria do 2º pavimento;

22/05/2015 - Laje Pavimento Tipo 1



-Locação dos gabaritos para a execução dos pilares.

22/05/2015 - Elétrica

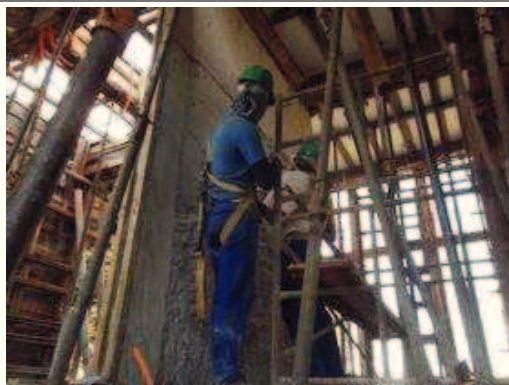

-Quebra do concreto em função do estufamento da forma.

25/05/2015 - Pavimento Térreo



-Execução da parte elétrica provisória.

25/05/2015 - Pavimento Térreo



Concretagem da laje do pavimento térreo.

25/05/2015 - 2º Pavimento



Alisamento da garagem da laje do pavimento térreo.

26/05/2015 - Laje do 2º Pavimento



Concretagem das contra-vergas.

26/05/2015 - Laje do 3º Pavimento



-Alvenaria do 2º Pavimento

26/05/2015 - Laje do 3º Pavimento



-Execução do Bandeirão

27/05/2015 - Pavimento Térreo



-Início da realização das formas do pavimento tipo 2;

27/05/2015 - 3º Pavimento



Realização das baias de argamassa e areia.

27/05/2015 - 1º Pavimento



Realização da alvenaria no 3º pavimento.

28/05/2015 - 3º Pavimento



Realização da contra-verga e do shaft para futura instalação das portas de acesso a escada enclausurada.

28/05/2015 - 1º Pavimento



-Execução da alvenaria no 3º pavimento.

28/05/2015 - Pavimento Tipo 2



-Retirada do bandeirão nas áreas que já possuem alvenaria.

28/05/2015 - 2º Pavimento



-Execução das formas para ferragens dos pilares.

29/05/2015 - 2º Pavimento



-Alvenaria do 2º pavimento.

29/05/2015 - Pavimento Tipo 2



Alvenaria do 2º pavimento.

29/05/2015 - Pavimento Térreo



Realização das formas e colocação das ferragens do pavimento tipo 2.

01/06/2015 - 2º Pavimento



Realização da parede entre elevadores do pavimento térreo.

01/06/2015 - Pavimento Tipo 2



Realização das contra-vergas das janelas.

01/06/2015 - Pavimento Tipo 2



Colocação das ferragens nas formas do pavimento tipo 2.

02/06/2015 - Pavimento Tipo 2



Início da separação das ferragens para montagem das vigas do pavimento tipo 2.

02/06/2015 - Pavimento Térreo



Fechamento das formas dos pilares do pavimento tipo 2.

02/06/2015 - 2º Pavimento



Conclusão das baias de areia e argamassa.

02/06/2015 - Pavimento Térreo



Execução da alvenaria do 2º pavimento.

03/06/2015 - 2º Pavimento



Execução da alvenaria do pavimento térreo.

03/06/2015 - Pavimento Tipo 2



Alvenaria do 2º Pavimento

03/06/2015 - Pavimento Tipo 2



Início do fechamento das formas dos pilares do pavimento tipo 2.

08/06/2015 - Pavimento Térreo



Alvenaria do pavimento térreo.

08/06/2015 - Pavimento Tipo 2



Realização das formas de vigas do pavimento tipo 2.

09/06/2015 - 1º Pavimento



-Retirada de uma parte da bandeja do 1º pavimento.

Início das formas das vigas do pavimento tipo 2.

03/06/2015 - 2º Pavimento



Alvenaria do 2º Pavimento.

08/06/2015 - Pavimento Tipo 2



Fechamento dos pilares do pavimento tipo 2.

08/06/2015 - Pavimento Tipo 2



Fechamento das formas dos pilares do pavimento tipo 2.

09/06/2015 - 2º Pavimento



-Realização do encanamento de esgoto.

09/06/2015 - Pavimento Tipo 2



-Formas dos pilares e vigas do pavimento tipo 2.

10/06/2015 - Pavimento Tipo 2



-Realização das formas e ferragens do pavimento tipo 2;

10/06/2015 - Pavimento Tipo 1



-Desforma das vigas e pilares do pavimento tipo 1.

10/06/2015 - 3º Pavimento

09/06/2015 - 2º Pavimento



-Alvenaria do 2º pavimento.

10/06/2015 - Pavimento Tipo 2



-Realização das formas e das ferragens das vigas do pavimento tipo 2.

10/06/2015 - 1º Pavimento



-Alvenaria do 1º pavimento.

10/06/2015 - 2º Pavimento



-Realização das bandejas secundárias.

11/06/2015 - 2º Pavimento



-Realização da alvenaria do 2º pavimento.

11/06/2015 - Pavimento Tipo 1



-Execução de encanamento do 2º pavimento.

11/06/2015 - Pavimento Tipo 2



-Desforma do pavimento tipo 1.

12/06/2015 - Pavimento Térreo



-Execução das formas das vigas do pavimento tipo 2.

12/06/2015 - Pavimento Tipo 2



Baía para armazenamento de ferragens

12/06/2015 - 2º Pavimento



Colocação do madeiramento para apoio dos vigotes

12/06/2015 - Pavimento Térreo



Colocação das concertinas no perímetro da obra.

12/06/2015 - 2º Pavimento



Alvenaria do 2º pavimento.

15/06/2015 - 2º Pavimento



Alvenaria do 2º pavimento.

15/06/2015 - Pavimento Térreo



Forma das vigas e pilares entre as paredes do elevador.

16/06/2015 - 1º Pavimento

Alvenaria do 2º pavimento.

12/06/2015 - Pavimento Térreo



Marcação da alvenaria do pavimento térreo.

15/06/2015 - Pavimento Tipo 2



Colocação dos caibros para apoios dos vigotes.

15/06/2015 - Pavimento Térreo



Execução das Concertinas.

15/06/2015 - 2º Pavimento



Execução das formas e ferragens do detalhe da fachada abaixo das janelas.

16/06/2015 - Pavimento Térreo



-Execução dos shafts do 1º pavimento.

16/06/2015 - Pavimento Térreo



-Execução das formas das vigas e pilares das paredes entre elevadores.

16/06/2015 - 3º Pavimento



-Retirada de uma parte da bandeja primária

16/06/2015 - 2º Pavimento



-Execução da bandeja secundária.

17/06/2015 - Pavimento Tipo 2



-Execução da alvenaria do 2º pavimento.

17/06/2015 - Pavimento Térreo



Execução do travamento entre vigas e pilares

17/06/2015 - 3º Pavimento



Chapiscamento da alvenaria no pavimento térreo.

18/06/2015 - Pavimento Tipo 2



Execução da bandeja secundária.

18/06/2015 - 1º Pavimento



Retirada das formas do pavimento tipo 2.

18/06/2015 - 1º Pavimento



Execução do detalhe da fachada frontal

18/06/2015 - Pavimento Térreo




Retirada de uma parte da bandeja primária.

18/06/2015 - 2º Pavimento



Chegada de material na obra.

19/06/2015 - 2º Pavimento

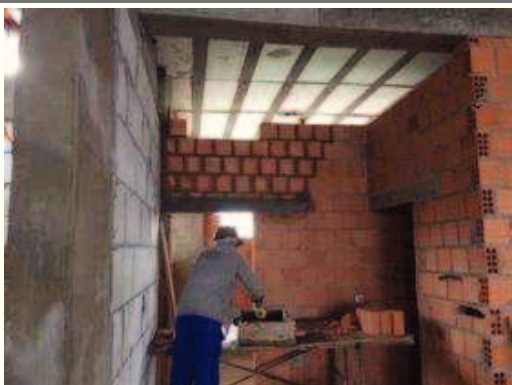

Execução de alvenaria.

19/06/2015 - Pavimento Tipo 2



Execução da alvenaria.

19/06/2015 - 1º Pavimento



Execução da laje do pavimento tipo 2.

19/06/2015 - Pavimento Tipo 2



Execução da alvenaria com bloco celular nos elevadores.



Execução da alvenaria do pavimento térreo.



Relatório gerado por Gerenciador de Obras e Projetos | www.obra24horas.com.br

Salvar Relatório

Curitiba, 25 de junho de 2015.



AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO

REF.: 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO
FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

REQUERIMENTO


A empresa Oros Engenharia Ltda. solicita pagamento da 14ª Medição do Contrato de empreitada global (CP8207/2013) referente à Construção do Fórum Trabalhista De São José - SC.

Favor efetuar o pagamento na seguinte conta bancária: Banco Itaú (341), Agência 3705, Conta Corrente 05786-1, CNPJ: 80.315.278/0001-97 em nome de Oros Engenharia Ltda.

Seguem em anexo, os seguintes documentos

- Nota Fiscal 858 no valor de R\$ 432.359,78
- Folha de Pagamento 05/2015
- GFIP 05/2015
- INSS 05/2015
- FGTS 05/2015
- CND INSS - certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros
- CND de tributos Federais e Dívida Ativa da União
- Certidão negativa de débitos salariais (não é mais emitida em função da PORTARIA Nº 140, DE 17/12/2012)
- Certidão negativa de débito trabalhista
- CND de tributos Estaduais
- CND de tributos Municipais
- Certificado de regularidade do FGTS
- Certidão e Mandado SINDUSCON (Não reter INSS)

Nestes Termos
Pede Deferimento



OROS ENGENHARIA LTDA.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12º REGIÃO																
Contratante TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12º REGIÃO																
Contratada																
EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA																
VALOR DO CONTRATO R\$ 11.161.000,00																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																
Valor Contrato																
R\$ 11.161.000,00																
Esta Medição																
R\$ 432.359,78																
Medição Acumulada																
R\$ 3.880.890,37																
Saldo Contrato																
R\$ 7.280.189,53																
14º MEDICAO																
Data: 20/06/2016																
Pedido																
21/05/2015 a 20/06/2015																

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO																	14ª MEDIÇÃO		
Contratante TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO																	Data: 20/06/2015		
Obra: Construção do TRT de São José																	Pedido		
Local: São José / SC																	21/05/2015 a 20/06/2015		
CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013																	Valor Contrato		
EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA																	R\$ 11.161.000,00		
Inscr. Estadual ISENTO																	Esta Medição		
Endereço RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100																	R\$ 432.359,78		
Fone 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL eng.trts@orosengenharia.com.br																	Medição Acumulada		
VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00																	R\$ 3.880.830,37		
																	Saldo Contrato		
																	R\$ 7.280.169,63		
Contratada																	Engº RODRIGO BORBA FRANCO		
																	CREA 081315-1		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	PREVISTO CONTRAT	QUANTIDADE		ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	PREÇO TOT.		PREÇOS ESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO	MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADO	EXECUT. %		
				ESTA MED	TER.					PREVISTO CONTRATO	UNITÁRIO	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MATERIAL						
02 01 03	Ponto de acesso de pessoas com uma folha de 1,10 x 2,20 m em madeira compensada resinada com espessura de 12 mm, com ferragens contra ventania e tancas de segurança, conforme projeto	Un	1,00		1,00	1,00	161,86	70,16	222,02	273,08	273,08	-	-	273,08	-	273,08	100,00%		
02 01 04	Plataforma (bandeja) de proteção para pedestres e área liso, instalada no 1º pavimento, com piso em madeira compensada do tipo "chapa resinada" de colagem com espessura de 18 mm, piso apoiado em madeira Pinus com 2,5 x 15 cm de largura, espaçada a cada 20 cm. A bandeja será apoiada no piso do Pavimento Térreo através de estuque em madeira de escaupito de boa qualidade. A estrutura em madeira de lei deverá ser formada por cabros de 6 x 12 cm e travas (iscouras) de pinus de 2,5 x 15 cm. O apra-liso deverá ser instalado em todo o perimetro da obra, (exceto nos locais onde houver escada), com no mínimo 2,50 m de balanço (horizontal) e 0,80 m de proteção da mão-francesa com hidrante aproximada de 45º conforme normas da NR 18 (Normas regulamentadoras de acidente de trabalho) e projeto	m	151,26		151,26	151,26	218,78	41,68	260,44	320,34	48.484,24	-	-	48.484,24	48.484,24	48.484,24	100,00%		
02 01 05	Plataforma (bandeja) de proteção para pedestres e área liso, instalada no 4º pavimento com piso em madeira compensada do tipo chapa resinada com colagem com espessura de 18 mm, piso apoiado em madeira Pinus com 2,5 x 15 cm de largura, espaçada a cada 20 cm. A bandeja será apoiada na estrutura de concreto (giso e teto) com madeira de escaupito de boa qualidade. A estrutura em madeira de lei deverá ser formada por cabros de 6 x 12 cm e travas de pinus (iscouras) de 2,5 x 15 cm. O apra-liso deverá ser instalado em todo o perimetro da obra, (exceto nos locais onde houver escada), com no mínimo 1,40 m de balanço (horizontal) e 0,80 m de proteção da mão-francesa com hidrante aproximada de 45º conforme normas da NR 18 (Normas regulamentadoras de acidente de trabalho) e projeto	m	180,51		80,25	80,25	197,06	33,04	230,09	246,11	38.503,12	-	-	19.750,33	19.750,33	19.750,33	50,00%		
02 01 06	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	3.881,13		-	-	8,86	6,53	13,49	18,58	64.387,85	-	-	-	-	-	0,00%		
02 01 07	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00		4,00	4,00	195,30	30,90	226,19	278,21	1.112,84	-	-	1.112,84	1.112,84	1.112,84	100,00%		
02 01 08	Materiais e mão de obra para sinalização e proteção contra acidentes dentro do canteiro de obras conforme exigências da NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil, incluindo sinalização de áreas de risco, proteções de segurança, guarda corpo, cortinões, proteções contra quedas, acessibilidade de pessoas e materiais para execução dos serviços, conforme memorial descritivo	mês	18,00	1,00	6,00	7,00	115,00	45,00	160,00	198,80	3.542,40	45,00	115,00	1.180,60	1.377,60	1.377,60	38,89%		
02 02	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA					-					20.202,44	-	-	-	-	-			
01 02 01	Barrado de obra para alojamento/esetérno, piso em pilão 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 8mm, inclusão fiação elétrica e esquadrias	M2	85,00		65,00	65,00	42,86	150,84	199,81	238,14	15.479,10	-	-	15.479,10	15.479,10	15.479,10	100,00%		
01 02 02	Plumaria (sua-pia ambientes internos, dias dentro cortanços, BETA Barrado de obra	M2	135,00		135,00	135,00	2,87	5,67	8,55	10,52	1.420,20	-	-	1.420,20	1.420,20	1.420,20	100,00%		

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO																	14ª MEDIÇÃO			
Contratante TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO																	Data: 20/06/2015			
Obra: Construção do TRT de São José																	Período: 21/05/2015 a 20/06/2015			
CONTRATO Termo de Contrato - CP 8207/2013																	Valor Contrato			
EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA																	R\$ 11.161.000,00			
Inscr. Estadual ISENTO																	Esta Medição			
Endereço RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100																	R\$ 432.359,78			
Fone 41 3362 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL eng trs@orosengenharia.com.br																	Medição Acumulada			
VALOR DO CONTRATO R\$ 11.161.000,00																	R\$ 3.880.830,37			
Contratada																	Saldo Contrato			
Engº RODRIGO BORBA FRANCO																	R\$ 7.280.169,63			
CREA 091315-1																				
ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UN	PREVISTO CONTRAT	QUANTIDADE		CUSTO UNITÁRIO		PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO	ACUMULADO	%				
						ESTA MED	ACUMULAN TER.	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO O.	UNITÁRIO TOTAL		PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.				
65	01.02.03	Instalações hidráulicas do barraco de obra incluindo tubulações e conexões de água fria e esgoto sanitário ligados na rede pública, vasos sanitários, lavatórios, chuveiros e ducha conforme projeto.		Cj	1,00	1,00	1,00	1.417,45	1.268,03	2.685,48	3.303,14	3.303,14	-	-	3.303,14	100,00%				
66	02.03	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA		UN	1,00	1,00	1,00	547,08	178,60	725,68	893,83	1.389,03	-	-	-					
67	02.03.01	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste madeira		UN	1,00	1,00	1,00	547,08	178,60	725,68	893,83	893,83	-	-	893,83	100,00%				
68	02.03.02	Ponto de água fria p/ve 3/4" - medida 5,00m do tubo de PVC rosca 1/2" e 3/4" e 2 joelhos de PVC rosca 1/2" e 3/4" água fria 3/4" - fornecimento e instalação		PT	6,00	6,00	6,00	40,44	23,86	64,30	79,21	475,26	-	-	475,26	100,00%				
69	03	MANUTENÇÃO DA OBRA										27.337,38								
70	03.01	Controle tecnológico em concreto, slump, moldagem, ruptura e laudo técnico de corpos de prova. (moldar a cada 3,5 m3 de concreto apalhado 01 corpo de prova)		M3	1.512,68		1.066,90	1,71	4,74	6,45	7,94	12.010,88	-	-	8.471,19	70,53%				
71	03.02	Limpeza e remoção de entulhos durante a execução da obra		MES	18,00	1,00	11,00	-	215,00	215,00	264,45	4.760,10	-	215,00	2.844,50	2.808,95	61,11%			
72	03.03	Carga de remoção e transporte de entulhos para toda fora (Cota de 5 m7)		Ox	72,00	4,00	36,00	120,00	-	120,00	147,60	10.627,20	480,00	-	5.313,80	5.804,00	55,56%			
73	04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS										73.572,88								
74	04.01	Aluguel de guincho de coluna 220 V, monofásico, com capacidade para 200 Kg de carga vertical, incluindo instalação e remoção.		mês	8,00	1,00	3,00	440,00	43,75	483,75	595,01	4.760,08	440,00	43,75	585,01	1.785,03	50,00%			
75	04.02	Elevador de obra c/ torre 2,0 x 2,0m h=15,0m carga máx 1500kg cabina aberta p/ transporte de material c/ guincho embreagem com engrenagem aliena tríplice 10cv (incl. manutenção/manutenção) (média 15 meses de uso)		H	10.800,00	1.350,00	2.754,00	5,20	-	5,20	5,82	62.858,00	7.026,00	-	7.857,00	8.171,28	25,50%			
76	04.03	Aluguel de andaime tubular para execução dos serviços, incluindo instalação e remoção.		m	120,00	-	-	34,81	5,46	40,34	48,64	5.856,80	-	-	-	-	0,00%			
77	05	ESPALHADOR REGULARIZAÇÃO REATERRO LIMPEZA DE TERRENO E TRANSPORTES										3.672,55								
78	05.01	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motobulldozer) de camada vegetal		M2	2.880,83		2.880,83	0,44	0,07	0,51	0,83	1.876,32	-	-	1.876,32	100,00%				
79	05.02	CARGA E TRANSPORTES										3.075,88	-	-	-					
80	05.02.01	Carga transporte e descarga mecânica ate 10,00 km		M3	289,08		289,08	9,33	0,07	9,40	11,56	3.075,88	-	-	3.075,88	100,00%				
81	05.03	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS										1.500,80	-	-	-					
82	05.03.01	Escavação mecânica de material 1a categoria, proveniente de corte de subleito (c/tractor esteira 160hp)		M3	252,66		252,66	2,34	0,23	2,58	3,17	800,83	-	-	800,83	100,00%				
83	05.03.02	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp para paredes/fundais		M3	252,66		252,66	1,98	0,30	2,26	2,77	698,87	-	-	698,87	100,00%				
84	05.04	REATERRO										1.419,55	-	-	-					

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO																	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Contratante TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO																	
Obra: Construção do TRT de São José																	
Local: São José / SC																	
CONTRATO: Termo de Contrato - CP 8207/2013																	
EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA																	
Inscrit. Estadual ISENTA																	
CNPJ 80.315.278/0001-97																	
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100																	
Fone 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trb@orosengenharia.com.br																	
VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00																	
Contratada Engº RODRIGO CORREA FRANCO CREA-081815-1																	
14ª MEDIÇÃO																	
Data: 20/06/2015																	
Pedidos: 21/05/2015 a 20/06/2015																	
Valor Contrato																	
R\$ 11.161.000,00																	
Esta Medição																	
R\$ 432.359,78																	
Medição Acumulada																	
R\$ 3.880.830,37																	
Saldo Contrato																	
R\$ 7.280.169,63																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			UN	PREVISTO CONTRAT	QUANTIDADE		CUSTO UNITÁRIO		PREÇO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO	%		
						ACUMULAN TER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO TOTAL	EXECUT.	
134	07 04 02	Relevo de vale com material granular respowebado adensado e vibrado.	M3	140,38		140,38	140,38	5,73	0,64	12,37	15,22	2.136,58	-	2.136,58	2.136,58	100,00%	
135	07 04 03	Transporte de material de qualquer natureza dist > 10 km, com caminhão basculante de 4,0 m³.	TXKM	5.892,12		5.892,12	5.892,12	0,16	0,58	0,74	0,81	5.361,83	-	5.361,83	5.361,83	100,00%	
136	07 04 04	Laço de brita	M3	115,03		115,03	115,03	79,57	17,20	96,77	119,03	13.692,02	-	13.692,02	13.692,02	100,00%	
137	07 04 05	Fôrma madeira pilão p/ concreto em fundação e respowebamento - corte / montagem / escoramento / desforma	M2	1.017,41		1.017,41	1.017,41	29,26	25,13	54,39	66,80	68.094,73	-	68.094,73	68.094,73	100,00%	
138	07 04 06	Armação de aço ca-50 diam. 3/4 a 50mm. - fôrmetimento / corte (cópia de 10%) / dobra / colocação	KG	1.133,80		1.133,80	1.133,80	2,20	4,50	6,70	8,24	9.343,34	-	9.343,34	9.343,34	80,00%	
139	07 04 07	Armação de aço ca-50, diam. 6/3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fôrmetimento / corte (cópia de 10%) / dobra / colocação	KG	17.389,58		17.389,58	17.389,58	4,02	2,26	6,28	7,72	134.247,59	-	134.247,59	134.247,59	90,00%	
140	07 04 08	Armação de aço ca-50, diam. 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fôrmetimento / corte (cópia de 10%) / dobra / colocação	KG	4.822,23		4.822,23	4.822,23	3,86	1,59	5,45	6,70	32.308,84	-	32.308,84	32.308,84	90,00%	
141	07 04 10	Concreto usinado bombeado fôrca-30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico	M3	240,08		240,08	240,08	350,58	38,27	388,85	478,29	114.827,89	-	114.827,89	114.827,89	100,00%	
142	07 05	SUPRA-ESTRUTURA															
143	07 05 01	Fôrma para estruturas de concreto (plata, viga e laje) em chapa de madeira compensada resitada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações (fôrmetimento, montagem e desmontagem).	M2	6.141,45	307,07	5571,85	5.879,02	18,58	17,24	35,82	44,06	270.592,29	5.705,36	5.293,86	245.500,12	259.029,62	55,73%
144	07 05 02	Escoramento fôrmas com madeira de 3a qualidade, não apilada, aproveitamento tubos 3x6 e prumos 4x4.	M3	12.310,19	1231,02	10418,38	11.647,40	2,10	3,70	5,80	7,13	87.771,05	2.595,14	4.554,77	74.286,79	83.045,96	94,82%
145	07 05 03	Armação de aço ca-50, diam. 3/4 a 50mm. - fôrmetimento / corte (cópia de 10%) / dobra / colocação	KG	16.074,56	482,24	13884,32	14.466,58	2,20	4,50	6,70	8,24	132.454,37	1.060,93	2.170,08	115.230,80	119.204,45	90,00%
146	07 05 04	Armação de aço ca-50, diam. 6/3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fôrmetimento / corte (cópia de 10%) / dobra / colocação	KG	28.227,23	4824,03	20580,81	25.404,84	4,02	2,27	6,28	7,74	218.478,76	19.392,60	10.850,55	158.286,47	196.633,46	90,00%
147	07 05 05	Armação de aço ca-50, diam. 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fôrmetimento / corte (cópia de 10%) / dobra / colocação	KG	29.502,04	2050,2	29502,04	25.451,84	3,86	1,59	5,45	6,70	102.963,67	4.531,82	11.066,34	180.963,57	171.867,33	90,00%
148	07 05 07	Concreto usinado bombeado fôrca-30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico	M3	1.146,89	274,07	699,64	973,71	350,58	38,27	388,85	478,29	548.546,02	98.083,46	10.488,86	334.630,82	465.716,78	84,80%
149	07 05 08	Laje pré-moldada unidirecional tipo treli cada, h=15 cm, enchimento de areia	M2	29,83				34,06	33,42	67,47	82,89	2.475,59	-	-	-	-	0,00%
150	07 05 09	Laje pré-moldada unidirecional tipo treli cada, h=25 cm, enchimento de areia	M2	2.894,14	576,58	2317,58	2.894,14	58,05	33,42	88,47	110,05	318.500,11	32.316,19	19.268,84	255.049,88	318.500,11	100,00%
151	07 05 10	Laje pré-moldada unidirecional tipo treli cada, h=35 cm, enchimento de areia	M2	1.609,09	119,21	1489,88	1.609,09	83,80	39,84	123,74	152,20	244.803,58	8.889,80	4.781,25	226.758,74	244.803,58	100,00%
152	07 05 11	Escoramento de laje pré-moldada	M2	4.533,06	500	3489	3.989,00	5,14	13,11	18,25	22,45	101.167,20	2.570,00	9.555,00	11.225,00	89.104,05	87,56%
153	07 06	ANEXOS															
154	07 06 01	Escavação de solo para estaca naz Ø 25 mm	m	48,00				136,00		136,00	166,05	7.970,40	-	-	-	-	0,00%
155	07 06 02	Escavação em rocha para estaca naz Ø 25 mm	m	18,00				315,00		315,00	387,45	8.974,10	-	-	-	-	0,00%
156	07 06 03	Armação de aço ca-50, diam. 6/3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fôrmetimento / corte (cópia de 10%) / dobra / colocação	KG	383,00				4,02	2,27	6,28	7,74	2.898,62	-	-	-	-	0,00%
157	07 06 04	Cimento Portland pozolânico ar 0 p - 32 e 50 kg	SC	34,00				23,16		23,16	27,60	893,00	-	-	-	-	0,00%
158	07 06 05	Área grossa lavada	m²	3,00				87,00		87,00	82,41	247,23	-	-	-	-	0,00%
159	07 06 06	Arreçamento de estacas	Un	6,00					35,10	35,10	43,17	256,02	-	-	-	-	0,00%
160	07 06 07	Confecção e içação de argamassa	SC	34,00					10,00	10,00	12,30	419,20	-	-	-	-	0,00%
161	07 06 08	Escavação manual de vale em material de 1ª categoria ate 1,5m incluindo espalhamento / escoramento	M3	103,64					30,11	30,11	37,04	3.638,83	-	-	-	-	0,00%
162	07 06 09	Relevo de vale com material granular respowebado adensado e vibrado.	M3	66,18				5,73	6,64	12,37	15,22	1.053,07	-	-	-	-	0,00%
163	07 06 10	Transporte de material de qualquer natureza dist > 10 km, com caminhão basculante de 4,0 m³.	TXKM	620,10				0,16	0,58	0,74	0,81	564,28	-	-	-	-	0,00%

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO																	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Contratante: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO																	
Data: 20/06/2015																	
Pedido:																	
21/05/2015 a 20/06/2015																	
Valor Contrato																	
Contratada																	
Engº RODRIGO BORBA FRANCO CREA 091315-1																	
R\$ 11.181.000,00																	
Esta Medição																	
R\$ 432.369,78																	
Medição Acumulada																	
R\$ 3.890.830,37																	
Saldo Contrato																	
R\$ 7.290.169,63																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	PREVISTO CONTRATO	QUANTIDADE ESTIMA	ACUMUL. TER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO O.	UNITÁRIO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOT. CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBR	TOTAL MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDICÃO ANTERIOR	ACUMULADO MEDICÃO O TOTAL	% EXECUT.
07 06 11	Leito de brita	M3	12,13				78,57	17,20	95,77	119,03	1.443,83	-	-	-	-	-	0,00%
07 06 12	Forma para estrutura de concreto (plac. viga e laje) em chapa de madeira compensada envernizada, de 1,10 x 2,20, espessura 12 mm. 02 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem)	M2	637,82				18,58	17,24	35,82	44,06	28.108,78	-	-	-	-	-	0,00%
07 06 13	Escoramento fôrmas, com madeira de 3a qualidade, não aparafusada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x	M3	187,81				2,10	3,70	5,80	7,13	1.196,48	-	-	-	-	-	0,00%
07 06 14	Armação de aço ca-50 diam. 3/4 a 8mm - fôrmechento / corte (operação de 10%) / dobra / colocação	KG	309,78				2,20	4,60	6,70	8,24	6.672,42	-	-	-	-	-	0,00%
07 06 15	Armação: aço ca-50, diam. 8,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - fôrmechento / corte (operação de 10%) / dobra / colocação	KG	2.900,96				4,02	2,27	6,29	7,74	22.453,43	-	-	-	-	-	0,00%
07 06 16	Concreto untado bombeado fôrca-30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico	M3	54,01				350,58	38,27	388,85	478,28	25.832,44	-	-	-	-	-	0,00%
07 07	EQUIPAMENTOS																
07 07 01	Escavação mecânica de vala em material de 2a categoria até 2m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	M3	223,00				8,12	2,17	11,29	13,89	3.097,47	-	-	-	-	-	0,00%
07 07 02	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e virado.	M3	148,70				5,73	6,04	12,37	15,22	2.265,21	-	-	-	-	-	0,00%
07 07 03	Transporte de material de qualquer natureza dimt > 10 km, com distribuição basculante de 4,0 m3.	TKM	1.337,40				0,18	0,59	0,74	0,91	1.217,03	-	-	-	-	-	0,00%
07 07 04	Leito de brita	M3	2,08				79,57	17,20	96,77	119,03	245,20	-	-	-	-	-	0,00%
07 07 05	Forma para espículas de concreto (plac. viga e laje) em chapa de madeira compensada envernizada, de 1,10 x 2,20, espessura 12 mm. 02 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem).	M2	186,04				18,58	17,24	35,82	44,06	8.637,52	-	-	-	-	-	0,00%
07 07 06	Escoramento fôrmas, com madeira de 3a qualidade, não aparafusada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x	M3	74,30				2,10	3,70	5,80	7,13	529,78	-	-	-	-	-	0,00%
07 07 07	Armação de aço ca-50 diam. 3/4 a 8mm - fôrmechento / corte (operação de 10%) / dobra / colocação	KG	790				2,20	4,50	6,70	8,24	85,10	-	-	-	-	-	0,00%
07 07 08	Armação: aço ca-50, diam. 8,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - fôrmechento / corte (operação de 10%) / dobra / colocação	KG	2.449,50				4,02	2,27	6,29	7,74	18.959,13	-	-	-	-	-	0,00%
07 07 10	Concreto untado bombeado fôrca-30mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico	M3	22,75				350,58	38,27	388,85	478,28	10.891,10	-	-	-	-	-	0,00%
08	IMPERMEABILIZAÇÕES																
08 01	Impermeabilização semi-flexível com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas dimensões	M2	143,18				3,81	3,50	7,41	8,11	1.304,19	-	-	-	-	-	0,00%
08 02	Impermeabilização com massa asfáltica 4mm	M2	229,87				32,85	0,86	33,51	41,22	9.475,24	-	-	-	-	-	0,00%
08 03	Proteção mecânica com argamassa tipo 1.3 (cimento e areia), espessura 2 em lnel instalação elétrica/instalação e iluminação externa	M2	229,87				6,10	6,19	12,29	15,12	3.475,83	-	-	-	-	-	0,00%
08 04	Impermeabilização com massa asfáltica, espessura 4mm, protegida com filme de alumínio gorroto espessura 0,8mm, incluído emulsão asfáltica	m²	426,42				32,28	29,43	61,71	75,90	32.289,38	-	-	-	-	-	0,00%
08 05	Cimento especial cristalinizante com adesivo líquido de alta performance a base de resina epóxi, 1kg/dentado	M2	606,87				15,60	38,54	56,14	67,82	41.080,10	-	-	-	-	-	0,00%
08 06	Impermeabilização flexível a base asfáltica para calhas, laje, paredes e marquises, seis camadas	M2	177,12				87,45	66,73	146,18	179,80	31.846,18	-	-	-	-	-	0,00%
09	VEDAÇÕES																
09 01	ALVENARIAS INTERNAS																
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	
47																	
48																	
49																	
50																	
51																	
52																	
53																	
54																	
55																	
56																	
57																	
58																	
59																	
60																	
61																	
62																	
63																	
64																	
65																	
66																	
67																	
68																	
69																	
70																	
71																	
72																	
73																	
74																	
75																	
76																	
77																	
78																	
79																	
80																	
81																	
82																	
83																	
84																	
85																	
86																	
87																	
88																	
89																	
90																	
91																	
92																	
93																	
94																	
95																	
96																	
97																	
98																	
99																	
100																	
101																	
102																	
103																	
104																	
105																	
106																	
107																	
108																	
109																	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12º REGIÃO																	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12º REGIÃO																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R																
Obra:Construção do TRT de São José																	14ª MEDIÇÃO																
Local: São José / SC																	Data: 20/05/2015																
CONTRATO Termo de Contrato - CP 8207/2013																	Pedição: 21/05/2015 a 20/06/2015																
EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA																	Valor Contrato																
Insc. Estadual ISENTO																	R\$ 11.161.000,00																
CNPJ 80.315.278/0001-97																	Esta Medição																
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100																	R\$ 432.359,78																
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL eng.brs@orosengenharia.com.br																	Medição Acumulada																
VALOR DO CONTRATO R\$ 11.161.000,00																	R\$ 3.880.930,37																
																	Saldo Contrato																
																	R\$ 7.280.169,63																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			UN	PREVISTO CONTRATO	QUANTIDADE		CUSTO UNITÁRIO		PREÇO		PREÇO TOT.		PREÇOS ESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO	%																
						ESTA MED	ACUMULAN TER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	MEDIÇÃO ANTERIOR	EXECUT.																
196	09.01.01	Tijolos Cerâmicos Furado											48.344,87	-	-	-	0,00%																
197	09.01.01.01	Alvenaria em bloco cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	M2	1.277,27	191,91	319	510,91	510,91	13,35	17,42	30,77	37,85	48.344,87	2.542,00	3.343,07	7.293,79	12.074,15	40,00%															
198	09.01.02	Blocos de Concreto Celular											36.117,53	-	-	-	#DIV/0!																
199	09.01.02.01	Alvenaria com blocos de concreto celular 10x10x60cm, espessura 10cm, assentados com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) preparo manual	M2	507,34	129,84	101	227,84	227,84	52,63	5,24	57,83	71,19	36.117,53	6.675,59	694,64	8.026,74	18.218,83	44,81%															
200	09.01.03	Serviço Sobre Alvenaria											100.758,09	-	-	-	#DIV/0!																
201	09.01.03.01	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1 vez com argamassa traço 1:0,5:3 (cimento, cal e areia), espessura 3cm	M	710,14					1,13	5,55	6,68	8,22	5.937,35	-	-	-	0,00%																
202	09.01.03.02	Verga, contraverga, ou chita em concreto armado fck=20mpa, prep. mecânico, forma canalada (15x20x20), apo ca 60 5,0 (taco da ferragem = 45,13 kg/m3).	M3	20,55	3,09	8,13	8,22	8,22	750,72	276,76	1.027,49	1.203,81	25.971,30	2.319,72	855,19	3.505,17	10.388,52	40,00%															
203	09.01.03.03	Execução de muçela de alvenaria para passagem de tubulações, incluindo tela pvc de amarração e reforço, conforme projeto	M²	41,97	10,49	10,49	10,49	10,49	1.009,85	221,41	1.231,36	1.514,57	83.568,50	10.594,36	2.322,59	15.887,84	-	24,88%															
204	09.01.03.04	Marcado de alvenaria de bloco de concreto para bloco 10x20x40, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).	M	583,07	140,77	140,77	281,54	281,54	3,72	4,05	7,77	8,56	5.382,85	523,69	570,12	1.345,76	2.691,52	50,00%															
205	09.02	ALVENARIAS EXTERNAS											321.070,82	-	-	-	#DIV/0!																
206	09.02.01	Tijolos Cerâmicos Furado											100.800,59	-	-	-	0,00%																
207	09.02.01.01	Alvenaria em bloco cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	M2	2.900,84	725,24	725,24	1.450,48	1.450,48	13,35	17,42	30,77	37,85	100.800,59	9.681,95	12.693,88	27.450,33	54.900,67	50,00%															
208	09.02.02	Blocos de Concreto Celular											16.918,80	-	-	-	#DIV/0!																
209	09.02.02.01	Alvenaria com blocos de concreto celular 10x10x60cm, espessura 10cm, assentados com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) preparo manual	M2	223,61	55,9	55,9	111,80	111,80	52,63	5,24	57,83	71,19	15.918,80	2.842,02	292,82	3.979,52	7.959,04	50,00%															
210	09.02.03	Serviço Sobre Alvenaria											185.351,54	-	-	-	#DIV/0!																
211	09.02.03.01	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1 vez com argamassa traço 1:0,5:3 (cimento, cal e areia), espessura 3cm	M	1.153,65					1,13	5,55	6,68	8,22	9.483,00	-	-	-	0,00%																
212	09.02.03.02	Verga, contraverga, ou chita em concreto armado fck=20mpa, prep. mecânico, forma canalada (15x20x20), apo ca 60 5,0 (taco da ferragem = 45,13 kg/m3).	M3	147,07	22,07	22,07	39,78	39,78	750,72	276,76	1.027,49	1.253,81	185.588,54	19.568,39	6.105,09	48.457,69	40,00%																
213	09.03	DIVISÓRIAS											279.446,88	-	-	-	#DIV/0!																
214	09.03.01	GESSO ACARTONADO (DRYWALL)											1.20.228,18	-	-	-	0,00%																
215	09.03.01.01	Perfite 14,3 cm, em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfil de aço galvanizado a fogo, incluindo fia, massa, parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação, Ref Knaut ou similar, conforme projeto.	M2	1.034,81					60,75	8,93	69,38	85,34	88.310,69	-	-	-	0,00%																

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO																	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Obra: Construção do TRT de São José																	
Local: São José / SC																	
CONTRATO: Termo de Contrato - CP 9207/2013																	
EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA																	
Inscr Estadual ISENTO																	
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100																	
Fone 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL eng.trb@orosengenharia.com.br																	
VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.161.000,00																	
Contratada																	
Engº RODRIGO DE ORBA FRANCO																	
CREA 091315-1																	
14ª MEDIÇÃO																	
Data: 20/06/2015																	
Pedido																	
21/05/2015 a 20/06/2015																	
Valor Contrato																	
R\$ 11.161.000,00																	
Esta Medição																	
R\$ 432.359,78																	
Medição Acumulada																	
R\$ 3.890.830,37																	
Saldo Contrato																	
R\$ 7.280.169,63																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	PREVISTO CONTRAT	QUANTIDADE	ACUMULAN TER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO O.	UNITÁRIO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADO	% EXECUT.
09 03 01 02	Parede 14,3 cm. em gesso acartonado (drywall) estruturado com perfil de aço galvanizado a fogo, recheado com la de rocha para isolamento térmico, incluindo fix. massa parafusos para fixação e todos os acessórios para instalação, Ref. Knur ou similar, conforme projeto.	M2	299,92				77,32	9,20	86,52	106,42	31 817,46	-	-	-	-	-	0,00%
222																	#DIV/0!
223																	0,00%
224	DIVISÓRIAS LAMINADAS PARA BANHEIROS																0,00%
09 03 04 01	Divisória Laminada Neocom Alcopla em painéis em laminado melamínico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla face, material monobloco de alta densidade à prova d'água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial. Incluido painéis externos com 1,80 m de altura, sem elevação do piso, painéis internos com 1,52m de altura elevados 0,27m do piso, todas as portas com 1,53m de altura, elevadas 0,27 m do piso, painéis internos entre vasos e chuveiros até o piso, conforme projeto	M2	186,16				324,85	38,33	363,18	446,71	83.155,07	-	-	-	-	-	0,00%
225																	#DIV/0!
09 03 04 02	Divisória Laminada Neocom Alcoplac, Tapa vista mistério, em painéis em laminado melamínico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla face, material monobloco de alta densidade à prova d'água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial	Un	2,00				228,17	30,82	258,99	318,56	637,12	-	-	-	-	-	0,00%
226																	0,00%
09 03 04 03	Divisória Laminada Neocom Alcoplac, Tapa vista mistério, em painéis em laminado melamínico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla face, material monobloco de alta densidade à prova d'água, com elevada resistência mecânica, dureza superficial	Un	9,00				228,17	30,82	258,99	318,56	2.867,04	-	-	-	-	-	0,00%
227																	#DIV/0!
228	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO																0,00%
09 03 06 01	Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação, perfil de alumínio e buletes de borracha	M2	351,31				134,69	32,83	167,92	208,54	72.559,57	-	-	-	-	-	0,00%
229																	0,00%
230																	0,00%
231																	0,00%
232																	0,00%
233	REVESTIMENTOS																0,00%
13 01 01	CHAPISCO E REBOCO INTERNO																0,00%
13 01 01 01	Paredes internas	M2	3.927,63	1.178,29		1.178,29	1,46	2,61	4,07	5,01	19.877,43	1.720,30	3.075,33	5.903,23	-	5.903,23	30,00%
13 01 01 01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	M2	3.927,63				4,84	14,10	19,94	23,30	91.513,78	-	-	-	-	-	0,00%
13 01 01 02	Emboço paulista (massa única) traço 1:2 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico	M2	1.080,66				1,46	9,79	11,22	13,80	15.055,11	-	-	-	-	-	0,00%
13 01 01 02	Requadrado de portas, janelas, aberturas, placas e vigas, com argamassa de cimento cal e areia penetrada no traço 1:4:5 ou equivalente	M	1.080,66				2,97	2,97	2,97	3,85	262,80	-	-	-	-	-	0,00%
13 01 01 02	Adubo impermeabilizante pega normal para argamassa skat ou equivalente	L	72,00									-	-	-	-	-	0,00%
13 01 02	Telas internas																0,00%
13 01 02 01	Chapisco em telas traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M2	1.387,73				1,53	5,58	7,09	8,72	12.188,21	-	-	-	-	-	0,00%
13 01 02 02	Emboço paulista (massa única) traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M2	1.387,73				5,86	14,78	20,65	25,40	35.502,34	-	-	-	-	-	0,00%
13 02	CHAPISCO E REBOCO EXTERNO																0,00%
338																	#DIV/0!
339																	0,00%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO																		
Obra: Construção do TRT de São José																		
Local: São José / SC																		
CONTRATO Termo de Contrato - CP 8207/2013																		
EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA																		
Inscr. Estadual ISENTO																		
CNPJ 00.315.278/0001-97																		
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100																		
Fone 41 3352 4500 - 41 9897-4641 E-MAIL eng trs@orosengenharia.com.br																		
VALOR DO CONTRATO R\$ 11.181.000,00																		
Contratante TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO																		
Contratada																		
Data: 20/06/2015																		
Pedido																		
21/05/2015 a 20/06/2015																		
Valor Contrato																		
R\$ 11.161.000,00																		
Esta Medição																		
R\$ 432.359,78																		
Medição Acumulada																		
R\$ 3.880.830,37																		
Saldo Contrato																		
R\$ 7.280.169,63																		
Engº RODRIGO CORREA FRANCO																		
CREA 091315-1																		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE	PREVISTO CONTRAT	ESTAB. MED	ACUMUL. TER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOT. CONTRATO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADO	% EXECUT.
340	Paralelos																	
341	Chapisco trape 1,3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	M2		3.850,07				1,40	2,81	4,07	5,01	19.333,94						0,00%
342	Emboço paulista (massa única) trape 1,3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M2		3.850,07				5,88	14,70	20,65	25,40	98.020,38						0,00%
343	Aditivo impermeabilizante pega normal para argamassa skat ou equivalente	L		54,00				2,97	2,97	2,97	3,65	107,10						0,00%
344	Tela Estampas																	0,00%
345	Chapisco em tela trape 1,3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M2		130,90				1,53	5,55	7,08	8,72	4.407,32						0,00%
346	Emboço paulista (massa única) trape 1,3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M2		130,93				5,88	14,79	20,65	25,40	3.326,82						0,00%
347	REVESTIMENTO CERÂMICO																	0,00%
348	Azulejo cerâmico dimensões de 30 x 40 cm, modelo "Forma Slim Branco Acetinado", da Elite ou similar, assentado com argamassa colante AC-II e devidamente rejuntado, conforme projeto.	M2		2.185,12				26,74	12,84	39,58	48,44	105.847,21						0,00%
349	PARQUETADO EM TAPETES																	0,00%
350	Regularização do contrapiso ou piso base com argamassa de cimento e areia média no trape 1,3, com espessura mínima de 5 cm.	M2		4.697,35				5,84	17,48	23,12	28,44	133.692,63						0,00%
351	PISO CIMENTADO																	0,00%
352	Piso cimentado liso (alissamento mecânico), trape 1,3 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo mecânico	M2		1.395,82	400		400,00	5,84	20,86	26,82	33,74	44.716,85						0,00%
353	PISO CERÂMICOS																	0,00%
354	Piso cerâmico com resistência à abrasão pe-6, dimensões 31 x 31 cm, referência "cargol plus white" da elite ou similar	M2		412,19				33,86	17,25	53,12	65,34	26.932,49						0,00%
355	PISO EM PORCELANATO																	0,00%
356	Piso porcelanato anti derrapante pe-6 marca portobello, linha d'emprego mod. d'emprego branco 60x60 x1 bold	M2		1.197,15				62,17	20,83	82,80	101,85	121.928,73						0,00%
357	PISO VINÍlicos																	0,00%
358	Piso Valico, Tarkett Edemans Paviflex linha Thru - Cor Âmbar - Em placas 30 cm x 30 cm x 2 mm	M2		1.408,39				51,81	3,70	55,51	68,20	98.164,87						0,00%
359	PISO ELEVADO																	0,00%
360	Piso Elevado ACECOPLOOR em placas CC1000 60x60cm, composta por uma chapa superior de aço carbono de alta dureza laminado fino não oleado e a chapa inferior em aço carbono laminado fino não oleado com enchimento em argamassa especial a base de cimento livre de resíduos, espuma expandida, plastificante e reciclados de fibras longas, Ref	m²		313,80				238,10	47,49	286,59	352,51	110.617,64						0,00%
361	RODAPE																	0,00%
362	Rodape																	0,00%
363																		0,00%
364																		0,00%
365																		0,00%
366																		0,00%
367																		0,00%
368																		0,00%
369																		0,00%
370																		0,00%
371																		0,00%
372																		0,00%

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12º REGIÃO																	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12º REGIÃO																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R																
Obra:Construção do TRT de São José																	14ª MEDIÇÃO																
Local: São José / SC																	Data: 2006/2015																
CONTRATO: Termo de Contrato - CP 82072013																	Pedido																
EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA																	Valor Contrato																
Inscr. Estadual ISENTO																	RS 11.181.000,00																
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100																	Esta Medição																
Fone 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trs@orosengenharia.com.br																	RS 432.359,78																
VALOR DO CONTRATO RS 11.181.000,00																	Medição Acumulada																
																	RS 3.880.830,37																
																	Saldo Contrato																
																	RS 7.200.189,63																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										UN	QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO		PREÇO		PREÇOS ESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO	%											
											PREVISTO CONTRATO	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO Q.	UNITÁRIO TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	EXECUT.												
373	14.07.01	Rodapé em EPS com altura de 7,0 cm na linha Moderna modelo 446 RPBR da Santa Lúzia Molduras ou similar incluindo instalação, conforme projeto.	m								635,61	-		12,10	5,24	17,34	21,33	-	-	-	-	0,00%											
374																																	
375	22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																															
578	22.01.01	Escavação e Retiro	M3								139,23	-	48,41	-	15,91	15,91	18,57	7.943,68	51.144,81	-	-												
580	22.01.01	Escavação manual em solo-prof até 1,50 m	M3								42,24	14,08	14,08	7,38	0,59	7,98	8,79	2.724,73	-	808,24	-	33,33%											
581	22.01.02	Escavação da vala rido encorrea em material do 1a categoria com profundidade de 1,5 até 3m com retroescavadeira 75hp, sem esgotamento.	M3								132,74	44,25	44,25	25,80	0,07	25,80	31,75	4.211,84	-	1.404,05	-	33,34%											
582	22.01.03	Resturo manual de valas	M3								35,52	-	-	4,50	7,22	11,72	14,42	512,20	-	-	-	0,00%											
583	22.01.04	Resturo de vala com material granular reaproveitado aderido a viondo	M3								13,21	4,40	4,40	0,97	0,07	1,04	1,28	16,81	-	5,63	-	33,31%											
584	22.01.05	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 50m3/11t e pa carregadeira sobre pneus "105 hp" cap. 1,72m3.	M3								13,21	-	-	3,45	0,52	3,97	4,88	64,48	-	-	-	0,00%											
585	22.01.06	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, até 0,5 e 1,0 km	M3									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!											
586																																	
587	22.02	Sistema de Água Fria																															
588	22.02.01	Tubo de pvc soldavel, sem conexões 25mm - fornecimento e instalação	M								832,70	-	-	2,00	2,61	2,61	5,67	18.080,14	-	-	-	0,00%											
589	22.02.01	Tubo de pvc soldavel, sem conexões 32mm - fornecimento e instalação	M								110,44	-	-	3,40	4,38	7,78	9,54	4.721,75	-	-	-	0,00%											
590	22.02.02	Tubo de pvc soldavel, sem conexões 40mm - fornecimento e instalação	M								51,57	-	-	5,15	4,38	9,51	11,70	1.053,60	-	-	-	0,00%											
591	22.02.03	Tubo de pvc soldavel, sem conexões 50mm - fornecimento e instalação	M								26,92	-	-	6,15	5,22	11,37	13,68	603,37	-	-	-	0,00%											
592	22.02.04	Tubo de pvc soldavel, sem conexões 60mm - fornecimento e instalação	M								12,14	-	-	10,05	10,98	20,94	25,76	376,61	-	-	-	0,00%											
593	22.02.05	Tubo de pvc soldavel, sem conexões 80mm - fornecimento e instalação	M									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%											
594	22.02.06	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'água 25mmx34" - fornecimento e instalação	UN								3,00	-	-	7,18	1,63	8,78	10,81	32,43	-	-	-	0,00%											
595	22.02.07	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'água 32mmx41" - fornecimento e instalação	UN								2,00	-	-	12,34	1,93	13,97	17,18	34,36	-	-	-	0,00%											
596	22.02.08	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'água 40mmx114" - fornecimento e instalação	UN								2,00	-	-	16,45	2,54	17,99	22,13	44,26	-	-	-	0,00%											
597	22.02.08	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'água 50mmx2" - fornecimento e instalação	UN								2,00	-	-	2,54	27,50	30,04	38,95	73,90	-	-	-	0,00%											
598	22.02.10	Adaptador pvc soldavel com flange livre para caixa d'água- 75 mm x 2 1/2", incluindo adesivo de pvc, fita ved-rosca, selopiso e instalação	Un								3,00	-	-	10,84	2,68	13,52	16,63	49,89	-	-	-	0,00%											
599	22.02.11	Adaptador pvc soldavel curto com bolca e rosca para registro - 25 x 3/4"	Un								141,00	-	-	1,81	2,72	4,53	6,57	785,37	-	-	-	0,00%											
600	22.02.12	Adaptador pvc soldavel curto com bolca e rosca para registro - 32 x 1"	Un								10,00	-	-	2,40	2,72	5,12	6,30	83,00	-	-	-	0,00%											
601	22.02.13	Adaptador pvc soldavel curto com bolca e rosca para registro - 40 x 1 1/4"	Un								2,00	-	-	2,78	3,18	5,96	7,33	14,68	-	-	-	0,00%											
602	22.02.14	Adaptador pvc soldavel curto com bolca e rosca para registro - 60 x 2"	Un								4,00	-	-	8,26	3,18	11,44	14,07	56,28	-	-	-	0,00%											
603	22.02.15	Bucha de redução pvc soldavel curta - 32 x 25 mm	Un								11,00	-	-	0,68	2,04	2,90	3,57	39,27	-	-	-	0,00%											
604	22.02.16	Bucha de redução pvc soldavel curta - 40 x 32 mm	Un								6,00	-	-	1,88	4,86	5,98	7,38	35,88	-	-	-	0,00%											
605	22.02.17	Bucha de redução pvc soldavel curta - 50 x 40 mm	Un								4,00	-	-	2,37	3,95	8,22	7,65	30,80	-	-	-	0,00%											
606	22.02.18	Redução de pvc soldavel 1/2" para 3/4" - fornecimento e instalação	UN								1,00	-	-	10,30	5,22	15,52	18,09	18,09	-	-	-	0,00%											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12º REGIÃO Obra: Construção do TRT de São José Local: São José / SC CONTRATO Termo de Contrato - CP 8207/2013 EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA Inscr. Estadual ISENTO CNPJ 00.315.278/0001-97 Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100 Fone 41 3352 4500 - 41 9637-4641 E-MAIL: eng.itsj@orosengenharia.com.br VALOR DO CONTRATO R\$ 11.161.000,00																	
Contratante TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12º REGIÃO Contratada:																	
Data: 20/06/2015 Pedido: 21/05/2015 a 20/06/2016 Valor Contrato:																	
Esta Medição: R\$ 11.161.000,00 Medição Acumulada: R\$ 432.359,78 Saldo Contrato: R\$ 3.880.830,37 R\$ 7.280.169,83																	
Engº RODRIGO BORBA FRANCO CREA 091316-1																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	PREVISTO CONTRAT	QUANTIDADE	ACUMUL. TER.	ACUMUL. TOTAL	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO O.	UNITÁRIO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOT.	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBR	TOTAL MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADO	% EXECUT.
637	Têa pvc soldável e com bucha de latão na bolsa central - 25mm x 25mm x 3/4"	Un	24,00				8,64	4,30	12,94	15,92	392,08	-	-	-	-	-	0,00%
638	Têa pvc soldável e com bucha de latão na bolsa central - 32mm x 32mm x 3/4"	Un	2,00				13,00	4,30	17,30	21,28	42,56	-	-	-	-	-	0,00%
639	União pvc soldável - 40 mm	Un	2,00				16,78	3,18	19,96	24,68	49,10	-	-	-	-	-	0,00%
640											1778,08	-	-	-	-	-	0,00%
641	Sistema de Aproveitamento de Água de Chuva										140,50	-	-	-	-	-	0,00%
642	Tubo de pvc soldável, sem conexões 25mm - fornecimento e instalação	M	24,78				2,00	2,61	4,61	5,67	285,83	-	-	-	-	-	0,00%
643	Tubo de pvc soldável, sem conexões 32mm - fornecimento e instalação	M	23,94				3,40	4,36	7,76	9,54	285,83	-	-	-	-	-	0,00%
644	Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 32mm - fornecimento e instalação	UN	2,00				12,34	1,63	13,97	17,18	34,36	-	-	-	-	-	0,00%
645	Bucha de redução pvc soldável curta - 32 x 25 mm	Un	6,00				0,86	2,04	2,90	3,57	21,42	-	-	-	-	-	0,00%
646	Joelho pvc soldável 45º água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	1,00				2,35	3,82	6,27	7,71	7,71	-	-	-	-	-	0,00%
647	Joelho pvc soldável 90º água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	6,00				0,70	3,82	4,62	5,89	34,08	-	-	-	-	-	0,00%
648	Joelho pvc soldável 90º água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	6,00				1,45	3,92	5,37	8,91	39,69	-	-	-	-	-	0,00%
649	Joelho 90º pvc soldável e com bucha de latão - 25 x 3/4"	Un	9,00				8,44	4,08	10,92	12,94	116,46	-	-	-	-	-	0,00%
650	Linha pvc soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	9,00				0,80	1,66	2,76	3,39	30,51	-	-	-	-	-	0,00%
651	Linha pvc soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	12,00				1,30	2,40	3,70	4,55	64,80	-	-	-	-	-	0,00%
652	Tê de redução pvc soldável água fria 32x25mm - fornecimento e instalação	UN	5,00				3,73	4,36	8,09	8,95	49,75	-	-	-	-	-	0,00%
653	Tê de pvc soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação	UN	1,00				1,04	3,92	4,96	6,10	8,10	-	-	-	-	-	0,00%
654	Tê de pvc soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação	UN	3,00				2,40	4,13	6,53	8,03	24,08	-	-	-	-	-	0,00%
655	Têa pvc soldável e com bucha de latão na bolsa central - 25mm x 25mm x 3/4"	Un	8,00				8,64	4,30	12,94	15,92	95,52	-	-	-	-	-	0,00%
656	Filtro fabricado em aço inox (elemento filtrante) e carcaça de polipropileno para a filtração das águas pluviais modelo WF 150 da aquastock com capacidade para coletar a água de telhados com até 500 m², filtra partícula de 0,28 mm	Un	2,00				18,94	158,78	175,70	218,11	432,22	-	-	-	-	-	0,00%
657	Desodor de sono tipo margarina com 200 mm e h = 170 mm, conforme projeto e manual hidráulico.	Un	2,00				13,18	4,61	17,79	21,99	43,78	-	-	-	-	-	0,00%
658	Kit de redimensionamento de água da rede que impede conexão cruzada com a água armazenada na cisterna, atuação através de válvula solenóide com acionamento automático, diâmetro nominal de 3/4", torneira com registro, mangueira, bocal separador conector e bola de nível	Un	2,00				7,68	98,99	106,66	131,18	262,36	-	-	-	-	-	0,00%
659	Freno d'água de entrada anti-turbulência em pvc de 100 mm de diâmetro de entrada	Un	2,00				13,18	27,20	40,38	49,87	99,34	-	-	-	-	-	0,00%
660	Sistema de Esgoto										85.604,18	-	-	-	-	-	0,00%
661	Tubo pvc esgoto - 40 mm	m	122,15	13	31	48,86	2,78	5,44	8,22	10,11	1.234,94	49,86	97,17	180,58	313,41	463,97	40,00%
662	Tubo pvc esgoto - 50 mm	m	272,73	41	68	109,09	4,88	6,90	11,69	14,38	3.621,86	200,84	279,47	590,90	877,84	1.566,74	40,00%
663	Tubo pvc esgoto - 75 mm	m	279,07	42	70	111,63	6,22	10,93	17,10	21,03	5.869,84	258,80	452,68	875,44	1.472,10	2.547,64	40,00%
664	Tubo pvc esgoto - 100 mm	m	647,38	38	161	258,65	7,92	11,78	19,41	23,88	15.459,43	748,03	1.154,70	2.339,09	3.844,89	6.183,77	40,00%
665	Anel de borraça - 40 mm	Un	344,00		86	86,00	0,66	1,36	2,02	2,48	853,12	-	-	-	213,28	213,28	25,00%

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO													TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO												
Obra: Construção do TRT de São José													Obra: Construção do TRT de São José												
Local: São José / SC													Local: São José / SC												
CONTRATO: Termo de Contrato - CP 82072013													CONTRATO: Termo de Contrato - CP 82072013												
EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA													EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA												
Inscr. Estadual ISENTO													Inscr. Estadual ISENTO												
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100													Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100												
Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trs@orosengenharia.com.br													Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trs@orosengenharia.com.br												
VALOR DO CONTRATO R\$ 11.181.000,00													VALOR DO CONTRATO R\$ 11.181.000,00												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
ITEM													ITEM												
UN													UN												
PREVISTO CONTRATO													PREVISTO CONTRATO												
QUANTIDADE													QUANTIDADE												
ESTA MED													ESTA MED												
ACUMULAD. TOTAL													ACUMULAD. TOTAL												
UNIDADE MATERIAL													UNIDADE MATERIAL												
CUSTO UNITÁRIO													CUSTO UNITÁRIO												
UNITÁRIO M. O.													UNITÁRIO M. O.												
PRECÇO UNITÁRIO													PRECÇO UNITÁRIO												
PREVISTO CONTRATO													PREVISTO CONTRATO												
PRECÇO TOT.													PRECÇO TOT.												
TOTAL MATERIAL													TOTAL MATERIAL												
TOTAL MÃO DE OBRA													TOTAL MÃO DE OBRA												
MEDIDAÇÃO ANTERIOR													MEDIDAÇÃO ANTERIOR												
ACUMULADO													ACUMULADO												
MEDIDAÇÃO TOTAL													MEDIDAÇÃO TOTAL												
EXECUT.													EXECUT.												
%													%												
14º MEDICAÇÃO													14º MEDICAÇÃO												
Data: 20/06/2015													Data: 20/06/2015												
Pedido:													Pedido:												
21/05/2015 a 20/06/2015													21/05/2015 a 20/06/2015												
Valor Contrato													Valor Contrato												
RS 11.181.000,00													RS 11.181.000,00												
Esta Medição													Esta Medição												
RS 432.359,78													RS 432.359,78												
Medição Acumulada													Medição Acumulada												
RS 3.880.830,37													RS 3.880.830,37												
Saldo Contrato													Saldo Contrato												
RS 7.280.169,63													RS 7.280.169,63												

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
1	Contratante TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO															
2	14ª MEDIÇÃO															
3	Data: 20/06/2015															
4	Pedido															
5	21/05/2015 a 20/06/2015															
6	Valor Contrato															
7	R\$ 11.181.000,00															
8	Esta Medição															
9	R\$ 432.359,78															
10	Medição Acumulada															
11	R\$ 3.880.830,37															
12	Saldo Contrato															
13	R\$ 7.280.199,83															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	PREVISTO CONTRAT	QUANTIDADE		ACUMULAM TER.	ACUMUL. TOTAL	CUSTO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOT.	PREÇOS ESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO	MEDIÇÃO ANTERIOR	%
				ESTA MED	TER.			UNITÁRIO M. O.	UNITÁRIO TOTAL			TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA			
709	Tubo pvc esgoto - ø 75 mm	m	184,11	74			73,84	8,22	17,10	21,03	3.871,83	457,83	801,36	1.548,73	-	40,00%
710	Tubo pvc esgoto - ø 100 mm	m	661,25	285			284,50	7,82	18,41	23,88	15.780,85	2.016,75	3.118,03	6.316,28	-	40,00%
711	Tubo pvc esgoto - ø 150 mm	m	122,57	49			49,03	21,44	12,70	41,68	5.145,49	1.081,00	622,42	2.059,20	-	40,00%
712	Tubo pvc esgoto - ø 200 mm	m	72,12	29			28,95	16,64	14,06	30,80	2.722,53	480,00	405,47	1.089,01	-	40,00%
713	Área de bota-fora - ø 40 mm	Un	48,00	20			19,80	0,66	2,02	2,48	121,52	12,84	26,86	48,81	-	40,00%
714	Área de bota-fora - ø 50 mm	Un	31,00	12			12,40	0,70	1,81	3,09	95,78	8,88	22,49	35,32	-	40,00%
715	Área de bota-fora - ø 75 mm	Un	180,00	64			84,00	0,80	2,95	4,73	759,80	97,60	188,61	302,72	-	40,00%
716	Área de bota-fora - ø 100 mm	Un	683,00	261			261,20	1,28	3,63	6,06	3.950,85	336,95	647,42	1.560,28	-	40,00%
717	Área de bota-fora - ø 150 mm	Un	118,00	47			47,20	5,18	4,08	8,24	1.341,68	243,55	192,60	538,88	-	40,00%
718	Área de bota-fora - ø 200 mm	Un	32,00	13			12,80	7,88	4,76	15,28	488,88	88,05	60,94	185,58	-	40,00%
719	Joelho pvc 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UN	13,00	5			5,20	1,58	5,43	8,66	112,45	8,22	28,54	44,98	-	40,00%
720	Joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	7,00	3			2,80	2,58	5,88	8,47	72,84	7,26	18,46	28,18	-	40,00%
721	Joelho pvc 45º esgoto 75mm - fornecimento e instalação	UN	15,00	6			6,00	5,53	7,40	12,93	23,50	33,18	44,40	85,40	-	40,00%
722	Joelho pvc 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	101,00	40			40,40	6,87	8,71	15,58	1.835,16	277,65	351,88	774,08	-	40,00%
723	Joelho 45º pvc esgoto 150 mm	Un	18,00	8			6,40	40,47	13,60	54,07	1.064,18	250,01	87,05	425,88	-	40,00%
724	Joelho 90º pvc esgoto 200 mm	Un	8,00	2			2,40	4,43	18,14	22,57	166,56	10,64	43,53	68,92	-	40,00%
725	Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UN	1,00	0			0,40	1,49	5,45	8,50	8,50	0,58	2,18	3,40	-	40,00%
726	Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	3,00	1			1,20	2,18	5,88	8,07	29,76	2,83	7,08	11,82	-	40,00%
727	Joelho pvc 90º esgoto 75mm - fornecimento e instalação	UN	31,00	12			12,40	5,03	7,40	12,43	473,98	62,37	81,76	188,80	-	40,00%
728	Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	127,00	51			50,80	7,34	8,71	16,05	1.974,76	372,87	442,47	1.002,79	-	40,00%
729	Joelho 90º pvc esgoto 150 mm	Un	18,00	7			7,20	12,18	13,60	31,71	570,78	87,93	220,31	220,31	-	40,00%
730	Joelho 90º pvc esgoto 200 mm	Un	10,00	4			4,00	16,52	18,14	34,66	428,30	68,10	72,54	170,52	-	40,00%
731	Junção simples pvc esgoto - ø 40 mm	Un	6,00	2			2,40	3,15	8,57	11,95	71,70	7,65	15,78	28,88	-	40,00%
732	Junção pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	UN	1,00	0			0,40	5,04	5,45	10,49	12,90	2,02	2,18	5,15	-	40,00%
733	Junção pvc esgoto 75x75mm - fornecimento e instalação	UN	14,00	6			5,60	10,61	7,40	18,01	310,10	59,44	41,44	124,04	-	40,00%
734	Junção pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	UN	42,00	17			16,80	14,37	8,71	23,08	1.192,38	241,42	146,33	479,95	-	40,00%
735	Junção simples pvc esgoto - 150 x 150 mm	Un	6,00	2			2,40	72,13	10,43	82,56	909,30	173,12	25,03	243,72	-	40,00%
736	Junção pvc esgoto 75x50mm - fornecimento e instalação	UN	1,00	0			0,40	10,03	9,07	19,10	23,49	4,01	3,63	9,40	-	40,00%
737	Junção com redução pvc esgoto - 150 x 100 mm	Un	8,00	3			3,20	39,74	10,43	50,17	493,88	127,18	33,37	197,47	-	40,00%
738	Lupa pvc esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UN	20,00	8			8,00	1,18	2,81	3,78	83,20	9,44	20,88	37,28	-	40,00%
739	Lupa pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UN	14,00	6			5,60	2,14	3,05	5,19	89,32	11,98	17,02	35,73	-	40,00%
740	Lupa pvc esgoto 75mm - fornecimento e instalação	UN	88,00	28			37,50	3,75	3,70	7,46	632,04	102,12	109,12	252,82	-	40,00%
741	Lupa pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UN	281,00	116			116,40	5,11	4,59	9,88	3.468,72	584,80	533,11	1.387,49	-	40,00%
742	Lupa simples pvc esgoto - 150 mm	Un	80,00	24			24,00	9,23	8,12	15,36	1.133,40	221,63	146,60	453,36	-	40,00%
743	Lupa simples pvc esgoto - 200 mm	Un	18,00	6			6,40	9,33	6,80	16,13	317,44	58,68	43,50	126,88	-	40,00%
744	Bucha de redução pvc esgoto 50 x 40 mm	Un	3,00	1			1,20	42,16	7,25	49,42	182,34	50,90	8,71	73,94	-	40,00%
745	Redução excêntrica pvc esgoto 75 x 50 mm	Un	1,00	0			0,40	7,18	8,16	18,88	18,88	2,87	3,28	7,55	-	40,00%
746	Redução excêntrica pvc esgoto 100 x 75 mm	Un	3,00	1			1,20	7,88	9,07	20,82	62,48	8,44	10,88	24,98	-	40,00%
747	Redução excêntrica pvc esgoto 100 x 75 mm	Un	2,00	1			0,80	9,69	10,20	18,76	48,68	7,87	8,16	18,47	-	40,00%
748	Redução excêntrica pvc esgoto 150 x 100 mm	Un	10,00	4			4,00	13,88	11,34	30,71	307,70	54,71	45,34	123,08	-	40,00%
749	Ta sanitário 75x50mm, junta soldada - fornecimento e instalação	UN	7,00	3			2,80	11,17	7,82	18,80	181,84	31,28	21,34	64,74	-	40,00%
750	Ta sanitário 100x100mm, junta soldada - fornecimento e instalação	UN	18,00	8			6,40	11,87	8,58	21,45	422,03	75,97	81,31	168,83	-	40,00%
751	Ta pvc esgoto 150 x 150 mm	Un	2,00	1			0,80	10,74	12,24	22,88	56,52	8,59	9,78	22,61	-	40,00%
752	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	UN	2,00	0			-	14,59	10,88	25,47	82,66	-	-	-	-	0,00%
753	Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação	UN	10,00	0			-	4,45	10,88	18,97	188,70	-	-	-	-	0,00%

Contratada

Engº RODRIGO CORREA FRANCO

CREA 091315-1

EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA

Inscr. Estadual ISENTO

CNPJ 00 315 278/0001-97

Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100

Fone: 41 3352 4500 - 41 9697-4841 E-MAIL eng_bts@orosengenharia.com.br

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.181.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO																	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 12ª REGIÃO																
Obra: Construção do TRT de São José																	Contratante																
Local: São José / SC																	Contratada																
EMPRESA : OROS ENGENHARIA LTDA																	Engº RODRIGO BORBA FRANCO																
CNPJ 08.315.278/0001-87																	Inscrit. Estadual ISENTO																
Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100																	Endereço: RUA CELESTINO JÚNIOR Nº 503 - SÃO FRANCISCO - CURITIBA/SC CEP - 80510-100																
Fone 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trb@orosenharia.com.br																	Fone 41 3352 4500 - 41 9697-4641 E-MAIL: eng.trb@orosenharia.com.br																
CONTRATO Termo de Contrato - CP 8207/2013																	CONTRATO Termo de Contrato - CP 8207/2013																
VALOR DO CONTRATO R\$ 11.161.000,00																	VALOR DO CONTRATO R\$ 11.161.000,00																
ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UN	QUANTIDADE		ACUMUL. TER.		ACUMUL. TOTAL		CUSTO UNITÁRIO		PREÇO		PREÇO TOT.		PREÇOS ESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO		MEDIÇÃO TOTAL		EXECUT.										
					ESTA MED		PREMISTO CONTRAT				UNITÁRIO M. O.		UNITÁRIO TOTAL		PREVISTO CONTRATO		TOTAL MATERIAL		TOTAL MÃO OBRA		MEDIÇÃO ANTERIOR		EXECUT.										
13	22.10.04	Caixa de passagem de esgoto em bloco de concreto graúdo e rebocado e impermeabilizado por dentro 70 x 70 cm, incluindo lâmpa de concreto com puxador e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.		Un			2,00				136,67	88,54	226,21	278,23	556,46	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
14	22.10.05	Caixa de inspeção de água de chuva em bloco de concreto graúdo e rebocado, 70 x 70 cm, incluindo lâmpa de concreto com puxador e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.		Un			5,00				130,32	68,09	198,40	244,04	1.220,20	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
813	22.10.06	Caixa de inspeção de água de chuva em bloco de concreto graúdo e rebocado, 70 x 70 cm, incluindo grelha de aço galvanizado e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.		Un			2,00				245,30	70,59	324,88	396,60	796,20	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
815	22.10.07	Caixa de inspeção de água de chuva em bloco de concreto graúdo e rebocado, 120 x 70 cm, incluindo lâmpa de concreto com puxador e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.		Un			1,00				186,81	86,71	268,52	364,72	364,72	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
816	22.10.08	Caixa de inspeção de água de chuva em bloco de concreto graúdo e rebocado, 120 x 70 cm, incluindo grelha de aço galvanizado e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.		Un			8,00				335,00	85,75	420,75	517,53	4.140,24	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
817	22.11	Bombas e Equipamentos													492,86	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
818	22.11.01	Moto bomba centrífuga modelo me-1315 - rotor 107 mm, potência 1,5 cv, monofásica, 115V, marca schneider ou similar, com sucção e recalque de 1" (32 mm) 3,7 m³/h, altura manométrica total de 45 m.c.a.		Un			2,00				8,60	181,79	200,39	246,48	492,96	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
820	22.12	Válvulas													144,76	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
821	22.12.01	Válvula de pé com erro 50mm (2") - fornecimento e instalação		Un			1,00				75,23	15,25	90,47	111,28	111,28	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
822	22.12.02	Válvula de retenção horizontal em pvc soldável 32 mm		Un			1,00				23,52	3,70	27,22	33,48	33,48	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
823	22.13	Registros e hidrômetros													7.508,88	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
824	22.13.01	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado atípicos - fornecimento e instalação		Un			69,00				57,20	13,83	71,02	87,35	6.027,15	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
825	22.13.02	Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação		Un			3,00				68,25	13,83	82,08	102,19	306,57	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
826	22.13.03	Registro gaveta 1 1/4" bruto lado - fornecimento e instalação		Un			2,00				32,31	12,02	44,33	54,53	109,08	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
827	22.13.04	Registro gaveta 2" bruto lado - fornecimento e instalação		Un			2,00				47,31	18,27	66,58	81,89	163,78	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
828	22.13.05	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado atípica - fornecimento e instalação		Un			2,00				90,47	18,27	108,74	134,88	269,88	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
829	22.13.07	Hidrômetro 5,00m³/h, 40°C - fornecimento e instalação		Un			3,00				56,25	13,83	70,09	86,20	258,80	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
830	22.13.08	Caixa de passagem de água de chuva em bloco de concreto graúdo e rebocado, 120 x 70 cm, incluindo lâmpa de concreto com puxador e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.		Un			1,00				104,10	3,65	108,08	132,91	132,91	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
831	22.13.09	Caixa de passagem de água de chuva em bloco de concreto graúdo e rebocado, 120 x 70 cm, incluindo grelha de aço galvanizado e cantoneiras metálicas, conforme projeto e memorial descritivo.		Un			1,00				78,61	8,53	86,04	105,83	105,83	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
832	22.13.08	Abdgo para exatidão hidrômetro pré-moldado de concreto - fornecimento e instalação		Un			1,00				44,50	65,34	109,84	135,10	135,10	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
833	22.14	Caixa d'água													3.863,56	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
834	22.14.01	Caixa d'água em fibra de vidro com capacidade para 7.500 litros		Un			2,00				1.439,38	167,76	1.607,14	1.676,78	3.863,58	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										
835	22.15	Diversos													4.280,65	-	-	-	-	-	-	-	0,00%										

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		
		658		
		Data e Hora de Emissão		
		25/08/2015 11:03:41		
		Código de Verificação		
		HE0DQ3DA		
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: DROS ENGENHARIA LTDA CPF / CNPJ: 80.315.278/0001-97 Inscrição Municipal: 07 02 0215555-4 Endereço: R. CELESTINO JÚNIOR, 090503 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO Tel.: 41 - 33524500 Município: CURITIBA UF: PR Email: financeiro@drosengenharia.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO CPF / CNPJ: 02.482.005/0001-23 IMU: Outro Doc.: Endereço: R. ESTEVES JÚNIOR, 395 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 68015905 Município: Florianópolis UF: SC Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Construção do Fórum Trabalhista De São José-SC, no Estado de Santa Catarina - Contrato CP8207/2013 Matrícula CEI: 51.223.337/32/02 CONTRATO ORIGINAL - PARCELA 14 Material Aplicado R\$ 289.695,00 Mão de Obra Aplicada R\$ 142.664,78 TOTAL R\$ 432.359,78 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S.A. AG. 3705 CONTA CORRENTE 05785-1 Não retém INSS de acordo com o Mandato de Segurança N.º 99.00.10841-4-PR/Distribuição 2804/1999 - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 334.095,97 IR - R\$ 5.188,31 / COFINS - R\$ 12.970,79 / CSLL - R\$ 4.323,59 / PIS - R\$ 2.810,33 / ISS RETIDO - R\$ 12.970,79 VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 432.359,78				
Código da Atividade 07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Soma da Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	432.359,78	3,00	12.970,79	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei 73/2008 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA. Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA. O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				

ANGELA
TREZEN
RA
TENVEIRA

Certifico que os serviços/materials
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 03/07/2015

Adalberto Knoth
Adalberto Knoth
Analista Judiciário
Engenheiro Civil
CREA/SC 124.968-3

Alexandre Koenig S. Thiago
Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do SRO

TERMO DE LIQUIDAÇÃO
Liquida-se o presente documento de
acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64.
O documento refere-se ao original da
1ª via, arquivado neste Setor.
Em 06/07/15

Silvane Donatelli Cardoso
SILVANE DONATELLI CARDOSO
Técnico Judiciário

13NE1737 - R.P.

51-91

CP 8207/2013

CERTIDÃO Nº 010822

O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná - SINDUSCON/PR certifica que a empresa:

OROS ENGENHARIA LTDA

CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.500.000,00

ASSOCIADA DESTE SINDICATO


ESTABELECIDADA EM: CURITIBA - PR

R: CELESTINO JUNIOR, 503 - CASA - SAO FRANCISCO

INSCRITA NO CNPJ / MF SOB Nº: 80.315.278/0001-97

Encontra-se em dia com a Tesouraria desta Entidade na presente data.

Curitiba, 18 de maio de 2015



Fábio Rios
Assistente Financeiro
assistentefinanciero@sinduscon-pr.com.br

VÁLIDA POR TRÊS MESES

Avenida Anita Garibaldi, nº 888 - Curitiba - CEP 80540-180 - Fone: (41)3210-1740 - Página: www.jfpr.jus.br - Email: pretb02@jfpr.jus.br

Curitiba, 16 de junho de 2015.

Ofício n.º 8985915

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 99.00.10941-4/PR

Prezados Senhores:

De ordem do MM. Juiz Federal Substituto, Dr. Cláudio Roberto da Silva, em cumprimento ao despacho proferido na fl.1139 dos autos em epígrafe, comunico a Vossa Senhoria que as empresas associadas ao SINDUSCON/PR foram beneficiadas pela sentença transitada em julgado em 16.12.2003, que afastou a exigibilidade da retenção na fonte de 11%(onze por cento) incidente sobre as faturas de prestação de serviços que importem cessão de mão-de-obra, porquanto não estão sujeitas ao recolhimento da contribuição social sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço, por meio do mecanismo de retenção previsto no art. 31 da Lei nº 3.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.711/98.

Ressalto que o presente ofício tem validade até 17.07.2015.

Atenciosamente,

Marluz Augusto Magierski
Diretor de Secretaria

Ilustríssimos senhores
Tomadores de Serviços dos Associados ao SINDUSCON/PR
Nesta Capital

Documento eletrônico assinado por **Marluz Augusto Magierski, Diretor de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.jfpr.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **8985915v2** e, se solicitado, do código CRC **DCB6ACC2**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Marluz Augusto Magierski
Data e Hora:	16/06/2015 14:17

07/07/15 18:26 USUARIO : GAMBA
DATA EMISSAO : 07Jul15 TIPO OB: 59 NUMERO : 2015OB803756
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP001181 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003114802-6 PROCESSO : CP-8207/2013
VALOR : 12.970,79

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2015LF000385
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 07/07/15
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NF 858 - OROS ENGENHARIA

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

07/07/15 18:27

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 07Jul15 TIPO OB: 11

NUMERO : 2015OB803757

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA

BANCO : 341 AGENCIA : 3705 CONTA CORRENTE : 57861

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2015NP001181 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003114805-0

PROCESSO : CP-8207/2013

VALOR : 394.095,95

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 858 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE São JOSÉ - 1
4A. MEDIÇÃO, REPRESENTA 3,62 P.P. DO TOTAL DA OBRA, ACUMULADO 34,54 P.P. - CÓD
IGO DO PROJETO 135X - CP-8207/2013

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

07/07/15 18:27 USUARIO : GAMBA
 DATA EMISSAO : 07Jul15 TIPO OB: 11 NUMERO : 2015OB803757
 UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
 BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA
 BANCO : 341 AGENCIA : 3705 CONTA CORRENTE : 57861
 VALOR : 394.095,95

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401006	2013NE001737400		44905191	394.095,95
02	531814	2013NE001737	213110400	44905191	394.095,95
03	561602	01000000000400D			394.095,95

LANÇADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 07Jul15 15:50
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

07/07/15 18:27

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 07Jul15 VENCIMENTO: 07Jul15 NUMERO : 2015DF800922
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
CONTRIBUINTE : 80315278/0001-97 - OROS ENGENHARIA LTDA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : CP-8207/2013 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2015NP001181
PERIODO APURACAO : 07Jul15 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES : BASE DE CALCULO : 432359,78
RECEITA : 25.293,04
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 07/07/15
TOTAL : 25.293,04

OBSERVACAO

Recolhimento de irrf e contribuições sociais retidas nf 858

LANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 07Jul15 15:50
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

