

Documentos da 10 Medição do Fórum de Tubarão

1 mensagem



Isabelle Batista <financeiro2@glocon.com.br>
Para: Adalberto Knoth <adalberto.knoth@trt12.jus.br>

10 de junho de 2025 às 10:48

Bom dia Adalberto, tudo bem? Segue as NFs e os documentos solicitados da 10ª Medição do TRT.

--
Atenciosamente,
Isabelle Bentes Batista
Analista Financeiro



8 anexos

-  **Reajuste Medição 10.pdf**
152K
-  **Medição 10.pdf**
152K
-  **TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EGRESSO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO.pdf**
845K
-  **MED10 - CRONOGRAMA ATUALIZADO.pdf**
254K
-  **3. RDOs TRT - 28.05 a 04.06.pdf**
141K
-  **1. RDOs TRT - 30.04 a 14.05.pdf**
3600K
-  **2. RDOs TRT - 15.05 a 28.05.pdf**
2519K
-  **FICHAS DE EPI's F'RRUM TRABALHISTA DE TUBARÃO-SC.pdf**
2515K



PREVISÃO DE MEDIÇÃO - MEDIÇÃO 10



| | | |
|------------|---|--|
| CLIENTE: | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO/SC | |
| ENDEREÇO: | RUA SÃO LUIS, S/Nº, VILA MOEMA | |
| MUNICÍPIO: | TUBARÃO / SC | |
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE TUBARÃO | |

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇO | UN | QUANTIDADE | | % ESTA MED | QUANT ACUMULADA | PREÇO TOTAL COM B.D.I. | PREÇO TOTAL ESTA MEDIÇÃO | TOTAL ACUMULADO | % EXECUTADO |
|-------|--------------|-----------------|--|-------|------------|----------|------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | PREVISTA | ESTA MED | | | | | | |
| 1 | | | DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO OBRA | | | - | | | R\$ 314.382,24 | R\$ 10.109,40 | R\$ 220.143,11 | 73,21% |
| 1.1 | | | DESPESAS TÉCNICAS INICIAS | | | - | | | R\$ 6.056,46 | R\$ - | R\$ 6.056,46 | 100,00% |
| 1.2 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | | | - | | | R\$ 308.295,88 | R\$ 10.109,40 | R\$ 224.086,65 | 72,69% |
| 1.2.1 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12,00 | 0,40 | 3,33% | 8,67 | R\$ 129.414,96 | R\$ 4.313,83 | R\$ 93.481,61 | 72,23% |
| 1.2.2 | COMP.ADM.004 | COMPOSIÇÃO | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 6 horas por dia | MES | 12,00 | 0,40 | 3,33% | 8,67 | R\$ 173.866,92 | R\$ 5.795,56 | R\$ 125.591,04 | 72,23% |
| 2 | | | LIMPEZA DO TERRENO E LOCAÇÃO | | | - | | | R\$ 14.787,87 | R\$ - | R\$ 14.787,87 | 100,00% |
| 3 | | | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | | - | | | R\$ 68.254,08 | R\$ 2.497,06 | R\$ 66.968,76 | 98,12% |
| 3.1 | COMP.ARQ.302 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER 2,3x6,00 ALTURA 2,50m PARA USO ADMINISTRATIVO NA OBRA | MÉS | 9,00 | 1,00 | 11,11% | 9,00 | R\$ 9.006,93 | R\$ 1.000,77 | R\$ 9.006,93 | 100,00% |
| 3.4 | 10527 | SINAPI | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO) | MXMES | 72,00 | | 0,00% | 60,00 | R\$ 2.286,56 | R\$ - | R\$ 1.888,80 | 83,33% |
| 3.5 | 10777 | SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BAGIAS, 4 CHUIVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | MES | 9,00 | 1,00 | 11,11% | 9,00 | R\$ 10.226,61 | R\$ 1.136,29 | R\$ 10.226,61 | 100,00% |
| 3.6 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 11/2017 | M | 72,00 | | 0,00% | 60,00 | R\$ 1.485,36 | R\$ - | R\$ 1.237,80 | 83,33% |
| 3.7 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 | M2 | 440,00 | 120,00 | 27,27% | 220,00 | R\$ 1.320,00 | R\$ 360,00 | R\$ 660,00 | 50,00% |
| 4 | | | SERVIÇOS GERAIS | | | - | | | R\$ 13.542,17 | R\$ 679,20 | R\$ 11.611,71 | 85,74% |
| 4.1 | COMP.ARQ.093 | INAPI / ADAPTAD | CARGA DE ENTULHO DE MODO MANUAL EM GANHÃO BASCULANTE 6M E DESCARGA LIVRE | M3 | 50,00 | | 0,00% | 44,00 | R\$ 3.742,00 | R\$ - | R\$ 3.292,96 | 88,00% |
| 4.2 | COMP.ARQ.090 | INAPI / ADAPTAD | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA | DIA | 270,00 | 30,00 | 11,11% | 220,00 | R\$ 6.112,80 | R\$ 679,20 | R\$ 4.980,80 | 81,48% |
| 4.4 | COMP.ARQ.091 | INAPI / ADAPTAD | PROTEÇÃO COM LONA PLÁSTICA | M2 | 100,00 | | 0,00% | 80,00 | R\$ 389,00 | R\$ - | R\$ 311,20 | 80,00% |
| 4.5 | COMP.ARQ.092 | INAPI / ADAPTAD | TRANSPORTE DE MATERIAIS E DE ENTULHO | M3 | 50,00 | | 0,00% | 44,00 | R\$ 2.263,50 | R\$ - | R\$ 1.991,88 | 88,00% |
| 5 | | | TRABALHOS EM TERRA | | | - | | | R\$ 179.616,69 | R\$ - | R\$ 110.582,10 | 61,57% |
| 6 | | | INFRAESTRUTURA | | | - | | | R\$ 840.696,18 | R\$ 5.082,91 | R\$ 840.696,08 | 100,00% |
| 6.1 | | | FUNDAÇÕES DO PRÉDIO | | | - | | | R\$ 714.787,39 | R\$ - | R\$ 714.787,39 | 100,00% |
| 6.2 | | | FUNDAÇÃO DO MURO, CONTENÇÕES E ESCADA | | | - | | | R\$ 119.603,69 | R\$ 5.082,91 | R\$ 119.603,59 | 100,00% |
| 6.2.1 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017 | KG | 261,90 | 13,19 | 5,04% | 261,90 | R\$ 5.434,43 | R\$ 273,69 | R\$ 5.434,43 | 100,00% |
| 6.2.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017 | KG | 965,19 | 51,52 | 5,34% | 965,19 | R\$ 15.066,62 | R\$ 804,21 | R\$ 15.066,62 | 100,00% |
| 6.2.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017 | KG | 560,16 | 31,02 | 5,54% | 560,16 | R\$ 10.710,26 | R\$ 593,03 | R\$ 10.710,26 | 100,00% |



PROAD n. 352/2024 DOC 410. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.MFDZ.YLPK: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



| ITEM | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇO | UN | QUANTIDADE | % ESTAMED | QUANT ACUMULADA | PREÇO TOTAL COM B.D.I. | PREÇO TOTAL ESTA MEDIÇÃO | TOTAL ACUMULADO | % EXECUTADO | |
|--------|--------------|----------------|--|----|------------|-----------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------|
| 6.2.5 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 32,26 | 1,23 | 3,80% | 32,26 | R\$ 25.706,38 | R\$ 976,94 | R\$ 25.706,38 | 100,00% |
| 6.2.6 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017 | M3 | 31,00 | 1,50 | 4,84% | 31,00 | R\$ 1.573,87 | R\$ 76,15 | R\$ 1.573,87 | 100,00% |
| 6.2.7 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 257,13 | 10,71 | 4,17% | 257,13 | R\$ 56.617,45 | R\$ 2.358,89 | R\$ 56.617,45 | 100,00% |
| 6.3 | | | FUNDAÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO | | - | | | R\$ 4.215,00 | R\$ - | R\$ 4.215,00 | 100,00% | |
| 6.4 | | | FUNDAÇÃO DA CABINE DE MEDIÇÃO | | - | | | R\$ 2.090,10 | R\$ - | R\$ 2.090,10 | 100,00% | |
| 7 | | | SUPRAESTRUTURA - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | | - | | | R\$ 53.999,07 | R\$ - | R\$ 53.999,07 | 100,00% | |
| 7.1 | | | PILARES, VIGAS E CINTAS | | - | | | R\$ 38.999,22 | R\$ - | R\$ 38.999,22 | 100,00% | |
| 7.2 | | | LAJE TRELIÇADA - RESERVATÓRIOS | | - | | | R\$ 8.747,15 | R\$ - | R\$ 8.747,15 | 100,00% | |
| 7.3 | | | LAJE TRELIÇADA - DEPÓSITO DE LIXO | | - | | | R\$ 4.112,67 | R\$ - | R\$ 4.112,67 | 100,00% | |
| 7.4 | | | LAJE TRELIÇADA - CABINE DE MEDIÇÃO | | - | | | R\$ 2.140,03 | R\$ - | R\$ 2.140,03 | 100,00% | |
| 8 | | | SUPRAESTRUTURA - ESTRUTURAS METÁLICAS | | - | | | R\$ 341.888,90 | R\$ - | R\$ 341.888,90 | 100,00% | |
| 9 | | | PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS | | - | | | R\$ 303.568,57 | R\$ - | R\$ 223.438,72 | 73,60% | |
| 9.1 | | | EXTERNAS | | - | | | R\$ 164.707,78 | R\$ - | R\$ 152.467,77 | 92,57% | |
| 9.2 | | | INTERNAS | | - | | | R\$ 138.860,79 | R\$ - | R\$ 70.970,95 | 51,11% | |
| 10 | | | COBERTURA | | - | | | R\$ 180.414,19 | R\$ - | R\$ 177.968,67 | 98,64% | |
| 11 | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | - | | | R\$ 19.979,81 | R\$ 741,63 | R\$ 19.024,86 | 95,22% | |
| 11.1 | | | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES | | - | | | R\$ 18.927,23 | R\$ 741,63 | R\$ 18.927,23 | 100,00% | |
| 11.1.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023 | M2 | 333,05 | 13,05 | 3,92% | 333,05 | R\$ 18.927,23 | R\$ 741,63 | R\$ 18.927,23 | 100,00% |
| 11.2 | | | IMPERMEABILIZAÇÕES INTERNAS | | - | | | R\$ 97,63 | R\$ - | R\$ 97,63 | 100,00% | |
| 11.3 | | | IMPERMEABILIZAÇÕES COBERTURAS | | - | | | R\$ 954,95 | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |
| 12 | | | ESQUADRIAS | | - | | | R\$ 231.098,27 | R\$ - | R\$ 125.391,87 | 54,26% | |
| 12.1 | | | ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO | | - | | | R\$ 151.408,61 | R\$ - | R\$ 125.391,87 | 82,82% | |
| 12.2 | | | ESQUADRIAS EM MADEIRA | | - | | | R\$ 36.983,75 | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |
| 12.3 | | | ESQUADRIAS EM VIDRO | | - | | | R\$ 14.534,38 | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |
| 12.4 | | | DIVERSOS | | - | | | R\$ 28.171,53 | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |
| 13 | | | REVESTIMENTOS DE FERRO | | - | | | R\$ 113.483,59 | R\$ 37.046,00 | R\$ 37.046,00 | 32,64% | |
| 13.1 | 96486 | SINAPI | FERRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 75,95 | | | R\$ - | R\$ 7.048,16 | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 13.2 | COMP.ARO.097 | SINAPI | FERRO REMOVÍVEL ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL APOIADOS EM PERFS METÁLICOS SUSPENSOS, PLACAS DE 625 X 625 MM | M2 | 535,54 | 200,00 | 37,35% | R\$ 200,00 | R\$ 99.198,07 | R\$ 37.046,00 | R\$ 37.046,00 | 37,35% |
| 14 | | | REVESTIMENTOS DE PAREDES | | - | | | R\$ 134.718,34 | R\$ 3.826,56 | R\$ 124.119,54 | 92,13% | |
| 14.1 | | | INTERNAS | | - | | | R\$ 71.459,14 | R\$ 3.826,56 | R\$ 65.216,16 | 91,26% | |
| 14.1.3 | COMP.ARO.056 | SINAPI ADAPTAD | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ESPESSURA 2CM E LARGURA DE 10CM | M | 69,80 | 9,80 | 14,04% | 69,80 | R\$ 3.679,16 | R\$ 516,56 | R\$ 3.679,16 | 100,00% |



PROAD n. 352/2024 DOC 410. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.MFDZ.YLPK: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇO | UN | QUANTIDADE | % EST. MED | QUANT. ACUMULADA | PREÇO TOTAL COM B.D.I. | PREÇO TOTAL ESTA MEDIÇÃO | TOTAL ACUMULADO | % EXECUTADO | |
|--------|--------------|------------------|---|----|------------|------------|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------|
| 14.1.5 | COMP.ARQ.020 | INAPI / ADAPTAD | REVESTIMENTO CERÂMICO 30x40CM - MODELO FORMA SLIM BRANCO ACETINADO - MARCA ELIANE OU EQUIVALENTE | M2 | 339,09 | 40,00 | 11,80% | 305,00 | R\$ 28.059,86 | R\$ 3.310,00 | R\$ 25.238,75 | 89,95% |
| 14.2 | | | EXTERNAS | | - | | | R\$ 63.259,20 | R\$ - | R\$ 58.903,38 | 93,11% | |
| 15 | | | REVESTIMENTO DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO | | - | | | R\$ 365.635,26 | R\$ 52.000,58 | R\$ 216.241,90 | 59,14% | |
| 15.1 | | | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | | - | | | R\$ 180.597,31 | R\$ 8.930,40 | R\$ 69.930,28 | 38,72% | |
| 15.1.7 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 428,65 | 60,00 | 14,00% | 212,36 | R\$ 63.800,12 | R\$ 8.930,40 | R\$ 31.607,66 | 49,54% |
| 15.2 | | | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | | - | | | R\$ 185.037,95 | R\$ 43.070,18 | R\$ 146.311,61 | 79,07% | |
| 15.2.1 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 1.214,28 | 0,00% | 242,86 | R\$ 3.497,13 | R\$ - | R\$ 699,43 | 20,00% | |
| 15.2.2 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 462,09 | 33,09 | 7,16% | 462,09 | R\$ 24.056,41 | R\$ 1.722,67 | R\$ 24.056,41 | 100,00% |
| 15.2.3 | COMP.ARQ.037 | SINAPI / COTAÇÃO | BATE-RODA DE RESINA MEDINDO 48 X 17 X 9CM, NA COR AMARELO | UN | 26,00 | - | 0,00% | - | R\$ 3.405,74 | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 15.2.4 | 92400 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 1.214,28 | 300,00 | 24,71% | 921,39 | R\$ 121.294,43 | R\$ 29.967,00 | R\$ 92.037,65 | 75,88% |
| 15.2.5 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 121,43 | 50,43 | 41,53% | 116,43 | R\$ 24.947,38 | R\$ 10.360,43 | R\$ 23.920,13 | 95,88% |
| 15.2.6 | COMP.ARQ.201 | SINAPI / COTAÇÃO | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO DE ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 25x25CM, NA COR VERMELHA | M | 132,50 | 20,50 | 15,47% | 112,50 | R\$ 6.593,20 | R\$ 1.020,08 | R\$ 5.598,00 | 84,91% |
| 15.2.7 | COMP.ARQ.308 | SINAPI ADAPTAD | REVESTIMENTO EM GRANITO SÃO GABRIEL PARA A BASE DOS MASTROS | M2 | 2,62 | - | 0,00% | - | R\$ 1.243,66 | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 16 | | | SERRALHERIA | | - | | | R\$ 115.030,44 | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |
| 17 | | | PINTURA | | - | | | R\$ 65.908,81 | R\$ - | R\$ 30.424,50 | 46,16% | |
| 17.1 | | | PINTURA INTERNA | | - | | | R\$ 38.092,06 | R\$ - | R\$ 26.407,50 | 69,33% | |
| 17.2 | | | PINTURA EXTERNA | | - | | | R\$ 27.816,75 | R\$ - | R\$ 4.017,00 | 14,44% | |
| 18 | | | MOBILIÁRIO E BANCADAS | | - | | | R\$ 24.281,23 | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |
| 19 | | | LOUÇAS E METAIS | | - | | | R\$ 78.185,73 | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |
| 20 | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | - | | | R\$ 88.239,82 | R\$ 419,15 | R\$ 80.387,87 | 91,10% | |
| 20.1 | | | INSTALAÇÕES DE ÁGUA | | - | | | R\$ 21.342,75 | R\$ - | R\$ 15.761,18 | 73,85% | |
| 20.1.2 | COMP.HID.010 | SINAPI | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA | M | 205,09 | 0,00% | 100,00 | R\$ 10.428,83 | R\$ - | R\$ 5.085,00 | 48,76% | |
| 20.2 | | | INSTALAÇÕES DE ESGOTO E VENTILAÇÃO | | - | | | R\$ 34.762,38 | R\$ 17,13 | R\$ 34.315,19 | 98,71% | |
| 20.2.1 | COMP.HID.011 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS | M | 146,85 | 0,20 | 0,14% | 146,85 | R\$ 12.577,70 | R\$ 17,13 | R\$ 12.577,70 | 100,00% |
| 20.2.6 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 0,00% | - | R\$ 447,10 | R\$ - | R\$ - | 0,00% | |
| 20.3 | | | INSTALAÇÕES PLUVIUMS | | - | | | R\$ 23.229,42 | R\$ 346,68 | R\$ 22.018,46 | 94,79% | |
| 20.3.5 | COMP.HID.006 | SINAPI ADAPTAD | CAIXA SEM GRELHA DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | 1,00 | 1,00 | 100,00% | 1,00 | R\$ 346,68 | R\$ 346,68 | R\$ 346,68 | 100,00% |



PROAD n. 352/2024 DOC 410. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.MFDZ.YLPK: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇO | UN | QUANTIDADE | % ESTABED | QUANT ACUMULADA | PREÇO TOTAL COM B.D.I. | PREÇO TOTAL ESTA MEDIÇÃO | TOTAL ACUMULADO | % EXECUTADO |
|---------|--------------|------------------|--|----|------------|-----------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| 20.4 | | | INSTALAÇÕES DRENO CLIMATIZAÇÃO | | | - | | R\$ 8.905,27 | R\$ 55,34 | R\$ 8.293,04 | 93,13% |
| 20.4.1 | COMP.HID.010 | SINAPI | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA | M | 162,04 | 0,00% | 150,00 | R\$ 8.239,73 | R\$ - | R\$ 7.627,50 | 92,57% |
| 20.4.3 | COMP.HID.007 | SINAPI / TCPO | ISOLAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA ESPONJOSA PARA TUBO 25MM | M | 59,46 | 9,46 | 59,46 | R\$ 347,84 | R\$ 55,34 | R\$ 347,84 | 100,00% |
| 21 | | | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | | | - | | R\$ 25.502,91 | R\$ 5.789,07 | R\$ 14.597,95 | 57,24% |
| 21.1 | | | EXTINTORES DE INCÊNDIO | | | - | | R\$ 1.446,18 | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 21.2 | | | ALARME DE INCÊNDIO | | | - | | R\$ 16.315,78 | R\$ - | R\$ 8.808,88 | 53,99% |
| 21.2.4 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 46,00 | 0,00% | 40,00 | R\$ 1.802,28 | R\$ - | R\$ 1.567,20 | 86,96% |
| 21.3 | | | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | | | - | | R\$ 5.789,07 | R\$ 5.789,07 | R\$ 5.789,07 | 100,00% |
| 21.3.1 | COMP.PPCL010 | SINAPI / COTAÇÃO | BATERIA 12V PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UN | 2,00 | 2,00 | 2,00 | R\$ 424,34 | R\$ 424,34 | R\$ 424,34 | 100,00% |
| 21.3.2 | COMP.PPCL009 | SINAPI / COTAÇÃO | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, REFERÊNCIA ASCAELE CLE 24/1200 OU EQUIVALENTE | UN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | R\$ 1.501,65 | R\$ 1.501,65 | R\$ 1.501,65 | 100,00% |
| 21.3.3 | COMP.PPCL011 | SINAPI / COTAÇÃO | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, EM LED, DO TIPO ACLARAMENTO, LIGADA A CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. REFERÊNCIA ASCAELE ALCL-M20 | UN | 26,00 | 26,00 | 26,00 | R\$ 3.863,08 | R\$ 3.863,08 | R\$ 3.863,08 | 100,00% |
| 21.4 | | | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | | | - | | R\$ 1.951,88 | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 22 | | | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | | | - | | R\$ 221.292,67 | R\$ - | R\$ 49.316,51 | 22,29% |
| 22.1 | | | EQUIPAMENTOS | | | - | | R\$ 149.615,62 | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 22.2 | | | ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO | | | - | | R\$ 21.137,61 | R\$ - | R\$ 7.113,70 | 33,65% |
| 22.3 | | | TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS | | | - | | R\$ 25.975,57 | R\$ - | R\$ 25.975,57 | 100,00% |
| 22.4 | | | INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS | | | - | | R\$ 5.472,39 | R\$ - | R\$ 5.472,39 | 100,00% |
| 22.5 | | | DUTOS DIFUSORES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO | | | - | | R\$ 19.091,48 | R\$ - | R\$ 10.754,85 | 56,33% |
| 23 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | - | | R\$ 518.636,53 | R\$ 26.711,87 | R\$ 266.446,61 | 51,37% |
| 23.1 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REDE COMUM ILUMINAÇÃO E REDE ESTABILIZADA | | | - | | R\$ 262.325,60 | R\$ 18.322,45 | R\$ 150.397,52 | 57,33% |
| 23.1.5 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 289,00 | 139,00 | 289,00 | R\$ 3.647,18 | R\$ 1.754,18 | R\$ 3.647,18 | 100,00% |
| 23.1.8 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.557,00 | 400,00 | 2.450,00 | R\$ 8.156,83 | R\$ 1.276,00 | R\$ 7.815,50 | 95,82% |
| 23.1.9 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.500,00 | 400,00 | 4.000,00 | R\$ 20.745,00 | R\$ 1.844,00 | R\$ 18.440,00 | 88,89% |
| 23.1.10 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 450,00 | 90,00 | 450,00 | R\$ 3.397,50 | R\$ 679,50 | R\$ 3.397,50 | 100,00% |
| 23.1.11 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.000,00 | 400,00 | 2.800,00 | R\$ 21.240,00 | R\$ 2.832,00 | R\$ 19.824,00 | 93,33% |
| 23.1.12 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120,00 | 20,00 | 120,00 | R\$ 1.183,20 | R\$ 197,20 | R\$ 1.183,20 | 100,00% |
| 23.1.13 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 115,00 | 87,00 | 115,00 | R\$ 1.224,75 | R\$ 926,55 | R\$ 1.224,75 | 100,00% |



PROAD n. 352/2024 DOC 410. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.MFDZ.YLPK: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇO | UN | QUANTIDADE | % ESTABED | QUANT ACUMULADA | PREÇO TOTAL COM B.D.I. | PREÇO TOTAL ESTA MEDIÇÃO | TOTAL ACUMULADO | % EXECUTADO | |
|-------------|--------------|-----------------|--|----|------------|-----------|-----------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------|
| 23.1.14 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 140,00 | 106,00 | 75,71% | 140,00 | R\$ 2.361,80 | R\$ 1.788,22 | R\$ 2.361,80 | 100,00% |
| 23.1.34 | COMP.ELE.012 | INAPI - ADAPTAD | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", COM TAMPA, DE 3/4" | UN | 20,00 | 20,00 | 100,00% | 20,00 | R\$ 434,40 | R\$ 434,40 | R\$ 434,40 | 100,00% |
| 23.1.35 | COMP.ELE.013 | INAPI - ADAPTAD | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", COM TAMPA, DE 3/4" | UN | 57,00 | 57,00 | 100,00% | 57,00 | R\$ 1.083,00 | R\$ 1.083,00 | R\$ 1.083,00 | 100,00% |
| 23.1.36 | COMP.ELE.014 | INAPI - ADAPTAD | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", COM TAMPA, DE 3/4" | UD | 14,00 | 14,00 | 100,00% | 14,00 | R\$ 278,88 | R\$ 278,88 | R\$ 278,88 | 100,00% |
| 23.1.37 | COMP.ELE.015 | INAPI - ADAPTAD | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", COM TAMPA, DE 3/4" | UN | 30,00 | 30,00 | 100,00% | 30,00 | R\$ 597,60 | R\$ 597,60 | R\$ 597,60 | 100,00% |
| 23.1.38 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 15,00 | 13,00 | 86,67% | 13,00 | R\$ 2.240,10 | R\$ 1.941,42 | R\$ 1.941,42 | 86,67% |
| 23.1.41 | 97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 5,00 | 3,00 | 60,00% | 4,00 | R\$ 4.482,50 | R\$ 2.689,50 | R\$ 3.586,00 | 80,00% |
| 23.2 | | | INSTALAÇÕES DE REDE ESTABILIZADA | | | | | R\$ 28.801,08 | R\$ 1.593,50 | R\$ 5.670,21 | 19,69% | |
| 23.2.5 | COMP.ELE.042 | INAPI - ADAPTAD | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 230,00 | 200,00 | 86,96% | 200,00 | R\$ 940,70 | R\$ 818,00 | R\$ 818,00 | 86,96% |
| 23.2.6 | COMP.ELE.043 | INAPI - ADAPTAD | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 165,00 | 165,00 | 100,00% | 165,00 | R\$ 775,50 | R\$ 775,50 | R\$ 775,50 | 100,00% |
| 23.2.7 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11,00 | | 0,00% | 5,00 | R\$ 442,09 | R\$ - | R\$ 200,95 | 45,45% |
| 23.2.10 | COMP.ELE.04 | INAPI - ADAPTAD | CAIXA DE TOMADA PARA DUTO DE PISO 25x140mm COM 4 PONTOS ELÉTRICOS E 4 DE DADOS | UN | 8,00 | | 0,00% | - | R\$ 4.817,04 | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 23.3 | | | QUADROS ELÉTRICOS E DISJUNTORES - INTERNOS | | | | | R\$ 9.379,69 | R\$ - | R\$ 9.379,69 | 100,00% | |
| 23.4 | | | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA, CFTV E ALARME | | | | | R\$ 135.912,55 | R\$ 6.347,90 | R\$ 65.534,62 | 48,22% | |
| 23.4.4 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15,00 | 15,00 | 100,00% | 15,00 | R\$ 315,60 | R\$ 315,60 | R\$ 315,60 | 100,00% |
| 23.4.6 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90,00 | 90,00 | 100,00% | 90,00 | R\$ 1.135,80 | R\$ 1.135,80 | R\$ 1.135,80 | 100,00% |
| 23.4.7 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 105,00 | 105,00 | 100,00% | 105,00 | R\$ 2.145,15 | R\$ 2.145,15 | R\$ 2.145,15 | 100,00% |
| 23.4.8 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120,00 | 120,00 | 100,00% | 120,00 | R\$ 1.514,40 | R\$ 1.514,40 | R\$ 1.514,40 | 100,00% |
| 23.4.9 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30,00 | 30,00 | 100,00% | 30,00 | R\$ 485,70 | R\$ 485,70 | R\$ 485,70 | 100,00% |
| 23.4.16 | COMP.ELE.024 | INAPI - ADAPTAD | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", COM TAMPA, DE 1" | UN | 3,00 | 3,00 | 100,00% | 3,00 | R\$ 80,46 | R\$ 80,46 | R\$ 80,46 | 100,00% |
| 23.4.17 | COMP.ELE.015 | INAPI - ADAPTAD | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", COM TAMPA, DE 3/4" | UN | 7,00 | 7,00 | 100,00% | 7,00 | R\$ 139,44 | R\$ 139,44 | R\$ 139,44 | 100,00% |
| 23.4.18 | COMP.ELE.025 | INAPI - ADAPTAD | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", COM TAMPA, DE 1" | UN | 15,00 | 15,00 | 100,00% | 15,00 | R\$ 351,45 | R\$ 351,45 | R\$ 351,45 | 100,00% |
| 23.4.19 | COMP.ELE.073 | INAPI - ADAPTAD | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | 2,00 | 2,00 | 100,00% | 2,00 | R\$ 94,66 | R\$ 94,66 | R\$ 94,66 | 100,00% |
| 23.4.20 | COMP.ELE.074 | INAPI - ADAPTAD | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | 2,00 | 2,00 | 100,00% | 2,00 | R\$ 85,24 | R\$ 85,24 | R\$ 85,24 | 100,00% |



PROAD n. 352/2024 DOC 410. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.MFDZ.YLPK: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇO | UN | QUANTIDADE | % ESTAMED | QUANT ACUMULADA | PREÇO TOTAL COM B.D.I. | PREÇO TOTAL ESTA MEDIÇÃO | TOTAL ACUMULADO | % EXECUTADO |
|--------------------------|--------------|------------|--|----|------------|-----------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| 23.5 | | | INSTALAÇÕES DE SOM | | - | | | R\$ 6.621,74 | R\$ - | R\$ 1.504,75 | 22,72% |
| 23.6 | | | SPDA E ATERRAMENTO | | - | | | R\$ 21.979,30 | R\$ - | R\$ 21.052,87 | 95,78% |
| 23.7 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES PROVISÓRIAS | | - | | | R\$ 12.906,95 | R\$ 448,02 | R\$ 12.906,95 | 100,00% |
| 23.7.17 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF_12/2020 | UN | 3,00 | 3,00 | 3,00 | R\$ 448,02 | R\$ 448,02 | R\$ 448,02 | 100,00% |
| 23.8 | | | SUBESTAÇÃO | | - | | | R\$ 40.708,62 | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 24 | | | CONTROLE TECNOLÓGICO DA OBRA | | - | | | R\$ 14.752,57 | R\$ - | R\$ 4.677,40 | 31,71% |
| 24.1 | COMP.ARO.318 | COTAÇÃO | ENSAIO DE ARRANCAMENTO DA ARGAMASSA | UN | 3,00 | 0,00% | - | R\$ 4.317,93 | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 25 | | | DIVERSOS | | - | | | R\$ 32.747,20 | R\$ 18.596,46 | R\$ 18.596,46 | 56,79% |
| 25.5 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 785,29 | 657,29 | 657,29 | R\$ 11.064,73 | R\$ 9.261,21 | R\$ 9.261,21 | 83,70% |
| 25.6 | COMP.ARO.315 | COMPOSIÇÃO | TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO DE GRAMA | M3 | 76,87 | 45,00 | 45,00 | R\$ 15.945,64 | R\$ 9.335,25 | R\$ 9.335,25 | 58,54% |
| 26 | | | SERVIÇOS FINAIS | | - | | | R\$ 8.386,80 | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| TOTAL MATERIAL | | | | | | | | R\$ 127.835,06 | | 78,19% | |
| TOTAL MÃO DE OBRA | | | | | | | | R\$ 35.664,82 | | 21,81% | |
| TOTAL MEDIÇÃO | | | | | | | | R\$163.499,88 | | | |



PROAD n. 352/2024 DOC 410. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.MFDZ.YLPK: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR

| Construção no novo Fórum Trabalhista de Tubarão | | Medição n° 10 | |
|---|--|----------------------------|-------------------------|
| Empresa Contratada: | CS Magon Construtora Ltda. | Contrato: | CE 352/2024 |
| Endereço de Execução: | esquina da Rua São Luís com a Rua Aracaju, Bairro Vila Moema | Período da Medição: | 30/04/2025 a 04/06/2025 |

| RESULTADO | VALOR MEDIDO R\$ 172.852,07 | DESCONTO 0,00% R\$ 0,00 | VALOR FINAL A PAGAR R\$ 172.852,07 |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|

| INDICADOR | DESCONTO PADRÃO | Nº DE OCORRÊNCIAS | DESCONTO TOTAL | LIMITE DE NOTIFICAÇÕES |
|-----------|-----------------|-------------------|----------------|------------------------|
| Nº 01 | 0,05% | 0 | 0,000% | 20 |
| Nº 02 | 0,25% | 0 | 0,000% | 5 |
| Nº 03 | 0,25% | 0 | 0,000% | 8 |

AVISO

MULTA: Caso o número de ocorrências ultrapasse o limite máximo permitido para algum indicador será necessário averiguar o CONTRATUAL: percentual da multa contratual a ser cobrada posteriormente (vide item 14.3 do Termo de Referência).

INFORMAÇÕES

- INDICADOR Nº 1: Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
- INDICADOR Nº 2: Uso de Equipamentos para trabalho em altura - andaimes, escadas, balancins, etc.
- INDICADOR Nº 3: Deixar de solicitar, previamente, à fiscalização técnica do TRT, a autorização para a subcontratação de serviços, conforme item 7.3.2 do Termo de Referência.



| | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| CS MAGON | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD242 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 289 | Data: 29/04/2025 (Terça-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminar: 76 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|----------------------|--------|-------------|
| Engenheiro Residente | 1 | |
| Almoxarife | 1 | |
| Oficial Pedreiro | 3 | |
| ajudante | 2 | |
| Mestre de obra | 1 | |
| pintor | 1 | |
| paver | 2 | |



DALBERTO
KNOTH
17/06/2025 15:50

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|------------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| limpeza e organização | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| revestimento ceramico | 1.0 | | nenhum | |
| textura fachada | 1.0 | | nenhum | |
| paver estacionamento | 1.0 | | nenhum | |
| vedação parafusos telhado | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| caixarias viga fundos gradil | 1.0 | | nenhum | |



Observações feitas por fiscais

Vistoria da fiscalização nesta data

- 1) Ajustar a altura das juntas de dilatação no assentamento do piso, de modo que o topo das juntas fique nivelado com o topo do piso porcelanato.
- 2) Empregar camada de terra vegetal previamente ao plantio da grama.
- 3) Tampas das caixas no passeio público não estão no mesmo nível do paver. Ajustar altura das caixas ou substituir por tampas mais espessas.
- 4) Discutidos os níveis do aterro e inclinação dos taludes ao longo das bacias de amortecimento.
- 5) Apresentar proposta para eliminar as juntas entre placas cimentícias, pois ficaram muito marcadas na fachada frontal.
- 6) Melhorar aplicação da textura nas paredes, pois estão ficando muito marcadas as sobreposições do rolo usado na aplicação.
- 7) Finalizar o refazimento dos contrapisos da edificação.
- 8) Remover restos de formas na região do abrigo do reservatório.
- 9) Retomar aplicação do azulejos das paredes.
- 10) Executar as caixas de passagem do pátio interno.
- 11) Executar as caixas de passagem do pátio externo, antes da execução do paver e grama.
- 12) Seguir aplicando dupla camada na execução dos porcelanatos.
- 13) Executar granito cinza corumbá na escada externa (a ser aditado).
- 14) Melhorar acabamento da aplicação de PU nas janelas. Antes de aplicar PU: sugiro colar fitas ao lado da junta, então aplicar o PU; Imediatamente após o PU, remover as fitas.

Atentar para as ponderações feitas em relatórios e vistorias anteriores.

Galeria de Fotos

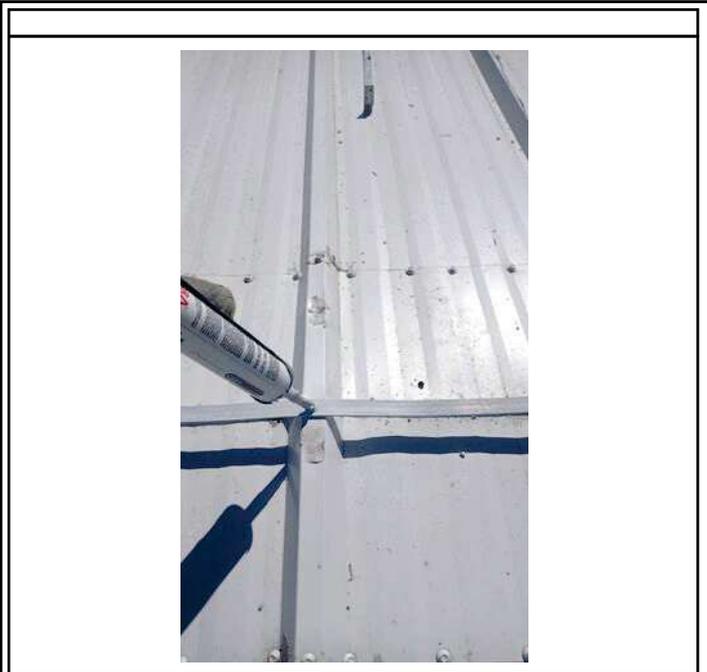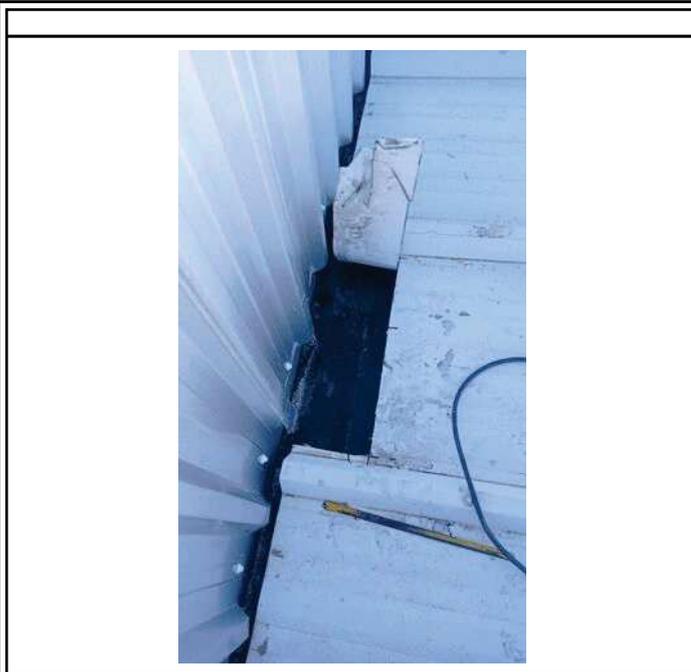



Fiscal

Responsável Técnico





| | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| CS MAGON | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD245 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 290 | Data: 30/04/2025 (Quarta-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminar: 75 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|----------------|--------|-------------|
| Mestre de obra | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 2 | |
| Residente | 1 | |
| paver | 2 | |
| almoxarifado | 1 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|-------------------------------|----------|-------|--------|-------------|
| limpeza e organizacao | 1.0 | | nenhum | |
| assentamento de piso ceramico | 1.0 | | nenhum | |
| paver calçada frontal | 1.0 | | nenhum | |
| taludes bacia de infiltracao | 1.0 | | nenhum | |

Galeria de Fotos

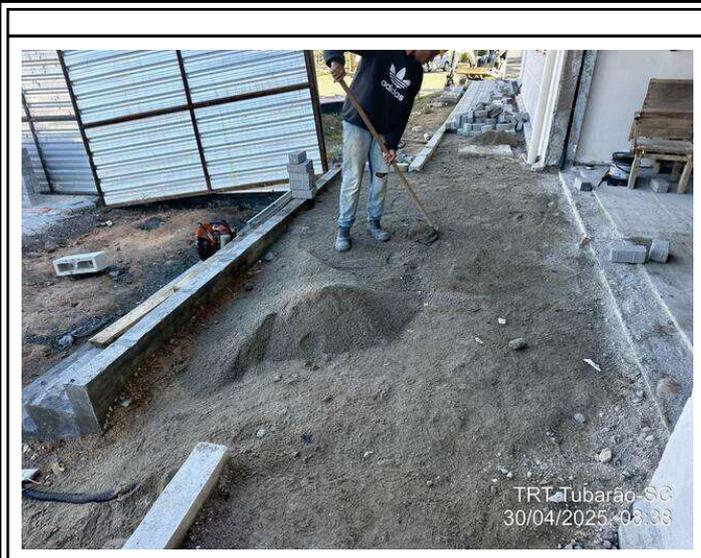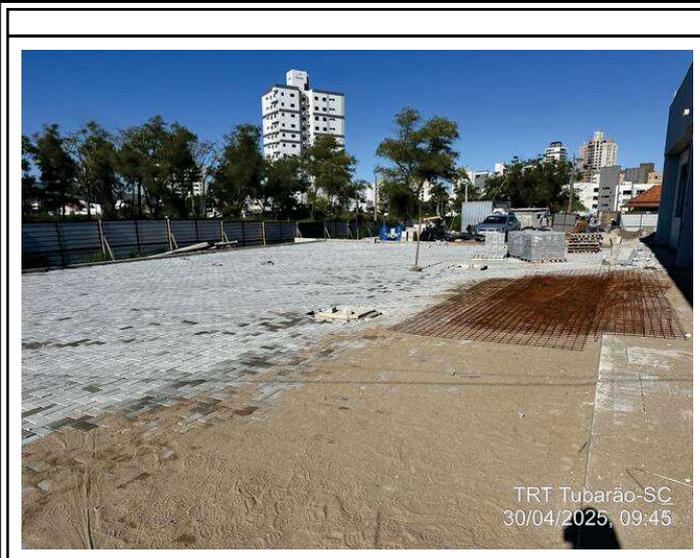



Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| CS MAGON | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD244 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 291 | Data: 01/05/2025 (Quinta-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminar: 74 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|----------------------|--------|-------------|
| Engenheiro Residente | 1 | |
| Almoxarife | 1 | |
| Oficial Pedreiro | 3 | |
| ajudante | 2 | |
| Mestre de obra | 1 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|------------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| limpeza e organização | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| revestimento ceramico | 1.0 | | nenhum | |
| Taludes bacia de infiltracao | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| Infra iluminacao | 1.0 | | nenhum | |

Observações feitas por fiscais

Equipe da CS Magon trabalhou no feriado, optando por folgar na sexta, dia 02.

Galeria de Fotos





Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| CS MAGON | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD244 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 292 | Data: 02/05/2025 (Sexta-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Término: 73 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Término Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|----------------------|----------|-------|--------|-------------|
| sem atividades | 0.0 | | nenhum | |

Observações feitas por fiscais

Equipe da CS Magon trabalhou no feriado, optando por folgar na sexta, dia 02.

Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| CS MAGON | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD244 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 293 | Data: 03/05/2025 (Sábado) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Término: 72 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Término Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|----------------------|----------|-------|--------|-------------|
| sem atividades | 0.0 | | nenhum | |

Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| CS MAGON | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD244 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 294 | Data: 04/05/2025 (Domingo) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Término: 71 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Término Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|----------------------|----------|-------|--------|-------------|
| sem atividades | 0.0 | | nenhum | |

Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| CS MAGON | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD248 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 295 | Data: 05/05/2025 (Segunda-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminar: 70 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| Eng. Residente | 1 | |
| Mestre de obras | 1 | |
| Almoxarifado | 1 | |
| Pedreiro | 3 | |
| Ajudante | 1 | |
| Paver | 2 | |
| Hidraulica | 1 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|-------------------------|----------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Organização | 1.0 | | nenhum | |
| Paver calçada | 1.0 | | nenhum | |
| Paver estacionamento | 1.0 | | nenhum | |
| Piso cerâmico | 1.0 | | nenhum | |
| Reparo pontos de esgoto | 1.0 | | nenhum | |

Galeria de Fotos





Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| CS MAGON | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD249 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 296 | Data: 06/05/2025 (Terça-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminar: 69 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|---------------------|--------|-------------|
| Eng. Residente | 1 | |
| Mestre de obras | 1 | |
| Almoxarifado | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 2 | |
| Paver | 2 | |
| Reparos contra piso | 1 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|---------------------------|----------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Organização | 1.0 | | nenhum | |
| Paver calçada | 1.0 | | nenhum | |
| Piso cerâmico | 1.0 | | nenhum | |
| Caixa de passagem pluvial | 1.0 | | nenhum | |

Observações feitas por fiscais

Vistoria da fiscalização nesta data.

- 1) Reunião com o Eng. Marcio Sena, novo coordenador de obras da CS Magon.
- 2) Discutido sobre os problemas da obra, histórico de tratativas, demandas a serem priorizadas.
- 3) Feito levantamento das instalações pendentes de execução no teto, de modo a se concluir para então iniciar o forro e avançar nas frentes de serviço.
- 4) Discutido sobre caixas de passagem e caixa pluvial pendentes de execução no pátio interno.
- 5) Discutido sobre acabamentos do paver do estacionamento e da entrada principal.
- 6) Avaliados os níveis da escada na entrada principal e discutido sobre revestimento em granito.
- 7) Discutido sobre deficiências na aplicação de textura nas fachadas
- 8) Tratado sobre acabamento grosseiro da fachada frontal, onde ficaram muito marcadas as juntas das placas cimentícias e textura, sendo necessária solução para esse aspecto.
- 9) CS Magon fará teste na fachada frontal, aplicando massa acrílica nas juntas das placas para então lixar e aplicar textura. Em seguida será avaliado se esse procedimento poderá ser usado para correção das imperfeições na fachada frontal e demais fachadas.
- 10) Avaliado em conjunto com o responsável pela execução das chapas cimentícias sobre a correção a ser feita no alinhamento de placas da parede da secretaria voltada para o pátio interno.
- 11) Discutido sobre fixação do forro fibromineral.
- 12) Mencionada necessidade de avaliar alternativa para a fixação das cassetes.

Galeria de Fotos





Fiscal

Responsável Técnico




| | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| CS MAGON | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD250 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 297 | Data: 07/05/2025 (Quarta-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminar: 68 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| Eng. Residente | 1 | |
| Mestre de obras | 1 | |
| Almoxarifado | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 2 | |
| Paver | 2 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|---------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Organização | 1.0 | | nenhum | |
| Paver estacionamento | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| Assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| Caixa de passagem pluvial | 1.0 | | nenhum | |
| reparos no contra piso | 1.0 | | nenhum | |

Galeria de Fotos

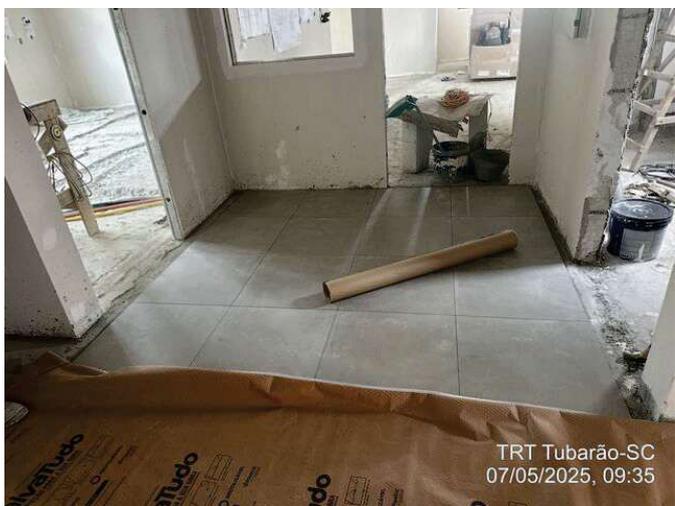



Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| CS MAGON | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD251 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 298 | Data: 08/05/2025 (Quinta-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminar: 67 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| Eng. Residente | 1 | |
| Mestre de obras | 1 | |
| Almoxarifado | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 2 | |
| Paver | 2 | |
| hidraulica | 1 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|------------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Organização | 1.0 | | nenhum | |
| Paver estacionamento | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| Assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| Caixa de passagem elétrica | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| correcoes pontos hidraulicos | 0.0 | | nenhum | |

Observações feitas por fiscais

Aumentar o número de funcionários na obra, atuando em mais frentes de serviço.

Serviços pendentes:

- execução de alvenaria
- chapisco
- reboco
- correções contrapiso
- correções infra elétrica
- correções infra ar condicionado
- correções placas cimentícias fachada frontal e pátio interno
- fechamento chapa cimentícia shaft abaixo da marquise frontal
- executar instalações de iluminação de emergência
- dentre outros

Galeria de Fotos





Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| CS MAGON | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD252 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 299 | Data: 09/05/2025 (Sexta-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminar: 66 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| Eng. Residente | 1 | |
| Mestre de obras | 1 | |
| Almoxarifado | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 2 | |
| Paver | 2 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|----------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Organização | 1.0 | | nenhum | |
| Paver rampa | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| Assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| Caixa de passagem elétrica | 1.0 | | nenhum | |


Observações feitas por fiscais


Aumentar o número de funcionários na obra, atuando em mais frentes de serviço.

Serviços pendentes:

- execução de alvenaria
- chapisco
- reboco
- correções contrapiso
- correções infra elétrica
- correções infra ar condicionado
- fechamento placas cimentícias fachada frontal e pátio interno
- fechamento chapa cimentícia shaft abaixo da marquise frontal
- executar instalações de iluminação de emergência
- dentre outros

Galeria de Fotos

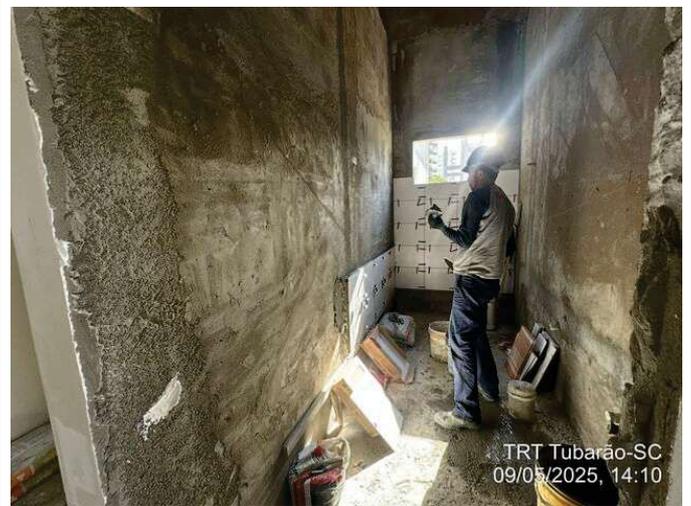

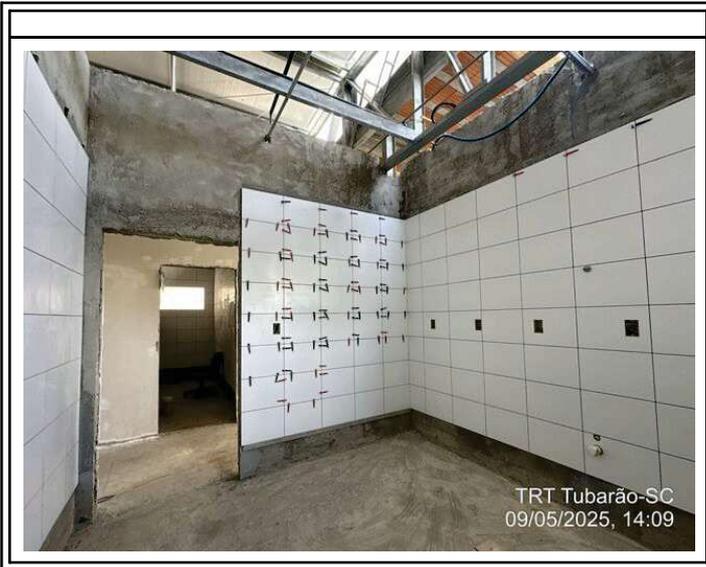

Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| CS MAGON | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD253 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 300 | Data: 10/05/2025 (Sábado) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Término: 65 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Término Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|----------------------|----------|-------|--------|-------------|
| sem atividades | 0.0 | | nenhum | |

Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| CS MAGON | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD254 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 301 | Data: 11/05/2025 (Domingo) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Término: 64 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Término Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|----------------------|----------|-------|--------|-------------|
| sem atividades | 0.0 | | nenhum | |

Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| CS MAGON | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD255 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 302 | Data: 12/05/2025 (Segunda-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminar: 63 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| Eng. Residente | 1 | |
| Mestre de obras | 1 | |
| Almoxarifado | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 2 | |
| Paver | 2 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|----------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Organização | 1.0 | | nenhum | |
| Paver rampa | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| Assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| Caixa de passagem elétrica | 1.0 | | nenhum | |

Observações feitas por fiscais


Aumentar o número de funcionários na obra, atuando em mais frentes de serviço.

Serviços pendentes:

- execução de alvenaria
- chapisco
- reboco
- correções contrapiso
- correções infra elétrica
- correções infra ar condicionado
- correções placas cimentícias fachada frontal e pátio interno
- fechamento chapa cimentícia shaft abaixo da marquise frontal
- executar instalações de iluminação de emergência
- dentre outros

Galeria de Fotos



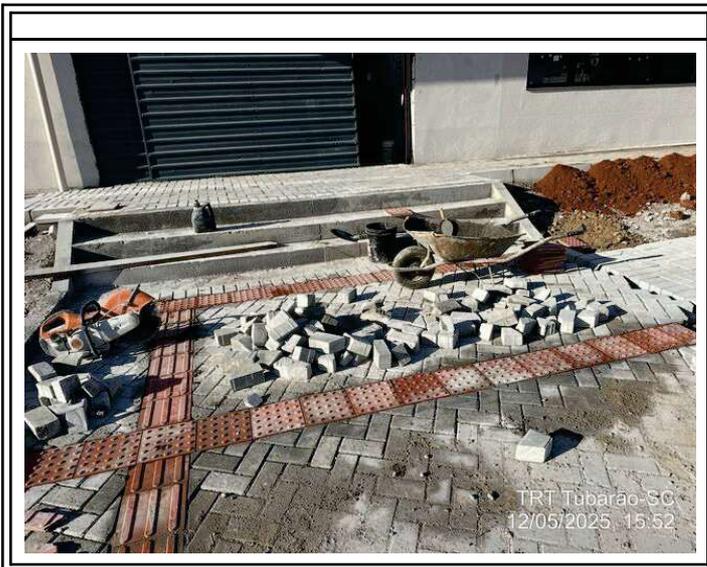

Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| CS MAGON | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD256 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 303 | Data: 13/05/2025 (Terça-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminar: 62 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra


| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| Eng. Residente | 1 | |
| Mestre de obras | 1 | |
| Almoxarifado | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 2 | |
| Paver | 2 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|----------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Organização | 1.0 | | nenhum | |
| Paver calçada interna | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| Assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| Caixa de passagem elétrica | 1.0 | | nenhum | |

Observações feitas por fiscais

Vistoria da fiscalização nesta data.
 Discutidos níveis dos taludes no pátio frontal do terreno.
 Discutido sobre caixas de passagem elétricas e telecom no pátio
 Corrigir revestimento de mocheta no sanitário masculino de público (reboco solto)
 Tratado sobre junta de dilatação a ser executada entre alvenaria e shafts externos (fachada frontal)

Galeria de Fotos



Fiscal

Responsável Técnico



PROAD n. 352/2024 DOC 412. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.FXNN.PHPX: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



PROAD n. 352/2024 DOC 412. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.FXNN.PHPX:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

| | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD257 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 304 | Data: 14/05/2025 (Quarta-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminar: 61 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| En . Residente | 1 | |
| Mestre de obras | 1 | |
| Almojarifado | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 4 | |
| Paver | 2 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|------------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Or anização | 1.0 | | nenhum | |
| Paver estacionamento externo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| Assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| preparo terreno para rama | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| reparo escada | 1.0 | | nenhum | |

Observações feitas por fiscais
 Orientar equipes a sempre utilizarem os EPIs.

Galeria de Fotos



Fiscal

Responsável Técnico



PROAD n. 352/2024 DOC 412. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.FXNN.PHPX:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

| | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD258 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 305 | Data: 15/05/2025 (Quinta-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminar: 60 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| En . Residente | 1 | |
| Mestre de obras | 1 | |
| Almoxarifado | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 4 | |
| Paver | 2 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|------------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Or anização | 1.0 | | nenhum | |
| Paver estacionamento externo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| Assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| preparo terreno para o paver | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| reparo escada | 1.0 | | nenhum | |
| correção contra piso | 1.0 | | nenhum | |

Galeria de Fotos



Fiscal

Responsável Técnico



PROAD n. 352/2024 DOC 412. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.FXNN.PHPX: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

| | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD259 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 306 | Data: 16/05/2025 (Sexta-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminar: 59 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |
| Relatório Diário de Obra | | | |

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| En . Residente | 1 | |
| Mestre de obras | 1 | |
| Almojarifado | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 4 | |
| Paver | 2 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|------------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Or anização | 1.0 | | nenhum | |
| Paver estacionamento externo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| Assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| paver calçada interna fundos | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| reparo escada | 1.0 | | nenhum | |

Galeria de Fotos



Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD260 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 307 | Data: 17/05/2025 (Sábado) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Término: 58 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Término Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|----------------------|----------|-------|--------|-------------|
| sem atividades | 1.0 | | nenhum | |

Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD261 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 308 | Data: 18/05/2025 (Domínio) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Término: 57 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Término Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|----------------------|----------|-------|--------|-------------|
| sem atividades | 1.0 | | nenhum | |

Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD262 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 309 | Data: 19/05/2025 (Se unda-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Termino: 56 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| En . Residente | 1 | |
| Mestre de obras | 1 | |
| Almoxarifado | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 5 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|----------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Or anização | 1.0 | | nenhum | |
| Assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| plntio rama | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| rejunte azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| impermeabilizacao janelas | 1.0 | | nenhum | |
| ajustes infra climatização | 1.0 | | nenhum | |

Galeria de Fotos





Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD263 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 310 | Data: 20/05/2025 (Terça-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminar: 55 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| En . Residente | 1 | |
| Mestre de obras | 1 | |
| Almoxarifado | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 4 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|-----------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Or anização | 1.0 | | nenhum | |
| platio rama | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| caixa vertedoura | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |

Galeria de Fotos



Fiscal

Responsável Técnico



PROAD n. 352/2024 DOC 412. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.FXNN.PHPX: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD264 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 311 | Data: 21/05/2025 (Quarta-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Termino: 54 | Inicio: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| En . Residente | 1 | |
| Mestre de obras | 1 | |
| Almoxarifado | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 4 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|-------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Or anização | 1.0 | | nenhum | |
| assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| paver estacionamento | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| caixas de passa em | 1.0 | | nenhum | |

Observações feitas por fiscais

Atentar que, atrás da subestação será instalado poste, que não deverá conflitar com a infraestrutura subterrânea (caixa e dutos).

Galeria de Fotos



| | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD265 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 312 | Data: 22/05/2025 (Quinta-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminar: 53 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| En . Residente | 1 | |
| Mestre de obras | 1 | |
| Almoxarifado | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 4 | |
| paver | 1 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|-------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Or anização | 1.0 | | nenhum | |
| assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| paver estacionamento | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| caixas de passa em | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| reparo contrapiso | 1.0 | | nenhum | |

Galeria de Fotos



Fiscal

Responsável Técnico



PROAD n. 352/2024 DOC 412. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.FXNN.PHPX: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

| | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD266 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 313 | Data: 23/05/2025 (Sexta-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Termino: 52 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| Mestre de obras | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 3 | |
| paver | 1 | |
| eletricista | 2 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|-------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Organização | 1.0 | | nenhum | |
| assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| paver estacionamento | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| caixas de passagem | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| Infra elétrica | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |

| Observações feitas por fiscais |
|---|
| CS Ma on deve descrever atividades executadas no dia. |

Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD267 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 314 | Data: 24/05/2025 (Sábado) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Término: 51 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Término Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| Mestre de obras | 1 | |
| Pedreiro | 1 | |
| Ajudante | 2 | |
| paver | 2 | |
| eletricista | 2 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|-----------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Organização | 1.0 | | nenhum | |
| paver estacionamento | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| caixas de passagem | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| infra elétrica | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |

| Observações feitas por fiscais |
|---|
| CS Ma on deve descrever as atividades executadas. |

Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD268 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 315 | Data: 25/05/2025 (Domínio) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Término: 50 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Término Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| Mestre de obras | 1 | |
| eletricista | 2 | |
| paver | 1 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|-----------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Organização | 1.0 | | nenhum | |
| paver estacionamento | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| infra elétrica | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |

| Observações feitas por fiscais |
|--|
| CS Ma on deve descrever as atividades executadas no dia. |

Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD269 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 316 | Data: 26/05/2025 (Se unda-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Termino: 49 | Inicio: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| Mestre de obras | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 3 | |
| paver | 2 | |
| eletricista | 2 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|-------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Or anização | 1.0 | | nenhum | |
| assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| paver estacionamento | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| caixas de passa em | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| infra elétrica | 1.0 | | nenhum | |

| Observações feitas por fiscais |
|--|
| CS Ma on deve descrever as atividades executadas no dia. |

Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD270 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 317 | Data: 27/05/2025 (Terça-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Término: 48 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Término Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| Mestre de obras | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 3 | |
| paver | 2 | |
| eletricista | 2 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|-------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Organização | 1.0 | | nenhum | |
| assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| paver estacionamento | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| caixas de passagem | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| infra elétrica | 1.0 | | nenhum | |

Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD271 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 318 | Data: 28/05/2025 (Quarta-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminar: 47 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| Mestre de obras | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 3 | |
| paver | 2 | |
| eletricista | 2 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|-------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Organização | 1.0 | | nenhum | |
| assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| paver estacionamento | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| caixas de passagem | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| infra elétrica | 1.0 | | nenhum | |

Fiscal

Responsável Técnico





PROAD n. 352/2024 DOC 412. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.FXNN.PHPX:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

| | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD271 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 318 | Data: 28/05/2025 (Quarta-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminar: 47 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| Mestre de obras | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 3 | |
| paver | 2 | |
| eletricista | 2 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|-------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Organização | 1.0 | | nenhum | |
| assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| paver estacionamento | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| caixas de passagem | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| infra elétrica | 1.0 | | nenhum | |

Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD272 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 319 | Data: 29/05/2025 (Quinta-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Término: 46 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Término Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| Mestre de obras | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 3 | |
| paver | 2 | |
| eletricista | 2 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|-------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Organização | 1.0 | | nenhum | |
| assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| paver estacionamento | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| caixas de passagem | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| infra elétrica | 1.0 | | nenhum | |

Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD273 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 320 | Data: 30/05/2025 (Sexta-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminar: 45 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| Mestre de obras | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 3 | |
| paver | 2 | |
| eletricista | 2 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|-------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Organização | 1.0 | | nenhum | |
| assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| paver estacionamento | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| caixas de passagem | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| infra elétrica | 1.0 | | nenhum | |

Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD282 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 321 | Data: 31/05/2025 (Sábado) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Término: 44 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Término Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

Comentários

sem atividades

Observações feitas por fiscais

Sem atividades nesta data.

Fiscal_____
Responsável Técnico

| | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD282 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 322 | Data: 01/06/2025 (Domínio) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Término: 43 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Término Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

Comentários

sem atividades

Observações feitas por fiscais

sem atividades nesta data.

Fiscal_____
Responsável Técnico

| | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD274 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 323 | Data: 02/06/2025 (Se unda-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminio: 42 | Inicio: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| Mestre de obras | 1 | |
| Pedreiro | 2 | |
| Ajudante | 3 | |
| paver | 2 | |
| eletricista | 2 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|-------------------------|----------------|-------|--------|-------------|
| Limpeza e Or anização | 1.0 | | nenhum | |
| assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| paver estacionamento | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| caixas de passa em | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| infra elétrica | 1.0 | | nenhum | |

Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD275 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 324 | Data: 03/06/2025 (Terça-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Término: 41 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Término Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| Mestre de obras | 1 | |
| Pedreiro | 3 | |
| Ajudante | 4 | |
| eletricista | 2 | |
| engenheiro | 2 | |
| Gesseiro | 2 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|-------------------------|----------------|-------|------------|-------------|
| Limpeza e Organização | 1.0 | | nenhum | |
| assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| caixas de passagem | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| infra elétrica | 1.0 | | nenhum | |
| Estrutura Forro | 1.0 | | nenhum | |
| Paver Estacionamento | 1.0 | | paralisada | |

Fiscal

Responsável Técnico



| | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| TRT12 | Dias Contratuais: 365 | RDO: RD276 | Juntado em 17/07/2025 |
| | Dias Decorridos: 325 | Data: 04/06/2025 (Quarta-Feira) | |
| Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024 | Dias para Terminar: 40 | Início: 15/07/2024 | |
| Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070 | | Termino Previsto: 14/07/2025 | |

Relatório Diário de Obra

| Mãos de Obra | Quant. | Empreiteiro |
|-----------------|--------|-------------|
| Mestre de obras | 1 | |
| Pedreiro | 3 | |
| Ajudante | 4 | |
| eletricista | 2 | |
| En enheiro | 1 | |
| Gesseiro | 2 | |

| Atividades / Tarefas | Quantit. | Unid. | Status | Empreiteiro |
|-------------------------|----------------|-------|------------|-------------|
| Limpeza e Or anização | 1.0 | | nenhum | |
| assentamento de azulejo | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| paver estacionamento | 1.0 | | paralisada | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| caixas de passa em | 1.0 | | nenhum | |
| Observações | Sem sub-tarefa | | | |
| infra elétrica | 1.0 | | nenhum | |
| Estrutura Forro | 1.0 | | nenhum | |

| Observações feitas por fiscais |
|--|
| <p>Visita da fiscalização nesta data. Presença do gestor do contrato e dos estores da CS Ma on.</p> <ul style="list-style-type: none"> - discutido sobre revestimento das fachadas - discutido sobre estrutura metálica do abrigo do reservatório - tratado sobre a pro ramação da CS Ma on para execução das próximas atividades da obra - apresentado do En . Antônio, que estará apoiando a CS Ma on na execução da obra - discutido sobre execução do forro e acabamento nos locais em que o forro passa sobre as paredes de drywall - tratado sobre vedação das janelas do pátio interno - tratado sobre as relhas das caixas pluviais |

Fiscal

Responsável Técnico





PROAD n. 352/2024 DOC 412. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.FXNN.PHPX:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA MEDIÇÃO

| ITEM | | Sim | Não | N/A | OBSERVAÇÕES |
|----------|---|-----|-----|-----|---|
| 1 | A medição somente poderá ser encaminhada se forem entregues pela contratada todos os documentos constantes no contrato, necessários à liberação da parcela de medição além de: | | | | Documentos e procedimentos a serem observados a cada medição, conforme o caso e análise da fiscalização. |
| 1.1 | Documento de Encaminhamento da Medição, conforme modelo CPO e orientações do Manual de Fiscalização (item 7.3); | X | | | |
| 1.2 | Declaração de emprego de egressos do sistema carcerário, conforme contrato; | X | | | |
| 1.3 | Nota Fiscal/ Fatura, conforme valor da planilha, discriminando os valores de mão-de-obra e de material; | X | | | Inserida no SIGEO |
| 1.4 | Planilha de medição pré aprovada pelo fiscal (observar Acórdão TCU 2622/2013, quanto à medição da administração local); | X | | | |
| 1.5 | Cronograma físico-financeiro atualizado, caso haja; | | X | | Em função do aditivo de prazo em tramitação será apresentado novo cronograma com a formalização do aditivo |
| 1.6 | Diário de obras; | X | | | |
| 1.7 | Relatório fotográfico; | X | | | Do próprio diário de obras |
| 1.8 | Relatório de atualização do projeto "as built"; | | X | | Não há nesta etapa de medição. |
| 1.9 | Recibo de entrega dos EPIs atualizado conforme atividades e quadro funcional vigente; | X | | | |
| 1.10 | Relação atualizada de empresas terceirizadas | | | X | |
| 2 | Atualização da planilha de gerenciamento de obra - PGO - para fins de controle contratual e atualização do Portal Transparência. | X | | | |
| 3 | Medições após aditivo | | | | |
| 3.1 | No caso de alteração substancial do projeto o fiscal informou a Seguradora acerca das alterações requerendo apólice do seguro retificada. | X | | | Apresentada garantia complementar |
| 3.2 | No caso de alteração substancial do objeto, verificar se é necessário acrescentar códigos na ART ou aumento significativo de área construída | | X | | Não há necessidade, sendo alterações pequenas no projeto |



PROAD n. 352/2024 DOC 415. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.XMYS.KQYC: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



INFORMAÇÃO DIGGPO Nº 28/2025

Em 17-06-2025

De: Eng. Adalberto Knoth

Para: Coordenador de Projetos e Obras


ADALBERTO
KNOTH
17/06/2025 16:13


JACSON
ALEXANDRE
PEREIRA
17/06/2025 17:35

Assunto: ENCAMINHAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO E MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE TUBARÃO

Proad pedido de providências: 7908/2025

Proad da obra: 352/2024

Senhor Coordenador de Projetos e Obras,

Encaminha-se para pagamento a 10ª medição dos serviços originais do contrato e a medição de reajuste contratual sobre a 10ª medição da obra de construção da nova sede do Fórum Trabalhista de Tubarão, em execução pela empresa CS Magon Construtora Ltda., por meio do contrato CE 352/2024.

A nota fiscal número 343 corresponde aos serviços da 10ª medição do contrato original, no valor de R\$ 163.499,88 e já está disponível no Sigeo.

A nota fiscal número 344 corresponde ao reajuste contratual da décima medição, no valor de R\$ 9.352,19 e já está disponível no Sigeo.

A seguir, um quadro resumo das medições.

| | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | NOTA FISCAL nº |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| MEDIÇÃO 10 | R\$ 127.835,06 | R\$ 35.664,82 | R\$ 163.499,88 | 343 |
| REAJUSTE MED 10 | R\$ 7.312,16 | R\$ 2.040,03 | R\$ 9.352,19 | 344 |

Portanto, o valor total desta medição é de R\$ 172.852,07 (cento e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sete centavos).


O valor ora medido inclui os serviços que foram executados no período de 30/04/2025 a 04/06/2025.

Não foram aplicados descontos em razão dos IMRs, uma vez que não foram observadas, no período de medição, infrações aos indicadores de resultados.

Quanto ao cumprimento do cronograma físico-financeiro, o valor medido ficou abaixo do valor previsto, sendo que o valor acumulado correspondente ao 10º mês atingiu 72,45% do total do contrato, enquanto que estava previsto atingir 74,53%. Assim, o valor medido acumulado corresponde a 97,21% do valor previsto acumulado, portanto, superior à 90% do valor previsto, sendo uma diferença ainda pequena, não sendo passível de aplicação de penalidade, nos termos do item "a" da cláusula dezesseis do contrato.



No gráfico a seguir pode-se verificar o andamento da obra até o momento:

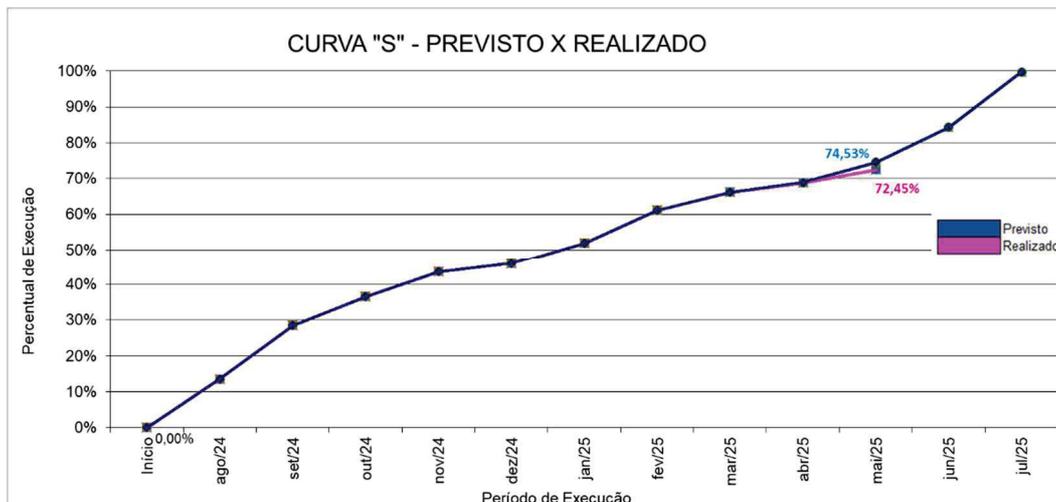

Também foram juntados no proad os seguintes documentos:

- Solicitação de medição 10, enviada por email;
- Planilha de medição 10;
- Tabela de IMR da medição 10;
- Diário de obras;
- Manifestação sobre emprego de egressos do sistema carcerário;
- Ficha de entrega de EPIs atualizada;
- Lista de verificação da medição 10.

Nesta medição não está sendo juntado cronograma físico-financeiro atualizado, pois será juntado um novo cronograma assim que for formalizado o terceiro aditivo do contrato, que já está em tramitação.

Solicita-se providências aos setores competentes para conferência dos demais documentos, bem como o encaminhamento ao pagamento do valor medido.

À sua consideração.

Adalberto Knoth

Eng. Civil – CREA 124.968-3

Divisão de Gestão e Governança de Projetos e Obras



De acordo.
À SECAD, para pagamento da medição.

Em 17-06-2025

Jacson Alexandre Pereira
Coordenador de Projetos e Obras



TERMO DE LIQUIDAÇÃO

Liquida(m)-se o(s) documento(s) abaixo relacionado(s) conforme Nota de Empenho, classificação da despesa e valor(es) informado(s) e em conformidade com o contrato próprio, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320 de 17/03/1964:

Processo: CE-352/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVO PREDIO DESTINADO AO FORUM TRABALHISTA DE TUBARÃO.

Fornecedor: 27.097.119/0001-80 C S MAGON CONSTRUTORA LTDA

EDINETE
VOLPATO
DUTRA DE
SOUZA
23/06/2025 16:51

| NOTA DE EMPENHO | NATUREZA DA DESPESA | DATA DE LIQUIDAÇÃO | OBSERVAÇÃO | COMPET. | DOCUMENTO | UNIDADE | VALOR |
|-----------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|-----------|---------|----------------|
| 2024NE000353 | 449051 91 OBRAS EM ANDAMENTO | 23/06/2025 | | 05/2025 | NF. 344 | SPO | R\$ 9.352,19 |
| 2024NE000353 | 449051 91 OBRAS EM ANDAMENTO | 23/06/2025 | | 05/2025 | NF. 343 | SPO | R\$ 163.499,88 |

Total Gerat: R\$ 172.852,07

2024NE000353 449051 R\$ 172.852,07

Certifico que, referente a competência da(s) liquidação(ões) acima relacionada(s), os documentos exigidos em contrato encontram-se atualizados, mantidas as condições de habilitação da licitação.

Florianópolis/SC, 23 de junho de 2025

Edinete Volpato Dutra de Souza



| | | | | | |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|--|--|
|  | MUNICÍPIO DE CAMBIRA | | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | |  |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | Número: | | |
| | CANADA, 320 - 86890000 - CENTRO - CAMBIRA - PR | | 344 | | |
| | Num. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS: | | Data Prestação: 06/06/2025 | | |
| | | Autenticidade: 251981295 | | | |

SITE AUTENTICIDADE: <https://cambira.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

| | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------------------|
| DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO | | | |
|  | Insc. Municipal: 00003098 | CNPJ/CPF: 27.097.119/0001-80 | Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO |
| | Nome/Razão Social: CS MAGON CONSTRUTORA LTDA | | |
| | Nome Fantasia: GLOCON ENGENHARIA | | |
| | Endereço: | | |
| | Rua CEU AZUL, 05 - RESIDENCIAL BELA VISTA | | |
| Município/UF: CAMBIRA-PR | | Insc. Estadual: | |
| Fone/Fax: | E-Mail: CONTATO@GLOCON.COM.BR | | CEP: 86.890-000 |

| | | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|
| DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO | | | |
| Insc. Municipal: | CNPJ/CPF: 02.482.005/0001-23 | Insc. Estadual: | |
| Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO | | | |
| Endereço: Rua Esteves Júnior, 395 - Centro | | | |
| Município/UF: Tubarão-SC | E-Mail: seof@trt12.jus.br | | CEP: 88.015-905 |
| Fone/Fax: (48) 3287-1000 | | | |

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DEFINIÇÃO DO SERVIÇO | | | |
| Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: | | | CNAE: |
| 702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA, DE TELECOMUNICACOES E DE OUTRAS SEMELHANÇAS, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE | | | 4120400 |
| Competência: | Local da Prestação do Serviço: | Situação da NFS-e: | Natureza da Operação: |
| 6/2025 | Tubarão-SC | EMITIDA | TRIBUTAÇÃO FORA DO |
| A.R.T: 9326494-7 | Nº Código da Obra: | Processo Obra: | Incorporação: NÃO |
| Nome Obra: Fórum Trabalhista de Tubarão | Resp. Obra: CAIO CESAR MAGON | | |
| Endereço Obra: CEP: , São Luiz, S/N , Bairro Vila Moema | | | |

| | |
|--|--|
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | |
| Reajuste Medição 10º da obra do novo prédio do Fórum Trabalhista de Tubarão Contrato Nº 352/2024 CNO 90.019.53356/75 INSS não retido de acordo com o IN 2110/2022, em se tratando de obra publica. Retenção de ISS 2,00% Retenção de IRPJ 1,20% Retenção de PIS 0,65% Retenção de COFINS 3,00% Retenção de CSLL 1,00% Pagamento: CNPJ: 27.097.119/0001-80 C S Magon Construtora LTDA/Glocon Engenharia Banco Grafeño digital - 274 Ag: 0001 C/C: 08111473-8 | |
| CERTIFICADO no docto PROAD nº 9 e 1.0 <i>Providência</i> | |

| ITENS DO SERVIÇO | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| Tributável | Descrição do Item | Quantidade | Valor Unitário | Desc. Incond. | Desc. Cond. | Valor Total |
| SIM | MAO DE OBRA | 1,00000 | 2.040,03 | 0,00 | 0,00 | 2.040,03 |
| SIM | MATERIAL | 1,00000 | 7.312,16 | 0,00 | 0,00 | 7.312,16 |

| TRIBUTOS INCIDENTES | | | |
|----------------------------|----------|-----------|--------|
| Tributo | Alíquota | Valor | Retido |
| ISSQN | 2,00000 | 187,04000 | Sim |
| PIS | 0,65000 | 60,79000 | Sim |
| COFINS | 3,00000 | 280,57000 | Sim |
| INSS | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| IR | 1,20000 | 112,23000 | Sim |
| CSLL | 1,00000 | 93,52000 | Sim |
| CPP | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| Impostos Federais | 0,00000 | 547,10000 | Não |
| Outras Retenções | | 0,00000 | Não |

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------------|
| UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | | Valor Líquido da NFS-e: | Valor Total da NFS-e: |
| Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o endereço eletrônico: https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml | | | |



| | | | | | |
|---|---|--|--|------------------------------------|--|
|  | MUNICÍPIO DE CAMBIRA | | | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica |  |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | Número: | |
| | CANADA, 320 - 86890000 - CENTRO - CAMBIRA - PR | | | 343 | |
| | Num. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS: | | | Data Prestação: 06/06/2025 | |
| | | | | Autenticidade: | |
| | | | | 480758159 | |

SITE AUTENTICIDADE: <https://cambira.oxy.elotech.com.br/lss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|
|  | Insc. Municipal: 00003098 | CNPJ/CPF: 27.097.119/0001-80 | Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO |
| | Nome/Razão Social: CS MAGON CONSTRUTORA LTDA | | |
| | Nome Fantasia: GLOCON ENGENHARIA | | |
| | Endereço: | | |
| | Rua CEU AZUL, 05 - RESIDENCIAL BELA VISTA | | |
| | Município/UF: CAMBIRA-PR | | |
| Fone/Fax: | | | Insc. Estadual: |
| E-Mail: CONTATO@GLOCON.COM.BR | | | CEP: 86.890-000 |

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Insc. Municipal: | CNPJ/CPF: 02.482.005/0001-23 | Insc. Estadual: | |
| Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO | | | |
| Endereço: Rua Esteves Júnior, 395 - Centro | | | |
| Município/UF: Tubarão-SC | | | |
| Fone/Fax: (48) 3287-1000 | | | |
| E-Mail: seof@trt12.jus.br | | | |
| | | | CEP: 88.015-905 |

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: | | | CNAE: |
| 702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA, DE TELECOMUNICACOES E DE OUTRAS SEMELHANÇAS, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE | | | 4120400 |
| Competência: | Local da Prestação do Serviço: | Situação da NFS-e: | Natureza da Operação: |
| 6/2025 | Tubarão-SC | EMITIDA | TRIBUTAÇÃO FORA DO |
| A.R.T: 9326494-7 | Nº Código da Obra: | Processo Obra: | Incorporação: NÃO |
| Nome Obra: Fórum Trabalhista de Tubarão | Resp. Obra: CAIO CESAR MAGON | | |
| Endereço Obra: CEP: , São Luiz, S/N , Bairro Vila Moema | | | |

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Medição 10ª da obra do novo prédio do Fórum Trabalhista de Tubarão
 Contrato Nº 352/2024
 CNO 90.019.53356/75
 INSS não retido de acordo com o IN 2110/2022, em se tratando de obra publica.
 Retenção de ISS 2,00%
 Retenção de IRPJ 1,20%
 Retenção de PIS 0,65%
 Retenção de COFINS 3,00%
 Retenção de CSLL 1,00%
 Pagamento:
 CNPJ: 27.097.119/0001-80 C S Magon Construtora LTDA/Glocon Engenharia
 Banco Grafeño digital - 274
 Ag: 0001
 C/C: 08111473-8

CERTIFICO no docto PROAD nº 9 e 10.

ITENS DO SERVIÇO

| Tributável | Descrição do Item | Quantidade | Valor Unitário | Desc. Incond. | Desc. Cond. | Valor Total |
|------------|-------------------|------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| SIM | MAO DE OBRA | 1,00000 | 127.835,06 | 0,00 | 0,00 | 127.835,06 |
| SIM | MATERIAL | 1,00000 | 35.664,82 | 0,00 | 0,00 | 35.664,82 |

TRIBUTOS INCIDENTES

| Tributo | Aliquota | Valor | Retido |
|-------------------|----------|-------------|--------|
| ISSQN | 2,00000 | 3.270,00000 | Sim |
| PIS | 0,65000 | 1.062,75000 | Sim |
| COFINS | 3,00000 | 4.905,00000 | Sim |
| INSS | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| IR | 1,20000 | 1.962,00000 | Sim |
| CSLL | 1,00000 | 1.635,00000 | Sim |
| CPP | 0,00000 | 0,00000 | Não |
| Impostos Federais | 0,00000 | 9.564,74000 | Não |
| Outras Retenções | | 0,00000 | Não |



UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
 Para verificar a autenticidade desta cópia,
 acesse o endereço: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Valor Líquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:

ATESTADO DE CONFORMIDADE PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE MÃO DE OBRA NÃO RESIDENTE

| LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL | | | |
|--|----------------------------|-----|---------------|
| CONTRATO/PROAD Nº CE- 352/2024 | UNIDADE: | | |
| EMPRESA CONTRATADA: | S C MAGON CONSTRUTORA LTDA | | |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO: | | | |
| RESPONSÁVEL: | | | |
| Item | SIM | NÃO | Não se aplica |
| 1. NA LIQUIDAÇÃO MENSAL DA NOTA FISCAL: | | | |
| 1.1 O Fiscal de Contrato atestou a conformidade na prestação dos serviços (Caso afirmativo informar o número do marcador do referido documento do respectivo proad) | X | | |
| 1.2 Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal | | | X |
| 1.3 Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho) | X | | |
| 1.4 Período da prestação de serviços está correto (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura) | | | X |
| 1.5 O gestor atestou a nota fiscal no SIGEO | X | | |
| 2. VALIDADE DAS CERTIDÕES NEGATIVAS: | | | |
| 2.1 Certidão negativa de débitos trabalhistas | X | | |
| 2.2 GRF (FGTS) | X | | |
| 2.3 Certidão conjunta de débitos relativos as Tributos Federais e Divida Ativa da União | X | | |
| 3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual | X | | |
| 3.1 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal | X | | |
| 3.2 | | | |
| 3.3 | | | |
| 3.4 | | | |
| 3.5 | | | |
| 3.6 | | | |
| 3.7 | | | |



25/06/25 14:04

USUARIO : HELOISA

PROAD n. 352/2024 DOC 421

DATA EMISSAO : 24Jun25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB002136

Cadastrado por 3806 - ANGELA TEREZINHA TEIXEIRA
Juntado em 17/07/2025

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 27097119/0001-80 - C S MAGON CONSTRUTORA LTDA

BANCO : 274 AGENCIA : 0001 CONTA CORRENTE : 81114738

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2025NP000811 SIST. ORIGEM : GESTAO COMP

NUMERO BANCARIO : 002949306-4

PROCESSO : CE-352/2024

VALOR : 159.283,18

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 24/06/25

PAGAMENTO DAS NFS-E 343 E 344 - 10ª MEDIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO DESTINADO AO FÓRUM TRABALHISTA DE TUBARÃO. CE-352/2024 - RETENÇÃO DE R\$ 3.457,04 REF. ISSRF. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - DCTFWEB - PROAD-1346/2025.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



PROAD n. 352/2024 DOC 421. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.VMRX.JDDH: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

25/06/25 14:04

USUARIO : HELOISA

PROAD n. 352/2024 DOC 421

DATA EMISSAO : 24Jun25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB002136

Cadastrado por 3806 - ANGELA TEREZINHA TEIXEIRA

Juntado em 17/07/2025

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 27097119/0001-80 - C S MAGON CONSTRUTORA LTDA

BANCO : 274 AGENCIA : 0001 CONTA CORRENTE : 81114738

VALOR : 159.283,18

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | VALOR |
|---|--------|-----------|-----------|----------|-------|
|---|--------|-----------|-----------|----------|-------|

| | | | | | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|
| 01 | 401006 | 2024NE000353400 | | 44905191 | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|

159.283,18

| | | | | | |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|
| 02 | 531814 | 2024NE000353 | 213110400 | 44905191 | |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|

159.283,18

| | | | | | |
|----|--------|----------------|--|--|--|
| 03 | 561602 | 1000000000400D | | | |
|----|--------|----------------|--|--|--|

159.283,18

LANCADO POR : 43050263920 - ALECIO

UG : 080013 24Jun25 16:10

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



PROAD n. 352/2024 DOC 421. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.VMRX.JDDH: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>
