



Adalberto Knoth <adalberto.knoth@trt12.jus.br>

11 Medição do Forum de Tubarão

1 mensagem



Isabelle Batista <financeiro2@glocon.com.br>

8 de julho de 2025 às 15:55

Para: Adalberto Knoth <adalberto.knoth@trt12.jus.br>



CARTAO PONTO TUBARAO.pdf

FICHAS DE EPI's FÓRUM TRABALHISTA DE
TUBARÃO-SC.pdf

GUIA E COMPROVANTE FGTS.pdf



GUIA E COMPROVANTE INSS.pdf

RELATORIO FGTS CS MAGON
CONSTRUTORA.pdfTENTATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EGRESSO
DO SISTEMA PENITENCIÁRIO.pdf

Boa tarde, tudo bem? Segue os documentos solicitados para a 11º Medição do Fórum de Tubarão

--

Atenciosamente,
Isabelle Bentes Batista
Analista Financeiro

11 anexos

CND MUNICIPAL 23.07 (1).pdf
78KCND TRABALHISTA 26.11.pdf
85KCND FEDERAL 06.09.pdf
78KCND FGTS 10.07 (1).pdf
103KCND ESTADUAL 16.07.pdf
25KPrévia 11º MEDIÇÃO - JUN.25 - R\$47.177,54.pdf
223KReajuste da medição 11.pdf
152K11 Medição.pdf
152KTRO_CONS_2024_IMR-MED 11.pdf
28KPROAD n. 352/2024 DOC 425. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.PFVY.HDPZ:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

 **MED11 - RDOs JUNHO 01.pdf**
1387K

 **MED11 - RDOs JUNHO 02.pdf**
2787K



PREVISÃO DE MEDIÇÃO - MEDIÇÃO 11																
CLIENTE:		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO/SC										Glocon SOLUÇÕES EM ENGENHARIA				
ENDEREÇO:		RUA SÃO LUIS, S/Nº, VILA MOEMA														
MUNICÍPIO:		TUBARÃO / SC														
OBRA:		IMPLANTAÇÃO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE TUBARÃO														
		B.D.I. APLICADO: 28,00%														
		BDI DIFERENCIADO: 17,00%														
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO	UN	QUANTIDADE		% ESTA MED	QUANT ACUMULADA	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO SEM B.D.I.	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I.	PREÇO TOTAL COM B.D.I.	PREÇO TOTAL ESTA MEDIÇÃO	TOTAL ACUMULADO	% EXECUTADO
					PREVISTA	ESTA MED										
1			DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO OBRA			-							R\$ 314.352,34	R\$ 2.527,35	R\$ 232.670,46	74,02%
1.1			DESPESAS TÉCNICAS INICIAIS			-							R\$ 6.056,46	R\$ -	R\$ 6.056,46	100,00%
1.1.1	COMP ART.001	COMPOSIÇÃO	DESPESAS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO CREA/SC	UN	2,00		0,00%	2,00	R\$ 223,65	R\$ -	R\$ 223,65	R\$ 286,27	R\$ 572,54	R\$ -	R\$ 572,54	100,00%
1.1.2	COMP ADM.009	COMPOSIÇÃO	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	CJ	1,00		0,00%	1,00	R\$ 1.950,65	R\$ -	R\$ 1.950,65	R\$ 2.496,83	R\$ 2.496,83	R\$ -	R\$ 2.496,83	100,00%
1.1.3	COMP ARQ.320-A	COMPOSIÇÃO	TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	UN	1,00		0,00%	1,00	R\$ 1.928,01	R\$ -	R\$ 1.928,01	R\$ 2.467,85	R\$ 2.467,85	R\$ -	R\$ 2.467,85	100,00%
1.1.4	COMP ARQ.321	COMPOSIÇÃO	TAXA DE LIGAÇÃO DE RAMAIS COM CADASTRO NOVOS NA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL E FORNECIMENTO DA CAIXA DE PROTEÇÃO HIDRÔMETRO	UN	1,00		0,00%	1,00	R\$ 405,66	R\$ -	R\$ 405,66	R\$ 519,24	R\$ 519,24	R\$ -	R\$ 519,24	100,00%
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			-							R\$ 308.295,68	R\$ 2.527,35	R\$ 226.614,00	73,51%
1.2.1	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00		0,10	8,77	R\$ 414,16	R\$ 8.011,29	R\$ 8.425,45	R\$ 10.784,58	R\$ 129.414,96	R\$ 1.078,46	R\$ 94.560,07	73,07%
1.2.2	COMP ADM.004	COMPOSIÇÃO	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 6 horas por dia	MES	12,00		0,10	8,77	R\$ 222,97	#####	R\$ 11.319,46	R\$ 14.488,91	R\$ 173.866,92	R\$ 1.448,89	R\$ 127.039,93	73,07%
1.2.3	COMP ADM.005	COMPOSIÇÃO	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 4 horas por dia	MES	2,00		0,00%	2,00	R\$ 150,96	R\$ 1.807,63	R\$ 1.958,59	R\$ 2.507,00	R\$ 5.014,00	R\$ -	R\$ 5.014,00	100,00%
2			LIMPEZA DO TERRENO E LOCAÇÃO			-							R\$ 14.787,87	R\$ -	R\$ 14.787,87	100,00%
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERILIZAF_05/2018	M2	2.466,40		0,00%	2.466,40	R\$ 0,22	R\$ 0,16	R\$ 0,38	R\$ 0,48	R\$ 1.183,87	R\$ -	R\$ 1.183,87	100,00%
2.2	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	50,00		0,00%	50,00	R\$ 1,50	R\$ 5,96	R\$ 7,46	R\$ 9,55	R\$ 477,50	R\$ -	R\$ 477,50	100,00%
2.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	150,00		0,00%	150,00	R\$ 44,32	R\$ 24,04	R\$ 68,36	R\$ 87,51	R\$ 13.126,50	R\$ -	R\$ 13.126,50	100,00%
3			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			-							R\$ 68.234,08	R\$ -	R\$ 66.968,76	96,12%
3.1	COMP ARQ.302	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER 2,3x6,00 ALTURA 2,50m PARA USO ADMINISTRATIVO NA OBRA	MES	9,00		0,00%	9,00	R\$ 781,85	R\$ -	R\$ 781,85	R\$ 1.000,77	R\$ 9.006,93	R\$ -	R\$ 9.006,93	100,00%
3.2	93585	SINAPI	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00		0,00%	6,00	R\$ 1.253,61	R\$ 197,67	R\$ 1.451,28	R\$ 1.857,64	R\$ 11.145,84	R\$ -	R\$ 11.145,84	100,00%
3.3	COMP HID.009	POSIÇÃO PRO	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	CJ	1,00		0,00%	1,00	R\$ 1.253,00	R\$ 968,24	R\$ 2.221,24	R\$ 2.843,18	R\$ 2.843,18	R\$ -	R\$ 2.843,18	100,00%
3.4	10527	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1,ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00' M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	MXMES	72,00		0,00%	60,00	R\$ 24,60	R\$ -	R\$ 24,60	R\$ 31,48	R\$ 2.266,56	R\$ -	R\$ 1.888,80	83,33%
3.5	10777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	9,00		0,00%	9,00	R\$ 887,72	R\$ -	R\$ 887,72	R\$ 1.136,29	R\$ 10.226,61	R\$ -	R\$ 10.226,61	100,00%
3.6	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	72,00		0,00%	60,00	R\$ 2,17	R\$ 13,95	R\$ 16,12	R\$ 20,63	R\$ 1.485,36	R\$ -	R\$ 1.237,80	83,33%
3.7	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	440,00		0,00%	220,00	R\$ 0,33	R\$ 2,02	R\$ 2,35	R\$ 3,00	R\$ 1.320,00	R\$ -	R\$ 660,00	50,00%
3.8	COMP ARQ.303	SINAPI ADAPTAD	TAPUME COM TELHA METÁLICA REAPROVEITÁVEL	M2	440,00		0,00%	440,00	R\$ 37,78	R\$ 15,41	R\$ 53,19	R\$ 68,09	R\$ 29.959,60	R\$ -	R\$ 29.959,60	100,00%
4			SERVIÇOS GERAIS			-							R\$ 13.542,17	R\$ -	R\$ 11.611,71	86,74%
4.1	COMP ARQ.093	SINAPI / ADAPTAD	CARGA DE ENTULHO DE MODO MANUAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ E DESCARGA LIVRE	M3	50,00		0,00%	44,00	R\$ 13,79	R\$ 44,68	R\$ 58,47	R\$ 74,84	R\$ 3.742,00	R\$ -	R\$ 3.292,96	88,00%
4.2	COMP ARQ.090	SINAPI / ADAPTAD	LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA	DIA	270,00		0,00%	220,00	R\$ 3,17	R\$ 14,51	R\$ 17,68	R\$ 22,64	R\$ 6.112,80	R\$ -	R\$ 4.980,80	81,48%
4.3	COMP ARQ.096	SINAPI / ADAPTAD	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,50		0,00%	1,50	R\$ 482,69	R\$ 56,30	R\$ 538,99	R\$ 689,91	R\$ 1.034,87	R\$ -	R\$ 1.034,87	100,00%
4.4	COMP ARQ.091	SINAPI / ADAPTAD	PROTEÇÃO COM LONA PLÁSTICA	M2	100,00		0,00%	80,00	R\$ 2,09	R\$ 0,95	R\$ 3,04	R\$ 3,89	R\$ 389,00	R\$ -	R\$ 311,20	80,00%
4.5	COMP ARQ.092	SINAPI / ADAPTAD	TRANSPORTE DE MATERIAIS E DE ENTULHO	M3	50,00		0,00%	44,00	R\$ 6,34	R\$ 29,03	R\$ 35,37	R\$ 45,27	R\$ 2.263,50	R\$ -	R\$ 1.991,88	88,00%
5			TRABALHOS EM TERRA			-							R\$ 179.616,69	R\$ -	R\$ 110.582,10	61,57%
5.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	2,95		0,00%	2,95	R\$ 50,20	R\$ 15,74	R\$ 65,94	R\$ 84,40	R\$ 248,98	R\$ -	R\$ 248,98	100,00%

PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JHXB.NTDD: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

5.2	COMP.ARQ.337	SNAPI	ATERRO MECANIZADO COM SOLO ARGILO-ARENOSO	M3	2.019,60		0,00%	1.173,29	R\$	41,71	R\$	0,21	R\$	41,92	R\$	53,66	R\$	108.371,74	R\$	-	R\$	62.953,92	100,00%
5.3	100973	SNAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	2.628,43		0,00%	1.528,11	R\$	6,42	R\$	1,67	R\$	8,09	R\$	10,36	R\$	27.230,53	R\$	-	R\$	15.831,21	100,00%
5.4	96385	SNAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	2.019,60		0,00%	1.081,24	R\$	7,19	R\$	2,99	R\$	10,17	R\$	13,02	R\$	26.295,19	R\$	-	R\$	14.077,74	100,00%
5.5	93358	SNAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	2,95		0,00%	2,95	R\$	12,51	R\$	57,44	R\$	69,95	R\$	89,94	R\$	263,70	R\$	-	R\$	263,70	100,00%
5.6	101616	SNAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_06/2020	M2	154,56		0,00%	154,55	R\$	0,81	R\$	4,56	R\$	5,37	R\$	6,87	R\$	1.061,79	R\$	-	R\$	1.061,79	100,00%
5.7	95876	SNAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	6.841,00		0,00%	6.841,00	R\$	1,64	R\$	0,20	R\$	1,84	R\$	2,36	R\$	16.144,76	R\$	-	R\$	16.144,76	100,00%
6			INFRAESTRUTURA			-											R\$	840.696,18	R\$	-	R\$	840.696,08	100,00%
6.1			FUNDAÇÕES DO PRÉDIO			-											R\$	714.787,39	R\$	-	R\$	714.787,39	100,00%
6.1.1	96546	SNAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	829,00		0,00%	829,00	R\$	9,71	R\$	2,49	R\$	12,19	R\$	15,61	R\$	12.940,69	R\$	-	R\$	12.940,69	100,00%
6.1.2	96546	SNAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	3.438,00		0,00%	3.438,00	R\$	9,71	R\$	2,49	R\$	12,19	R\$	15,61	R\$	53.667,18	R\$	-	R\$	53.667,18	100,00%
6.1.3	96547	SNAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	11.684,00		0,00%	11.684,00	R\$	8,42	R\$	1,84	R\$	10,26	R\$	13,13	R\$	153.410,92	R\$	-	R\$	153.410,92	100,00%
6.1.4	96548	SNAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	4.813,00		0,00%	4.813,00	R\$	8,31	R\$	1,31	R\$	9,62	R\$	12,31	R\$	59.248,03	R\$	-	R\$	59.248,03	100,00%
6.1.5	96544	SNAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	427,00		0,00%	427,00	R\$	10,31	R\$	4,62	R\$	14,93	R\$	19,12	R\$	8.164,24	R\$	-	R\$	8.164,24	100,00%
6.1.6	96545	SNAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	627,00		0,00%	627,00	R\$	10,42	R\$	3,34	R\$	13,76	R\$	17,61	R\$	11.047,47	R\$	-	R\$	11.047,47	100,00%
6.1.7	97092	SNAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196, AF_09/2021	KG	2.678,00		0,00%	2.678,00	R\$	11,31	R\$	0,61	R\$	11,91	R\$	15,25	R\$	40.839,50	R\$	-	R\$	40.839,50	100,00%
6.1.8	95601	SNAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM, AF_05/2021	UN	32,00		0,00%	32,00	R\$	2,36	R\$	11,13	R\$	13,49	R\$	17,27	R\$	552,64	R\$	-	R\$	552,64	100,00%
6.1.9	97087	SNAPI	CÂMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	M2	660,00		0,00%	660,00	R\$	1,95	R\$	0,35	R\$	2,30	R\$	2,95	R\$	1.947,00	R\$	-	R\$	1.947,00	100,00%
6.1.10	97087	SNAPI	CÂMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	M2	660,00		0,00%	660,00	R\$	1,95	R\$	0,35	R\$	2,30	R\$	2,95	R\$	1.947,00	R\$	-	R\$	1.947,00	100,00%
6.1.11	97084	SNAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF_09/2021	M2	660,00		0,00%	660,00	R\$	0,11	R\$	0,47	R\$	0,58	R\$	0,74	R\$	488,40	R\$	-	R\$	488,40	100,00%
6.1.12	97096	SNAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_09/2021	M3	129,32		0,00%	129,32	R\$	553,35	R\$	14,53	R\$	567,88	R\$	726,88	R\$	94.000,12	R\$	-	R\$	94.000,12	100,00%
6.1.13	97082	SNAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER, AF_09/2021	M3	33,28		0,00%	33,28	R\$	9,19	R\$	42,16	R\$	51,35	R\$	65,72	R\$	2.187,16	R\$	-	R\$	2.187,16	100,00%
6.1.14	100957	SNAPI	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSIVE EMENDA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF_12/2019	M	1.280,00		0,00%	1.280,00	R\$	120,58	R\$	12,55	R\$	133,13	R\$	170,41	R\$	218.124,80	R\$	-	R\$	218.124,80	100,00%
6.1.15	97086	SNAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	M2	140,35		0,00%	140,35	R\$	68,85	R\$	71,71	R\$	140,56	R\$	179,91	R\$	25.250,37	R\$	-	R\$	25.250,37	100,00%
6.1.16	96624	SNAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, AF_06/2017	M3	99,00		0,00%	99,00	R\$	111,49	R\$	26,49	R\$	137,97	R\$	176,61	R\$	17.484,39	R\$	-	R\$	17.484,39	100,00%
6.1.17	COMP. EST. 002	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, DE EQUIPAMENTO PARA ESTACQUEAMENTO	UN	1,00		0,00%	1,00	R\$	10.541,78	R\$	-	R\$	10.541,78	R\$	13.493,48	R\$	13.493,48	R\$	-	R\$	13.493,48	100,00%
6.2			FUNDAÇÃO DO MURO, CONTENÇÕES E ESCADA			-											R\$	119.603,69	R\$	-	R\$	119.603,59	100,00%
6.2.1	96543	SNAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	261,90		0,00%	261,90	R\$	9,84	R\$	6,37	R\$	16,21	R\$	20,75	R\$	5.434,43	R\$	-	R\$	5.434,43	100,00%
6.2.2	96546	SNAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	965,19		0,00%	965,19	R\$	9,71	R\$	2,49	R\$	12,19	R\$	15,61	R\$	15.066,62	R\$	-	R\$	15.066,62	100,00%
6.2.3	96547	SNAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	94,45		0,00%	94,45	R\$	8,42	R\$	1,84	R\$	10,26	R\$	13,13	R\$	1.240,13	R\$	-	R\$	1.240,12	100,00%
6.2.4	96544	SNAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	560,16		0,00%	560,16	R\$	10,31	R\$	4,62	R\$	14,93	R\$	19,12	R\$	10.710,26	R\$	-	R\$	10.710,26	100,00%
6.2.5	96558	SNAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_11/2019	M3	32,26		0,00%	32,26	R\$	601,51	R\$	21,02	R\$	622,54	R\$	796,85	R\$	25.706,38	R\$	-	R\$	25.706,38	100,00%
6.2.6	96521	SNAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETRO-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	M3	31,00		0,00%	31,00	R\$	26,34	R\$	13,33	R\$	39,66	R\$	50,77	R\$	1.573,87	R\$	-	R\$	1.573,87	100,00%
6.2.7	96535	SNAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	257,13		0,00%	257,13	R\$	94,90	R\$	77,12	R\$	172,02	R\$	220,19	R\$	56.617,45	R\$	-	R\$	56.617,45	100,00%

PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JHXB.NTDD: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



6.2.8	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	4,22		0,00%	4,22	R\$ 384,08	R\$ 218,43	R\$ 602,52	R\$ 771,22	R\$ 3.254,55	R\$ -	R\$ 3.254,47	100,00%
6.3			FUNDAÇÃO DO DEPÓSITO DE LIXO			-							R\$ 4.215,00	R\$ -	R\$ 4.215,00	100,00%
6.3.1	COMP. EST. 003	INAPI ADAPTAD	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-335	KG	110,86		0,00%	110,86	R\$ 10,00	R\$ 1,19	R\$ 11,19	R\$ 14,32	R\$ 1.587,52	R\$ -	R\$ 1.587,52	100,00%
6.3.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	10,32		0,00%	10,32	R\$ 1,95	R\$ 0,35	R\$ 2,30	R\$ 2,95	R\$ 30,45	R\$ -	R\$ 30,45	100,00%
6.3.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	10,32		0,00%	10,32	R\$ 0,54	R\$ 2,28	R\$ 2,83	R\$ 3,62	R\$ 37,37	R\$ -	R\$ 37,37	100,00%
6.3.4	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	2,00		0,00%	2,00	R\$ 553,35	R\$ 14,53	R\$ 567,88	R\$ 726,88	R\$ 1.453,76	R\$ -	R\$ 1.453,76	100,00%
6.3.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	4,63		0,00%	4,63	R\$ 68,85	R\$ 71,71	R\$ 140,56	R\$ 179,91	R\$ 832,44	R\$ -	R\$ 832,44	100,00%
6.3.6	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_08/2017	M3	1,55		0,00%	1,55	R\$ 111,49	R\$ 26,49	R\$ 137,97	R\$ 176,61	R\$ 273,46	R\$ -	R\$ 273,46	100,00%
6.4			FUNDAÇÃO DA CABINE DE MEDIÇÃO			-							R\$ 2.090,10	R\$ -	R\$ 2.090,10	100,00%
6.4.1	COMP. EST. 003	INAPI ADAPTAD	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-335	KG	52,04		0,00%	52,04	R\$ 10,00	R\$ 1,19	R\$ 11,19	R\$ 14,32	R\$ 745,21	R\$ -	R\$ 745,21	100,00%
6.4.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	4,85		0,00%	4,84	R\$ 1,95	R\$ 0,35	R\$ 2,30	R\$ 2,95	R\$ 14,29	R\$ -	R\$ 14,29	100,00%
6.4.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	4,85		0,00%	4,85	R\$ 0,54	R\$ 2,28	R\$ 2,83	R\$ 3,62	R\$ 17,54	R\$ -	R\$ 17,54	100,00%
6.4.4	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,97		0,00%	0,97	R\$ 553,35	R\$ 14,53	R\$ 567,88	R\$ 726,88	R\$ 704,35	R\$ -	R\$ 704,35	100,00%
6.4.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	2,67		0,00%	2,67	R\$ 68,85	R\$ 71,71	R\$ 140,56	R\$ 179,91	R\$ 480,36	R\$ -	R\$ 480,36	100,00%
6.4.6	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_08/2017	M3	0,73		0,00%	0,73	R\$ 111,49	R\$ 26,49	R\$ 137,97	R\$ 176,61	R\$ 128,35	R\$ -	R\$ 128,35	100,00%
7			SUPRAESTRUTURA - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO			-							R\$ 53.999,07	R\$ -	R\$ 53.999,07	100,00%
7.1			PILARES, VIGAS E CINTAS			-							R\$ 38.999,22	R\$ -	R\$ 38.999,22	100,00%
7.1.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,52		0,00%	28,52	R\$ 9,28	R\$ 3,82	R\$ 13,10	R\$ 16,77	R\$ 478,28	R\$ -	R\$ 478,28	100,00%
7.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	119,75		0,00%	119,75	R\$ 9,49	R\$ 1,10	R\$ 10,59	R\$ 13,55	R\$ 1.622,61	R\$ -	R\$ 1.622,61	100,00%
7.1.3	COMP. EST. 001	INAPI ADAPTAD	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,72		0,00%	2,72	R\$ 549,31	R\$ 21,00	R\$ 570,31	R\$ 730,00	R\$ 1.985,17	R\$ -	R\$ 1.985,17	100,00%
7.1.4	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	27,70		0,00%	27,70	R\$ 104,64	R\$ 20,70	R\$ 125,33	R\$ 160,43	R\$ 4.443,91	R\$ -	R\$ 4.443,91	100,00%
7.1.5	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	45,70		0,00%	45,70	R\$ 119,79	R\$ 21,84	R\$ 141,63	R\$ 181,28	R\$ 8.284,50	R\$ -	R\$ 8.284,50	100,00%
7.1.6	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,42		0,00%	15,42	R\$ 87,82	R\$ 50,36	R\$ 138,19	R\$ 176,88	R\$ 2.728,30	R\$ -	R\$ 2.728,30	100,00%
7.1.7	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	52,30		0,00%	52,30	R\$ 107,14	R\$ 20,70	R\$ 127,84	R\$ 163,63	R\$ 8.557,85	R\$ -	R\$ 8.557,85	100,00%
7.1.8	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	58,30		0,00%	58,30	R\$ 124,27	R\$ 21,78	R\$ 146,05	R\$ 186,94	R\$ 10.898,60	R\$ -	R\$ 10.898,60	100,00%
7.2			LAJE TRELIÇADA - RESERVATÓRIOS			-							R\$ 8.747,15	R\$ -	R\$ 8.747,15	100,00%
7.2.1	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	78,06		0,00%	78,06	R\$ 13,12	R\$ 1,09	R\$ 14,21	R\$ 18,19	R\$ 1.419,910000	R\$ -	R\$ 1.419,910000	100,00%
7.2.2	COMP. EST. 001	INAPI ADAPTAD	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,15		0,00%	1,15	R\$ 549,31	R\$ 21,00	R\$ 570,31	R\$ 730,00	R\$ 842,400000	R\$ -	R\$ 842,400000	100,00%
7.2.3	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIDADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+4). AF_11/2020, PA	M2	25,10		0,00%	25,10	R\$ 175,49	R\$ 26,35	R\$ 201,84	R\$ 258,36	R\$ 6.484,840000	R\$ -	R\$ 6.484,840000	100,00%
7.3			LAJE TRELIÇADA - DEPÓSITO DE LIXO			-							R\$ 4.112,67	R\$ -	R\$ 4.112,67	100,00%
7.3.1	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	35,95		0,00%	35,95	R\$ 11,31	R\$ 0,61	R\$ 11,91	R\$ 15,25	R\$ 548,24	R\$ -	R\$ 548,24	100,00%
7.3.2	COMP. EST. 001	INAPI ADAPTAD	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,50		0,00%	0,50	R\$ 549,31	R\$ 21,00	R\$ 570,31	R\$ 730,00	R\$ 361,95	R\$ -	R\$ 361,95	100,00%



PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JHXB.NTDD: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

7.3.3	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOMADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8-4); AF_11/2020_PA	M2	12,40	-	0,00%	12,40	R\$ 175,49	R\$ 26,35	R\$ 201,84	R\$ 258,36	R\$ 3.202,48	R\$ -	R\$ 3.202,48	100,00%
7.4			LAJE TRELÇADA - CABINE DE MEDIÇÃO			-							R\$ 2.140,03	R\$ -	R\$ 2.140,03	100,00%
7.4.1	97092	SINAPI	ARMACÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196; AF_09/2021	KG	22,10	-	0,00%	22,10	R\$ 11,31	R\$ 0,61	R\$ 11,91	R\$ 15,25	R\$ 337,03	R\$ -	R\$ 337,03	100,00%
7.4.2	COMP-EST-001	INAPI-ADAPTADA	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU REVIRADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO; AF_12/2015	M3	0,25	-	0,00%	0,25	R\$ 549,31	R\$ 21,00	R\$ 570,31	R\$ 730,00	R\$ 183,08	R\$ -	R\$ 183,08	100,00%
7.4.3	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOMADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8-4); AF_11/2020_PA	M2	6,27	-	0,00%	6,27	R\$ 175,49	R\$ 26,35	R\$ 201,84	R\$ 258,36	R\$ 1.619,92	R\$ -	R\$ 1.619,92	100,00%
8			SUPRAESTRUTURA - ESTRUTURAS METÁLICAS			-							R\$ 341.888,95	R\$ -	R\$ 341.888,95	100,00%
8.1	100765	SINAPI	PLAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUI MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; AF_01/2020_PSA	KG	2.146,52	-	0,00%	2.146,52	R\$ 18,23	R\$ 0,39	R\$ 18,62	R\$ 23,83	R\$ 51.151,57	R\$ -	R\$ 51.151,57	100,00%
8.2	100763	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUI MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; AF_01/2020_PSA	KG	1.281,21	-	0,00%	1.281,21	R\$ 18,10	R\$ 0,86	R\$ 18,96	R\$ 24,27	R\$ 31.094,97	R\$ -	R\$ 31.094,97	100,00%
8.3	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO FNK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUI PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; AF_01/2020_PSA	KG	12.555,24	-	0,00%	12.555,24	R\$ 15,33	R\$ 0,83	R\$ 16,16	R\$ 20,68	R\$ 259.642,36	R\$ -	R\$ 259.642,36	100,00%
9			PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS			-							R\$ 303.568,07	R\$ -	R\$ 303.568,07	73,60%
9.1			EXTERNAS			-							R\$ 164.707,78	R\$ -	R\$ 164.707,78	92,57%
9.1.1	101155	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA; AF_05/2020	M2	696,17	-	0,00%	696,00	R\$ 139,56	R\$ 31,66	R\$ 171,22	R\$ 219,16	R\$ 152.572,29	R\$ -	R\$ 152.572,29	94,23%
9.1.2	101154	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA; AF_05/2020	M2	96,96	-	0,00%	18,00	R\$ 97,55	R\$ 24,03	R\$ 121,57	R\$ 155,61	R\$ 5.751,35	R\$ -	R\$ 5.751,35	48,70%
9.1.3	100210	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXXM); AF_07/2019	UNXXM	61,46	-	0,00%	76,78	R\$ 2,61	R\$ 12,11	R\$ 14,72	R\$ 18,85	R\$ 1.535,50	R\$ -	R\$ 1.535,50	94,23%
9.1.4	93203	SINAPI	FIKAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA; AF_03/2016	M	256,00	-	0,00%	235,00	R\$ 12,87	R\$ 1,83	R\$ 14,70	R\$ 18,94	R\$ 4.848,64	R\$ -	R\$ 4.848,64	91,80%
9.2			INTERIAS			-							R\$ 138.860,79	R\$ -	R\$ 138.860,79	51,11%
9.2.1	101154	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA; AF_05/2020	M2	230,38	-	0,00%	230,37	R\$ 97,55	R\$ 24,03	R\$ 121,57	R\$ 155,61	R\$ 35.848,65	R\$ -	R\$ 35.848,65	100,00%
9.2.2	COMP-ARQ-025	INAPI-ADAPTADA	BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 10MM, E ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, MEDINDO 1,60 X 1,80M, COM PORTA DE CORRER	M2	2,88	-	0,00%	-	R\$ 320,18	R\$ 57,73	R\$ 377,91	R\$ 483,73	R\$ 1.393,14	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.2.3	COMP-ARQ-087	COMPOSIÇÃO	DIVISÓRIA EM PAINEL MSD-COMEÇA E-30MM, CEGA, EUCATEX UV COR BRANCO MAX E PERFIS DE AÇO SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO COR BRANCO NEVE, REF. DIVILUX DA EUCATEX OU EQUIVALENTE	M2	126,10	-	0,00%	-	R\$ 124,79	R\$ 51,15	R\$ 175,94	R\$ 225,20	R\$ 28.397,27	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.2.4	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA; AF_01/2021_PS	M2	52,54	-	0,00%	-	R\$ 305,95	R\$ 48,25	R\$ 354,20	R\$ 453,37	R\$ 23.820,97	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.2.5	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CRIZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVELY FERRAGENS; AF_01/2021	M2	14,11	-	0,00%	-	R\$ 662,52	R\$ 61,83	R\$ 724,34	R\$ 927,16	R\$ 13.084,08	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.2.6	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE; AF_01/2021_PS	M2	3,72	-	0,00%	-	R\$ 227,73	R\$ 23,35	R\$ 251,08	R\$ 321,38	R\$ 1.194,38	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.2.7	COMP-ARQ-031	INAPI / COTAÇÃO	SOLAMENTO ACÚSTICO COM LÁ DE ROCHA, ESPESSURA 50MM	M2	122,65	-	0,00%	122,65	R\$ 69,01	R\$ 10,23	R\$ 79,24	R\$ 101,42	R\$ 12.438,76	R\$ -	R\$ 12.438,76	100,00%
9.2.8	COMP-ARQ-001	INAPI-ADAPTADA	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES (SI) E OUTRA FACE SIMPLES (RU) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS SIMPLES	M2	20,85	-	0,00%	20,85	R\$ 148,76	R\$ 18,12	R\$ 166,87	R\$ 213,60	R\$ 4.453,56	R\$ -	R\$ 4.453,56	100,00%
9.2.9	96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS; AF_07/2023_PS	M2	143,34	-	0,00%	143,34	R\$ 85,98	R\$ 13,38	R\$ 99,36	R\$ 127,18	R\$ 18.229,98	R\$ -	R\$ 18.229,98	100,00%
10			COBERTURA			-							R\$ 180.414,18	R\$ -	R\$ 180.414,18	96,64%



PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JHXB.NTDD: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

10.1	COMP.ARQ.324	SINAPI ADAPTADA	ALGERÇOZ METÁLICO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 16CM	M	59,27		0,00%	59,27	R\$	22,51	R\$	5,30	R\$	27,81	R\$	35,60	R\$	2.110,01	R\$	-	R\$	2.110,01	100,00%
10.2	COMP.ARQ.034	SINAPI/ ADAPTADA	ALGERÇOZ METÁLICO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 25CM	M	8,32		0,00%	8,32	R\$	39,92	R\$	5,97	R\$	45,89	R\$	58,74	R\$	488,72	R\$	-	R\$	488,72	100,00%
10.3	100287	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24 CORTE 93 UNIDADE: MXXM, AF. 07/2019	MXXM	2,37		0,00%	2,37	R\$	1,92	R\$	8,90	R\$	10,81	R\$	13,84	R\$	32,81	R\$	-	R\$	32,81	100,00%
10.4	COMP.ARQ.325	SINAPI ADAPTADA	CALHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 65 CM	M	59,27		0,00%	51,84	R\$	56,60	R\$	11,06	R\$	67,66	R\$	86,60	R\$	5.132,78	R\$	-	R\$	4.489,34	87,46%
10.5	COMP.ARQ.326	SINAPI ADAPTADA	CAPEAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 93CM	M	162,43		0,00%	127,00	R\$	29,80	R\$	5,30	R\$	35,10	R\$	44,93	R\$	7.297,98	R\$	-	R\$	5.706,11	78,19%
10.6	94231	SINAPI	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M	108,58		0,00%	105,00	R\$	39,92	R\$	5,95	R\$	45,87	R\$	58,71	R\$	6.374,73	R\$	-	R\$	6.164,55	96,70%
10.7	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOLUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF. 07/2019	M2	8,84		0,00%	8,84	R\$	61,95	R\$	3,29	R\$	65,24	R\$	83,51	R\$	736,23	R\$	-	R\$	736,23	100,00%
10.8	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF. 07/2019	M2	653,69		0,00%	653,69	R\$	186,44	R\$	2,07	R\$	188,51	R\$	241,30	R\$	157.735,40	R\$	-	R\$	157.735,40	100,00%
10.9	100275	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XXM), AF. 07/2019	M2XXM	26,50		0,00%	26,50	R\$	2,63	R\$	12,22	R\$	14,85	R\$	19,00	R\$	503,52	R\$	-	R\$	503,50	100,00%
11			IMPERMEABILIZAÇÃO			-											R\$	19.979,81	R\$	-	R\$	19.024,86	95,22%
11.1			IMPERMEABILIZAÇÃO FUNDAÇÕES			-											R\$	18.927,23	R\$	-	R\$	18.927,23	100,00%
11.1.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO, AF. 09/2023	M2	333,05		0,00%	333,05		33,94		10,45		44,40		56,83	R\$	18.927,23	R\$	-	R\$	18.927,23	100,00%
11.2			IMPERMEABILIZAÇÕES INTERNAS			-											R\$	97,63	R\$	-	R\$	97,63	100,00%
11.2.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃO, REFORÇADA COM VEU DE POLIÉSTER (MAV), AF. 09/2023	M2	1,32		0,00%	1,32		27,21		24,08		51,29		65,65	R\$	86,66	R\$	-	R\$	86,66	100,00%
11.2.2	98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV), AF. 09/2023	UN	1,00		0,00%	1,00		5,25		3,32		8,57		10,97	R\$	10,97	R\$	-	R\$	10,97	100,00%
11.3			IMPERMEABILIZAÇÕES COBERTURAS			-											R\$	954,95	R\$	-	R\$	-	0,00%
11.3.1	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃO, AF. 09/2023	M2	18,19		0,00%	-	R\$	27,11	R\$	13,90	R\$	41,01	R\$	52,49	R\$	954,95	R\$	-	R\$	-	0,00%
12			ESQUADRIAS			-											R\$	231.098,27	R\$	-	R\$	125.391,87	54,26%
12.1			ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO			-											R\$	151.408,61	R\$	-	R\$	125.391,87	82,82%
12.1.1	COMP.ARQ.007	COMPOSIÇÃO	JA01 - JANELA MAXIM-AR 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, VIDRO BOREAL 4MM, MEDINDO 120X60160CM, LINHA DOLD	UN	2,00		0,00%	2,00		622,78		155,70		778,48		996,45	R\$	1.992,90	R\$	-	R\$	1.992,90	100,00%
12.1.2	COMP.ARQ.008	COMPOSIÇÃO	JA02 - JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA,04 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA, VIDRO COMUM 6 MM, MEDINDO 360X175/100	UN	2,00		0,00%	2,00		3.109,55		777,39		3.886,94		4.975,28	R\$	9.950,56	R\$	-	R\$	9.950,56	100,00%
12.1.3	COMP.ARQ.009	COMPOSIÇÃO	JA05 - JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, 03 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA, VIDRO COMUM 6 MM, MEDINDO 270X175/100	UN	8,00		0,00%	8,00		2.581,23		645,31		3.226,54		4.129,97	R\$	33.039,76	R\$	-	R\$	33.039,76	100,00%
12.1.4	COMP.ARQ.005	COMPOSIÇÃO	JA08 - JANELA MAXIM-AR COM BANDEIRA FIXA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETA, CINCO FOLHAS, EM VIDRO COMUM 6mm, MEDINDO 450X175/100 CM	UN	6,00		0,00%	6,00		4.016,44		1.004,11		5.020,55		6.426,30	R\$	38.557,80	R\$	-	R\$	38.557,80	100,00%
12.1.5	COMP.ARQ.006	COMPOSIÇÃO	JA06 - JANELA MAXIM-A DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA,2 FOLHAS, VIDRO BOREAL 4MM, MEDINDO 150X60X/100	UN	12,00		0,00%	2,00		584,10		146,02		730,12		934,55	R\$	11.214,60	R\$	-	R\$	1.868,10	16,67%
12.1.6	COMP.ARQ.010	COMPOSIÇÃO	JAV01 - JANELA VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA/FIXA, MEDINDO 110X90 CM, LINHA SUPREMA	UN	1,00		0,00%	-		383,16		95,79		478,95		613,06	R\$	613,06	R\$	-	R\$	-	0,00%
12.1.7	COMP.ARQ.013	COMPOSIÇÃO	PAV209 - PORTA VENEZIANADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, UMA FOLHA, MEDINDO 90X210 CM, COM CONTRAMARCO	UN	4,00		0,00%	-		1.125,63		281,41		1.407,04		1.801,01	R\$	7.204,04	R\$	-	R\$	-	0,00%
12.1.8	COMP.ARQ.015	COMPOSIÇÃO	PAV02 - PORTA VENEZIANADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO 04 FOLHA DE CORRER 370X210cm, COM FECHADURA MAÇANETA TIPO ALAVANCA	UN	1,00		0,00%	-		4.605,36		1.151,34		5.756,70		7.368,58	R\$	7.368,58	R\$	-	R\$	-	0,00%
12.1.9	COMP.ARQ.014	COMPOSIÇÃO	PAV201 - PORTA VENEZIANADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, UMA FOLHA, MEDINDO 70X210 CM, COM FECHADURA MAÇANETA TIPO ALAVANCA	UN	1,00		0,00%	-		928,47		232,12		1.160,59		1.485,56	R\$	1.485,56	R\$	-	R\$	-	0,00%
12.1.10	COMP.ARQ.063	COTAÇÃO	GRA-01 - 360X175CM - GRADE FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, EM TUBO DE 19MM COLINDRICO COM ESPAÇAMENTO DE 10 CM ENTRE SI	UN	2,00		0,00%	2,00		4.996,31		1.249,08		6.245,38		7.994,09	R\$	15.988,18	R\$	-	R\$	15.988,18	100,00%
12.1.11	COMP.ARQ.061	COTAÇÃO	GRA-02 - 120 X 60 CM - GRADE FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, EM TUBO DE 19MM COLINDRICO COM ESPAÇAMENTO DE 10 CM ENTRE SI	UN	2,00		0,00%	2,00		628,07		157,02		785,09		1.004,91	R\$	2.009,82	R\$	-	R\$	2.009,82	100,00%
12.1.12	COMP.ARQ.064	COTAÇÃO	GRA-03 - 270X175CM - GRADE FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, EM TUBO DE 19MM COLINDRICO COM ESPAÇAMENTO DE 10 CM ENTRE SI	UN	2,00		0,00%	2,00		3.747,23		936,81		4.684,04		5.995,57	R\$	11.991,14	R\$	-	R\$	11.991,14	100,00%
12.1.13	COMP.ARQ.062	COTAÇÃO	GRA-04 - 450 X 175CM - GRADE FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, EM TUBO DE 19MM COLINDRICO COM ESPAÇAMENTO DE 10 CM ENTRE SI	UN	1,00		0,00%	1,00		6.245,38		1.561,35		7.806,73		9.992,61	R\$	9.992,61	R\$	-	R\$	9.992,61	100,00%



PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JHXB.NTDD:
<https://proad.tr12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

			ESQUADRIAS EM MADEIRA			-							R\$	36.983,75	R\$	-	R\$	-	0,00%			
12.2.1	90791	SINAPI	KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	2,00	0,00%	-	R\$	773,65	R\$	20,14	R\$	793,80	R\$	1.016,06	R\$	2.032,12	R\$	-	0,00%		
12.2.2	90793	SINAPI	KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	19,00	0,00%	-	R\$	818,90	R\$	24,93	R\$	843,83	R\$	1.080,11	R\$	20.522,09	R\$	-	0,00%		
12.2.3	COMP.ARQ.202	SINAPI / SBC	PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL, DE ABRIR, COR BRANCA, UMA FOLHA, MEDINDO 90X210, COM FERRAGENS E FECHADURA.	UN	7,00	0,00%	-	R\$	704,37	R\$	46,40	R\$	750,76	R\$	960,97	R\$	6.726,79	R\$	-	0,00%		
12.2.4	COMP.ARQ.203	INAPI / COTAÇÃO	PORTAS PARA SANITÁRIOS TIPO "TS" 118mm Ø,70x1,80m; MONTADO COM PERFIL TUBULAR PARA GRANITO COM DOBRADIÇAS E TARGETA LIVRE-OCUPADO.	UN	5,00	0,00%	-	R\$	1.158,76	R\$	44,80	R\$	1.203,56	R\$	1.540,55	R\$	7.702,75	R\$	-	0,00%		
12.3			ESQUADRIAS EM VIDRO			-									R\$	14.534,38	R\$	-	0,00%			
12.3.1	COMP.ARQ.338	COTAÇÃO	PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO DE SEGURANÇA 10MM, COM PERIFIS METÁLICOS PRETO ANODIZADO, COM BANDEIRAS FIXAS, COM 4 MÓDULOS, SENDO 2 FIXOS E 2 DE ABRIR, MEDINDO 455X75 CM	UN	1,00	0,00%	-	R\$	6.538,56	R\$	1.634,64	R\$	8.173,20	R\$	10.461,70	R\$	10.461,70	R\$	-	0,00%		
12.3.2	102184	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLTA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X219 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01_2021	UN	1,00	0,00%	-	R\$	1.540,96	R\$	97,05	R\$	1.638,01	R\$	2.096,65	R\$	2.096,65	R\$	-	0,00%		
12.3.3	COMP.ARQ.339	COTAÇÃO	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS DE ABRIR, COM PUXADOR DE AÇO INOX TUBULAR, TIPO 1Y, D=38mm E FECHADURA, MEDINDO 120X210 CM	UN	1,00	0,00%	-	R\$	1.225,02	R\$	306,75	R\$	1.543,77	R\$	1.976,03	R\$	1.976,03	R\$	-	0,00%		
12.4			DIVERSOS			-									R\$	28.171,53	R\$	-	0,00%			
12.4.1	COMP.ARQ.340	COTAÇÃO	PQDM-61 - PORTA GIRATORIA - MARCA DE REFERÊNCIA: GMD-CO DA MPPI METAL PROTECTOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS - DETECTOR DE METAIS SITUADO NO CENTRO DA LAZARILHA DA ENTRADA, NÃO DETECTANDO NA SAÍDA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 90 A 240 VAC / 60HZ, COM SISTEMA DE NOBREAK - CONSUMO DE 60 VA.	UN	1,00	0,00%	-	R\$	16.775,33	R\$	4.193,83	R\$	20.969,16	R\$	26.840,53	R\$	26.840,53	R\$	-	0,00%		
12.4.2	COMP.ARQ.343	INAPI ADAPTAR	ESQUADRIA EM AÇO TIPO VENEZIANA PADRÃO SUBESTAÇÃO, FIXA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO	M2	0,96	0,00%	-	R\$	319,10	R\$	24,78	R\$	343,89	R\$	440,17	R\$	422,56	R\$	-	0,00%		
12.4.3	COMP.ARQ.344	INAPI ADAPTAR	PORTA EM AÇO TIPO VENEZIANA PADRÃO SUBESTAÇÃO, FIXA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, COM CONTRAPARCO, COM DOBRADIÇAS E FECHADURA PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	0,00%	-	R\$	682,47	R\$	27,25	R\$	709,72	R\$	908,44	R\$	908,44	R\$	-	0,00%		
13			REVESTIMENTOS DE PORFO			-									R\$	113.483,56	R\$	918,72	R\$	43.202,05	93,80%	
13.1	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO AF_08/2023_PS	M2	75,95	9,90	13,03%	9,90	R\$	61,85	R\$	10,65	R\$	72,50	R\$	92,80	R\$	7.048,16	R\$	918,72	R\$	13,03%
13.2	COMP.ARQ.097	SINAPI	FORRO REMOVÍVEL ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS SUSPENSOS, PLACAS DE 625 X 625 MM	M2	535,54	0,00%	200,00	R\$	130,20	R\$	14,51	R\$	144,71	R\$	185,23	R\$	99.198,07	R\$	-	R\$	37.046,00	37,39%
13.3	COMP.ARQ.031	INAPI / COTAÇÃO	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÂ DE ROCHA, ESPESSURA 50MM	M2	71,36	0,00%	71,36	R\$	69,01	R\$	10,23	R\$	79,24	R\$	101,42	R\$	7.237,33	R\$	-	R\$	7.237,33	100,00%
14			REVESTIMENTOS DE PAREDES			-									R\$	134.718,34	R\$	-	R\$	126.501,75	93,90%	
14.1			INTERNAS			-									R\$	71.459,14	R\$	-	R\$	67.598,37	94,60%	
14.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	801,66	0,00%	760,50		1,84	2,13	3,98	5,09	R\$	4.080,46	R\$	-	R\$	3.870,93	R\$	94,80%		
14.1.2	COMP.ARQ.306	INAPI ADAPTAR	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA), APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 2,0 CM, COM EXECUÇÃO DE TALISAS	M2	320,22	0,00%	300,00		17,31	14,78	32,09	41,07	R\$	13.151,27	R\$	-	R\$	12.321,00	R\$	93,69%		
14.1.3	COMP.ARQ.056	INAPI ADAPTAR	PEITORIL EM GRANITO CINZA COLUMBA ESPESSURA 2CM E LARGURA DE 10CM	M	69,80	0,00%	69,80		32,92	8,26	41,18	52,71	R\$	3.679,16	R\$	-	R\$	3.679,16	R\$	100,00%		
14.1.4	COMP.ARQ.040	INAPI / ADAPTAR	REBOCO, MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA), APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 2,0 CM, COM EXECUÇÃO DE TALISAS	M2	481,45	0,00%	481,45		21,39	15,10	36,49	46,71	R\$	22.488,39	R\$	-	R\$	22.488,53	R\$	100,00%		
14.1.5	COMP.ARQ.029	INAPI / ADAPTAR	REVESTIMENTO CERÂMICO 30x40CM - MODELO FORMA SLIM BRANCO ACETINADO - MARCA ELIANE OU EQUIVALENTE	M2	339,09	0,00%	305,06		39,08	25,57	64,65	82,75	R\$	28.059,86	R\$	-	R\$	25.236,75	R\$	89,95%		
14.2			EXTERNAS			-									R\$	63.259,20	R\$	-	R\$	58.903,38	93,11%	
14.2.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	735,89	0,00%	675,89		2,28	4,79	7,07	9,05	R\$	6.659,79	R\$	-	R\$	6.116,79	R\$	91,85%		
14.2.2	COMP.ARQ.040	INAPI / ADAPTAR	REBOCO, MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA), APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 2,0 CM, COM EXECUÇÃO DE TALISAS	M2	735,89	0,00%	672,89		21,39	15,10	36,49	46,71	R\$	34.373,35	R\$	-	R\$	31.430,69	R\$	91,44%		
14.2.3	COMP.ARQ.331	POSIÇÃO PRO	REVESTIMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA ESPESSURA 6MM	M2	102,17	0,00%	98,17		57,33	112,62	189,95	217,54	R\$	22.226,06	R\$	-	R\$	21.355,90	R\$	96,08%		
15			REVESTIMENTO DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO			-									R\$	365.633,26	R\$	19.911,93	R\$	236.103,83	64,89%	



PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JHXB.NTDD: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Nº			PAVIMENTAÇÃO INTERNA			-			R\$	180.997,31	R\$	19.911,93	R\$	89.842,22	49,79%								
15.1.1	94439	SINAPI	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (C/M E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	M2	645,49	0,00%	645,49	R\$	30,63	R\$	15,75	R\$	46,38	R\$	59,37	R\$	38.322,68	R\$	-	R\$	38.322,62	100,00%	
15.1.2	4920	ORSE	PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO DE BASE ACILICA (PRIMER A SER APLICADO PREVIAMENTE À ARGAMASSA AUTONIVELANTE)	M2	213,00	53,25	25,00%	53,25	R\$	12,94	R\$	1,30	R\$	14,24	R\$	18,22	R\$	3.881,38	R\$	970,35	R\$	970,35	25,00%
15.1.3	COMP ARQ.200	POSIÇÃO PRO	ARGAMASSA AUTONIVELANTE PARA REGULARIZAÇÃO E PREPARO DE CONTRAPISO PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO VINÍLICO	M2	213,00	0,00%	-	R\$	11,17	R\$	1,13	R\$	12,29	R\$	15,74	R\$	3.352,62	R\$	-	R\$	-	0,00%	
15.1.4	COMP ARQ.309	POSIÇÃO PRO	JUNTA DE DESSOLIDARIZAÇÃO	M	306,83	0,00%	-	R\$	4,87	R\$	4,22	R\$	9,09	R\$	11,64	R\$	3.571,50	R\$	-	R\$	-	0,00%	
15.1.5	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	14,75	0,00%	-	R\$	124,18	R\$	12,27	R\$	136,45	R\$	174,66	R\$	2.576,24	R\$	-	R\$	-	0,00%	
15.1.6	COMP ARQ.017	COMPOSIÇÃO	PISO VINÍLICO DA TARKETT - BEIGE PORCELAIN 60x60cm, E= 5,0mm, LINHA AMBIENTA COLEÇÃO STONE OU EQUIVALENTE	M2	213,00	0,00%	-	R\$	175,36	R\$	4,81	R\$	180,17	R\$	230,82	R\$	49.122,06	R\$	-	R\$	-	0,00%	
15.1.7	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_05/2020_PS	M2	428,85	123,84	28,84%	336,00	R\$	103,08	R\$	13,20	R\$	116,28	R\$	148,84	R\$	63.800,12	R\$	18.402,58	R\$	50.010,24	78,39%
15.1.8	COMP ARQ.307	SINAPI / SBC	RODAPÊ DE POLIESTIRENO DE 7CM	M	294,61	0,00%	-	R\$	31,99	R\$	2,91	R\$	34,89	R\$	44,67	R\$	13.160,23	R\$	-	R\$	-	0,00%	
15.1.9	COMP ARQ.094	SINAPI / SBC	SOLEIRA EM PERFIL ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	M	3,60	0,00%	-	R\$	58,32	R\$	19,89	R\$	78,21	R\$	100,11	R\$	360,45	R\$	-	R\$	-	0,00%	
15.1.10	COMP ARQ.329	SINAPI ADAPTAT	SOLEIRA EM GRANTO CINZA CORUMBÁ, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	8,53	8,53	100,00%	8,53	R\$	33,26	R\$	16,11	R\$	49,37	R\$	63,19	R\$	539,01	R\$	539,01	R\$	539,01	100,00%
15.1.11	COMP ARQ.030	SINAPI ADAPTAT	SOLEIRA EM GRANTO CINZA CORUMBÁ, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	4,55	0,00%	-	R\$	60,28	R\$	16,11	R\$	76,38	R\$	97,77	R\$	444,85	R\$	-	R\$	-	0,00%	
15.1.12	98889	SINAPI	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	12,37	0,00%	-	R\$	80,22	R\$	12,38	R\$	92,60	R\$	118,53	R\$	1.466,22	R\$	-	R\$	-	0,00%	
15.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA													R\$	185.037,95	R\$	-	R\$	148.311,61	79,87%	
15.2.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	M2	1.214,28	0,00%	242,86	R\$	2,07	R\$	0,18	R\$	2,25	R\$	2,88	R\$	3.497,13	R\$	-	R\$	690,43	20,00%	
15.2.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA IMÓVIL EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130X3 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016	M	462,09	0,00%	462,09	R\$	27,81	R\$	12,86	R\$	40,67	R\$	52,06	R\$	24.056,41	R\$	-	R\$	24.056,41	100,00%	
15.2.3	COMP ARQ.037	SINAPI / COTAÇÃO	BATE-RODA DE RESINA MEDINDO 48 X 17 X 3 CM, NA COR AMARELO	UN	26,00	0,00%	-	R\$	88,18	R\$	14,16	R\$	102,34	R\$	130,99	R\$	3.405,74	R\$	-	R\$	-	0,00%	
15.2.4	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM, AF_10/2022	M2	1.214,28	0,00%	921,39	R\$	66,61	R\$	11,43	R\$	78,04	R\$	99,89	R\$	121.294,43	R\$	-	R\$	92.037,65	75,88%	
15.2.5	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVS CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019_PS	M3	121,43	0,00%	116,43	R\$	155,78	R\$	4,73	R\$	160,51	R\$	205,45	R\$	24.947,38	R\$	-	R\$	23.920,13	95,88%	
15.2.6	COMP ARQ.201	SINAPI / COTAÇÃO	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO DE ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 25x25CM, NA COR VERMELHA	M	132,50	0,00%	112,50	R\$	26,84	R\$	12,03	R\$	38,87	R\$	49,76	R\$	6.593,20	R\$	-	R\$	5.598,00	84,91%	
15.2.7	COMP ARQ.308	SINAPI ADAPTAT	REVESTIMENTO EM GRANTO SÃO GABRIEL, PARA A BASE DOS MASTROS	M2	2,62	0,00%	-	R\$	335,89	R\$	34,95	R\$	370,84	R\$	474,68	R\$	1.243,66	R\$	-	R\$	-	0,00%	
16			SERRALHERIA			-										R\$	118.030,44	R\$	-	R\$	-	0,00%	
16.1	COMP ARQ.312	POSIÇÃO PRO	ALCAPOÃO METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 1250 X 625 MM, COM PINTURA DE ACABAMENTO ESMALTE ACETINADO PARA, PARA ACESSO AOS RESERVATÓRIOS	UN	1,00	0,00%	-	R\$	911,80	R\$	409,05	R\$	1.320,85	R\$	1.690,69	R\$	1.690,69	R\$	-	R\$	-	0,00%	
16.2	COMP ARQ.026	SINAPI / COTAÇÃO	BICICLETARIO METÁLICO EM FORMA DE "U" INVERTIDO, FIXO NO CHÃO, EM TUBO DE AÇO 2", COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI NA COR PRETA	UN	4,00	0,00%	-	R\$	523,92	R\$	35,40	R\$	559,32	R\$	715,93	R\$	2.863,72	R\$	-	R\$	-	0,00%	
16.3	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_PS	M	18,43	0,00%	-	R\$	62,18	R\$	31,85	R\$	94,03	R\$	120,36	R\$	2.218,23	R\$	-	R\$	-	0,00%	
16.4	COMP ARQ.314	POSIÇÃO PRO	ESCADA MARINHEIRO PERFIL DE FERRO COM ANCORAGEM E SEM PROTEÇÃO	M	4,00	0,00%	-	R\$	1.025,70	R\$	31,64	R\$	1.057,35	R\$	1.353,40	R\$	5.413,60	R\$	-	R\$	-	0,00%	
16.5	COMP ARQ.339	POSIÇÃO PRO	ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO PARA FIXAR AS DIVISÓRIAS LEVES E DE VIDRO	M	24,05	0,00%	-	R\$	14,35	R\$	12,02	R\$	26,37	R\$	33,75	R\$	811,69	R\$	-	R\$	-	0,00%	
16.6	COMP ARQ.057	COTAÇÃO	GRADIL REVESTIDO EM PVC, MALHA 200X30MM, REF. GRADIL MORLAN OU EQUIVALENTE	M	92,80	0,00%	-	R\$	460,53	R\$	162,00	R\$	622,53	R\$	796,84	R\$	73.946,75	R\$	-	R\$	-	0,00%	
16.7	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 - GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 30X4,8MM, FIXADO COM CHUMBERADO MECÂNICO, AF_04/2019_PS	M	27,99	0,00%	-	R\$	240,65	R\$	194,33	R\$	434,98	R\$	556,77	R\$	15.583,99	R\$	-	R\$	-	0,00%	
16.8	COMP ARQ.313	POSIÇÃO PRO	MASTRO PARA BANDEIRA H= 4,80M, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" E ALTA ALTURA DE 2,18 M COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2" COM PONTA CHAMFRADO, COM FUNDO PRIME EPOXI E DUAS DEMÃO DE TINTA EPOXI	M	3,00	0,00%	-	R\$	519,32	R\$	96,41	R\$	617,73	R\$	790,69	R\$	2.372,07	R\$	-	R\$	-	0,00%	
16.9	COMP ARQ.058	COTAÇÃO	PORTÃO GRADIL EM PVC DE CORRER MEDINDO 400 X 210MM, COMPLETO, COM AUTOMAÇÃO	UN	1,00	0,00%	-	R\$	5.440,43	R\$	2.473,40	R\$	7.913,83	R\$	10.129,70	R\$	10.129,70	R\$	-	R\$	-	0,00%	
17			PINTURA			-										R\$	65.908,81	R\$	-	R\$	30.424,50	46,16%	
17.1			PINTURA INTERNA			-										R\$	38.092,06	R\$	-	R\$	26.407,36	69,33%	
17.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M2	678,29	0,00%	620,00	R\$	1,46	R\$	1,72	R\$	3,18	R\$	4,07	R\$	2.760,62	R\$	-	R\$	2.520,40	91,41%	



PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JHXB.NTDD: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

17.1.2	96129	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	657,13		0,00%	639,13	R\$	10,89	R\$	18,30	R\$	29,19	R\$	37,37	R\$	24.556,76	R\$	-	R\$	23.884,10	97,28%
17.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	678,29		0,00%	-	R\$	6,25	R\$	4,18	R\$	10,44	R\$	13,36	R\$	9.061,89	R\$	-	R\$	-	0,00%
17.1.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	90,72		0,00%	-	R\$	6,80	R\$	7,95	R\$	14,75	R\$	18,88	R\$	1.712,79	R\$	-	R\$	-	0,00%
17.2			PINTURA EXTERNA														R\$	27.316,75	R\$	-	R\$	4.917,00	14,44%
17.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	772,04		0,00%	650,00	R\$	1,46	R\$	1,72	R\$	3,18	R\$	4,07	R\$	3.142,19	R\$	-	R\$	2.645,50	84,19%
17.2.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	772,04		0,00%	50,00	R\$	6,25	R\$	4,18	R\$	10,44	R\$	13,36	R\$	10.314,43	R\$	-	R\$	668,00	6,48%
17.2.3	100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINZEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	129,99		0,00%	-	R\$	5,48	R\$	4,48	R\$	9,96	R\$	12,75	R\$	1.657,40	R\$	-	R\$	-	0,00%
17.2.4	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	240,02		0,00%	-	R\$	3,26	R\$	2,24	R\$	5,50	R\$	7,04	R\$	1.689,74	R\$	-	R\$	-	0,00%
17.2.5	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	9,36		0,00%	-	R\$	47,63	R\$	7,38	R\$	55,01	R\$	70,41	R\$	659,04	R\$	-	R\$	-	0,00%
17.2.6	95305	SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	735,89		0,00%	50,00	R\$	7,03	R\$	3,96	R\$	10,99	R\$	14,07	R\$	10.353,95	R\$	-	R\$	703,50	6,79%
18			MOBILIÁRIO E BANCADAS														R\$	24.281,23	R\$	-	R\$	-	0,00%
18.1	COMP.ARQ.060	COTAÇÃO	BALCÃO COPA	UN	1,00		0,00%	-	R\$	3.823,15	R\$	955,79	R\$	4.778,94	R\$	6.117,05	R\$	6.117,05	R\$	-	R\$	-	0,00%
18.2	COMP.ARQ.332	COTAÇÃO	BALCÃO RECEPÇÃO	UN	1,00		0,00%	-	R\$	8.148,80	R\$	2.037,20	R\$	10.186,00	R\$	13.038,08	R\$	13.038,08	R\$	-	R\$	-	0,00%
18.3	COMP.ARQ.052	INAPI ADAPTADA	BG-01 - SANIT. C - BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBA MEDINDO 135 X 50CM, COM SAIA E ESPELHO, COM 1 CUBAS OVAL EM LOUÇA, INCLUSO FUROS PARA PAPELEIRA, TORNEIRAS E CUBAS	UN	2,00		0,00%	-	R\$	439,01	R\$	43,84	R\$	482,84	R\$	618,04	R\$	1.236,08	R\$	-	R\$	-	0,00%
18.4	COMP.ARQ.053	INAPI ADAPTADA	BG-02 - SANIT. D - BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBA MEDINDO 220 X 50CM, COM SAIA E ESPELHO, COM 2 CUBAS OVAL EM LOUÇA, INCLUSO FUROS PARA PAPELEIRA, TORNEIRAS E CUBAS	UN	1,00		0,00%	-	R\$	668,65	R\$	43,84	R\$	712,49	R\$	911,99	R\$	911,99	R\$	-	R\$	-	0,00%
18.5	COMP.ARQ.054	INAPI ADAPTADA	BG-03 - CÔPA - BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBA MEDINDO 250 X 60CM, COM SAIA E ESPELHO	UN	1,00		0,00%	-	R\$	884,79	R\$	43,84	R\$	928,63	R\$	1.188,64	R\$	1.188,64	R\$	-	R\$	-	0,00%
18.6	COMP.ARQ.055	INAPI ADAPTADA	BG-04 - FRALDÁRIO - BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBA MEDINDO 120 X 80CM, COM SAIA E ESPELHO	UN	1,00		0,00%	-	R\$	463,32	R\$	43,84	R\$	507,16	R\$	649,16	R\$	649,16	R\$	-	R\$	-	0,00%
18.7	COMP.ARQ.333	INAPI ADAPTADA	BG-05 - SANIT. FEM 2 - BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBA MEDINDO 260 X 50CM, COM SAIA E ESPELHO, INCLUSO FUROS PARA PAPELEIRA, TORNEIRAS E CUBAS	UN	1,00		0,00%	-	R\$	846,97	R\$	43,84	R\$	890,80	R\$	1.140,23	R\$	1.140,23	R\$	-	R\$	-	0,00%
19			LOUÇAS E METAIS														R\$	78.180,73	R\$	-	R\$	-	0,00%
19.1	COMP.ARQ.039	INAPI / COTAÇÃO	ALARME AUDIOVISUAL 127/220V	UN	5,00		0,00%	-	R\$	222,97	R\$	49,77	R\$	272,73	R\$	349,10	R\$	1.745,50	R\$	-	R\$	-	0,00%
19.2	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00		0,00%	-	R\$	311,50	R\$	25,09	R\$	336,59	R\$	430,84	R\$	8.195,96	R\$	-	R\$	-	0,00%
19.3	COMP.ARQ.093	INAPI / COTAÇÃO	BARRA DE APOIO VERTICAL PARA LAVATÓRIO EM INOX POLIDO DIAM 32MM, ESP.1,5MM, COMP. 40CM, RETA	UN	10,00		0,00%	-	R\$	876,57	R\$	25,10	R\$	901,68	R\$	1.154,14	R\$	11.541,40	R\$	-	R\$	-	0,00%
19.4	COMP.ARQ.105	SINAPI / SBC	BEBEDOURO DE PRESSÃO ACESSÍVEL SUSPENSO	UN	2,00		0,00%	-	R\$	2.636,06	R\$	50,55	R\$	2.686,61	R\$	3.438,96	R\$	6.877,72	R\$	-	R\$	-	0,00%
19.5	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00		0,00%	-	R\$	67,41	R\$	11,81	R\$	79,21	R\$	101,39	R\$	101,39	R\$	-	R\$	-	0,00%
19.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00		0,00%	-	R\$	94,72	R\$	16,88	R\$	111,60	R\$	142,85	R\$	1.142,80	R\$	-	R\$	-	0,00%
19.7	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00		0,00%	-	R\$	166,91	R\$	9,52	R\$	176,43	R\$	225,84	R\$	225,84	R\$	-	R\$	-	0,00%
19.8	COMP.ARQ.334	INAPI / COTAÇÃO	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, ref. 1984 C35 DA DECA OU EQUIVALENTE	UN	5,00		0,00%	-	R\$	336,41	R\$	11,66	R\$	348,07	R\$	445,53	R\$	2.227,65	R\$	-	R\$	-	0,00%
19.9	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00		0,00%	-	R\$	36,52	R\$	4,02	R\$	40,54	R\$	51,89	R\$	1.401,03	R\$	-	R\$	-	0,00%
19.10	COMP.ARQ.342	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	6,30		0,00%	-	R\$	357,47	R\$	22,99	R\$	380,46	R\$	486,99	R\$	3.068,04	R\$	-	R\$	-	0,00%
19.11	COMP.ARQ.041	INAPI / COTAÇÃO	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa, REF. CEUTE 600X415X430 / 1562020010300 OU EQUIVALENTE	UN	5,00		0,00%	-	R\$	685,93	R\$	72,40	R\$	758,33	R\$	970,66	R\$	4.853,30	R\$	-	R\$	-	0,00%
19.12	100859	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00		0,00%	-	R\$	701,07	R\$	55,97	R\$	757,04	R\$	969,01	R\$	2.907,03	R\$	-	R\$	-	0,00%
19.13	COMP.ARQ.098	API + COT. MERC	PLACA DE INOX PROTEÇÃO IMPACTO PARA PORTA DEFICIENTE 60X90CM	UN	10,00		0,00%	-	R\$	184,67	R\$	7,84	R\$	192,51	R\$	246,41	R\$	2.464,10	R\$	-	R\$	-	0,00%



PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JHXB.NTDD: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

19.14	COMP.ARQ.042	SINAPI	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS, TIPO ROLÃO DE 300 A 800 METROS, COM SISTEMA DE ABERTURA ATRAVÉS DE CHAVE, MODELO PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO TRILHA (CÓD.: 080941) DA COPAPEL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	0,00%	-	R\$ 39,52	R\$ 8,43	R\$ 47,95	R\$ 61,37	R\$ 675,07	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.15	100874	SINAPI	PUKADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	0,00%	-	R\$ 283,81	R\$ 25,09	R\$ 308,90	R\$ 395,39	R\$ 1.976,95	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.16	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	0,00%	-	R\$ 38,06	R\$ 8,35	R\$ 46,42	R\$ 59,42	R\$ 831,88	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.17	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00%	-	R\$ 7,86	R\$ 2,22	R\$ 10,08	R\$ 12,91	R\$ 12,91	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.18	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	0,00%	-	R\$ 144,10	R\$ 7,22	R\$ 151,32	R\$ 193,69	R\$ 2.905,35	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.19	COMP.ARQ.049	SINAPI	SUPORTE PARA TOALHAS INTERFOLHADAS, SERÁ DO TIPO SOBREPOR EM PLÁSTICO ABS, PARA TOALHAS INTERFOLHADAS DE 2 OU 3 DOBRAS, COM SISTEMA DE ABERTURA ATRAVÉS DE CHAVE, MODELO TOALHEIRO TRILHA (CÓD.: 080892) DA COPAPEL OU EQUIVALENTE	UN	11,00	0,00%	-	R\$ 39,52	R\$ 8,43	R\$ 47,95	R\$ 61,37	R\$ 675,07	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.20	COMP.ARQ.048	INAPI / COTAÇÃO	TANQUE SUSPENSO ESMALTADO 20L 530X410X285MM, COR BRANCO, DA MARCA DACOL OU EQUIVALENTE	UN	1,00	0,00%	-	R\$ 771,63	R\$ 55,85	R\$ 827,48	R\$ 1.059,18	R\$ 1.059,18	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.21	COMP.ARQ.051	INAPI / COTAÇÃO	TORNEIRA BICA MÓVEL DE PAREDE, DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	0,00%	-	R\$ 281,81	R\$ 4,23	R\$ 286,04	R\$ 366,13	R\$ 732,26	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.22	COMP.ARQ.050	INAPI / COTAÇÃO	TORNEIRA DE MESA DO TIPO PRESSMATIC, DA MARCA DACOL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	0,00%	-	R\$ 176,12	R\$ 4,23	R\$ 180,35	R\$ 230,85	R\$ 3.231,90	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.23	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00%	-	R\$ 93,15	R\$ 4,02	R\$ 97,17	R\$ 124,38	R\$ 248,76	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.24	COMP.ARQ.341	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACOIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	3,00	0,00%	-	R\$ 190,84	R\$ 30,28	R\$ 221,22	R\$ 283,17	R\$ 849,51	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.25	COMP.ARQ.336	INAPI / COTAÇÃO	KIT CAIXA ACOPLADA CELITE ACESSO CONFORT BRANCO BRILHANTE, COM ASSENTO SOFT CLOSE	UN	6,00	0,00%	-	R\$ 1.121,48	R\$ 21,82	R\$ 1.143,11	R\$ 1.463,18	R\$ 8.779,08	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.26	COMP.ARQ.335	INAPI / COTAÇÃO	KIT CAIXA ACOPLADA CELITE AZULEIRO BRANCO BRILHANTE, COM ASSENTO SOFT CLOSE	UN	5,00	0,00%	-	R\$ 1.457,45	R\$ 21,82	R\$ 1.479,07	R\$ 1.893,21	R\$ 9.466,05	R\$ -	R\$ -	0,00%
20			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			-						R\$ 88.239,62	R\$ -	R\$ 88.387,87	91,10%
20.1			INSTALAÇÕES DE ÁGUA			-						R\$ 21.342,75	R\$ -	R\$ 15.761,18	73,88%
20.1.1	COMP.HID.012	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS	M	45,09	0,00%	45,09	R\$ 13,88	R\$ 26,28	R\$ 40,16	R\$ 51,40	R\$ 2.317,63	R\$ -	R\$ 2.317,63	100,00%
20.1.2	COMP.HID.010	SINAPI	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	M	205,09	0,00%	100,00	R\$ 13,77	R\$ 25,95	R\$ 39,72	R\$ 50,85	R\$ 10.428,83	R\$ -	R\$ 5.085,00	48,76%
20.1.3	COMP.HID.013	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS	M	62,17	0,00%	62,17	R\$ 25,10	R\$ 5,84	R\$ 30,94	R\$ 39,61	R\$ 2.462,55	R\$ -	R\$ 2.462,55	100,00%
20.1.4	COMP.HID.017	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS	M	19,29	0,00%	19,29	R\$ 16,34	R\$ 11,46	R\$ 27,79	R\$ 35,57	R\$ 686,15	R\$ -	R\$ 686,15	100,00%
20.1.5	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	0,00%	6,00	R\$ 13,58	R\$ 5,13	R\$ 18,71	R\$ 23,95	R\$ 143,70	R\$ -	R\$ 143,70	100,00%
20.1.6	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	0,00%	2,00	R\$ 19,20	R\$ 5,12	R\$ 24,33	R\$ 31,14	R\$ 62,28	R\$ -	R\$ 62,28	100,00%
20.1.7	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	0,00%	2,00	R\$ 919,22	R\$ 10,11	R\$ 929,33	R\$ 1.189,54	R\$ 2.379,08	R\$ -	R\$ 2.379,08	100,00%
20.1.8	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	6,00	0,00%	6,00	R\$ 0,41	R\$ 3,29	R\$ 3,70	R\$ 4,73	R\$ 28,38	R\$ -	R\$ 28,38	100,00%
20.1.9	102592	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	2,00	0,00%	2,00	R\$ 0,49	R\$ 3,67	R\$ 4,16	R\$ 5,33	R\$ 10,66	R\$ -	R\$ 10,66	100,00%
20.1.10	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (1/2), 5,0 MMH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	0,00%	-	R\$ 165,89	R\$ 19,84	R\$ 185,73	R\$ 237,73	R\$ 237,73	R\$ -	R\$ -	0,00%
20.1.11	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	44,00	0,00%	44,00	R\$ 4,32	R\$ 4,55	R\$ 8,87	R\$ 11,36	R\$ 499,84	R\$ -	R\$ 499,84	100,00%
20.1.12	89969	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	0,00%	1,00	R\$ 26,64	R\$ 8,76	R\$ 35,39	R\$ 45,30	R\$ 45,30	R\$ -	R\$ 45,30	100,00%
20.1.13	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	0,00%	2,00	R\$ 60,14	R\$ 7,61	R\$ 67,75	R\$ 86,72	R\$ 173,44	R\$ -	R\$ 173,44	100,00%

PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JHXB.NTDD: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



20.1.14	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00		0,00%	2,00	R\$ 44,14	R\$ 5,58	R\$ 49,72	R\$ 63,64	R\$ 127,28	R\$ -	R\$ 127,28	100,00%
20.1.15	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00		0,00%	3,00	R\$ 26,42	R\$ 2,70	R\$ 29,11	R\$ 37,26	R\$ 111,78	R\$ -	R\$ 111,78	100,00%
20.1.16	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00		0,00%	4,00	R\$ 28,07	R\$ 4,15	R\$ 32,21	R\$ 41,23	R\$ 164,92	R\$ -	R\$ 164,92	100,00%
20.1.17	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CAMPIJA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14,00		0,00%	14,00	R\$ 68,02	R\$ 8,34	R\$ 76,36	R\$ 97,74	R\$ 1.368,36	R\$ -	R\$ 1.368,36	100,00%
20.1.18	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00		0,00%	2,00	R\$ 29,88	R\$ 7,17	R\$ 37,05	R\$ 47,42	R\$ 94,84	R\$ -	R\$ 94,84	100,00%
20.2			INSTALAÇÕES DE ESGOTO E VENTILAÇÃO			-							R\$ 34.782,38	R\$ -	R\$ 34.315,19	98,71%
20.2.1	COMP.HID.011	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS	M	146,85		0,00%	146,85	40,10	26,81	66,91	85,65	R\$ 12.577,70	R\$ -	R\$ 12.577,70	100,00%
20.2.2	COMP.HID.014	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS	M	8,30		0,00%	8,30	26,87	14,91	41,78	53,47	R\$ 443,80	R\$ -	R\$ 443,80	100,00%
20.2.3	COMP.HID.016	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS	M	27,01		0,00%	27,01	25,44	44,38	69,82	89,37	R\$ 2.413,88	R\$ -	R\$ 2.413,79	100,00%
20.2.4	COMP.HID.015	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS	M	93,22		0,00%	93,22	46,48	41,81	88,29	113,01	R\$ 10.534,79	R\$ -	R\$ 10.534,79	100,00%
20.2.5	COMP.HID.010	SINAPI	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	M	1,40		0,00%	1,40	13,77	25,95	39,72	50,85	R\$ 71,19	R\$ -	R\$ 71,19	100,00%
20.2.6	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO- 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00		0,00%	-	338,91	10,38	349,29	447,10	R\$ 447,10	R\$ -	R\$ -	0,00%
20.2.7	COMP.HID.002	INAPI ADAPTAD	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 800 X 500MM	CJ	12,00		0,00%	12,00	374,04	9,22	383,26	490,58	R\$ 5.886,96	R\$ -	R\$ 5.886,96	100,00%
20.2.8	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00		0,00%	12,00	46,88	15,96	62,85	80,44	R\$ 965,28	R\$ -	R\$ 965,28	100,00%
20.2.9	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00		0,00%	1,00	74,79	18,01	92,79	118,78	R\$ 118,78	R\$ -	R\$ 118,78	100,00%
20.2.10	104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00		0,00%	10,00	33,36	9,23	42,60	54,52	R\$ 545,20	R\$ -	R\$ 545,20	100,00%
20.2.11	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,00		0,00%	11,00	21,99	4,78	26,77	34,26	R\$ 376,86	R\$ -	R\$ 376,86	100,00%
20.2.12	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00		0,00%	4,00	15,98	1,70	17,68	22,64	R\$ 90,56	R\$ -	R\$ 90,56	100,00%
20.2.13	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00		0,00%	2,00	28,09	8,30	36,40	46,59	R\$ 93,18	R\$ -	R\$ 93,18	100,00%
20.2.14	COMP.HID.001	INAPI ADAPTAD	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	9,00		0,00%	9,00	11,21	5,89	17,11	21,90	R\$ 197,10	R\$ -	R\$ 197,10	100,00%
20.3			INSTALAÇÕES PLUVIAIS			-							R\$ 23.229,42	R\$ -	R\$ 22.018,46	94,79%
20.3.1	COMP.HID.011	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS	M	174,95		0,00%	174,95	R\$ 40,10	R\$ 26,81	R\$ 66,91	R\$ 85,65	R\$ 14.984,47	R\$ -	R\$ 14.984,47	100,00%
20.3.2	COMP.HID.014	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS	M	13,30		0,00%	13,30	R\$ 26,87	R\$ 14,91	R\$ 41,78	R\$ 53,47	R\$ 711,15	R\$ -	R\$ 711,15	100,00%
20.3.3	COMP.HID.015	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS	M	5,75		0,00%	5,75	R\$ 46,48	R\$ 41,81	R\$ 88,29	R\$ 113,01	R\$ 649,81	R\$ -	R\$ 649,81	100,00%
20.3.4	COMP.HID.005	INAPI ADAPTAD	CAIXA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	13,00		0,00%	11,00	R\$ 189,94	R\$ 122,12	R\$ 312,06	R\$ 399,43	R\$ 5.192,59	R\$ -	R\$ 4.393,73	84,62%
20.3.5	COMP.HID.006	INAPI ADAPTAD	CAIXA SEM GRELHA DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	1,00		0,00%	1,00	R\$ 148,73	R\$ 122,12	R\$ 270,84	R\$ 346,68	R\$ 346,68	R\$ -	R\$ 346,68	100,00%
20.3.6	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00		0,00%	1,00	R\$ 74,79	R\$ 18,01	R\$ 92,79	R\$ 118,78	R\$ 118,78	R\$ -	R\$ 118,78	100,00%



PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JHXB.NTDD: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

20.3.7	COMP.HID.003	INAPI/ADAPTAD	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	10,00		0,00%	-	R\$ 22,76	R\$ 9,43	R\$ 32,20	R\$ 41,21	R\$ 412,10	R\$ -	R\$ -	0,00%
20.3.8	COMP.HID.004	INAPI / COTAÇÃO	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONDIÇÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	4,28		0,00%	4,28	R\$ 111,96	R\$ 36,60	R\$ 148,55	R\$ 190,15	R\$ 813,84	R\$ -	R\$ 813,84	100,00%
20.4			INSTALAÇÕES DRENO CLIMATIZAÇÃO			-							R\$ 8.905,27	R\$ -	R\$ 8.293,04	93,13%
20.4.1	COMP.HID.010	SINAPI	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	M	162,04		0,00%	150,00	R\$ 13,77	R\$ 25,95	R\$ 29,72	R\$ 50,85	R\$ 9.239,73	R\$ -	R\$ 7.627,50	92,57%
20.4.2	COMP.HID.017	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS	M	8,61		0,00%	8,61	R\$ 16,34	R\$ 11,46	R\$ 27,79	R\$ 35,57	R\$ 306,26	R\$ -	R\$ 306,26	100,00%
20.4.3	COMP.HID.007	SINAPI / TCPO	ISOLAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA ESPONJOSA PARA TUBO 25MM	M	59,46		0,00%	59,46	R\$ 1,55	R\$ 3,02	R\$ 4,57	R\$ 5,85	R\$ 347,84	R\$ -	R\$ 347,84	100,00%
20.4.4	COMP.HID.008	SINAPI / TCPO	ISOLAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA ESPONJOSA PARA TUBO 32MM	M	1,39		0,00%	1,39	R\$ 2,65	R\$ 3,77	R\$ 6,43	R\$ 8,23	R\$ 11,44	R\$ -	R\$ 11,44	100,00%
21			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			-							R\$ 23.502,91	R\$ -	R\$ 14.997,95	97,44%
21.1			EXTINTORES DE INCÊNDIO			-							R\$ 1.446,18	R\$ -	R\$ -	0,00%
21.1.1	COMP.PPCL.001	INAPI / COTAÇÃO	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		0,00%	-	R\$ 171,05	R\$ 17,26	R\$ 188,31	R\$ 241,03	R\$ 1.446,18	R\$ -	R\$ -	0,00%
21.2			ALARME DE INCÊNDIO			-							R\$ 16.315,78	R\$ -	R\$ 8.808,88	53,99%
21.2.1	COMP.PPCL.003	INAPI / COTAÇÃO	ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL, REFERÊNCIA INTELBRAS OU EQUIVALENTE	UN	3,00		0,00%	-	R\$ 110,99	R\$ 131,87	R\$ 242,86	R\$ 310,86	R\$ 932,58	R\$ -	R\$ -	0,00%
21.2.2	COMP.PPCL.006	INAPI / COTAÇÃO	CABO DE COBRE BLINDADO - PARA ALARME DE INCÊNDIO 2 X 0,75 M/M²	M	131,00		0,00%	131,00	R\$ 4,68	R\$ 2,07	R\$ 6,75	R\$ 8,64	R\$ 1.131,84	R\$ -	R\$ 1.131,84	100,00%
21.2.3	COMP.PPCL.002	INAPI / COTAÇÃO	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, REFERÊNCIA INTELBRAS OU EQUIVALENTE	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 1.331,62	R\$ 134,29	R\$ 1.465,91	R\$ 1.676,37	R\$ 1.876,37	R\$ -	R\$ -	0,00%
21.2.4	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (RT), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 15/2002	UN	46,00		0,00%	40,00	R\$ 15,74	R\$ 14,86	R\$ 30,61	R\$ 39,18	R\$ 1.802,28	R\$ -	R\$ 1.567,20	86,96%
21.2.5	COMP.PPCL.001	INAPI / COTAÇÃO	DETECTOR DE FUMAÇA, ENDEREÇÁVEL, REFERÊNCIA INTELBRAS OU EQUIVALENTE	UN	21,00		0,00%	-	R\$ 122,12	R\$ 13,40	R\$ 135,52	R\$ 173,46	R\$ 3.642,66	R\$ -	R\$ -	0,00%
21.2.6	COMP.PPCL.006	INAPI / COTAÇÃO	DETECTOR DE TEMPERATURA, ENDEREÇÁVEL, REFERÊNCIA INTELBRAS OU EQUIVALENTE	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 126,98	R\$ 13,40	R\$ 140,38	R\$ 179,68	R\$ 179,68	R\$ -	R\$ -	0,00%
21.2.7	COMP.PPCL.007	SINAPI / TCPO	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, Ø20MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	131,00		0,00%	131,00	R\$ 15,70	R\$ 20,74	R\$ 36,44	R\$ 46,64	R\$ 6.109,84	R\$ -	R\$ 6.109,84	100,00%
21.2.8	COMP.PPCL.004	INAPI / COTAÇÃO	SINALIZADOR AUDIOVISUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL, REFERÊNCIA INTELBRAS OU EQUIVALENTE	UN	3,00		0,00%	-	R\$ 116,45	R\$ 50,35	R\$ 166,80	R\$ 213,51	R\$ 640,53	R\$ -	R\$ -	0,00%
21.3			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA			-							R\$ 5.789,07	R\$ -	R\$ 5.789,07	100,00%
21.3.1	COMP.PPCL.010	INAPI / COTAÇÃO	BATERIA 12V PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	2,00		0,00%	2,00	R\$ 145,02	R\$ 20,74	R\$ 165,76	R\$ 212,17	R\$ 424,34	R\$ -	R\$ 424,34	100,00%
21.3.2	COMP.PPCL.009	INAPI / COTAÇÃO	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, REEFERÊNCIA ASCAEI CLE 24/1200 OU EQUIVALENTE	UN	1,00		0,00%	1,00	R\$ 1.048,75	R\$ 124,42	R\$ 1.173,16	R\$ 1.501,65	R\$ 1.501,65	R\$ -	R\$ 1.501,65	100,00%
21.3.3	COMP.PPCL.011	INAPI / COTAÇÃO	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, EM LED, DO TIPO ACLARAMENTO, LIGADA A CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, REFERÊNCIA ASCAEI ALCI-M20	UN	26,00		0,00%	26,00	R\$ 109,40	R\$ 6,68	R\$ 116,08	R\$ 148,58	R\$ 3.863,08	R\$ -	R\$ 3.863,08	100,00%
21.4			SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA			-							R\$ 1.951,88	R\$ -	R\$ -	0,00%
21.4.1	COMP.PPCL.013	INAPI/ADAPTAD	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20CM, EM PVC 2 MM ANTICHAMA, (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	12,00		0,00%	-	R\$ 24,83	R\$ 4,86	R\$ 29,69	R\$ 38,00	R\$ 456,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
21.4.2	COMP.PPCL.012	INAPI/ADAPTAD	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 30 X 15CM, EM PVC 2 MM ANTICHAMA, (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	28,00		0,00%	-	R\$ 30,24	R\$ 4,86	R\$ 35,10	R\$ 44,93	R\$ 1.258,04	R\$ -	R\$ -	0,00%
21.4.3	COMP.PPCL.014	INAPI/ADAPTAD	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, TRIANGULAR, 15CM, EM PVC 2 MM ANTICHAMA, (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00		0,00%	-	R\$ 41,59	R\$ 4,86	R\$ 46,45	R\$ 59,46	R\$ 237,84	R\$ -	R\$ -	0,00%
22			INSTALAÇÕES MEGAWATTS			-							R\$ 221.232,67	R\$ -	R\$ 49.316,51	22,29%
22.1			EQUIPAMENTOS			-							R\$ 149.615,62	R\$ -	R\$ -	0,00%
22.1.1	COMP.HVAC.001	INAPI / COTAÇÃO	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER, MODELO H-WALL (PAREDE), CICLO QUENTE/FRIO, CAPACIDADE NOMINAL 9.000 BTU/H.	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 2.298,65	R\$ 94,21	R\$ 2.392,86	R\$ 2.799,65	R\$ 2.799,65	R\$ -	R\$ -	0,00%
22.1.2	COMP.HVAC.003	INAPI / COTAÇÃO	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER, MODELO H-WALL (PAREDE), CICLO QUENTE/FRIO, CAPACIDADE NOMINAL 12.000 BTU/H.	UN	6,00		0,00%	-	R\$ 2.317,10	R\$ 94,21	R\$ 2.411,31	R\$ 2.821,24	R\$ 16.927,44	R\$ -	R\$ -	0,00%

PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JHXB.NTDD: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



22.1.3	COMP.HVAC.003	SINAPI / COTAÇÃO	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER, MODELO H-WALL, (PAREDE), CICLO QUENTE/FRIO, CAPACIDADE NOMINAL: 18.000 BTU/H.	UN	2,00		0,00%	-	R\$ 3.609,69	R\$ 101,84	R\$ 3.711,54	R\$ 4.342,50	R\$ 8.685,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
22.1.4	COMP.HVAC.004	SINAPI / COTAÇÃO	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), CICLO QUENTE/FRIO, CAPACIDADE NOMINAL: 18.000 BTU/H.	UN	12,00		0,00%	-	R\$ 7.715,90	R\$ 160,30	R\$ 7.876,19	R\$ 9.215,15	R\$ 110.581,80	R\$ -	R\$ -	0,00%
22.1.5	COMP.HVAC.006	SINAPI / COTAÇÃO	VENTILADOR / EXAUSTOR AXIAL, V=130MM/H, INCLUSIVE ACESSÓRIOS VENEZIANA, TIMER E INTERRUPTOR. VENTOKIT 150	UN	2,00		0,00%	-	R\$ 275,90	R\$ 36,73	R\$ 312,63	R\$ 365,78	R\$ 731,56	R\$ -	R\$ -	0,00%
22.1.6	COMP.HVAC.005	SINAPI / COTAÇÃO	VENTILADOR / EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO EM LINHA, ADAPTÁVEL A TUBOS DE Ø=125MM, CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO ATÉ 398MM/H.	UN	2,00		0,00%	-	R\$ 1.423,80	R\$ 183,67	R\$ 1.607,46	R\$ 1.880,73	R\$ 3.761,46	R\$ -	R\$ -	0,00%
22.1.7	COMP.HVAC.027	SINAPI / COTAÇÃO	VENTILADOR / EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO EM LINHA, ADAPTÁVEL A TUBOS DE Ø=200MM, CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO ATÉ 800MM/H.	UN	2,00		0,00%	-	R\$ 1.708,97	R\$ 183,67	R\$ 1.892,64	R\$ 2.214,38	R\$ 4.428,76	R\$ -	R\$ -	0,00%
22.1.8	COMP.HVAC.007	SINAPI / COTAÇÃO	VENTILADOR DE RENOVAÇÃO SPLITVENT CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO ATÉ 100MM/H.	UN	5,00		0,00%	-	R\$ 253,86	R\$ 36,73	R\$ 290,59	R\$ 339,99	R\$ 1.699,95	R\$ -	R\$ -	0,00%
22.2			ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO			-							R\$ 21.137,61	R\$ -	R\$ 7.113,70	33,69%
22.2.1	COMP.HVAC.008	PRÓPRIA / SINAPI	ADESIVO PARA TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - LATA 900ml - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UN	4,00		0,00%	-	R\$ 144,29	R\$ 1,40	R\$ 145,69	R\$ 186,49	R\$ 745,96	R\$ -	R\$ -	0,00%
22.2.2	COMP.HVAC.009	SINAPI / COTAÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM COM DRENO PARA SPLIT, EM PVC DE EMBUTIR NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		0,00%	4,00	R\$ 24,64	R\$ 12,11	R\$ 36,75	R\$ 47,05	R\$ 188,20	R\$ -	R\$ 188,20	100,00%
22.2.3	COMP.HVAC.010	SINAPI / COTAÇÃO	CALÇO DE BORRACHA COM PARAFUSO PARA CONDENSADORA SPLIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	21,00		0,00%	-	R\$ 23,84	R\$ 12,88	R\$ 36,72	R\$ 47,00	R\$ 987,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
22.2.4	COMP.HVAC.011	SINAPI / COTAÇÃO	FITA SILVER TAPE 48mmX50m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	300,00		0,00%	150,00	R\$ 35,66	R\$ 0,42	R\$ 36,07	R\$ 46,17	R\$ 13.851,00	R\$ -	R\$ 6.925,50	50,00%
22.2.5	COMP.HVAC.012	SINAPI / TCPO	GÁS REFRIGERANTE R410A - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	KG	15,00		0,00%	-	R\$ 237,93	R\$ 10,09	R\$ 248,02	R\$ 317,47	R\$ 4.762,05	R\$ -	R\$ -	0,00%
22.2.6	COMP.HVAC.013	SINAPI / COTAÇÃO	GÁS 141B PARA PRESSURIZAÇÃO E LIMPEZA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	KG	4,00		0,00%	-	R\$ 107,76	R\$ 10,09	R\$ 117,85	R\$ 150,85	R\$ 603,40	R\$ -	R\$ -	0,00%
22.3			TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS			-							R\$ 25.975,57	R\$ -	R\$ 25.975,57	100,00%
22.3.1	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	95,00		0,00%	95,00	19,39	1,95	21,34	27,31	2.594,45	R\$ -	R\$ 2.594,45	100,00%
22.3.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	166,00		0,00%	166,00	32,72	2,13	34,85	44,61	R\$ 7.405,26	R\$ -	R\$ 7.405,26	100,00%
22.3.3	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	88,00		0,00%	88,00	42,28	2,29	44,57	57,05	R\$ 5.020,40	R\$ -	R\$ 5.020,40	100,00%
22.3.4	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	157,00		0,00%	157,00	52,12	2,40	54,52	69,78	R\$ 10.955,46	R\$ -	R\$ 10.955,46	100,00%
22.4			INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS			-							R\$ 5.472,39	R\$ -	R\$ 5.472,39	100,00%
22.4.1	COMP.HVAC.014	SINAPI / COTAÇÃO	CABO PP BLINDADO 3X2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	253,00		0,00%	253,00	7,09	1,91	9,00	11,52	R\$ 2.914,56	R\$ -	R\$ 2.914,56	100,00%
22.4.2	COMP.HVAC.015	SINAPI / COTAÇÃO	CABO PP BLINDADO 4X1,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	253,00		0,00%	253,00	5,99	1,91	7,89	10,11	R\$ 2.557,83	R\$ -	R\$ 2.557,83	100,00%
22.5			DUTOS DIFUSORES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO			-							R\$ 19.091,48	R\$ -	R\$ 10.754,85	56,33%
22.5.1	COMP.HID.011	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉRICO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS	M	22,00		0,00%	22,00	R\$ 40,10	R\$ 26,81	R\$ 66,91	R\$ 85,65	R\$ 1.884,30	R\$ -	R\$ 1.884,30	100,00%
22.5.2	COMP.HVAC.022	PRÓPRIA / SINAPI	BALANCEAMENTO DE VAZÕES DE AR EM TODOS OS DIFUSORES E GRELHAS DAS REDES DE DUTOS, UTILIZANDO-SE ANEMÔMETRO DIGITAL AFERIDO E COM BOA PRECISÃO, AS MEDIÇÕES DEVERÃO SER ORGANIZADAS EM RELATÓRIO, A SER SUBMETIDO À FISCALIZAÇÃO	UN	12,00		0,00%	-	R\$ 29,39	R\$ 196,08	R\$ 225,46	R\$ 288,59	R\$ 3.463,08	R\$ -	R\$ -	0,00%
22.5.3	COMP.HVAC.016	SINAPI / COTAÇÃO	CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO G4-M5 Ø125MM	UN	2,00		0,00%	-	R\$ 354,11	R\$ 106,53	R\$ 470,64	R\$ 602,41	R\$ 1.204,82	R\$ -	R\$ -	0,00%
22.5.4	COMP.HVAC.017	SINAPI / COTAÇÃO	CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO G4-M5 Ø200MM	UN	2,00		0,00%	-	R\$ 676,37	R\$ 108,99	R\$ 785,36	R\$ 1.005,25	R\$ 2.010,50	R\$ -	R\$ -	0,00%
22.5.5	96695	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_062022	UN	10,00		0,00%	10,00	R\$ 42,93	R\$ 10,29	R\$ 53,22	R\$ 68,12	R\$ 681,20	R\$ -	R\$ 681,20	100,00%
22.5.6	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRIE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_062022	UN	6,00		0,00%	6,00	R\$ 54,57	R\$ 3,89	R\$ 58,46	R\$ 74,83	R\$ 448,98	R\$ -	R\$ 448,98	100,00%
22.5.7	104065	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRIE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_062022	UN	6,00		0,00%	6,00	R\$ 125,36	R\$ 4,06	R\$ 129,42	R\$ 165,66	R\$ 993,96	R\$ -	R\$ 993,96	100,00%
22.5.8	104064	SINAPI	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRIE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_062022	UN	4,00		0,00%	4,00	R\$ 148,93	R\$ 4,06	R\$ 152,99	R\$ 195,82	R\$ 783,28	R\$ -	R\$ 783,28	100,00%
22.5.9	COMP.HVAC.018	SINAPI / COTAÇÃO	DIFUSOR DE AR CIRCULAR, EM PVC, COR BRANCA, COM REGISTRO, DIMENSÕES Ø100	UN	13,00		0,00%	-	R\$ 41,28	R\$ 20,18	R\$ 61,46	R\$ 78,67	R\$ 1.022,71	R\$ -	R\$ -	0,00%



PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JHXB.NTDD: <https://proad.tr12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtmll>

22.5.10	COMP.HVAC.028	SINAPI / COTAÇÃO	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 200 X 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	2,00		0,00%	2,00	R\$ 482,85	R\$ 13,09	R\$ 495,93	R\$ 634,80	R\$ 1.269,60	R\$ -	R\$ 1.269,60	100,00%
22.5.11	104176	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00		0,00%	2,00	R\$ 207,28	R\$ 13,07	R\$ 220,46	R\$ 282,18	R\$ 564,36	R\$ -	R\$ 564,36	100,00%
22.5.12	COMP.HVAC.024	SINAPI / COTAÇÃO	JUNTA FLEXÍVEL 70/100 - 5 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,50		0,00%	-	R\$ 27,57	R\$ 12,11	R\$ 39,68	R\$ 50,79	R\$ 228,56	R\$ -	R\$ -	0,00%
22.5.13	COMP.HVAC.021	SINAPI / SBC	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 150x100 MM	UN	10,00		0,00%	10,00	R\$ 23,89	R\$ 10,94	R\$ 34,84	R\$ 44,59	R\$ 445,90	R\$ -	R\$ 445,90	100,00%
22.5.14	COMP.HVAC.022	SINAPI / COTAÇÃO	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 150x125 MM	UN	4,00		0,00%	4,00	R\$ 67,20	R\$ 12,00	R\$ 79,19	R\$ 101,37	R\$ 405,48	R\$ -	R\$ 405,48	100,00%
22.5.15	COMP.HVAC.024	SINAPI / SBC	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 200x150MM	UN	3,00		0,00%	3,00	R\$ 83,76	R\$ 13,09	R\$ 96,85	R\$ 123,97	R\$ 371,91	R\$ -	R\$ 371,91	100,00%
22.5.16	104177	SINAPI	TÉ. PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00		0,00%	4,00	R\$ 147,98	R\$ 13,07	R\$ 161,05	R\$ 206,15	R\$ 824,60	R\$ -	R\$ 824,60	100,00%
22.5.17	COMP.HVAC.028	SINAPI / COTAÇÃO	TOMADA DE AR EXTERNO CIRCULAR, TELA DE PROTEÇÃO E PINGADERA Ø150MM	UN	2,00		0,00%	-	R\$ 19,32	R\$ 37,74	R\$ 57,06	R\$ 73,03	R\$ 146,06	R\$ -	R\$ -	0,00%
22.5.18	COMP.HVAC.028	SINAPI / COTAÇÃO	TOMADA DE AR EXTERNO CIRCULAR, TELA DE PROTEÇÃO E PINGADERA Ø200MM	UN	2,00		0,00%	-	R\$ 26,88	R\$ 37,74	R\$ 64,62	R\$ 82,71	R\$ 165,42	R\$ -	R\$ -	0,00%
22.5.19	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1,50		0,00%	1,50	R\$ 125,77	R\$ 2,99	R\$ 128,36	R\$ 164,31	R\$ 246,47	R\$ -	R\$ 246,47	100,00%
22.5.20	COMP.HVAC.020	SINAPI / COTAÇÃO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 125MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	0,50		0,00%	0,50	R\$ 55,58	R\$ 11,75	R\$ 67,33	R\$ 86,18	R\$ 43,09	R\$ -	R\$ 43,09	100,00%
22.5.21	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AGREGO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	28,00		0,00%	28,00	R\$ 38,25	R\$ 11,75	R\$ 49,99	R\$ 63,99	R\$ 1.791,72	R\$ -	R\$ 1.791,72	100,00%
22.5.22	COMP.HVAC.019	SINAPI / COTAÇÃO	VENEZIANA CIRCULAR EXTERIOR EM ALUMINIO NA COR BRANCA E TELA DE PROTEÇÃO Ø150MM	UN	2,00		0,00%	-	R\$ 17,11	R\$ 20,18	R\$ 37,30	R\$ 47,74	R\$ 95,48	R\$ -	R\$ -	0,00%
23			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-						R\$ 518.636,53	R\$ 786,18	R\$ 268.189,22	51,70%
23.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REDE COMUM ILUMINAÇÃO E REDE ESTABILIZADA				-						R\$ 262.325,60	R\$ -	R\$ 150.397,52	57,33%
23.1.1	COMP.ELE.01	SINAPI, TCPO	PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 22, LARGURA 38 MM X ALTURA 38 MM, SEM TAMPA, INSTALAÇÃO SUPERIOR COM BUCHA, INCLUSIVE CONEXÕES	M	450,00		0,00%	450,00	R\$ 59,47	R\$ 19,91	R\$ 79,37	R\$ 101,60	R\$ 45.720,00	R\$ -	R\$ 45.720,00	100,00%
23.1.2	COMP.ELE.02	SINAPI, TCPO	ELETROCALHA LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 22, TIPO "U", SEM TAMPA, LARGURA 200 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES	M	92,00		0,00%	92,00	R\$ 101,12	R\$ 22,40	R\$ 123,51	R\$ 158,10	R\$ 14.545,20	R\$ -	R\$ 14.545,20	100,00%
23.1.3	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	160,00		0,00%	160,00	R\$ 3,05	R\$ 5,58	R\$ 8,63	R\$ 11,04	R\$ 1.766,40	R\$ -	R\$ 1.766,40	100,00%
23.1.4	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	649,00		0,00%	649,00	R\$ 4,19	R\$ 5,58	R\$ 9,77	R\$ 12,50	R\$ 8.112,50	R\$ -	R\$ 8.112,50	100,00%
23.1.5	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	289,00		0,00%	289,00	R\$ 4,91	R\$ 4,95	R\$ 9,86	R\$ 12,62	R\$ 3.647,18	R\$ -	R\$ 3.647,18	100,00%
23.1.6	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,00		0,00%	45,00	R\$ 4,20	R\$ 2,79	R\$ 6,99	R\$ 8,95	R\$ 402,75	R\$ -	R\$ 402,75	100,00%
23.1.7	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00		0,00%	200,00	R\$ 11,73	R\$ 7,13	R\$ 18,86	R\$ 24,14	R\$ 4.828,00	R\$ -	R\$ 4.828,00	100,00%
23.1.8	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.557,00		0,00%	2.450,00	R\$ 1,55	R\$ 0,95	R\$ 2,49	R\$ 3,19	R\$ 8.156,63	R\$ -	R\$ 7.815,50	95,82%
23.1.9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.500,00		0,00%	4.000,00	R\$ 2,40	R\$ 1,20	R\$ 3,60	R\$ 4,61	R\$ 20.745,00	R\$ -	R\$ 18.440,00	88,89%
23.1.10	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,00		0,00%	450,00	R\$ 4,28	R\$ 1,62	R\$ 5,89	R\$ 7,55	R\$ 3.397,50	R\$ -	R\$ 3.397,50	100,00%
23.1.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.000,00		0,00%	2.800,00	R\$ 3,92	R\$ 1,62	R\$ 5,53	R\$ 7,08	R\$ 21.240,00	R\$ -	R\$ 19.824,00	93,33%
23.1.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00		0,00%	120,00	R\$ 5,59	R\$ 2,12	R\$ 7,70	R\$ 9,86	R\$ 1.183,20	R\$ -	R\$ 1.183,20	100,00%
23.1.13	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115,00		0,00%	115,00	R\$ 7,98	R\$ 0,34	R\$ 8,32	R\$ 10,65	R\$ 1.224,75	R\$ -	R\$ 1.224,75	100,00%
23.1.14	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00		0,00%	140,00	R\$ 12,65	R\$ 0,53	R\$ 13,18	R\$ 16,87	R\$ 2.361,80	R\$ -	R\$ 2.361,80	100,00%
23.1.15	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	250,00		0,00%	-	R\$ 73,74	R\$ 5,08	R\$ 78,82	R\$ 100,89	R\$ 25.222,50	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.1.16	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 15,54	R\$ 18,47	R\$ 34,01	R\$ 43,53	R\$ 43,53	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.1.17	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 23,15	R\$ 25,48	R\$ 48,63	R\$ 62,25	R\$ 62,25	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.1.18	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00		0,00%	-	R\$ 20,63	R\$ 22,01	R\$ 42,63	R\$ 54,57	R\$ 600,27	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.1.19	91963	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00		0,00%	-	R\$ 33,28	R\$ 36,07	R\$ 69,35	R\$ 88,76	R\$ 2.219,00	R\$ -	R\$ -	0,00%



PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código JHXB.NTDD: <https://proad.tr12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

23.1.20	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00		0,00%	-	R\$ 28,26	R\$ 29,04	R\$ 57,30	R\$ 73,35	R\$ 293,40	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.1.21	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P-T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	43,00		0,00%	-	R\$ 11,53	R\$ 13,15	R\$ 24,68	R\$ 31,59	R\$ 1.358,37	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.1.22	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	144,00		0,00%	-	R\$ 13,97	R\$ 15,37	R\$ 29,34	R\$ 37,56	R\$ 5.408,64	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.1.23	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00		0,00%	-	R\$ 22,54	R\$ 22,80	R\$ 45,34	R\$ 58,03	R\$ 290,15	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.1.24	COMP.ELE.03	INAPI - ADAPTAD	TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	UN	35,00		0,00%	-	R\$ 17,30	R\$ 16,59	R\$ 33,89	R\$ 43,38	R\$ 1.518,30	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.1.25	COMP.ELE.06	INAPI - ADAPTAD	COLUNA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COMPRIMENTO 9m, PARA DESCIDAS DE TUBULAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA PELA PARTE SUPERIOR, DIMENSÕES APROXIMADAS 103mm x 105mm REF.: DUTOTEC DT-76290.01 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		0,00%	-	R\$ 1.595,01	R\$ 29,03	R\$ 1.624,04	R\$ 2.078,77	R\$ 4.157,54	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.1.26	COMP.ELE.07	SINAPI	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	16,00		0,00%	-	R\$ 33,90	R\$ 18,66	R\$ 52,57	R\$ 67,28	R\$ 1.076,48	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.1.27	COMP.ELE.084	INAPI ADAPTAD	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO "30 X 15" CM, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	2,00		0,00%	-	R\$ 73,05	R\$ 20,98	R\$ 94,03	R\$ 120,36	R\$ 240,72	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.1.28	COMP.ELE.091	SINAPI	POSTE CONCO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIÂMETRO INFERIOR = "130" MM	UN	10,00		0,00%	-	R\$ 1.923,29	R\$ 110,62	R\$ 2.033,91	R\$ 2.603,40	R\$ 26.034,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.1.29	101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00		0,00%	-	R\$ 186,30	R\$ 16,19	R\$ 204,49	R\$ 261,75	R\$ 2.617,50	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.1.30	COMP.ELE.08	INAPI - ADAPTAD	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	6,00		0,00%	-	R\$ 38,51	R\$ 4,98	R\$ 43,48	R\$ 55,66	R\$ 333,96	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.1.31	COMP.ELE.09	INAPI - ADAPTAD	LUMINÁRIA LED QUADRADA 40W LUZ BRANCO NEUTRO QUADRADO BIVOLT	UN	111,00		0,00%	-	R\$ 172,86	R\$ 16,59	R\$ 189,44	R\$ 242,49	R\$ 26.916,39	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.1.32	COMP.ELE.010	INAPI - ADAPTAD	LUMINÁRIA LED RETANGULAR 48W LUZ BRANCO NEUTRO QUADRADO BIVOLT	UN	21,00		0,00%	-	R\$ 279,63	R\$ 16,59	R\$ 296,22	R\$ 379,17	R\$ 7.962,57	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.1.33	COMP.ELE.011	SINAPI	CAIXA PARA TOMADA FIXA, PERFIL COM TAMPA E TOMADA UNIVERSAL, PARA 250/250	UN	89,00		0,00%	89,00	R\$ 21,15	R\$ 26,96	R\$ 48,10	R\$ 61,57	R\$ 5.479,73	R\$ -	R\$ 5.479,73	100,00%
23.1.34	COMP.ELE.012	INAPI - ADAPTAD	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", COM TAMPA, DE 3/4"	UN	20,00		0,00%	20,00	R\$ 12,82	R\$ 4,15	R\$ 16,97	R\$ 21,72	R\$ 434,40	R\$ -	R\$ 434,40	100,00%
23.1.35	COMP.ELE.013	INAPI - ADAPTAD	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", COM TAMPA, DE 3/4"	UN	57,00		0,00%	57,00	R\$ 10,69	R\$ 4,15	R\$ 14,84	R\$ 19,00	R\$ 1.083,00	R\$ -	R\$ 1.083,00	100,00%
23.1.36	COMP.ELE.014	INAPI - ADAPTAD	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", COM TAMPA, DE 3/4"	UD	14,00		0,00%	14,00	R\$ 11,41	R\$ 4,15	R\$ 15,56	R\$ 19,92	R\$ 278,88	R\$ -	R\$ 278,88	100,00%
23.1.37	COMP.ELE.015	INAPI - ADAPTAD	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", COM TAMPA, DE 3/4"	UN	30,00		0,00%	30,00	R\$ 11,41	R\$ 4,15	R\$ 15,56	R\$ 19,92	R\$ 597,60	R\$ -	R\$ 597,60	100,00%
23.1.38	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	15,00		0,00%	13,00	R\$ 97,05	R\$ 19,63	R\$ 116,67	R\$ 149,34	R\$ 2.240,10	R\$ -	R\$ 1.941,42	86,67%
23.1.39	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	149,00		0,00%	149,00	R\$ 3,17	R\$ 6,95	R\$ 10,12	R\$ 12,95	R\$ 1.929,55	R\$ -	R\$ 1.929,55	100,00%
23.1.40	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	63,00		0,00%	63,00	R\$ 4,02	R\$ 12,21	R\$ 16,23	R\$ 20,78	R\$ 1.724,74	R\$ -	R\$ 1.724,74	100,00%
23.1.41	97884	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	5,00		0,00%	4,00	R\$ 618,48	R\$ 61,91	R\$ 700,39	R\$ 896,50	R\$ 4.482,50	R\$ -	R\$ 3.586,00	80,00%
23.1.42	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00		0,00%	2,00	R\$ 5,70	R\$ 22,98	R\$ 28,68	R\$ 36,71	R\$ 73,42	R\$ -	R\$ 73,42	100,00%
23.1.43	COMP.ELE.044	INAPI - ADAPTAD	ANILHA EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS	UN	450,00		0,00%	-	R\$ 0,13	R\$ 0,41	R\$ 0,55	R\$ 0,70	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.2			INSTALAÇÕES DE REDE ESTABILIZADA				-						R\$ 28.901,08	R\$ -	R\$ 5.670,21	19,65%
23.2.1	COMP.ELE.01	SINAPI- TIPO	PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 22, LARGURA 38 MM X ALTURA 38 MM, SEM TAMPA, INSTALAÇÃO SUPERIOR COM BUCHA, INCLUSIVE CONEXÕES	M	29,00		0,00%	29,00	R\$ 59,47	R\$ 19,91	R\$ 79,37	R\$ 101,60	R\$ 2.946,40	R\$ -	R\$ 2.946,40	100,00%
23.2.2	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	16,00		0,00%	16,00	R\$ 3,05	R\$ 5,58	R\$ 8,63	R\$ 11,04	R\$ 176,64	R\$ -	R\$ 176,64	100,00%
23.2.3	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00		0,00%	30,00	R\$ 4,19	R\$ 5,58	R\$ 9,77	R\$ 12,50	R\$ 375,00	R\$ -	R\$ 375,00	100,00%
23.2.4	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00		0,00%	20,00	R\$ 4,91	R\$ 4,95	R\$ 9,86	R\$ 12,62	R\$ 252,40	R\$ -	R\$ 252,40	100,00%



PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JHXB.NTDD: <https://proad.tr12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

23.2.5	COMP.ELE.042	NAPI - ADAPTA	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	230,00		0,00%	200,00	R\$	1,95	R\$	1,24	R\$	3,20	R\$	4,09	R\$	940,70	R\$	-	R\$	818,00	86,96%	
23.2.6	COMP.ELE.043	NAPI - ADAPTA	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	165,00		0,00%	165,00	R\$	2,43	R\$	1,24	R\$	3,67	R\$	4,70	R\$	775,50	R\$	-	R\$	775,50	100,00%	
23.2.7	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P-T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00		0,00%	5,00	R\$	16,04	R\$	15,36	R\$	31,40	R\$	40,19	R\$	442,09	R\$	-	R\$	200,95	45,45%	
23.2.8	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00		0,00%	8,00	R\$	3,17	R\$	6,95	R\$	10,12	R\$	12,95	R\$	103,60	R\$	-	R\$	103,60	100,00%	
23.2.9	COMP.ELE.012	NAPI - ADAPTA	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", COM TAMPA, DE 3/4"	UN	1,00		0,00%	1,00	R\$	12,82	R\$	4,15	R\$	16,97	R\$	21,72	R\$	21,72	R\$	-	R\$	21,72	100,00%	
23.2.10	COMP.ELE.04	NAPI - ADAPTA	CAIXA DE TOMADA PARA DUTO DE PISO 25x140mm COM 4 PONTOS ELÉTRICOS E 4 DE DADOS	UN	8,00		0,00%	-	R\$	443,46	R\$	26,96	R\$	470,42	R\$	602,13	R\$	4.817,04	R\$	-	R\$	-	0,00%	
23.2.11	COMP.ELE.05	NAPI - ADAPTA	NOBREAK MONOFÁSICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA	UN	1,00		0,00%	-	R\$	13.933,88	R\$	62,21	R\$	13.996,09	R\$	17.914,99	R\$	17.914,99	R\$	-	R\$	-	0,00%	
23.2.12	COMP.ELE.044	NAPI - ADAPTA	ANILHA EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS	UN	50,00		0,00%	-	R\$	0,13	R\$	0,41	R\$	0,55	R\$	0,70	R\$	35,00	R\$	-	R\$	-	0,00%	
23.3			QUADROS ELÉTRICOS E DISJUNTORES - INTERNOS				-										R\$	9.379,69	R\$	-	R\$	9.379,69	100,00%	
23.3.1	COMP.ELE.16	NAPI - ADAPTA	QUADRO ELÉTRICO EM CHAPA DE AÇO, DE SOBREPOR, PARA 64 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU 973 x 465 x 95 mm, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO	UN	1,00		0,00%	1,00	2.046,02	145,16	2.191,18	2.804,71	2.804,71	R\$	2.804,71	R\$	-	R\$	2.804,71	R\$	-	R\$	2.804,71	100,00%
23.3.2	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,00%	1,00	476,30	24,48	500,79	641,01	641,01	R\$	641,01	R\$	-	R\$	641,01	R\$	-	R\$	641,01	100,00%
23.3.3	COMP.ELE.085	SINAPI	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8"	M	1,00		0,00%	1,00	9,14	3,32	12,46	15,95	15,95	R\$	15,95	R\$	-	R\$	15,95	R\$	-	R\$	15,95	100,00%
23.3.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	41,00		0,00%	41,00	8,49	1,96	10,45	13,38	13,38	R\$	548,58	R\$	-	R\$	548,58	R\$	-	R\$	548,58	100,00%
23.3.5	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	33,00		0,00%	33,00	8,88	2,74	11,62	14,88	14,88	R\$	491,04	R\$	-	R\$	491,04	R\$	-	R\$	491,04	100,00%
23.3.6	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00		0,00%	10,00	8,88	2,74	11,62	14,88	14,88	R\$	148,80	R\$	-	R\$	148,80	R\$	-	R\$	148,80	100,00%
23.3.7	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,00%	1,00	9,27	3,77	13,04	16,69	16,69	R\$	16,69	R\$	-	R\$	16,69	R\$	-	R\$	16,69	100,00%
23.3.8	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00		0,00%	5,00	13,18	5,60	18,78	24,04	24,04	R\$	120,20	R\$	-	R\$	120,20	R\$	-	R\$	120,20	100,00%
23.3.9	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		0,00%	2,00	60,14	23,55	83,69	107,13	107,13	R\$	214,26	R\$	-	R\$	214,26	R\$	-	R\$	214,26	100,00%
23.3.10	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR - CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,00%	1,00	474,05	54,86	528,91	677,00	677,00	R\$	677,00	R\$	-	R\$	677,00	R\$	-	R\$	677,00	100,00%
23.3.11	COMP.ELE.017	NAPI - ADAPTA	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	13,00		0,00%	13,00	112,22	2,90	115,12	147,35	147,35	R\$	1.915,55	R\$	-	R\$	1.915,55	R\$	-	R\$	1.915,55	100,00%
23.3.12	COMP.ELE.018	NAPI - ADAPTA	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00		0,00%	1,00	114,20	2,90	117,10	149,89	149,89	R\$	149,89	R\$	-	R\$	149,89	R\$	-	R\$	149,89	100,00%
23.3.13	COMP.ELE.019	NAPI - ADAPTA	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	UN	4,00		0,00%	4,00	84,02	2,90	86,92	111,26	111,26	R\$	445,04	R\$	-	R\$	445,04	R\$	-	R\$	445,04	100,00%
23.3.14	COMP.ELE.020	NAPI - ADAPTA	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	UN	6,00		0,00%	6,00	57,05	2,90	59,95	76,74	76,74	R\$	460,44	R\$	-	R\$	460,44	R\$	-	R\$	460,44	100,00%
23.3.15	COMP.ELE.021	NAPI - ADAPTA	CHAVE REVERSORA 4 POLOS, 40A, 3 POSIÇÕES	UN	1,00		0,00%	1,00	9,47	32,35	41,82	53,53	53,53	R\$	53,53	R\$	-	R\$	53,53	R\$	-	R\$	53,53	100,00%
23.3.16	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR - CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,00%	1,00	474,05	54,86	528,91	677,00	677,00	R\$	677,00	R\$	-	R\$	677,00	R\$	-	R\$	677,00	100,00%
23.4			INSTALAÇÕES REDE LÓGICA, CFTV E ALARME				-									R\$	135.912,55	R\$	-	R\$	65.534,62	48,22%		
23.4.1	COMP.ELE.072	SINAPI- TCPO	ELETROCALHA LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 22 TIPO "U", SEM TAMPA LARGURA 300 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES	M	68,00		0,00%	68,00	R\$	95,60	R\$	27,37	R\$	122,96	R\$	157,41	R\$	10.703,88	R\$	-	R\$	10.703,88	100,00%	
23.4.2	COMP.ELE.071	SINAPI- TCPO	ELETROCALHA LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 22 TIPO "U", SEM TAMPA LARGURA 300 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,00		0,00%	11,00	R\$	95,60	R\$	27,37	R\$	122,96	R\$	157,41	R\$	1.731,51	R\$	-	R\$	1.731,51	100,00%	
23.4.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	140,00		0,00%	140,00	R\$	6,04	R\$	3,92	R\$	9,96	R\$	12,75	R\$	1.785,00	R\$	-	R\$	1.785,00	100,00%	
23.4.4	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00		0,00%	15,00	R\$	9,72	R\$	6,72	R\$	16,44	R\$	21,04	R\$	315,60	R\$	-	R\$	315,60	100,00%	
23.4.5	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	137,00		0,00%	-	R\$	35,12	R\$	8,55	R\$	43,67	R\$	55,90	R\$	7.658,30	R\$	-	R\$	-	0,00%	

PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JHXB.NTDD: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



23.4.6	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	90,00		0,00%	90,00	R\$	4,91	R\$	4,95	R\$	9,86	R\$	12,62	R\$	1.135,80	R\$	-	R\$	1.135,80	100,00%
23.4.7	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	105,00		0,00%	105,00	R\$	7,77	R\$	8,19	R\$	15,96	R\$	20,43	R\$	2.145,15	R\$	-	R\$	2.145,15	100,00%
23.4.8	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	120,00		0,00%	120,00	R\$	4,91	R\$	4,95	R\$	9,86	R\$	12,62	R\$	1.514,40	R\$	-	R\$	1.514,40	100,00%
23.4.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	30,00		0,00%	30,00	R\$	5,30	R\$	7,35	R\$	12,65	R\$	16,19	R\$	485,70	R\$	-	R\$	485,70	100,00%
23.4.10	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	22,00		0,00%	22,00	R\$	5,03	R\$	7,18	R\$	12,21	R\$	15,63	R\$	343,86	R\$	-	R\$	343,86	100,00%
23.4.11	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	3,00		0,00%	3,00	R\$	7,64	R\$	23,81	R\$	31,45	R\$	40,26	R\$	120,78	R\$	-	R\$	120,78	100,00%
23.4.12	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	1,00		0,00%	1,00	R\$	4,02	R\$	12,21	R\$	16,23	R\$	20,78	R\$	20,78	R\$	-	R\$	20,78	100,00%
23.4.13	92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	20,00		0,00%	20,00	R\$	2,88	R\$	6,95	R\$	9,83	R\$	12,58	R\$	251,60	R\$	-	R\$	251,60	100,00%
23.4.14	92867	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	15,00		0,00%	15,00	R\$	5,41	R\$	22,98	R\$	28,39	R\$	36,34	R\$	545,10	R\$	-	R\$	545,10	100,00%
23.4.15	COMP.ELE.023	SINAPI	CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO	UN	137,00		0,00%	-	R\$	1,66	R\$	10,37	R\$	12,02	R\$	15,39	R\$	2.108,43	R\$	-	R\$	-	0,00%
23.4.16	COMP.ELE.024	INAPI - ADAPTA	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", COM TAMPA, DE 1"	UN	3,00		0,00%	3,00	R\$	15,98	R\$	4,98	R\$	20,95	R\$	26,82	R\$	80,46	R\$	-	R\$	80,46	100,00%
23.4.17	COMP.ELE.015	INAPI - ADAPTA	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", COM TAMPA, DE 3/4"	UN	7,00		0,00%	7,00	R\$	11,41	R\$	4,15	R\$	15,56	R\$	19,92	R\$	139,44	R\$	-	R\$	139,44	100,00%
23.4.18	COMP.ELE.025	INAPI - ADAPTA	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", COM TAMPA, DE 1"	UN	15,00		0,00%	15,00	R\$	13,33	R\$	4,98	R\$	18,31	R\$	23,43	R\$	351,45	R\$	-	R\$	351,45	100,00%
23.4.19	COMP.ELE.073	INAPI - ADAPTA	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	UN	2,00		0,00%	2,00	R\$	32,00	R\$	4,98	R\$	36,98	R\$	47,33	R\$	94,66	R\$	-	R\$	94,66	100,00%
23.4.20	COMP.ELE.074	INAPI - ADAPTA	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	UN	2,00		0,00%	2,00	R\$	26,32	R\$	4,98	R\$	33,29	R\$	42,62	R\$	85,24	R\$	-	R\$	85,24	100,00%
23.4.21	COMP.ELE.026	INAPI - ADAPTA	PATCH CORD, CATEGORIA 5E, EXTENSÃO DE 0,30 M	UN	154,00		0,00%	-	R\$	16,97	R\$	6,22	R\$	23,19	R\$	29,69	R\$	4.572,26	R\$	-	R\$	-	0,00%
23.4.22	COMP.ELE.027	INAPI - ADAPTA	PATCH CORD, CATEGORIA 5E, EXTENSÃO DE 3 M	UN	96,00		0,00%	-	R\$	45,52	R\$	8,29	R\$	53,81	R\$	68,88	R\$	6.612,48	R\$	-	R\$	-	0,00%
23.4.23	COMP.ELE.067	INAPI - ADAPTA	PATCH CORD, CATEGORIA 5E, EXTENSÃO DE 6 M	UN	24,00		0,00%	-	R\$	84,49	R\$	4,15	R\$	88,63	R\$	113,40	R\$	2.722,80	R\$	-	R\$	-	0,00%
23.4.24	COMP.ELE.069	INAPI - ADAPTA	CABO UTP CATEGORIA 6, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6.035,00		0,00%	5.500,00	R\$	3,61	R\$	2,16	R\$	5,77	R\$	7,38	R\$	44.538,30	R\$	-	R\$	40.590,00	91,14%
23.4.25	100562	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.º 603X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	UN	1,00		0,00%	-	R\$	218,94	R\$	47,99	R\$	266,93	R\$	341,67	R\$	341,67	R\$	-	R\$	-	0,00%
23.4.26	COMP.ELE.070	SINAPI	CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA TELEFÔNICA TIPO R1, COMPRIMENTO 60cm, LARGURA 40cm, PROFUNDIDADE 50cm, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, "R1".	UN	5,00		0,00%	2,00	R\$	616,66	R\$	234,11	R\$	850,77	R\$	1.088,98	R\$	5.444,90	R\$	-	R\$	2.177,96	40,00%
23.4.27	100555	SINAPI	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	UN	1,00		0,00%	-	R\$	950,92	R\$	42,54	R\$	993,46	R\$	1.271,63	R\$	1.271,63	R\$	-	R\$	-	0,00%
23.4.28	98304	SINAPI	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2018	UN	4,00		0,00%	-	R\$	2.309,92	R\$	511,09	R\$	2.621,01	R\$	3.610,89	R\$	14.443,56	R\$	-	R\$	-	0,00%
23.4.29	COMP.ELE.031	INAPI - ADAPTA	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	UN	2,00		0,00%	-	R\$	635,21	R\$	18,66	R\$	653,87	R\$	836,95	R\$	1.673,90	R\$	-	R\$	-	0,00%
23.4.30	COMP.ELE.032	INAPI - ADAPTA	REGUA COM 8 TOMADAS TIPO 2P-T10A/250V PADRÃO 19" PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ARMÁRIO EQUIPADO COM PROTETORES DE SURTOS INCORPORADOS, LEDS INDICATIVOS DE OPERAÇÃO	UN	2,00		0,00%	-	R\$	96,94	R\$	12,44	R\$	109,38	R\$	140,01	R\$	280,02	R\$	-	R\$	-	0,00%
23.4.31	COMP.ELE.075	INAPI - ADAPTA	SWITCH 24 PORTAS, CATEGORIA 6, PARA RACK DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	UN	1,00		0,00%	-	R\$	1.013,91	R\$	20,74	R\$	1.034,65	R\$	1.324,35	R\$	1.324,35	R\$	-	R\$	-	0,00%
23.4.32	COMP.ELE.076	INAPI - ADAPTA	SWITCH 48 PORTAS, CATEGORIA 6, PARA RACK DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	UN	3,00		0,00%	-	R\$	3.042,22	R\$	41,47	R\$	3.083,69	R\$	3.947,13	R\$	11.841,39	R\$	-	R\$	-	0,00%
23.4.33	COMP.ELE.077	INAPI - ADAPTA	KIT DE VENTILAÇÃO 1U COM 4 VENTILADOR E TERMOSTATO PARA RACK	UN	1,00		0,00%	-	R\$	321,87	R\$	16,59	R\$	338,46	R\$	433,23	R\$	433,23	R\$	-	R\$	-	0,00%
23.4.34	COMP.ELE.078	INAPI - ADAPTA	GUIA DE CABOS HORIZONTAL 19" 1U 60mm METÁLICO PRETO PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00		0,00%	-	R\$	26,25	R\$	12,44	R\$	40,70	R\$	52,09	R\$	364,63	R\$	-	R\$	-	0,00%
23.4.35	COMP.ELE.079	INAPI - ADAPTA	BANDEJA DUPLA DE FIXAÇÃO VENTILADA PADRÃO 19"X1U, 600mm PARA RACK	UN	3,00		0,00%	-	R\$	433,20	R\$	12,44	R\$	445,64	R\$	570,42	R\$	1.711,26	R\$	-	R\$	-	0,00%
23.4.36	COMP.ELE.080	INAPI - ADAPTA	DISTRIBUIDOR INTERNO DE FIBRA ÓPTICA 12F, 1 HU	UN	1,00		0,00%	-	R\$	460,18	R\$	62,21	R\$	522,39	R\$	668,66	R\$	668,66	R\$	-	R\$	-	0,00%

PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JHXB.NTDD: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



23.4.37	COMP.ELE.081	INAPI - ADAPTA	ENVOLOPAMENTO EM CONCRETO PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA	M	25,00		0,00%	25,00	R\$ 14,47	R\$ 14,16	R\$ 28,63	R\$ 36,65	R\$ 916,25	R\$ -	R\$ 916,25	100,00%
23.4.38	COMP.ELE.082	INAPI - ADAPTA	BLOCO DE CONEXÃO PADRÃO IDC - 10 PARES PARA TELECOMUNICAÇÕES	UN	2,00		0,00%	-	R\$ 1.592,02	R\$ 10,37	R\$ 1.602,39	R\$ 2.051,06	R\$ 4.102,12	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.4.39	COMP.ELE.083	INAPI - ADAPTA	KIT PORCA GAIOLA COM 10 PEÇAS	CJ	50,00		0,00%	-	R\$ 11,98	R\$ 4,15	R\$ 16,12	R\$ 20,64	R\$ 1.032,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.5			INSTALAÇÕES DE SOM			-							R\$ 6.621,74	R\$ 786,18	R\$ 2.290,93	34,60%
23.5.1	COMP.ELE.038	INAPI - ADAPTA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2X22 AWG BLINDADO PARA AUDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00		0,00%	35,00	R\$ 7,13	R\$ 12,44	R\$ 19,57	R\$ 25,05	R\$ 1.753,50	R\$ -	R\$ 876,75	50,00%
23.5.2	COMP.ELE.039	INAPI - ADAPTA	CABO POLARIZADO DE COBRE 2x1,5mm² PARA SOM	M	95,00		0,00%	40,00	R\$ 3,97	R\$ 8,29	R\$ 12,26	R\$ 15,70	R\$ 1.491,50	R\$ -	R\$ 628,00	42,11%
23.5.3	91999	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO); PVC; INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	4,00	100,00%	4,00	R\$ 5,70	R\$ 22,88	R\$ 28,68	R\$ 36,71	R\$ 146,84	R\$ 146,84	R\$ 146,84	100,00%
23.5.4	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%	2,00	R\$ 44,85	R\$ 5,48	R\$ 50,33	R\$ 64,42	R\$ 128,84	R\$ 128,84	R\$ 128,84	100,00%
23.5.5	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,00	18,00	100,00%	18,00	R\$ 4,91	R\$ 4,95	R\$ 9,86	R\$ 12,62	R\$ 227,16	R\$ 227,16	R\$ 227,16	100,00%
23.5.6	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	10,00	100,00%	10,00	R\$ 5,30	R\$ 7,35	R\$ 12,65	R\$ 16,19	R\$ 161,90	R\$ 161,90	R\$ 161,90	100,00%
23.5.7	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	8,00	100,00%	8,00	R\$ 3,29	R\$ 8,57	R\$ 11,86	R\$ 15,18	R\$ 121,44	R\$ 121,44	R\$ 121,44	100,00%
23.5.8	COMP.ELE.040	INAPI - ADAPTA	PAR DE CAIXA DE SOM ACÚSTICA BRANCA DE SOBREPOTÊNCIA MÍNIMA DE 100 WATTS RMS, IMPEDÂNCIA NOMINAL DE 8 OHMS	CJ	2,00		0,00%	-	R\$ 956,78	R\$ 55,16	R\$ 1.011,94	R\$ 1.295,28	R\$ 2.590,56	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.6			SPDA E ATERRAMENTO			-							R\$ 21.979,39	R\$ -	R\$ 21.979,39	100,00%
23.6.1	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	M	240,00		0,00%	240,00	R\$ 43,87	1,35	45,22	57,89	R\$ 13.893,60	R\$ -	R\$ 13.893,60	100,00%
23.6.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,33		0,00%	10,33	12,51	57,44	69,95	89,54	R\$ 924,95	R\$ -	R\$ 924,95	100,00%
23.6.3	COMP.ELE.093	SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE	M²	10,33		0,00%	10,33	7,61	34,81	42,42	54,30	R\$ 560,92	R\$ -	R\$ 560,92	100,00%
23.6.4	96985	SINAPI	MASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	12,00		0,00%	12,00	52,99	10,29	63,28	80,59	R\$ 971,88	R\$ -	R\$ 971,88	100,00%
23.6.5	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,00		0,00%	18,00	7,77	8,19	15,96	20,43	R\$ 367,74	R\$ -	R\$ 367,74	100,00%
23.6.6	COMP.ELE.085	INAPI ADAPTA	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8"	M	230,00		0,00%	230,00	9,14	3,32	12,46	15,95	R\$ 3.668,50	R\$ -	R\$ 3.668,50	100,00%
23.6.7	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00		0,00%	8,00	41,50	5,70	47,20	60,42	R\$ 483,36	R\$ -	R\$ 483,36	100,00%
23.6.8	COMP.ELE.089	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	18,00		0,00%	18,00	1,49	2,07	3,56	4,56	R\$ 82,08	R\$ -	R\$ 82,08	100,00%
23.6.9	COMP.ELE.090	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	6,00		0,00%	6,00	5,24	2,07	7,31	9,36	R\$ 56,16	R\$ -	R\$ 56,16	100,00%
23.6.10	COMP.ELE.045	INAPI - ADAPTA	TERMINAL AÉREO EM ALUMÍNIO 7/8"x1/8" COM BASE PLANA	UN	27,00		0,00%	27,00	19,77	8,29	28,07	35,93	R\$ 970,11	R\$ -	R\$ 970,11	100,00%
23.7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES PROVISÓRIAS			-							R\$ 12.906,95	R\$ -	R\$ 12.906,95	100,00%
23.7.1	COMP.ELE.086	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 10,00 M, RESISTÊNCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		0,00%	1,00	R\$ 1.718,90	R\$ 153,60	R\$ 1.872,50	R\$ 2.396,80	R\$ 2.396,80	R\$ -	R\$ 2.396,80	100,00%
23.7.2	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		0,00%	2,00	R\$ 58,24	R\$ 16,81	R\$ 75,06	R\$ 96,07	R\$ 192,14	R\$ -	R\$ 192,14	100,00%
23.7.3	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,00%	1,00	R\$ 57,03	R\$ 11,32	R\$ 68,35	R\$ 87,49	R\$ 87,49	R\$ -	R\$ 87,49	100,00%
23.7.4	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOT, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,00%	1,00	R\$ 420,56	R\$ 63,16	R\$ 483,73	R\$ 619,17	R\$ 619,17	R\$ -	R\$ 619,17	100,00%
23.7.5	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00		0,00%	3,00	R\$ 8,49	R\$ 1,96	R\$ 10,45	R\$ 13,38	R\$ 40,14	R\$ -	R\$ 40,14	100,00%
23.7.6	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00		0,00%	5,00	R\$ 8,88	R\$ 2,74	R\$ 11,62	R\$ 14,88	R\$ 74,40	R\$ -	R\$ 74,40	100,00%
23.7.7	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,00%	1,00	R\$ 55,85	R\$ 8,23	R\$ 64,08	R\$ 82,02	R\$ 82,02	R\$ -	R\$ 82,02	100,00%
23.7.8	COMP.ELE.042	INAPI - ADAPTA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00		0,00%	200,00	R\$ 1,95	R\$ 1,24	R\$ 3,20	R\$ 4,09	R\$ 818,00	R\$ -	R\$ 818,00	100,00%
23.7.9	COMP.ELE.046	INAPI - ADAPTA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00		0,00%	100,00	R\$ 2,48	R\$ 1,66	R\$ 4,14	R\$ 5,30	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ 530,00	100,00%
23.7.10	COMP.ELE.047	INAPI - ADAPTA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 1 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00		0,00%	150,00	R\$ 6,91	R\$ 3,19	R\$ 10,11	R\$ 12,93	R\$ 1.939,50	R\$ -	R\$ 1.939,50	100,00%

PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JHXB.NTDD: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



23.7.11	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00		0,00%	1,00	R\$ 95,12	R\$ 63,18	R\$ 158,30	R\$ 202,63	R\$ 202,63	R\$ -	R\$ 202,63	100,00%
23.7.12	COMP.ELE.087	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO.	UN	8,00		0,00%	8,00	R\$ 5,34	R\$ 2,07	R\$ 7,41	R\$ 9,48	R\$ 75,84	R\$ -	R\$ 75,84	100,00%
23.7.13	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	100,00		0,00%	100,00	R\$ 7,38	R\$ 6,19	R\$ 13,57	R\$ 17,37	R\$ 1.737,00	R\$ -	R\$ 1.737,00	100,00%
23.7.14	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	100,00		0,00%	100,00	R\$ 3,05	R\$ 5,58	R\$ 8,63	R\$ 11,04	R\$ 1.104,00	R\$ -	R\$ 1.104,00	100,00%
23.7.15	91872	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	30,00		0,00%	30,00	R\$ 7,77	R\$ 8,19	R\$ 15,96	R\$ 20,43	R\$ 612,90	R\$ -	R\$ 612,90	100,00%
23.7.16	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	1,00		0,00%	1,00	R\$ 52,99	R\$ 10,29	R\$ 63,28	R\$ 80,99	R\$ 80,99	R\$ -	R\$ 80,99	100,00%
23.7.17	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300,300,3 M. AF. 12/2020	UN	3,00		0,00%	3,00	R\$ 97,05	R\$ 19,63	R\$ 116,67	R\$ 149,34	R\$ 448,02	R\$ -	R\$ 448,02	100,00%
23.7.18	COMP.ELE.088	SINAPI	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"	UN	1,00		0,00%	1,00	R\$ 5,08	R\$ 2,07	R\$ 7,15	R\$ 9,15	R\$ 9,15	R\$ -	R\$ 9,15	100,00%
23.7.19	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	50,00		0,00%	50,00	R\$ 4,20	R\$ 2,79	R\$ 6,99	R\$ 8,95	R\$ 447,50	R\$ -	R\$ 447,50	100,00%
23.7.20	COMP.ELE.048	NAPI - ADAPTADO	ELETRODUTO DE AÇO COM COSTURA GALVANIZAÇÃO A FOGO Ø2"	M	3,00		0,00%	3,00	R\$ 46,21	R\$ 18,66	R\$ 64,88	R\$ 83,04	R\$ 249,12	R\$ -	R\$ 249,12	100,00%
23.7.21	COMP.ELE.049	NAPI - ADAPTADO	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	1,00		0,00%	1,00	R\$ 66,03	R\$ 4,15	R\$ 70,18	R\$ 89,83	R\$ 89,83	R\$ -	R\$ 89,83	100,00%
23.7.22	COMP.ELE.050	NAPI - ADAPTADO	CABO UTP CATEGORIA 6, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00		0,00%	50,00	R\$ 2,72	R\$ 2,16	R\$ 4,88	R\$ 6,24	R\$ 312,00	R\$ -	R\$ 312,00	100,00%
23.7.23	COMP.ELE.051	NAPI - ADAPTADO	CABO DE FIBRA ÓPTICA - 6 FIBRAS, EXTERNO	M	50,00		0,00%	50,00	R\$ 5,52	R\$ 2,16	R\$ 7,68	R\$ 9,82	R\$ 491,00	R\$ -	R\$ 491,00	100,00%
23.7.24	COMP.ELE.052	NAPI - ADAPTADO	MODEM COM ROTEADOR WIRELESS PARA REDE DE INTERNET	UN	1,00		0,00%	1,00	R\$ 206,77	R\$ 2,07	R\$ 208,84	R\$ 267,31	R\$ 267,31	R\$ -	R\$ 267,31	100,00%
23.8			SUBESTAÇÃO									R\$ 40.799,62	R\$ -	R\$ -	0,00%	
23.8.1	102106	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 100 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 20.588,70	R\$ 400,12	R\$ 20.988,83	R\$ 26.865,70	R\$ 26.865,70	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.2	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 547,59	R\$ 29,39	R\$ 576,98	R\$ 738,53	R\$ 738,53	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.3	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 69,80	R\$ 10,10	R\$ 79,90	R\$ 102,27	R\$ 102,27	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.4	91871	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,50		0,00%	-	R\$ 5,30	R\$ 7,35	R\$ 12,65	R\$ 16,19	R\$ 24,29	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.5	97564	SINAPI	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 3,72	R\$ 12,26	R\$ 15,99	R\$ 20,47	R\$ 20,47	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.6	91872	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	6,00		0,00%	-	R\$ 7,77	R\$ 8,19	R\$ 15,96	R\$ 20,43	R\$ 122,58	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.7	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	2,00		0,00%	-	R\$ 5,11	R\$ 13,62	R\$ 18,73	R\$ 23,97	R\$ 47,94	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.8	101546	SINAPI	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	3,00		0,00%	-	R\$ 26,96	R\$ 1,66	R\$ 28,62	R\$ 36,63	R\$ 109,89	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.9	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 325,08	R\$ 21,84	R\$ 346,92	R\$ 444,06	R\$ 444,06	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.10	COMP.ELE.092	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,00		0,00%	-	R\$ 27,44	R\$ 14,14	R\$ 41,58	R\$ 53,22	R\$ 585,42	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.11	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	M	20,00		0,00%	-	R\$ 43,87	R\$ 1,35	R\$ 45,22	R\$ 57,89	R\$ 1.157,80	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.12	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	11,00		0,00%	-	R\$ 2,40	R\$ 1,20	R\$ 3,60	R\$ 4,61	R\$ 50,71	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.13	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2,00		0,00%	-	R\$ 15,05	R\$ 4,73	R\$ 19,77	R\$ 25,31	R\$ 50,62	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.14	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,70		0,00%	-	R\$ 3,05	R\$ 5,58	R\$ 8,63	R\$ 11,04	R\$ 18,77	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.15	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,80		0,00%	-	R\$ 2,86	R\$ 2,95	R\$ 5,81	R\$ 7,43	R\$ 13,37	R\$ -	R\$ -	0,00%



PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JHXB.NTDD: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

23.8.16	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 111,15	R\$ 11,67	R\$ 122,81	R\$ 157,20	R\$ 157,20	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.17	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 14,48	R\$ 18,47	R\$ 32,94	R\$ 42,17	R\$ 42,17	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.18	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 13,00	R\$ 14,96	R\$ 27,96	R\$ 35,79	R\$ 35,79	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.19	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR - CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 474,05	R\$ 54,86	R\$ 528,91	R\$ 677,00	R\$ 677,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.20	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	5,00		0,00%	-	R\$ 52,99	R\$ 10,29	R\$ 63,28	R\$ 80,99	R\$ 404,95	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.21	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 8,49	R\$ 1,96	R\$ 10,45	R\$ 13,38	R\$ 13,38	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.22	COMP.ELE.053	NAPI - ADAPTA	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, CURVA "C", 1cc MIN 4,5 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 55,38	R\$ 2,07	R\$ 57,45	R\$ 73,54	R\$ 73,54	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.23	COMP.ELE.054	NAPI - ADAPTA	DISPOSITIVO DPS CLASSE L 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 60 kA (TIPO AC), (10/350 us)	UN	3,00		0,00%	-	R\$ 151,18	R\$ 2,07	R\$ 153,25	R\$ 196,16	R\$ 588,48	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.24	COMP.ELE.055	NAPI - ADAPTA	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO, TENSÃO NOMINAL 15 kV	UN	3,00		0,00%	-	R\$ 191,39	R\$ 82,95	R\$ 274,34	R\$ 351,16	R\$ 1.053,48	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.25	COMP.ELE.056	NAPI - ADAPTA	POSTE DE CONCRETO TRONCO CÔNICO 11 m (600 daN)	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 305,00	R\$ 161,33	R\$ 466,33	R\$ 596,91	R\$ 596,91	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.26	COMP.ELE.057	NAPI - ADAPTA	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 763,81	R\$ 103,68	R\$ 867,49	R\$ 1.110,38	R\$ 1.110,38	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.27	COMP.ELE.058	NAPI - ADAPTA	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 250,06	R\$ 82,95	R\$ 333,01	R\$ 426,25	R\$ 426,25	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.28	COMP.ELE.059	NAPI - ADAPTA	ELETRODUTO DE AÇO COM COSTURA GALVANIZAÇÃO A FOGO Ø4"	M	8,00		0,00%	-	R\$ 47,54	R\$ 26,96	R\$ 74,50	R\$ 95,36	R\$ 762,88	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.29	COMP.ELE.060	NAPI - ADAPTA	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 90 GRAUS, DE 4"	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 239,46	R\$ 16,59	R\$ 256,05	R\$ 327,75	R\$ 327,75	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.30	COMP.ELE.061	NAPI - ADAPTA	ISOLADOR SUSPENSÃO PARA ANCORAGEM DO TIPO POLIMÉRICO 15 kV PARA MÉDIA TENSÃO	UN	3,00		0,00%	-	R\$ 75,20	R\$ 62,21	R\$ 137,41	R\$ 175,88	R\$ 527,64	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.31	COMP.ELE.062	NAPI - ADAPTA	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 mm SEÇÃO, 90 X 90 mm	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 135,30	R\$ 41,47	R\$ 176,77	R\$ 226,26	R\$ 226,26	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.32	COMP.ELE.063	NAPI - ADAPTA	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 3,43	R\$ 9,95	R\$ 13,38	R\$ 17,13	R\$ 17,13	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.33	COMP.ELE.064	NAPI - ADAPTA	CURVA 90 GRAUS DE AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO Ø 4"	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 3,90	R\$ 11,61	R\$ 15,51	R\$ 19,86	R\$ 19,86	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.34	COMP.ELE.065	NAPI - ADAPTA	CABO FLEXÍVEL ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 95 mm² - 0,6/1kV	M	36,00		0,00%	-	R\$ 61,78	R\$ 7,05	R\$ 68,83	R\$ 88,11	R\$ 3.171,96	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.35	COMP.ELE.066	NAPI - ADAPTA	PLACA DE ADVERTÊNCIA QUANTO AO RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS	UN	4,00		0,00%	-	R\$ 4,64	R\$ 2,07	R\$ 6,71	R\$ 8,59	R\$ 34,36	R\$ -	R\$ -	0,00%
23.8.36	COMP.ELE.049	NAPI - ADAPTA	RTA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 66,03	R\$ 4,15	R\$ 70,18	R\$ 89,83	R\$ 89,83	R\$ -	R\$ -	0,00%
24			CONTROLE TECNOLÓGICO DA OBRA			-						R\$ 14.792,57	R\$ -	R\$ 4.677,40	31,71%	
24.1	COMP.AQ.318	COTAÇÃO	ENSAIO DE ARRANCAMENTO DA ARGAMASSA	UN	3,00		0,00%	-	R\$ 1.124,46	R\$ -	R\$ 1.124,46	R\$ 1.439,31	R\$ 4.317,93	R\$ -	R\$ -	0,00%
24.2	COMP.AQ.319	COTAÇÃO	ENSAIO PIT PARA ESTACAS	UN	32,00		0,00%	-	R\$ 131,77	R\$ -	R\$ 131,77	R\$ 168,67	R\$ 5.397,44	R\$ -	R\$ -	0,00%
24.3	COMP.AQ.317	COTAÇÃO	TESTE DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO PARA CORPOS DE PROVA DE CONCRETO	UN	140,00		0,00%	130,00	R\$ 28,11	R\$ -	R\$ 28,11	R\$ 35,98	R\$ 5.037,20	R\$ -	R\$ 4.677,40	92,86%
25			DIVERSOS			-						R\$ 32.747,20	R\$ -	R\$ 18.596,46	56,79%	
25.1	COMP.AQ.322	INAPI / COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA EM ALUMÍNIO DE SINALIZAÇÃO VISUAL JUNTO A FACHADA	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 2.210,45	R\$ 80,54	R\$ 2.290,99	R\$ 2.932,47	R\$ 2.932,47	R\$ -	R\$ -	0,00%
25.2	COMP.AQ.32	INAPI / COTAÇÃO	MAPA TÁTIL EM PVC BRANCO OU ACRÍLICO BRANCO LEITOSO, ESPESURA 3 MM, DIMENSÕES 40X30 CM, INCLUI PEDESTAL METÁLICO FIXADO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 1.543,68	R\$ 34,10	R\$ 1.577,78	R\$ 2.019,56	R\$ 2.019,56	R\$ -	R\$ -	0,00%
25.3	COMP.AQ.310	POSIÇÃO PROJ	PLACA METÁLICA VERTICAL SINALIZADORA DE VAGA EXCLUSIVA PARA IDOSO	M	1,00		0,00%	-	R\$ 133,09	R\$ 16,96	R\$ 150,05	R\$ 192,06	R\$ 192,06	R\$ -	R\$ -	0,00%
25.4	COMP.AQ.311	POSIÇÃO PROJ	PLACA METÁLICA VERTICAL SINALIZADORA DE VAGA EXCLUSIVA PARA PNE	M	3,00		0,00%	-	R\$ 137,40	R\$ 16,96	R\$ 154,36	R\$ 197,58	R\$ 592,74	R\$ -	R\$ -	0,00%
25.5	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	M2	785,29		0,00%	657,29	R\$ 8,15	R\$ 2,86	R\$ 11,01	R\$ 14,09	R\$ 11.064,73	R\$ -	R\$ 9.261,21	83,70%
25.6	COMP.AQ.315	COMPOSIÇÃO	TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO DE GRAMA	M3	76,87		0,00%	45,00	R\$ 154,82	R\$ 7,26	R\$ 162,07	R\$ 207,45	R\$ 15.945,64	R\$ -	R\$ 9.335,25	58,54%
26			SERVIÇOS FINAIS			-						R\$ 8.398,80	R\$ -	R\$ -	0,00%	
26.1	COMP.AQ.033	COMPOSIÇÃO	LMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA	M2	696,71		0,00%	-	R\$ 0,67	R\$ 3,05	R\$ 3,71	R\$ 4,75	R\$ 3.309,37	R\$ -	R\$ -	0,00%
26.2	COMP.AQ.316	COMPOSIÇÃO	AS BUILT E MANUAL DO USUÁRIO - 1 VIA PLOTADA	M2	696,71		0,00%	-	R\$ 0,08	R\$ 4,22	R\$ 4,30	R\$ 5,51	R\$ 3.838,67	R\$ -	R\$ -	0,00%
26.3	COMP.AQ.320	COMPOSIÇÃO	TAXA HABITE-SE CORPO DE BOMBEIROS	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 480,19	R\$ -	R\$ 480,19	R\$ 614,64	R\$ 614,64	R\$ -	R\$ -	0,00%
26.4	COMP.AQ.320-C	COMPOSIÇÃO	TAXA HABITE-SE PREFEITURA	UN	1,00		0,00%	-	R\$ 487,44	R\$ -	R\$ 487,44	R\$ 623,92	R\$ 623,92	R\$ -	R\$ -	0,00%



PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JHXB.NTDD: <https://proad.tr12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

PROAD n. 352/2024 DOC 426
Cadastrado por 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA
Juntado em 28/07/2025

-	-	TOTAL MATERIAL R\$	18.782,17	77,79%
-	-	TOTAL MÃO DE OBRA R\$	5.362,01	22,21%
-	-	TOTAL MEDIÇÃO	R\$24.144,18	



PROAD n. 352/2024 DOC 426. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JHXB.NTDD: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

CS MAGON	Dias Contratuais: 365	RDO: RD276
	Dias Decorridos: 325	Data: 04/06/2025 (Quarta-Feira)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 40	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Mestre de obras	1	
Pedreiro	3	
Ajudante	4	
eletricista	2	
Engenheiro	1	
Gesseiro	2	



ALBERTO
R. NOVO
09/07/2025 13:42

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		nenhum	
assentamento de azulejo	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		paralisada	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		nenhum	
Estrutura Forro	1.0		nenhum	

Observações feitas por fiscais
Visita da fiscalização nesta data. Presença do gestor do contrato e dos gestores da CS Magon. - discutido sobre revestimento das fachadas - discutido sobre estrutura metálica do abrigo do reservatório - tratado sobre a programação da CS Magon para execução das próximas atividades da obra - apresentado do Eng. Antônio, que estará apoiando a CS Magon na execução da obra - discutido sobre execução do forro e acabamento nos locais em que o forro passa sobre as paredes de drywall - tratado sobre vedação das janelas do pátio interno - tratado sobre as grelhas das caixas pluviais

Fiscal

Responsável Técnico



PROAD n. 352/2024 DOC 428. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.KQYJ.RHYN:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

CS MAGON	Dias Contratuais: 365	RDO: RD277
	Dias Decorridos: 326	Data: 05/06/2025 (Quinta-Feira)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 39	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070	Termino Previsto: 14/07/2025	

Relatório Diário de Obra

Clima	Praticável		
claro	sim	08:00	

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Mestre de obras	1	
Pedreiro	3	
Ajudante	4	
eletricista	2	
Gesseiro	2	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		nenhum	
assentamento de azulejo	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		paralisada	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		nenhum	
Estrutura Forro	1.0		nenhum	

Galeria de Fotos



Fiscal

Responsável Técnico



PROAD n. 352/2024 DOC 428. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.KQYJ.RHYN:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

PROAD n. 352/2024 DOC 428

Cadastrado por 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

CS MAGON	Dias Contratuais: 365	RDO: RD278	Juntado em 28/07/2025
	Dias Decorridos: 327	Data: 06/06/2025 (Sexta-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 38	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
Gesseiro	2	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		nenhum	
assentamento de azulejo	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		paralisada	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		paralisada	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos









CS MAGON	Dias Contratuais: 365	RDO: RD282	Juntado em 28/07/2025
	Dias Decorridos: 328	Data: 07/06/2025 (Sábado)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 37	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Equipe Piso vinílico	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Impermeabilização - Piso Vinílico	1.0		em andamento	

Galeria de Fotos















Fiscal

Responsável Técnico



PROAD n. 352/2024 DOC 428. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.KQYJ.RHYN:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

CS MAGON	Dias Contratuais: 365	RDO: RD282
	Dias Decorridos: 329	Data: 08/06/2025 (Domingo)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 36	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025
Relatório Diário de Obra		

Comentários
sem atividades

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
mestre de obras	1	

Observações feitas por fiscais
Sem atividades nesta data.

Fiscal

Responsável Técnico



CS MAGON	Dias Contratuais: 365	RDO: RD279
	Dias Decorridos: 330	Data: 09/06/2025 (Segunda-Feira)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Termino: 35	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025
Relatório Diário de Obra		

Clima	Praticável		
claro	sim	07:30	

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	2	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	

Observações feitas por fiscais
Corrigido o preenchimento, conforme solicitado pela fiscalização.

Galeria de Fotos	
Fechamento de vãos	Limpeza
	



Porcelanato



Fechamento de vãos



Fiscal

Responsável Técnico

Cadastrado por 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

CS MAGON

Dias Contratuais: 365

Dias Decorridos: 331

Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024

Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070

RDO: RD280

Data: 10/06/2025 (Terça-Feira)

Início: 15/07/2024

Termino Previsto: 14/07/2025

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	3	
Ajudante	4	
engenheiro	1	
mestre de obras	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	

Observações feitas por fiscais

Vistoria da fiscalização nesta data.

1) Avaliado o reboco das paredes externas, sendo demarcados alguns locais em que o reboco deverá ser refeito, com destaque para as paredes da fachada Noroeste.

2) Explanado sobre o ajuste necessário no paver na entrada frontal da edificação, que deverá ser rebaixado, pois ficou sem desnível em relação ao piso interno.

3) Discutido sobre fechamento do vão da porta de entrada principal, que requer um complemento acima do vidro fixo e complemento nas laterais, para melhor acabamento junto aos pilares.

4) No pátio interno, explicado sobre a regularização e impermeabilização das bases das paredes, para posterior assentamento de granito e selante PU.

5) Necessária remoção do chapisco que recém havia sido aplicado nas faces laterais do radier, pois o local não será rebocado, sendo apenas pintado.

6) Fundos das caixas de infra elétrica e telecom: fundo deve ser em brita.

7) Necessária troca de perfilado que está com ferrugem (Secretaria, próximo ao fraldário)

8) Eletrodutos de aço ao alarme de incêndio: abaixo do forro devem ser pintados em vermelho; acima do forro, pintados em vermelho com faixas de 30 cm intercaladas em 1 metro.

9) Necessário complementar a altura de algumas parede de drywall, pois devem passar cerca de 20 cm acima do forro, conforme mostrado no local (Salas de audiências, secretarias, hall público)

10) Reboco das paredes do Depósito requer correções: algumas trincas em uma área em que está oco.

11) Janela do gabinete do juiz substituto (lado esquerdo) requer correções no requadro pelo lado externo (usar ACIII), próximo ao peitoril.

12) Corrigir reboco danificado ao redor do quadro QDAC.

13) Envelopar quadros elétricos para evitar danos e poeira.

14) Envelopar cabeamento UTP que está chegando na sala do rack, para proteção contra sujeira, poeira e danos. Cabeamento sensível e que terá que ser certificado.

15) Rodapé: poderá ser assentado com PU; na parte superior do rodapé (entre rodapé e parede) vedar com adesivo acrílico de base aquosa.




16) Conversado sobre revestimento das demais paredes do fraldário: previsto em azulejo; pode ser executado em massa corrida e pintura, com os devidos ajustes de custos.

Galeria de Fotos







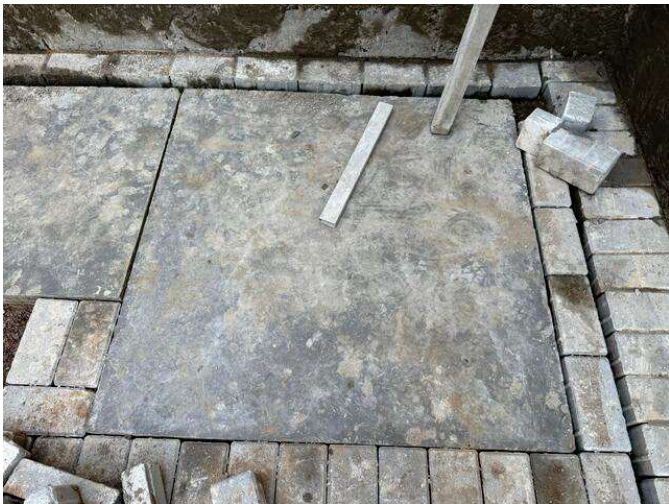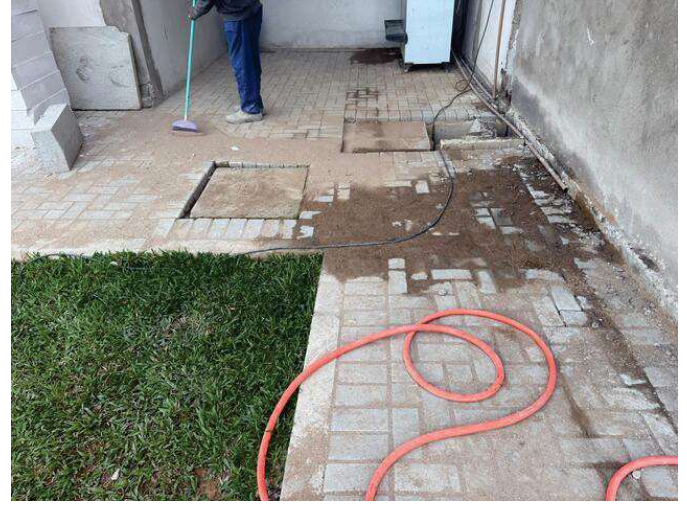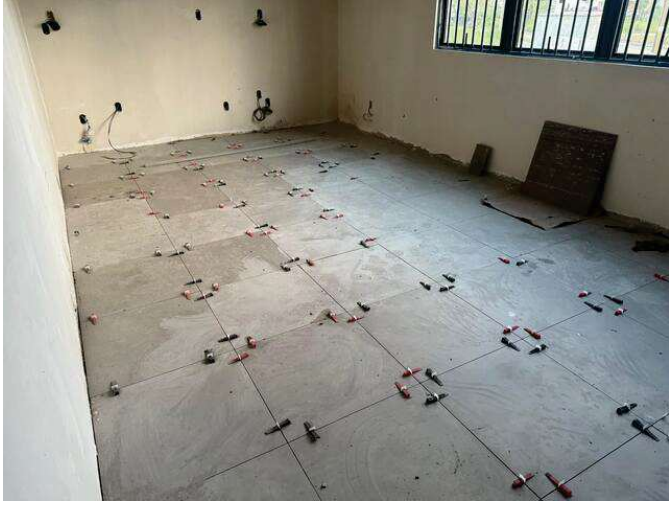

Fiscal

Responsável Técnico



Cadastrado por 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

CS MAGON

Dias Contratuais: 365

Dias Decorridos: 332

Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024

Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070

RDO: RD281

Data: 11/06/2025 (Quarta-Feira)

Início: 15/07/2024

Termino Previsto: 14/07/2025

Relatório Diário de Obra

Clima	Praticável		
claro	sim	07:30	

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	3	
Ajudante	4	
engenheiro	1	
mestre de obras	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	

Observações feitas por fiscais
Informar o motivo das paralisações dos serviços relatados.
Ajustada descrição do status dos serviços.

Galeria de Fotos









Fiscal

Responsável Técnico



CS MAGON

Dias Contratuais: 365

Dias Decorridos: 333

Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024

Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070

RDO: RD282

Data: 12/06/2025 (Quinta-Feira)

Início: 15/07/2024

Termino Previsto: 14/07/2025

Cadastrado por 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

Juntado em 28/07/2025

Relatório Diário de Obra

Clima	Praticável		
claro	sim	07:30	

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	3	
Ajudante	4	
engenheiro	1	
mestre de obras	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	

Galeria de Fotos







Fiscal

Responsável Técnico



PROAD n. 352/2024 DOC 428. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.KQYJ.RHYN: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

CS MAGON	Dias Contratuais: 365	RDO: RD284
	Dias Decorridos: 334	Data: 13/06/2025 (Sexta-Feira)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 31	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	3	
Ajudante	4	
engenheiro	1	
mestre de obras	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	

Observações feitas por fiscais
Atentar que atrás da subestação será instalado poste para o transformador.

Galeria de Fotos









Fiscal

Responsável Técnico



CS MAGON	Dias Contratuais: 365	RDO: RD284
	Dias Decorridos: 335	Data: 14/06/2025 (Sábado)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Termino: 30	Inicio: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	1	
Ajudante	1	
engenheiro	1	
mestre de obras	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	

Fiscal

Responsável Técnico



CS MAGON	Dias Contratuais: 365	RDO: RD284
	Dias Decorridos: 336	Data: 15/06/2025 (Domingo)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 29	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025
Relatório Diário de Obra		
Comentários		
Não houve atividades nesse dia.		
Observações feitas por fiscais		
Sem atividades nesta data (domingo).		

Fiscal

Responsável Técnico



PROAD n. 352/2024 DOC 428


Cadastrado por 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

CS MAGON	Dias Contratuais: 365	RDO: RD283	Juntado em 28/07/2025
	Dias Decorridos: 337	Data: 16/06/2025 (Segunda-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 28	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	3	
Ajudante	4	
engenheiro	1	
mestre de obras	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	

Galeria de Fotos

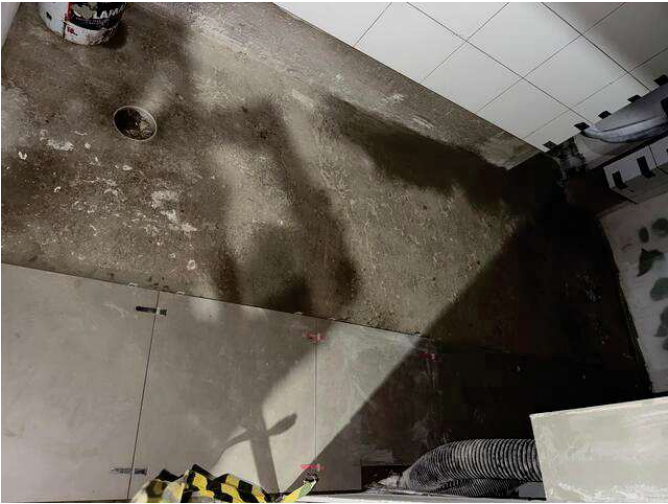



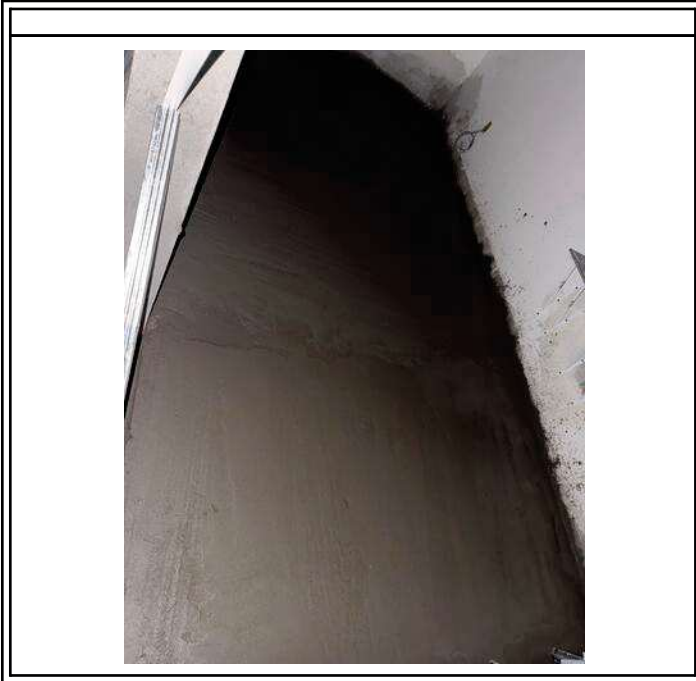

Fiscal

Responsável Técnico



Cadastrado por 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

CS MAGON

Dias Contratuais: 365

Dias Decorridos: 338

Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024

Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070

RDO: RD284

Data: 17/06/2025 (Terça-Feira)

Início: 15/07/2024

Termino Previsto: 14/07/2025

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	3	
Ajudante	2	
engenheiro	1	
mestre de obras	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		iniciado	

Observações feitas por fiscais

Orientações reboco subestação e lixeira:

- Atentar para traço 1:4 (C:A) em volume;

- Controlar a dosagem do traço, para garantir qualidade;

- Empregar areia média, não usar areia fina;

- Fazer cura úmida do reboco por, ao menos, 3 dias seguidos;

- Durante o período de cura, não deixar o reboco secar, manter sempre úmido.

Galeria de Fotos









Fiscal

Responsável Técnico



PROAD n. 352/2024 DOC 428. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.KQYJ.RHYN:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

CS MAGON

Dias Contratuais: 365

Dias Decorridos: 339

Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024

Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070

RDO: RD285

Data: 18/06/2025 (Quarta-Feira)

Início: 15/07/2024

Termino Previsto: 14/07/2025

Cadastrado por 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

Juntado em 28/07/2025

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	3	
Ajudante	2	
engenheiro	1	
mestre de obras	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Galeria de Fotos











PROAD n. 352/2024 DOC 428. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.KCYJ.RHYN:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



Fiscal

Responsável Técnico





PROAD n. 352/2024 DOC 428. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.KQYJ.RHYN:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRT12	Dias Contratuais: 365	RDO: RD286
	Dias Decorridos: 340	Data: 19/06/2025 (Quinta-Feira)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 25	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070	Termino Previsto: 14/07/2025	

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	3	
Ajudante	2	
engenheiro	1	
mestre de obras	1	

ALBERTO
KNOH
09/07/2025 13:42

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Galeria de Fotos



PROAD n. 352/2024 DOC 429. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.CSGB.FDSP: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Fiscal

Responsável Técnico



PROAD n. 352/2024 DOC 429. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.CSGB.FDSP: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRT12	Dias Contratuais: 365	RDO: RD288	Juntado em 28/07/2025
	Dias Decorridos: 341	Data: 20/06/2025 (Sexta-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 24	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Comentários
Não houve atividades nesse dia.
Observações feitas por fiscais
Sem atividades nesta data. Empresa trabalhou no dia 19 (feriado Corpus Christi) para compensar o dia 20/junho.

Fiscal

Responsável Técnico



TRT12	Dias Contratuais: 365	RDO: RD288	Juntado em 28/07/2025
	Dias Decorridos: 342	Data: 21/06/2025 (Sábado)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 23	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			
Comentários			
Não houve atividades nesse dia.			
Observações feitas por fiscais			
Sem atividades nesta data (sábado).			

Fiscal

Responsável Técnico



TRT12	Dias Contratuais: 365	RDO: RD288	Juntado em 28/07/2025
	Dias Decorridos: 343	Data: 22/06/2025 (Domingo)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 22	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Comentários
Não houve atividades nesse dia.
Observações feitas por fiscais
Sem atividades nesta data (domingo).

Fiscal

Responsável Técnico



Cadastrado por 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA		PROAD n. 352/2024 DOC 429
TRT12	Dias Contratuais: 365	RDO: RD288
	Dias Decorridos: 344	Juntado em 28/07/2025
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Termino: 21	Data: 23/06/2025 (Segunda-Feira)
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Início: 15/07/2024
		Termino Previsto: 14/07/2025
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	2	
engenheiro	1	


Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Galeria de Fotos





PROAD n. 352/2024 DOC 429. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.CSGB.FDSP: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

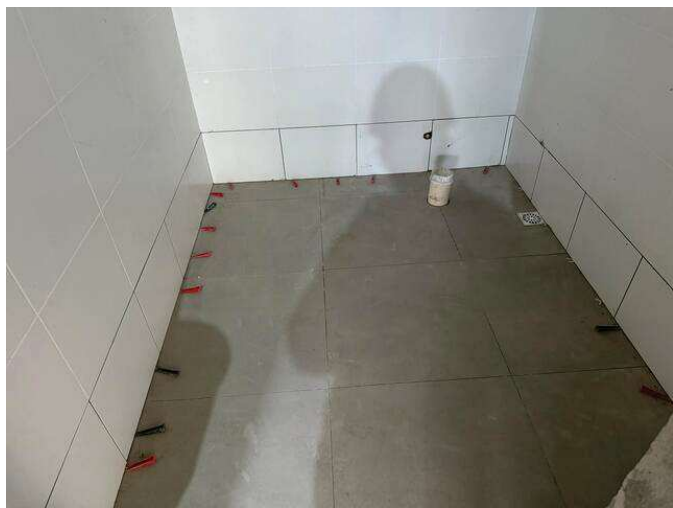

Fiscal

Responsável Técnico



PROAD n. 352/2024 DOC 429

Cadastrado por 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

TRT12	Dias Contratuais: 365	RDO: RD289	Juntado em 28/07/2025
	Dias Decorridos: 345	Data: 24/06/2025 (Terça-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 20	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	2	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Galeria de Fotos



Fiscal

Responsável Técnico




TRT12	Dias Contratuais: 365	RDO: RD290
	Dias Decorridos: 346	Data: 25/06/2025 (Quarta-Feira)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 19	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070	Termino Previsto: 14/07/2025	

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	2	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Galeria de Fotos

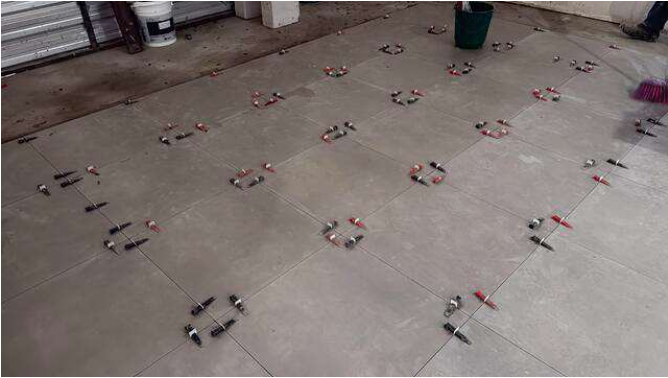











Fiscal

Responsável Técnico



TRT12	Dias Contratuais: 365	RDO: RD291
	Dias Decorridos: 347	Data: 26/06/2025 (Quinta-Feira)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 18	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		iniciado	

Galeria de Fotos





Fiscal

Responsável Técnico



PROAD n. 352/2024 DOC 429. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.CSGB.FDSP: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRT12	Dias Contratuais: 365	RDO: RD292
	Dias Decorridos: 348	Data: 27/06/2025 (Sexta-Feira)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Termino: 17	Inicio: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		iniciado	

Galeria de Fotos













Fiscal

Responsável Técnico



TRT12	Dias Contratuais: 365	RDO: RD294	Juntado em 28/07/2025
	Dias Decorridos: 349	Data: 28/06/2025 (Sábado)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 16	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			
Comentários			
Não houve atividades nesse dia.			
Observações feitas por fiscais			
Sem atividades nesta data (sábado).			

Fiscal

Responsável Técnico



TRT12	Dias Contratuais: 365	RDO: RD294	Juntado em 28/07/2025
	Dias Decorridos: 350	Data: 29/06/2025 (Domingo)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 15	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			
Comentários			
Não houve atividades nesse dia.			
Observações feitas por fiscais			
Sem atividades nesta data.			

Fiscal

Responsável Técnico



Cadastrado por 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA		PROAD n. 352/2024 DOC 429
TRT12	Dias Contratuais: 365	RDO: RD293
	Dias Decorridos: 351	Data: 30/06/2025 (Segunda-Feira)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Termino: 14	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		iniciado	

Observações feitas por fiscais
Deverá ser ajustado o paver ao redor do poste, conforme instrução enviada no relatório de vistoria.

Galeria de Fotos









PROAD n. 352/2024 DOC 429. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.CSGB.FDSP: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Fiscal

Responsável Técnico



PROAD n. 352/2024 DOC 429. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.CSGB.FDSP: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

PROAD n. 352/2024 DOC 429

Cadastrado por 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

TRT12	Dias Contratuais: 365	RDO: RD294	Juntado em 28/07/2025
	Dias Decorridos: 352	Data: 01/07/2025 (Terça-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 13	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Observações feitas por fiscais
Mobilizar novas equipes para andamento da obra de acordo com o cronograma. Redução no efetivo de funcionários, que poderá comprometer o prazo da obra.

Galeria de Fotos







Fiscal

Responsável Técnico



Cadastrado por 2389 - EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

TRT12

Dias Contratuais: 365

Dias Decorridos: 353

Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024

Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070

RDO: RD295

Data: 02/07/2025 (Quarta-Feira)

Início: 15/07/2024

Termino Previsto: 14/07/2025

Juntado em 28/07/2025

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Observações feitas por fiscais

Vistoria da fiscalização:

1) Mobilizar novas equipes para andamento da obra de acordo com o cronograma. Redução no efetivo de funcionários, que poderá comprometer o prazo da obra.

2) Substituir azulejo danificado no WC Masc Público

3) Fazer fechamento em gesso acartonado por trás do QGBT. Pintar eletrocalha na mesma cor da parede

4) Limpar janelas manchadas com pintura. Ao fazer a pintura das paredes, envelopar o perímetro das janelas com fita protetora.

5) Corrigir fixação das placas de gesso da parede entre os gabinetes (lado direito da planta). Placas estão "soltas". Gerou abertura de trinca entre drywall e alvenaria.

6) Pendente a instalação de caixa de drenagem do ar condicionado no gabinete de juiz substituto (lado direito da planta).

7) Eletrodutos enterrados devem ser do tipo Kanaflex. Trazer informações sobre o eletroduto de cor azul que foi empregado

8) Eletrodutos enterrados devem estar à profundidade de 40 a 50 cm.

Galeria de Fotos









Fiscal

Responsável Técnico





PROAD n. 352/2024 DOC 429. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.CSGB.FDSP:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
CLIENTE:		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO/SC														
ENDEREÇO:		RUA SÃO LUIS, S/Nº, VILA MOEMA														
MUNICÍPIO:		TUBARÃO / SC														
OBRA:		IMPLANTAÇÃO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE TUBARÃO														
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (Cf. BDI)	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	11º MES	12º MES	13º MES	TOTAL
			Costo do mês	Costo do mês	Costo do mês	Costo do mês	Costo do mês	Costo do mês	Costo do mês	Costo do mês	Costo do mês	Costo do mês	Costo do mês	Costo do mês	Costo do mês	
1	DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO OBRA	R\$ 314.362,34	R\$ 63.456,93	R\$ 33.797,82	R\$ 27.890,94	R\$ 15.164,09	R\$ 15.416,53	R\$ 15.955,12	R\$ 25.273,45	R\$ 12.636,75	R\$ 7.582,05	R\$ 10.109,40	R\$ 13.554,30	R\$ 0,00	R\$ 70.654,53	R\$ 314.362,34
2	LIMPEZA DO TERRENO E LOCAÇÃO	R\$ 14.787,87	R\$ 8.224,62	R\$ 10.795,00	R\$ 8.849,66	R\$ 4.820,00	R\$ 4.820,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 4,00	R\$ 2,41	R\$ 3,22	R\$ 4,31	R\$ 0,00	R\$ 22,48	R\$ 14.787,87
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 98.065,69	R\$ 46.085,68	R\$ 2.137,06	R\$ 2.658,16	R\$ 521,10	R\$ 2.240,21	R\$ 2.916,56	R\$ 2.815,56	R\$ 2.916,56	R\$ 2.658,16	R\$ 2.437,06	R\$ 2.497,06	R\$ 0,00	R\$ 583,24	R\$ 69.354,08
4	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 13.642,17	R\$ 4.420,47	R\$ 199,43	R\$ 2.137,95	R\$ 0,00	R\$ 2.240,21	R\$ 2.916,56	R\$ 2.815,56	R\$ 2.916,56	R\$ 2.658,16	R\$ 2.437,06	R\$ 2.497,06	R\$ 0,00	R\$ 1.802,50	R\$ 13.642,17
5	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 179.616,69	R\$ 110.453,34	R\$ 62.443,95	R\$ 15.472,40	R\$ 0,00	R\$ 1.689,10	R\$ 9.497,10	R\$ 19.620,49	R\$ 14.989,10	R\$ 5.029,10	R\$ 5.629,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179.616,69
6	INFRAESTRUTURA	R\$ 940.696,18	R\$ 29.247.354,11	R\$ 678.464,08	R\$ 8.619,10	R\$ 66.714,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.879,20	R\$ 6.982,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 840.696,18
7	SUPRAESTRUTURA - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 63.999,07	R\$ 11.507,28	R\$ 0,00	R\$ 17.523,75	R\$ 5.891,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.999,07
8	SUPRAESTRUTURA - ESTRUTURAS METÁLICAS	R\$ 241.888,90	R\$ 11.507,28	R\$ 0,00	R\$ 272.804,60	R\$ 66.714,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.662,60	R\$ 0,00	R\$ 714,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341.888,90
9	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	R\$ 103.268,57	R\$ 2,04	R\$ 0,00	R\$ 6.197,35	R\$ 15.501,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,11	R\$ 29.732,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.268,57
10	COBERTURA	R\$ 180.414,18	R\$ 2.045	R\$ 4.489,34	R\$ 150.199,52	R\$ 36,41	R\$ 14,12	R\$ 9,46	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,12	R\$ 21,27	R\$ 180.414,18
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 19.879,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.499,00	R\$ 83,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,96	R\$ 19.879,81
12	ESQUADRIAS	R\$ 231.098,27	R\$ 71.111,00	R\$ 0,00	R\$ 19.919,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 26.708,20	R\$ 3,71	R\$ 0,00	R\$ 4,78	R\$ 231.098,27
13	REVESTIMENTOS DE FORRO	R\$ 113.483,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,90	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.483,56
14	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 124.716,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,64	R\$ 14,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.716,34
15	REVESTIMENTO DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 388.636,26	R\$ 8.324,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,14	R\$ 17.926,72	R\$ 19.785,14	R\$ 41.107,10	R\$ 62.000,58	R\$ 2,35	R\$ 68.345,09	R\$ 388.636,26
16	SERRALHERIA	R\$ 115.030,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.499,00	R\$ 83,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,96	R\$ 115.030,44
17	PINTURA	R\$ 65.988,81	R\$ 71.111,00	R\$ 0,00	R\$ 19.919,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 26.708,20	R\$ 3,71	R\$ 0,00	R\$ 4,78	R\$ 65.988,81
18	MOBILIÁRIO E BANCADAS	R\$ 24.281,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.281,23
19	LOUÇAS E METAIS	R\$ 78.185,73	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.185,73
20	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 19.239,82	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 15.160,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.331,82	R\$ 17,73	R\$ 8.841,94	R\$ 2.466,35	R\$ 4.675,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.239,82
21	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 105.262,67	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,49	R\$ 42.391,81	R\$ 6.925,50	R\$ 22,70	R\$ 25.080,50	R\$ 23,01	R\$ 80.469,57	R\$ 105.262,67
22	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ 618.636,53	R\$ 9,32	R\$ 12.458,93	R\$ 6.928,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.596,99	R\$ 66.872,75	R\$ 79.970,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,33	R\$ 15.987,58	R\$ 618.636,53
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.782,57	R\$ 2,40	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,37	R\$ 12,70	R\$ 15,42	R\$ 0,00	R\$ 5,15	R\$ 3,38	R\$ 3,00	R\$ 42,65	R\$ 14.782,57
24	CONTROLE TECNOLÓGICO DA OBRA	R\$ 32.747,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.662,52	R\$ 13,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.747,20
25	DIVERSOS	R\$ 6.386,80	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.386,80
26	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 140.482,22	R\$ 140,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.482,22
27	1º ADITIVO - TERRAPLANAGEM	R\$ 158.866,58	R\$ 158,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.910,87	R\$ 25.994,18	R\$ 36.170,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.866,58
28	2º ADITIVO - SERVIÇOS GERAIS	R\$ 171.497,91	R\$ 171,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,47	R\$ 37.395,18	R\$ 12.220,52	R\$ 3,96	R\$ 6.797,37	R\$ 3,96	R\$ 8.362,19	R\$ 171.497,91
29	REAJUSTE CONTRATUAL	R\$ 862,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 862,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 862,32
30	DESCONTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31	3º ADITIVO - SERVIÇOS GERAIS	R\$ 67.837,28	R\$ 67,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.837,28
32	1º ADITIVO - SUPRÊSSES	R\$ 51.511,56	R\$ 51,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.511,56
33	2º ADITIVO - SUPRÊSSES	R\$ 80.338,18	R\$ 80,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.338,18
34	3º ADITIVO - SUPRÊSSES	R\$ 4.839.506,71	R\$ 4.839,51	R\$ 1.348.189,52	R\$ 1.724.904,87	R\$ 2.096.138,52	R\$ 2.166.682,95	R\$ 2.403.267,02	R\$ 2.889.451,43	R\$ 3.128.916,22	R\$ 3.255.148,70	R\$ 3.428.060,77	R\$ 3.587.645,09	R\$ 3.905.426,67	R\$ 4.839.644,51	R\$ 4.839.506,71
TOTAL GERAL		R\$ 4.839.506,71	R\$ 4.841.841,24	R\$ 7.996.540,28	R\$ 1.726.745,18	R\$ 3.391.193,65	R\$ 4.110.554,43	R\$ 4.886.676,72	R\$ 5.686.189,76	R\$ 6.460.964,80	R\$ 7.025.632,48	R\$ 7.772.852,27	R\$ 8.399.844,31	R\$ 9.337.780,92	R\$ 10.333.216,98	R\$ 4.839.506,71
TOTAL AJUSTADO		R\$ 4.839.506,71	R\$ 4.841.841,24	R\$ 7.996.540,28	R\$ 1.726.745,18	R\$ 3.391.193,65	R\$ 4.110.554,43	R\$ 4.886.676,72	R\$ 5.686.189,76	R\$ 6.460.964,80	R\$ 7.025.632,48	R\$ 7.772.852,27	R\$ 8.399.844,31	R\$ 9.337.780,92	R\$ 10.333.216,98	R\$ 4.839.506,71

G S MAGNON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 27.007.119/0001-40

REP. LEGAL E RESP. TÉCNICO CAIO CESAR MAGNON

CREA-PR 151.815/0 - CPF 079.461.789-13


C S MASON CONSTRUTORA LTDA
CPF: 27.007.119/0001-80
REP. LEGAL E RESP. TECNICO: CAIO CESAR MAGON
CREAR: 151.815/D - CPF: 079.451.789-13



PROAD n. 352/2024 DOC 431. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.MGQG.YWBK: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

[illegible]

Assinado de forma digital por CAIO
CESAR MAGON:07946178913
Dados: 2025.07.08 15:11:44 -03'00'





ADALBERTO
KNÖTH
09/07/2025 13:39

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR

Construção no novo Fórum Trabalhista de Tubarão			Medição nº 11	
Empresa Contratada:	CS Magon Construtora Ltda.		Contrato:	CE 352/2024
Endereço de Execução:	esquina da Rua São Luís com a Rua Aracaju, Bairro Vila Moema	Período da Medição:	05/06/2025 a 02/07/2025	

RESULTADO	VALOR MEDIDO	DESCONTO		VALOR FINAL A PAGAR
	R\$ 25.525,23	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 25.525,23

INDICADOR	DESCONTO PADRÃO	Nº DE OCORRÊNCIAS	DESCONTO TOTAL	LIMITE DE NOTIFICAÇÕES
Nº 01	0,05%	0	0,000%	20
Nº 02	0,25%	0	0,000%	5
Nº 03	0,25%	0	0,000%	8

AVISO

MULTA Caso o número de ocorrências ultrapasse o limite máximo permitido para algum indicador será necessário averiguar o CONTRATUAL: percentual da multa contratual a ser cobrada posteriormente (vide item 14.3 do Termo de Referência).

INFORMAÇÕES

- INDICADOR Nº 1: Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
- INDICADOR Nº 2: Uso de Equipamentos para trabalho em altura - andaimes, escadas, balancins, etc.
- INDICADOR Nº 3: Deixar de solicitar, previamente, à fiscalização técnica do TRT, autorização para a subcontratação de serviços, conforme item 7.3.2 do Termo de Referência.



LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA MEDIÇÃO					
ITEM		Sim	Não	N/A	OBSERVAÇÕES
1	A medição somente poderá ser encaminhada se forem entregues pela contratada todos os documentos constantes no contrato, necessários à liberação da parcela de medição além de:				Documentos e procedimentos a serem observados a cada medição, conforme o caso e análise da fiscalização.
1.1	Documento de Encaminhamento da Medição, conforme modelo CPO e orientações do Manual de Fiscalização (item 7.3);	X			
1.2	Declaração de emprego de egressos do sistema carcerário, conforme contrato;	X			
1.3	Nota Fiscal/ Fatura, conforme valor da planilha, discriminando os valores de mão-de-obra e de material;	X			Inserida no SIGEO
1.4	Planilha de medição pré aprovada pelo fiscal (observar Acórdão TCU 2622/2013, quanto à medição da administração local);	X			
1.5	Cronograma físico-financeiro atualizado, caso haja;	X			
1.6	Diário de obras;	X			
1.7	Relatório fotográfico;	X			Do próprio diário de obras
1.8	Relatório de atualização do projeto "as built";		X		Não há nesta etapa de medição.
1.9	Recibo de entrega dos EPs atualizado conforme atividades e quadro funcional vigente;		x		Sem atualizações.
1.10	Relação atualizada de empresas terceirizadas			X	
2	Atualização da planilha de gerenciamento de obra - PGO - para fins de controle contratual e atualização do Portal Transparência.	X			
3	Medições após aditivo				
3.1	No caso de alteração substancial do projeto o fiscal informou a Seguradora acerca das alterações requerendo apólice do seguro retificada.		X		Solicitado à contratada a apresentação da garantia complementetar.
3.2	No caso de alteração substancial do objeto, verificar se é necessário acrescentar códigos na ART ou aumento significativo de área construída		X		Não há necessidade, sendo alterações pequenas no projeto



PROAD n. 352/2024 DOC 433. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.CMPL.QYCP: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

INFORMAÇÃO DIGGPO Nº 34/2025

Em 09-07-2025

De: Eng. Adalberto Knoth

Para: Coordenador de Projetos e Obras


ADALBERTO
KNOTH
09/07/2025 14:05


JACSON
ALEXANDRE
PEREIRA
09/07/2025 14:20

**Assunto: ENCAMINHAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO E MEDIÇÃO DE
REAJUSTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO
FÓRUM TRABALHISTA DE TUBARÃO**

Proad pedido de providências: 8861/2025

Proad da obra: 352/2024

Senhor Coordenador de Projetos e Obras,

Encaminha-se para pagamento a 11ª medição dos serviços originais do contrato e a medição de reajuste contratual sobre a 11ª medição da obra de construção da nova sede do Fórum Trabalhista de Tubarão, em execução pela empresa CS Magon Construtora Ltda., por meio do contrato CE 352/2024.

A nota fiscal número 364 corresponde aos serviços da 11ª medição do contrato original, no valor de R\$ 24.144,18 e já está disponível no Sigeo.

A nota fiscal número 365 corresponde ao reajuste contratual da décima primeira medição, no valor de R\$ 1.381,05 e já está disponível no Sigeo.

A seguir, um quadro resumo das medições.

	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	NOTA FISCAL nº
MEDIÇÃO 11	R\$ 18.782,17	R\$ 5.362,01	R\$ 24.144,18	364
REAJUSTE MED 11	R\$ 1.074,34	R\$ 306,71	R\$ 1.381,05	365

Portanto, o valor total desta medição é de R\$ 25.525,23 (vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos).

O valor ora medido inclui os serviços que foram executados no período de 05/06/2025 a 02/07/2025.

Não foram aplicados descontos em razão dos IMRs, uma vez que não foram observadas, no período de medição, infrações aos indicadores de resultados.

Quanto ao cumprimento do cronograma físico-financeiro, o valor medido ficou abaixo do valor previsto, sendo que o valor acumulado correspondente ao 11º mês atingiu 70,09% do total do contrato, enquanto que estava previsto atingir 72,43%. Neste montante já estão computados os serviços que foram incluídos no contrato por meio do aditivo 03.

Assim, o valor medido acumulado corresponde a 96,8% do valor previsto acumulado, portanto, superior à 90% do valor previsto, sendo uma diferença




ainda pequena, não sendo passível de aplicação de multa moratória, nos termos do item "II" da cláusula dezesseis do contrato.

Em relação ao cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada (doc. 09), considerando os 13 meses de execução de obra, conforme prazo formalizado no Termo Aditivo 03, a contratada está prevendo a execução de cerca de R\$ 1,4 milhão de reais em serviços, o que é algo extremamente difícil de ser atingido em uma obra como a do Fórum no período de 30 dias.

No proad 8642/2025 foi informada redução no ritmo de execução da obra, observada no mês de junho, e que impactou diretamente no montante desta medição. A empresa alega dificuldades financeiras que têm impactado na execução do contrato, o que preocupa esta fiscalização, pois se a situação não for resolvida pela empresa, poderá comprometer o andamento da obra.

No gráfico a seguir pode-se verificar o andamento da obra até o momento:

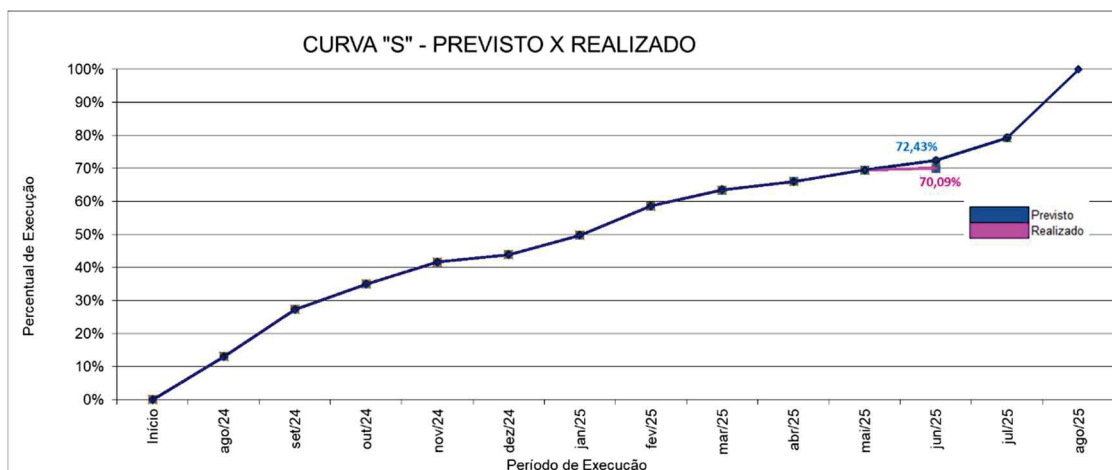

Também foram juntados no proad os seguintes documentos:

- Solicitação de medição 11, enviada por email;
- Planilha de medição 11;
- Tabela de IMR da medição 11;
- Diário de obras;
- Manifestação sobre emprego de egressos do sistema carcerário;
- Cronograma físico-financeiro atualizado;
- Lista de verificação da medição 11.

Solicita-se providências aos setores competentes para conferência dos demais documentos, bem como o encaminhamento ao pagamento do valor medido.

À sua consideração.

Adalberto Knoth
Eng. Civil – CREA 124.968-3
Divisão de Gestão e Governança de Projetos e Obras



À SECAD, para pagamento da medição.

Em 09-07-2025

Jacson Alexandre Pereira
Coordenador de Projetos e Obras



180

anos

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRT da 12ª Região (SC)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E ANÁLISE DA DESPESA

TERMO DE LIQUIDAÇÃO

Liquida(m)-se o(s) documento(s) abaixo relacionado(s) conforme Nota de Empenho, classificação da despesa e valor(es) informado(s) e em conformidade com o contrato próprio, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320 de 17/03/1964:

Processo: CE-352/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVO PREDIO DESTINADO AO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO.

Fornecedor: 27.097.119/0001-80 C S MAGON CONSTRUTORA LTDA

NOTA DE EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	DATA DE LIQUIDAÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMPET.	DOCUMENTO	UNIDADE	VALOR
2024NE000353	449051 91 OBRAS EM ANDAMENTO	11/07/2025		06/2025	NF. 364	CPO	R\$ 24.144,18
2024NE000353	449051 91 OBRAS EM ANDAMENTO	11/07/2025		06/2025	NF. 365	CPO	R\$ 1.381,05
Total Geral:							R\$ 25.525,23
						2024NE000353	449051 R\$ 25.525,23

Certifico que, referente a competência da(s) liquidação(ões) acima relacionada(s), os documentos exigidos em contrato encontram-se atualizados, mantidas as condições de habilitação da licitação.

Florianópolis/SC, 11 de julho de 2025

Edinete Volpato Dutra de Souza

EDINETE
VOLPATO
DUTRA DE
SOUZA
11/07/2025 14:30

então a documentação providenciada 1908/25, mar. 11 e 12.



	MUNICÍPIO DE CAMBIRA		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Número:	
	CANADA, 320 - 86890000 - CENTRO - CAMBIRA - PR		364	
	Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:		Data Prestação: 07/07/2025	
			Autenticidade: 530394274	

SITE AUTENTICIDADE: <https://cambira.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Insc. Municipal: 00003098 CNPJ/CPF: 27.097.119/0001-80 Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO
	Nome/Razão Social: CS MAGON CONSTRUTORA LTDA
	Nome Fantasia: GLOCON ENGENHARIA
	Endereço: Rua CEU AZUL, 05 - RESIDENCIAL BELA VISTA
	Município/UF: CAMBIRA-PR CEP: 86.890-000
Fone/Fax:	E-Mail: CONTATO@GLOCON.COM.BR
Insc. Estadual:	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF: 02.482.005/0001-23	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO		
Endereço: Rua Esteves Júnior, 395 - Centro		
Município/UF: Tubarão-SC CEP: 88.015-905		
Fone/Fax: (48) 3287-1000 E-Mail: seof@trt12.jus.br		

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:			CNAE:
702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA, DE TELECOMUNICACOES E DE OUTRAS SEMELHANÇAS, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE			4120400
Competência: 7/2025	Local da Prestação do Serviço: Tubarão-SC	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO FORA DO
A.R.T: 9326494-7	Nº Código da Obra:	Processo Obra:	Incorporação: NÃO
Nome Obra: Fórum Trabalhista de Tubarão	Resp. Obra: CAIO CESAR MAGON		
Endereço Obra: CEP: , São Luiz, S/N , Bairro Vila Moema			

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Medição 11º da obra do novo prédio do Fórum Trabalhista de Tubarão
Contrato Nº 352/2024
CNO 90.019.53356/75
INSS não retido de acordo com o IN 2110/2022, em se tratando de obra publica.
Retenção de ISS 2,00%
Retenção de IRPJ 1,20%
Retenção de PIS 0,65%
Retenção de COFINS 3,00%
Retenção de CSLL 1,00%
Pagamento:
CNPJ: 27.097.119/0001-80 C S Magon Construtora LTDA/Glocon Engenharia
Banco Grafeno digital - 274
Ag: 0001
C/C: 08111473-8

CERTIFICADO no docto PROAD nº 11 e 12

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Incond.	Desc. Cond.	Valor Total
SIM	MAO DE OBRA	1,00000	5.362,01	0,00	0,00	5.362,01
SIM	MATERIAL	1,00000	18.782,17	0,00	0,00	18.782,17

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	482,88000	Sim
PIS	0,65000	156,94000	Sim
COFINS	3,00000	724,33000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,20000	289,73000	Sim
CSLL	1,00000	241,44000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	1.412,43000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

PROAD n. 352/2024 DOC 437. Para verificar a autenticidade desta cópia,
base de cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: Valor Total das Retenções:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Valor Líquido da NFS-e:

Valor Total da NFS-e:

24.144,18	0,00	0,00	22.248,86	24.144,18 ✓
-----------	------	------	-----------	-------------

NFS-E Nº
364

Recebemos de CS MAGON CONSTRUTORA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____



	MUNICÍPIO DE CAMBIRA	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Número:	
	CANADA, 320 - 86890000 - CENTRO - CAMBIRA - PR	365	
	Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:	Data Prestação: 07/07/2025	
		Autenticidade: 606642914	

SITE AUTENTICIDADE: <https://cambira.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Insc. Municipal: 00003098	CNPJ/CPF: 27.097.119/0001-80	Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO
	Nome/Razão Social: CS MAGON CONSTRUTORA LTDA		
	Nome Fantasia: GLOCON ENGENHARIA		
	Endereço:		
	Rua CEU AZUL, 05 - RESIDENCIAL BELA VISTA		
Município/UF: CAMBIRA-PR		Insc. Estadual:	
Fone/Fax:		CEP: 86.890-000	
		E-Mail: CONTATO@GLOCON.COM.BR	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF: 02.482.005/0001-23	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO		
Endereço: Rua Esteves Júnior, 395 - Centro		
Município/UF: Tubarão-SC		CEP: 88.015-905
Fone/Fax: (48) 3287-1000		E-Mail: seof@trt12.jus.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:			CNAE:
702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA, DE TELECOMUNICACOES E DE OUTRAS SEMELHANÇAS, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE			4120400
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
7/2025	Tubarão-SC	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO FORA DO
A.R.T.: 9326494-7	Nº Codigo da Obra:	Processo Obra:	Incorporação: NÃO
Nome Obra:	Fórum Trabalhista de Tubarão	Resp. Obra:	CAIO CESAR MAGON
Endereço Obra: CEP: , São Luiz, S/N , Bairro Vila Moema			

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Reajuste da Medição 11º da obra do novo prédio do Fórum Trabalhista de Tubarão
Contrato Nº 352/2024
CNO 90.019.53356/75
INSS não retido de acordo com o IN 2110/2022, em se tratando de obra publica.
Retenção de ISS 2,00%
Retenção de IRPJ 1,20%
Retenção de PIS 0,65%
Retenção de COFINS 3,00%
Retenção de CSLL 1,00%
Pagamento:
CNPJ: 27.097.119/0001-80 C S Magon Construtora LTDA/Glocon Engenharia
Banco Grafeño digital - 274
Ag: 0001
C/C: 08111473-8

CERTIFICO no docto PROAD nº 11612

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Incond.	Desc. Cond.	Valor Total
SIM	MAO DE OBRA	1,00000	1.074,34	0,00	0,00	1.074,34
SIM	MATERIAL	1,00000	306,71	0,00	0,00	306,71

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	27,62000	Sim
PIS	0,65000	8,98000	Sim
COFINS	3,00000	41,43000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,20000	16,57000	Sim
CSLL	1,00000	13,81000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	80,79000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

PROAD n. 352/2024 DOC 437. Para verificar a autenticidade desta cópia,
base de cálculo do ISSQN. Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções:
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.NGY1.FMMW:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Valor Líquido da NFS-e:

Valor Total da NFS-e:

1.381,05	0,00	0,00	1.272,64	1.381,05
----------	------	------	----------	----------

NFS-E Nº
365

Recebemos de CS MAGON CONSTRUTORA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____



**ATESTADO DE CONFORMIDADE PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE MÃO DE OBRA
NÃO RESIDENTE**

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL			
CONTRATO/PROAD Nº CE- 352/2024	UNIDADE:		
EMPRESA CONTRATADA:	S C MAGON CONSTRUTORA LTDA		
VIGÊNCIA DO CONTRATO:			
RESPONSÁVEL:			
Item	SIM	NÃO	Não se aplica
1. NA LIQUIDAÇÃO MENSAL DA NOTA FISCAL:			
1.1 O Fiscal de Contrato atestou a conformidade na prestação dos serviços (Caso afirmativo informar o número do marcador do referido documento do respectivo proad)	X		
1.2 Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal			X
1.3 Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho)	X		
1.4 Período da prestação de serviços está correto (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura)			X
1.5 O gestor atestou a nota fiscal no SIGEO	X		
2. VALIDADE DAS CERTIDÕES NEGATIVAS:			
2.1 Certidão negativa de débitos trabalhistas	X		
2.2 GRF (FGTS)	X		
2.3 Certidão conjunta de débitos relativos as Tributos Federais e Divida Ativa da União	X		
3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	X		
3.1 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	X		
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			
3.6			
3.7			



16/07/25 18:04

USUARIO : JEAN

DATA EMISSAO : 14Jul25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB002418

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 27097119/0001-80 - C S MAGON CONSTRUTORA LTDA

BANCO : 274 AGENCIA : 0001 CONTA CORRENTE : 81114738

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2025NP000917 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003366585-0

PROCESSO : CE-352/2024

VALOR : 23.521,50

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 14/07/25

PAGAMENTO NFS-E 364 E 365 - REAJUSTE DE MEDIÇÕES. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO DESTINADO AO FÓRUM TRABALHISTA DE TUBARÃO. CE-352/2024 - RETENÇÃO DE R\$ 510,50 REF. ISSRF. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - DCTFWEB - PROAD-1346/2025.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



16/07/25 18:04

USUARIO : JEAN

DATA EMISSAO : 14Jul25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB002418

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 27097119/0001-80 - C S MAGON CONSTRUTORA LTDA

BANCO : 274 AGENCIA : 0001 CONTA CORRENTE : 81114738

VALOR : 23.521,50

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR

01 401006 2024NE000353400 44905191

23.521,50

02 531814 2024NE000353 213110400 44905191

23.521,50

03 561602 1000000000400D

23.521,50

LANCADO POR : 43050263920 - ALECIO

UG : 080013 14Jul25 16:15

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) Juntado em 28/07/2025

16/07/25 18:04

USUARIO : JEAN

DATA EMISSAO : 14Jul25

NUMERO : 2025OB002418

UG/GESTAO EMITENTE : 080013 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP002417

ASS. ORDENADOR DESPESA : 143.876.948-23 DATA: 14Jul25 HORA: 16:09

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 430.502.639-20 DATA: 14Jul25 HORA: 16:15

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202507142875820

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 02375 DATA: 14Jul25 HORA: 16:40

LANCADO POR : 43050263920 - ALECIO UG : 080013 14Jul25 16:15

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

