



Andre Wagner <andre.wagner@trt12.jus.br>

Formalização de solicitação de 12a medição Fórum Trabalhista de Tubarão - TRT, CT 352/2024

Isabelle Batista <financeiro2@glocon.com.br>
Para: Andre Wagner <andre.wagner@trt12.jus.br>

18 de agosto de 2025 às 16:



Boa tarde, tudo bem? Segue em anexo.

Em seg., 18 de ago. de 2025 às 13:24, Andre Wagner <andre.wagner@trt12.jus.br> escreveu:
Prezados CS Magon,

Houve algum retorno sobre a questão da contratação de egressos do sistema carcerário em relação à última medição?
Além do contato que vocês fizeram com o Fórum e com a Polícia Penal, há no quadro da empresa alguém outro que tenha tido passagem pelo Sistema Penitenciário?

Atenciosamente,



Eng. Civil André Wagner

Serviço de Projetos e Obra - SPO

Telefone **(48) 3216-4250**

Em seg., 18 de ago. de 2025 às 12:08, Andre Wagner <andre.wagner@trt12.jus.br> escreveu:
De acordo. Podem emitir uma NF para a medição e outra pro Reajuste.

Atenciosamente,



Eng. Civil André Wagner

Serviço de Projetos e Obra - SPO

Telefone **(48) 3216-4250**

Em seg., 18 de ago. de 2025 às 11:58, Matheus Schoenberg <engenharia4@glocon.com.br> escreveu:
Prezados.

Conforme demandado via mensagem, solicitamos a medição de:
- **R\$280.414,87, sendo:**

- R\$171.287,91 referente à 12ª medição do contrato inicial

PROAD n. 352/2024 DOC 517. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JPWY.ZRCC:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



- R\$-15.004,01 referente ao abatimento de valores de medição do 2º aditivo de valores
- R\$99.086,58 referente à 1ª medição do 3º aditivo de valores
- R\$25.044,39 referente à 1ª medição do 4º aditivo de valores

- **R\$9.797,67**, referente à medição de reajuste da 12ª medição da planilha orçamentária inicial.

Segue link da planilha de medição alinhada em obra: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VmltT-Ai19K6Pm7zt4kZ6eW7SwngdJrAdJoQ0Pg3JQ0/edit?usp=drivesdk>

Atenciosamente.

--



--

Atenciosamente,
Exibindo image.png



Egresso Carcerario Tubarao.pdf
288K



PROAD n. 352/2024 DOC 517. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.JPWY.ZRCC: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

PLAN. ORC.	18.4	BG-02 – SANIT. D - BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBA MEDINDO 220 X 50CM, COM SAIA E ESPELHO, COM 2 CUBAS OVAL EM LOUÇA INCLUSO FUROS PARA PAPELEIRA	UN	1,00	R\$	911,99	R\$	911,99	0,02%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	18.5	BG-04 - FALDARIO - BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBA MEDINDO 250 X 60CM, COM SAIA E ESPELHO	UN	1,00	R\$	1.188,64	R\$	1.188,64	0,03%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	18.6	BG-04 - FALDARIO - BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBA MEDINDO 120 X 60CM, COM SAIA E ESPELHO	UN	1,00	R\$	649,16	R\$	649,16	0,01%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	18.7	BG-05 – SANIT. FEM 2 - BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBA MEDINDO 260 X 50CM, COM SAIA E ESPELHO INCLUSO FUROS PARA PAPELEIRA, TORNEIRAS E CUBAS	UN	1,00	R\$	1.140,23	R\$	1.140,23	0,03%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19	LOUÇAS E METAIS					R\$	78.185,73	1,79%								
PLAN. ORC.	19.1	ALARME AUDIOVISUAL 127/220V	UN	5,00	R\$	349,10	R\$	1.745,50	0,04%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE	UN	19,00	R\$	430,84	R\$	8.185,96	0,19%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.3	BARRA DE APOIO VERTICAL PARA LAVA TÓRTO EM INOX POLIDO DIAM 32MM, ESP.1.5MM. COMP. 40CM RETA	UN	10,00	R\$	1.154,14	R\$	11.541,40	0,26%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.4	BEBEDOURO DE PRESSÃO ACESSIVEL SUSPENSO	UN	2,00	R\$	3.438,86	R\$	6.877,72	0,16%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.5	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$	101,39	R\$	101,39	0,00%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$	142,85	R\$	1.142,80	0,03%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.7	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$	225,84	R\$	225,84	0,01%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.8	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, ref. 1984 C35 DA DECA OU EQUIVALENTE	UN	5,00	R\$	445,53	R\$	2.227,65	0,05%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.9	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00	R\$	51,89	R\$	1.401,03	0,03%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.10	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	6,30	R\$	486,99	R\$	3.068,04	0,07%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.11	LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA, REF. CELITE 600X415X430/ 1562020010300 OU EQUIVALENTE	UN	5,00	R\$	970,66	R\$	4.853,30	0,11%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.12	MICTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE AGUA EMBOTIDA PADRAO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$	969,01	R\$	2.907,03	0,07%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.13	PLACA DE INOX PROTEÇÃO IMPACTO PARA PORTA DEFICIENTE 40X90CM	UN	10,00	R\$	246,41	R\$	2.464,10	0,06%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.14	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, TIPO ROLAO DE 300 A 600 METROS, COM SISTEMA DE ABERTURA ATRAVÉS DE CHAVE. MODELO PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	11,00	R\$	61,37	R\$	675,07	0,02%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.15	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$	395,39	R\$	1.976,95	0,05%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.16	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$	59,42	R\$	831,88	0,02%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.17	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$	12,91	R\$	12,91	0,00%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.18	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	R\$	193,69	R\$	2.905,35	0,07%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.19	SUPORTE PARA TOALHAS INTERFOLHADAS, SERA DO TIPO SOBREPOR EM PLASTICO ABS, PARA TOALHAS INTERFOLHADAS DE 2 OU 3 DOBRAS, COM SISTEMA DE ABERTURA	UN	11,00	R\$	61,37	R\$	675,07	0,02%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.20	TANQUE SUSPENSO ESMALTADO 20L 530X410X285MM, COR BRANCO, DA MARCA DUCOL OU EQUIVALENTE	UN	1,00	R\$	1.059,18	R\$	1.059,18	0,02%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.21	TORNEIRA BICA MÓVEL DE PAREDE, DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	R\$	366,13	R\$	732,26	0,02%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.22	TORNEIRA DE MESA DO TIPO PRESSMATIC, DA MARCA DUCOL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R\$	230,85	R\$	3.231,90	0,07%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.23	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$	124,38	R\$	248,76	0,01%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.24	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM AÇIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	3,00	R\$	283,17	R\$	849,51	0,02%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.25	KIT CAIXA ACOPLADA CELITE ACESSO CONFORT BRANCO BRILHANTE, COM ASSENTO SOFT CLOSE	UN	6,00	R\$	1.463,18	R\$	8.779,08	0,20%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	19.26	KIT CAIXA ACOPLADA CELITE AZALEA BRANCO BRILHANTE, COM ASSENTO SOFT CLOSE	UN	5,00	R\$	1.893,21	R\$	9.466,05	0,22%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	20	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$	88.239,82	2,02%								
PLAN. ORC.	20.1	INSTALAÇÕES DE ÁGUA					R\$	21.342,75	0,49%								
PLAN. ORC.	20.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA RAMAL DE ESG. SANIT. PRIMADA ESG. LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	M	45,09	R\$	51,40	R\$	2.317,63	0,05%		R\$	-	0,00%	45,09	R\$	2.317,63	100,00%
PLAN. ORC.	20.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA RAMAL DE ESG. SANIT. PRIMADA ESG. LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	M	205,09	R\$	50,85	R\$	10.428,83	0,24%		R\$	-	0,00%	100,00	R\$	5.085,00	48,76%
PLAN. ORC.	20.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA RAMAL DE ESG. SANIT. PRIMADA ESG. LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	M	62,17	R\$	39,61	R\$	2.462,55	0,06%		R\$	-	0,00%	62,17	R\$	2.462,55	100,00%
PLAN. ORC.	20.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA RAMAL DE ESG. SANIT. PRIMADA ESG. LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	M	19,29	R\$	35,57	R\$	686,15	0,02%		R\$	-	0,00%	19,29	R\$	686,15	100,00%
PLAN. ORC.	20.1.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	UN	6,00	R\$	23,95	R\$	143,70	0,00%		R\$	-	0,00%	6,00	R\$	143,70	100,00%
PLAN. ORC.	20.1.6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	UN	2,00	R\$	31,14	R\$	62,28	0,00%		R\$	-	0,00%	2,00	R\$	62,28	100,00%
PLAN. ORC.	20.1.7	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R\$	1.189,54	R\$	2.379,08	0,05%		R\$	-	0,00%	2,00	R\$	2.379,08	100,00%
PLAN. ORC.	20.1.8	FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2" ATE 5 MM E DIAMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	6,00	R\$	4,73	R\$	28,38	0,00%		R\$	-	0,00%	6,00	R\$	28,38	100,00%
PLAN. ORC.	20.1.9	FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2" ATE 5 MM E DIAMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	2,00	R\$	5,33	R\$	10,66	0,00%		R\$	-	0,00%	2,00	R\$	10,66	100,00%
PLAN. ORC.	20.1.10	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 MP/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R\$	237,73	R\$	237,73	0,01%	1,00	R\$	237,73	100,00%	1,00	R\$	237,73	100,00%
PLAN. ORC.	20.1.11	JOELHO 90 GRAUS COM BOCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	UN	44,00	R\$	11,36	R\$	499,84	0,01%		R\$	-	0,00%	44,00	R\$	499,84	100,00%
PLAN. ORC.	20.1.12	KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	45,30	R\$	45,30	0,00%		R\$	-	0,00%	1,00	R\$	45,30	100,00%
PLAN. ORC.	20.1.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$	86,72	R\$	173,44	0,00%		R\$	-	0,00%	2,00	R\$	173,44	100,00%
PLAN. ORC.	20.1.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$	63,64	R\$	127,28	0,00%		R\$	-	0,00%	2,00	R\$	127,28	100,00%
PLAN. ORC.	20.1.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$	37,26	R\$	111,78	0,00%		R\$	-	0,00%	3,00	R\$	111,78	100,00%
PLAN. ORC.	20.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$	41,23	R\$	164,92	0,00%		R\$	-	0,00%	4,00	R\$	164,92	100,00%
PLAN. ORC.	20.1.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14,00	R\$	97,74	R\$	1.368,36	0,03%		R\$	-	0,00%	14,00	R\$	1.368,36	100,00%
PLAN. ORC.	20.1.18	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$	47,42	R\$	94,84	0,00%		R\$	-	0,00%	2,00	R\$	94,84	100,00%
PLAN. ORC.	20.2	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E VENTILAÇÃO					R\$	34.762,38	0,80%								
PLAN. ORC.	20.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA RAMAL DE ESG. SANIT. PRIMADA ESG. LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	M	146,85	R\$	85,65	R\$	12.577,70	0,29%		R\$	-	0,00%	146,85	R\$	12.577,70	100,00%
PLAN. ORC.	20.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA RAMAL DE ESG. SANIT. PRIMADA ESG. LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	M	8,30	R\$	53,47	R\$	443,80	0,01%		R\$	-	0,00%	8,30	R\$	443,80	100,00%
PLAN. ORC.	20.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA RAMAL DE ESG. SANIT. PRIMADA ESG. LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	M	27,01	R\$	89,37	R\$	2.413,88	0,06%		R\$	-	0,00%	27,01	R\$	2.413,79	100,00%
PLAN. ORC.	20.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA RAMAL DE ESG. SANIT. PRIMADA ESG. LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	M	93,22	R\$	113,01	R\$	10.534,79	0,24%		R\$	-	0,00%	93,22	R\$	10.534,79	100,00%
PLAN. ORC.	20.2.5	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO: 0,3 M. AF_12/2020	M	1,40	R\$	50,85	R\$	71,19	0,00%		R\$	-	0,00%	1,40	R\$	71,19	100,00%
PLAN. ORC.	20.2.6	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO: 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$	447,10	R\$	447,10	0,01%		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%
PLAN. ORC.	20.2.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 60X40X40 CM, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE	CJ	12,00	R\$	490,58	R\$	5.886,96	0,13%		R\$	-	0,00%	12,00	R\$	5.886,96	100,00%
PLAN. ORC.	20.2.8	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE	UN	12,00	R\$	80,44	R\$	965,28	0,02%		R\$	-	0,00%	12,00	R\$	965,28	100,00%
PLAN. ORC.	20.2.9	CAIXA SIFONADA, PVC DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$	118,78	R\$	118,78	0,00%		R\$	-	0,00%	1,00	R\$	118,78	100,00%



PLAN. ORC.	22.4	INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS				R\$	5.472,39	0,13%
PLAN. ORC.	22.4.1	CABO PP BLINDADO 3X2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	253,00	R\$	11,52	R\$ 2.914,56	0,07%
PLAN. ORC.	22.4.2	CABO PP BLINDADO 4X1,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	253,00	R\$	10,11	R\$ 2.557,83	0,06%
PLAN. ORC.	22.5	DUTOS DIFUSORES E ACESÓRIOS DO SITEMA DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO				R\$	19.091,48	0,44%
PLAN. ORC.	22.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE CARGA RAMAL DE ESG. SANIT. PRIMARIA ESG. BALANCEAMENTO DE VAZÕES DE AR EM TODOS OS DIFUSORES E GREIJAS DAS REDES DE DUTOS, UTILIZANDO-SE ANEMÔMETRO DIGITAL AFERIDO E COM BOA PRECISÃO. AS	M	22,00	R\$	85,65	R\$ 1.884,30	0,04%
PLAN. ORC.	22.5.2	CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO G4+M5 Ø125MM	UN	12,00	R\$	288,59	R\$ 3.463,08	0,08%
PLAN. ORC.	22.5.3	CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO G4+M5 Ø125MM	UN	2,00	R\$	602,41	R\$ 1.204,82	0,03%
PLAN. ORC.	22.5.4	CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO G4+M5 Ø200MM	UN	2,00	R\$	1.005,25	R\$ 2.010,50	0,05%
PLAN. ORC.	22.5.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLOVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AE 06/2022	UN	10,00	R\$	68,12	R\$ 681,20	0,02%
PLAN. ORC.	22.5.6	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCURE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AE 06/2022	UN	6,00	R\$	74,83	R\$ 448,98	0,01%
PLAN. ORC.	22.5.7	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCURE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AE 06/2022	UN	6,00	R\$	165,66	R\$ 993,96	0,02%
PLAN. ORC.	22.5.8	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCURE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AE 06/2022	UN	4,00	R\$	195,82	R\$ 783,28	0,02%
PLAN. ORC.	22.5.9	DIFUSOR DE AR CIRCULAR, EM PVC, COR BRANCA, COM REGISTRO, DIMENSÕES Ø100	UN	13,00	R\$	78,67	R\$ 1.022,71	0,02%
PLAN. ORC.	22.5.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 200 X 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	2,00	R\$	634,80	R\$ 1.269,60	0,03%
PLAN. ORC.	22.5.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLOVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AE 06/2022	UN	2,00	R\$	282,18	R\$ 564,36	0,01%
PLAN. ORC.	22.5.12	JUNTA FLEXÍVEL 70/100 - 5 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,50	R\$	50,79	R\$ 228,56	0,01%
PLAN. ORC.	22.5.13	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 150x100 MM	UN	10,00	R\$	44,59	R\$ 445,90	0,01%
PLAN. ORC.	22.5.14	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 150x125 MM	UN	4,00	R\$	101,37	R\$ 405,48	0,01%
PLAN. ORC.	22.5.15	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 200x150MM	UN	3,00	R\$	123,97	R\$ 371,91	0,01%
PLAN. ORC.	22.5.16	TE, PVC, SERIE R, AGUA PLOVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AE 06/2022	UN	4,00	R\$	206,15	R\$ 824,60	0,02%
PLAN. ORC.	22.5.17	TOMADA DE AR EXTERNO CIRCULAR, TELA DE PROTEÇÃO E PINGADEIRA Ø150MM	UN	2,00	R\$	73,03	R\$ 146,06	0,00%
PLAN. ORC.	22.5.18	TOMADA DE AR EXTERNO CIRCULAR, TELA DE PROTEÇÃO E PINGADEIRA Ø200MM	UN	2,00	R\$	82,71	R\$ 165,42	0,00%
PLAN. ORC.	22.5.19	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AE 01/2021	M	1,50	R\$	164,31	R\$ 246,47	0,01%
PLAN. ORC.	22.5.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 125MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	0,50	R\$	86,18	R\$ 43,09	0,00%
PLAN. ORC.	22.5.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES AÉREOS DE ESGOTO SANITÁRIO. AE 08/2022	M	28,00	R\$	63,99	R\$ 1.791,72	0,04%
PLAN. ORC.	22.5.22	VENEZIANA CIRCULAR EXTERIOR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA E TELA DE PROTEÇÃO Ø150MM	UN	2,00	R\$	47,74	R\$ 95,48	0,00%
PLAN. ORC.	23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$	518.636,53	11,87%
PLAN. ORC.	23.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REDE COMUM ILUMINAÇÃO E REDE ESTABILIZADA				R\$	262.325,60	6,00%
PLAN. ORC.	23.1.1	PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 22, LARGURA 38 MM X ALTURA 38 MM, SEM TAMPA, INSTALAÇÃO SUPERIOR COM BUCHA, INCLUSIVE CONEXÕES	M	450,00	R\$	101,60	R\$ 45.720,00	1,05%
PLAN. ORC.	23.1.2	ELEITROCALHA LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 22, TIPO U, SEM TAMPA, LARGURA 200 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR INCLUSIVE CONEXÕES	M	92,00	R\$	158,10	R\$ 14.545,20	0,33%
PLAN. ORC.	23.1.3	ELEITRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 03/2023	M	160,00	R\$	11,04	R\$ 1.766,40	0,04%
PLAN. ORC.	23.1.4	ELEITRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 03/2023	M	649,00	R\$	12,50	R\$ 8.112,50	0,19%
PLAN. ORC.	23.1.5	ELEITRODUTO RÍGIDO ROSTAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 03/2023	M	289,00	R\$	12,62	R\$ 3.647,18	0,08%
PLAN. ORC.	23.1.6	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 12/2021	M	45,00	R\$	8,95	R\$ 402,75	0,01%
PLAN. ORC.	23.1.7	ELEITRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 12/2021	M	200,00	R\$	24,14	R\$ 4.828,00	0,11%
PLAN. ORC.	23.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 03/2023	M	2.557,00	R\$	3,19	R\$ 8.156,83	0,19%
PLAN. ORC.	23.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 03/2023	M	4.500,00	R\$	4,61	R\$ 20.745,00	0,47%
PLAN. ORC.	23.1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 03/2023	M	450,00	R\$	7,55	R\$ 3.397,50	0,08%
PLAN. ORC.	23.1.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 03/2023	M	3.000,00	R\$	7,08	R\$ 21.240,00	0,49%
PLAN. ORC.	23.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 03/2023	M	120,00	R\$	9,86	R\$ 1.183,20	0,03%
PLAN. ORC.	23.1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 12/2015	M	115,00	R\$	10,65	R\$ 1.224,75	0,03%
PLAN. ORC.	23.1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 12/2015	M	140,00	R\$	16,87	R\$ 2.361,80	0,05%
PLAN. ORC.	23.1.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	R\$	100,89	R\$ 25.222,50	0,58%
PLAN. ORC.	23.1.16	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 03/2023	UN	1,00	R\$	43,53	R\$ 43,53	0,00%
PLAN. ORC.	23.1.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 03/2023	UN	1,00	R\$	62,25	R\$ 62,25	0,00%
PLAN. ORC.	23.1.18	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 03/2023	UN	11,00	R\$	54,57	R\$ 600,27	0,01%
PLAN. ORC.	23.1.19	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 03/2023	UN	25,00	R\$	88,76	R\$ 2.219,00	0,05%
PLAN. ORC.	23.1.20	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 03/2023	UN	4,00	R\$	73,35	R\$ 293,40	0,01%
PLAN. ORC.	23.1.21	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 03/2023	UN	43,00	R\$	31,59	R\$ 1.358,37	0,03%
PLAN. ORC.	23.1.22	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 03/2023	UN	144,00	R\$	37,56	R\$ 5.408,64	0,12%
PLAN. ORC.	23.1.23	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 03/2023	UN	5,00	R\$	58,03	R\$ 290,15	0,01%
PLAN. ORC.	23.1.24	TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 12/2021	UN	35,00	R\$	43,38	R\$ 1.518,30	0,03%
PLAN. ORC.	23.1.25	CONDUTORA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COMPRIMENTO 3M, PARA DESCIDAS DE TUBULAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA PELA PARTE SUPERIOR. DIMENSÕES	UN	2,00	R\$	2.078,77	R\$ 4.157,54	0,10%
PLAN. ORC.	23.1.26	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	16,00	R\$	67,28	R\$ 1.076,48	0,02%
PLAN. ORC.	23.1.27	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO - 30 X 15 - CM, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	2,00	R\$	120,36	R\$ 240,72	0,01%
PLAN. ORC.	23.1.28	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO - H = 9 M DIÂMETRO INFERIOR = 1135* MM	UN	10,00	R\$	2.603,40	R\$ 26.034,00	0,60%
PLAN. ORC.	23.1.29	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 08/2020	UN	10,00	R\$	261,75	R\$ 2.617,50	0,06%
PLAN. ORC.	23.1.30	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	6,00	R\$	55,66	R\$ 333,96	0,01%
PLAN. ORC.	23.1.31	LUMINÁRIA LED QUADRADA 40W LUZ BRANCO NEUTRO QUADRADO BIVOLT	UN	111,00	R\$	242,49	R\$ 26.916,39	0,62%
PLAN. ORC.	23.1.32	LUMINÁRIA LED RETANGULAR 48W LUZ BRANCO NEUTRO QUADRADO BIVOLT	UN	21,00	R\$	379,17	R\$ 7.962,57	0,18%
PLAN. ORC.	23.1.33	CAIXA PARA TOMADA FIXA, PERFIL COM TAMPA E TOMADA UNIVERSAL, PARA PERFILADO	UN	89,00	R\$	61,57	R\$ 5.479,73	0,13%

	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	4.873,55	25,53%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
2,00	R\$	1.204,82	100,00%
2,00	R\$	2.010,50	100,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
13,00	R\$	1.022,71	100,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
4,50	R\$	228,56	100,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
2,00	R\$	146,06	100,00%
2,00	R\$	165,42	100,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
2,00	R\$	95,48	100,00%
	R\$	82.370,80	15,88%
	R\$	74.860,55	28,54%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
107,00	R\$	341,33	4,18%
500,00	R\$	2.305,00	11,11%
	R\$	-	0,00%
200,00	R\$	1.416,00	6,67%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
250,00	R\$	25.222,50	100,00%
1,00	R\$	43,53	100,00%
1,00	R\$	62,25	100,00%
9,00	R\$	491,13	81,82%
22,00	R\$	1.952,72	88,00%
3,00	R\$	220,05	75,00%
38,00	R\$	1.200,42	88,37%
129,00	R\$	4.845,24	89,58%
4,00	R\$	232,12	80,00%
31,00	R\$	1.344,78	88,57%
2,00	R\$	4.157,54	100,00%
16,00	R\$	1.076,48	100,00%
2,00	R\$	240,72	100,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
111,00	R\$	26.916,39	100,00%
5,00	R\$	1.895,85	23,81%
	R\$	-	0,00%

	R\$	5.472,39	100,00%
253,00	R\$	2.914,56	100,00%
253,00	R\$	2.557,83	100,00%
	R\$	15.628,40	81,86%
22,00	R\$	1.884,30	100,00%
0,00	R\$	-	0,00%
2,00	R\$	1.204,82	100,00%
2,00	R\$	2.010,50	100,00%
10,00	R\$	681,20	100,00%
6,00	R\$	448,98	100,00%
6,00	R\$	993,96	100,00%
4,00	R\$	783,28	100,00%
13,00	R\$	1.022,71	100,00%
2,00	R\$	1.269,60	100,00%
2,00	R\$	564,36	100,00%
4,50	R\$	228,56	100,00%
10,00	R\$	445,90	100,00%
4,00	R\$	405,48	100,00%
3,00	R\$	371,91	100,00%
4,00	R\$	824,60	100,00%
2,00	R\$	146,06	100,00%
2,00	R\$	165,42	100,00%
1,50	R\$	246,47	100,00%
0,50	R\$	43,09	100,00%
28,00	R\$	1.791,72	100,00%
2,00	R\$	95,48	100,00%
	R\$	349.603,59	67,41%
	R\$	225.258,07	85,87%
450,00	R\$	45.720,00	100,00%
92,00	R\$	14.545,20	100,00%
160,00	R\$	1.766,40	100,00%
649,00	R\$	8.112,50	100,00%
289,00	R\$	3.647,18	100,00%
45,00	R\$	402,75	100,00%
200,00	R\$	4.828,00	100,00%
2.557,00	R\$	8.156,83	100,00%
4.500,00	R\$	20.745,00	100,00%
450,00	R\$	3.397,50	100,00%
3.000,00	R\$	21.240,00	100,00%
120,00	R\$	1.183,20	100,00%
115,00	R\$	1.224,75	100,00%
140,00	R\$	2.361,80	100,00%
250,00	R\$	25.222,50	100,00%
1,00	R\$	43,53	100,00%
1,00	R\$	62,25	100,00%
9,00	R\$	491,13	81,82%
22,00	R\$	1.952,72	88,00%
3,00	R\$	220,05	75,00%
38,00	R\$	1.200,42	88,37%
129,00	R\$	4.845,24	89,58%
4,00	R\$	232,12	80,00%
31,00	R\$	1.344,78	88,57%
2,00	R\$	4.157,54	100,00%
16,00	R\$	1.076,48	100,00%
2,00	R\$	240,72	100,00%
0,00	R\$	-	0,00

ADITIVO 03	17.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATU	M2	5,00	R\$	78,30	R\$	391,50	0,01%
ADITIVO 03	17.8	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO DE ALERTA OU DIRECIONAL, MEDINDO 25x25CM, NA COR V	m	1,00	R\$	49,76	R\$	49,76	0,00%
ADITIVO 03	17.9	TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO DE GRAMA	m2	5,24	R\$	207,45	R\$	1.086,55	0,02%
ADITIVO 03	17.10	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m2	53,50	R\$	14,09	R\$	753,82	0,02%
ADITIVO 03									0,00%
ADITIVO 03	18	SHAFTS NO PÁTIO INTERNO PARA REDE FRIGORÍGENA					R\$	3.580,80	0,08%
ADITIVO 03	18.1	REVESTIMENTO EM PLACA CIMENTICIA ESPESSURA 10MM	M2	14,68	R\$	217,54	R\$	3.192,88	0,07%
ADITIVO 03	18.2	CAPEAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	2,94	R\$	44,93	R\$	132,09	0,00%
ADITIVO 03	18.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	14,68	R\$	4,07	R\$	59,74	0,00%
ADITIVO 03	18.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF	M2	14,68	R\$	13,36	R\$	196,09	0,00%
ADITIVO 03									0,00%
ADITIVO 03	19	FECHAMENTO INTERNO DA PLATIBANDA					R\$	7.482,50	0,17%
ADITIVO 03	19.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAM	M2	89,60	R\$	83,51	R\$	7.482,50	0,17%
ADITIVO 03									0,00%
ADITIVO 03	20	ALTERAÇÃO BORRACHAS DE ISOLAMENTO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS							
ADITIVO 03	20.1	DIFERENÇA DE CUSTO TUBO DE ELASTOMÉRICA FLEXIVEL (PRETA) VS TUBO POLIPEX - DIÂ	M	95,00	-R\$	2,15	R\$	(204,25)	0,00%
ADITIVO 03	20.2	DIFERENÇA DE CUSTO TUBO DE ELASTOMÉRICA FLEXIVEL (PRETA) VS TUBO POLIPEX - DIÂ	M	166,00	-R\$	9,48	R\$	(1.573,68)	-0,04%
ADITIVO 03	20.3	DIFERENÇA DE CUSTO TUBO DE ELASTOMÉRICA FLEXIVEL (PRETA) VS TUBO POLIPEX - DIÂ	M	88,00	-R\$	10,28	R\$	(904,64)	-0,02%
ADITIVO 03	20.4	DIFERENÇA DE CUSTO TUBO DE ELASTOMÉRICA FLEXIVEL (PRETA) VS TUBO POLIPEX - DIÂ	M2	157,00	-R\$	11,99	R\$	(1.882,43)	-0,04%
ADITIVO 03									0,00%
ADITIVO 03	21	ATERRAMENTOS GERAIS PARA A EDIFICAÇÃO					R\$	3.217,24	0,07%
ADITIVO 03	21.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRA	M	56,00	R\$	49,64	R\$	2.779,84	0,06%
ADITIVO 03	21.2	ATERRAMENTO DE ELETROCALHAS (LIGAÇÃO DA ELETROCALHA AO BEP) - CABO 10 MM	UNID	1,00	R\$	43,46	R\$	43,46	0,00%
ADITIVO 03	21.3	ATERRAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA (LIGAÇÃO DA ESTRUTURA AO BEP) - CABO 10 M	UNID	1,00	R\$	62,49	R\$	62,49	0,00%
ADITIVO 03	21.4	CONEXÃO ENTRE ELETROCALHAS ELÉTRICAS COM CABO 6 MM PARA CONTINUIDADE ELÉT	UNID	35,00	R\$	9,47	R\$	331,45	0,01%
ADITIVO 03									0,00%
ADITIVO 03	22	ALTERAÇÃO NO TRAÇADO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO - CIRCUITO RC.25					R\$	1.027,34	0,02%
ADITIVO 03	22.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/202	m³	0,56	R\$	78,66	R\$	44,05	0,00%
ADITIVO 03	22.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I	M	7,00	R\$	9,70	R\$	67,90	0,00%
ADITIVO 03	22.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM E	UNID	2,00	R\$	131,19	R\$	262,38	0,01%
ADITIVO 03	22.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM	M	134,40	R\$	4,66	R\$	626,30	0,01%
ADITIVO 03	22.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	m³	0,56	R\$	47,70	R\$	26,71	0,00%
ADITIVO 03									0,00%
ADITIVO 03	23	CIRCUITO PARA ILUMINAÇÃO NO BARRILETE					R\$	1.879,66	0,04%
ADITIVO 03	23.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA	M	21,40	R\$	11,08	R\$	237,11	0,01%
ADITIVO 03	23.2	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", COM TAMPA, DE 3/4"	UNID	10,00	R\$	17,50	R\$	374,50	0,01%
ADITIVO 03	23.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	UNID	8,00	R\$	13,34	R\$	106,72	0,00%
ADITIVO 03	23.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I	UNID	8,00	R\$	8,35	R\$	66,80	0,00%
ADITIVO 03	23.5	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUS	UNID	27,00	R\$	1,19	R\$	32,13	0,00%
ADITIVO 03	23.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIM	UNID	1,00	R\$	31,44	R\$	31,44	0,00%
ADITIVO 03	23.7	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SE	UNID	6,00	R\$	141,76	R\$	850,56	0,02%
ADITIVO 03	23.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TEF	M	64,20	R\$	2,81	R\$	180,40	0,00%
ADITIVO 03									0,00%
ADITIVO 03	24	JUNTA DE DILATAÇÃO NO CONTRAPISO E NO PISO PORCELANATO					R\$	586,14	0,01%
ADITIVO 03	24.1	JUNTA DE DILATAÇÃO EM CONTRAPISO (CORTE REENCHIDO COM SELANTE PU)	M	14,10	R\$	9,01	R\$	127,04	0,00%
ADITIVO 03	24.2	JUNTA DE DILATAÇÃO EM PISO PORCELANATO COM PERFIL DE PVC, COR CINZA, 10 MM LAI	M	14,10	R\$	32,56	R\$	459,10	0,01%
ADITIVO 03									0,00%
ADITIVO 03	25	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PEITORIS DE JANELAS					R\$	378,14	0,01%
ADITIVO 03	25.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLIC	M²	5,76	R\$	65,65	R\$	378,14	0,01%
ADITIVO 03									0,00%
ADITIVO 03	26	COLOCAÇÃO DE TAMPAS CEGAS NAS TOMADAS EXTERNAS					R\$	195,84	0,00%
ADITIVO 03	26.1	INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA EM CAIXAS 4X2 NAS PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE VEDAC	UNID	6,00	R\$	32,64	R\$	195,84	0,00%
ADITIVO 03									0,00%
ADITIVO 03	27	POSTES E LUMINÁRIAS - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA					R\$	5.730,30	0,13%
ADITIVO 03	27.1	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO,	UNID	2,00	R\$	2.603,40	R\$	5.206,80	0,12%
ADITIVO 03	27.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INS	UNID	2,00	R\$	261,75	R\$	523,50	0,01%
ADITIVO 03									0,00%
ADITIVO 03	28	PISO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ ACABAMENTO FLAMENADO E IMPERMEABILIZAÇÃO ACESSO/SAÍDA FUNDO					R\$	1.590,90	0,04%
ADITIVO 03	28.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLIC	M2	3,20	R\$	65,65	R\$	210,08	0,00%
ADITIVO 03	28.2	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M²	2,55	R\$	471,87	R\$	1.203,27	0,03%
ADITIVO 03	28.3	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	2,12	R\$	83,75	R\$	177,55	0,00%

5,00	R\$	391,50	100,00%
1,00	R\$	49,76	100,00%
5,24	R\$	1.086,55	100,00%
53,50	R\$	753,82	100,00%
	R\$	3.192,88	89,17%
14,68	R\$	3.192,88	100,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	7.482,50	100,00%
89,60	R\$	7.482,50	100,00%
	R\$	(4.565,00)	
95,00	R\$	(204,25)	100,00%
166,00	R\$	(1.573,68)	100,00%
88,00	R\$	(904,64)	100,00%
157,00	R\$	(1.882,43)	100,00%
	R\$	3.217,24	100,00%
56,00	R\$	2.779,84	100,00%
1,00	R\$	43,46	100,00%
1,00	R\$	62,49	100,00%
35,00	R\$	331,45	100,00%
	R\$	1.027,34	100,00%
0,56	R\$	44,05	100,00%
7,00	R\$	67,90	100,00%
2,00	R\$	262,38	100,00%
134,40	R\$	626,30	100,00%
0,56	R\$	26,71	100,00%
	R\$	1.680,16	89,39%
21,40	R\$	237,11	100,00%
10,00	R\$	175,00	46,73%
8,00	R\$	106,72	100,00%
8,00	R\$	66,80	100,00%
27,00	R\$	32,13	100,00%
1,00	R\$	31,44	100,00%
6,00	R\$	850,56	100,00%
64,20	R\$	180,40	100,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	378,14	100,00%
5,76	R\$	378,14	100,00%
	R\$	195,84	100,00%
6,00	R\$	195,84	100,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%
	R\$	-	0,00%

5,00	R\$	391,50	100,00%
1,00	R\$	49,76	100,00%
5,24	R\$	1.086,55	100,00%
53,50	R\$	753,82	100,00%
0,00	R\$	-	
	R\$	3.192,88	
14,68	R\$	3.192,88	100,00%
0,00	R\$	-	0,00%
0,00	R\$	-	0,00%
0,00	R\$	-	0,00%
0,00	R\$	-	
	R\$	7.482,50	
89,60	R\$	7.482,50	100,00%
0,00	R\$	-	
95,00	R\$	(204,25)	100,00%
166,00	R\$	(1.573,68)	100,00%
88,00	R\$	(904,64)	100,00%
157,00	R\$	(1.882,43)	100,00%
0,00	R\$	-	
	R\$	3.217,24	
56,00	R\$	2.779,84	100,00%
1,00	R\$	43,46	100,00%
1,00	R\$	62,49	100,00%
35,00	R\$	331,45	100,00%
0,00	R\$	-	
	R\$	1.027,34	
0,56	R\$	44,05	100,00%
7,00	R\$	67,90	100,00%
2,00	R\$	262,38	100,00%
134,40	R\$	626,30	100,00%
0,56	R\$	26,71	100,00%
0,00	R\$	-	
	R\$	1.680,16	
21,40	R\$	237,11	100,00%
10,00	R\$	175,00	46,73%
8,00	R\$	106,72	100,00%
8,00	R\$	66,80	100,00%
27,00	R\$	32,13	100,00%
1,00	R\$	31,44	100,00%
6,00	R\$	850,56	100,00%
64,20	R\$	180,40	100,00%
0,00	R\$	-	
0,00	R\$	-	0,00%
0,00	R\$	-	0,00%
0,00	R\$	-	
	R\$	378,14	
5,76	R\$	378,14	100,00%
0,00	R\$	-	
	R\$	195,84	
6,00	R\$	195,84	100,00%
0,00	R\$	-	
0,00	R\$	-	0,00%
0,00	R\$	-	0,00%
0,00	R\$	-	
0,00	R\$	-	0,00%
0,00	R\$	-	0,00%



ADITIVO 04	corte manual	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇ	m	24,00	R\$ 22,12	R\$ 530,88	0,01%	24,00	R\$ 530,88	100,00%	24,00	R\$ 530,88	100,00%
ADITIVO 04	preparo do piso	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN	m3	0,03	R\$ 213,50	R\$ 6,83	0,00%	0,03	R\$ 6,41	93,85%	0,03	R\$ 6,41	93,85%
ADITIVO 04	remoção de c	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT	m2	2,40	R\$ 24,60	R\$ 59,04	0,00%	2,40	R\$ 59,04	100,00%	2,40	R\$ 59,04	100,00%
ADITIVO 04	6.1.1.0	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM	UN	4,00	R\$ 8,87	R\$ 35,48	0,00%	4,00	R\$ 35,48	100,00%	4,00	R\$ 35,48	100,00%
ADITIVO 04	6.1.1.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALA	m	1,00	R\$ 18,71	R\$ 18,71	0,00%	1,00	R\$ 18,71	100,00%	1,00	R\$ 18,71	100,00%
ADITIVO 04	9.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSUR	m2	2,00	R\$ 171,22	R\$ 342,44	0,01%		R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%
ADITIVO 04	14.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COL	m2	4,00	R\$ 3,98	R\$ 15,92	0,00%		R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%
ADITIVO 04	14.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE	m2	4,00	R\$ 32,09	R\$ 128,36	0,00%		R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%
ADITIVO 04	14.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO 30x40CM - MODELO FORMA SLIM BRANCO ACETINADO - MARCA	m2	4,80	R\$ 64,65	R\$ 310,32	0,01%		R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%
ADITIVO 04							0,00%				0,00		
ADITIVO 04	8	ALTERAÇÃO DE COLUNAS DUTOTEC				R\$ 538,62	0,01%		R\$ 538,62	100,00%		R\$ 538,62	
ADITIVO 04		ACRÉSCIMO CUSTO COLUNA STANDART - DUTOTEC	UNID	2,00	R\$ 269,31	R\$ 538,62	0,01%	2,00	R\$ 538,62	100,00%	2,00	R\$ 538,62	100,00%
ADITIVO 04							0,00%				0,00		
ADITIVO 04	9	AUTOMAÇÃO PORTÃO				R\$ 562,50	0,01%						
ADITIVO 04		CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO COMPATÍVEL COM MOTOR - DISTÂNCIA MÍNIMA DE ACIO	UNID	10,00	R\$ 56,25	R\$ 562,50	0,01%		R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%
ADITIVO 04							0,00%				0,00		
ADITIVO 04	10	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS				R\$ 4.410,00	0,10%						
ADITIVO 04	6.3	ANILHA EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS	UN	6.300,00	R\$ 0,70	R\$ 4.410,00	0,10%		R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%
VALOR TOTAL PLANILHA ADITIVO 04					PREÇO (COM B.D.I)	R\$ 72.347,44	1,66%	ADITIVO 04	R\$ 25.044,39	34,62%	ADITIVO 04	R\$ 25.044,39	





ANDRE
WAGNER

19/08/2025 17:29

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR

Construção no novo Fórum Trabalhista de Tubarão		Medição nº 12	
Empresa Contratada:	CS Magon Construtora Ltda.	Contrato:	CE 352/2024
Endereço de Execução:	esquina da Rua São Luís com a Rua Aracaju, Bairro Vila Moema	Período da Medição:	03/07/2025 a 14/08/2025

RESULTADO	VALOR MEDIDO	DESCONTO		VALOR FINAL A PAGAR
	R\$ 290.212,54	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 290.212,54

INDICADOR	DESCONTO PADRÃO	Nº DE OCORRÊNCIAS	DESCONTO TOTAL	LIMITE DE NOTIFICAÇÕES
Nº 01	0,05%	0	0,000%	20
Nº 02	0,25%	0	0,000%	5
Nº 03	0,25%	0	0,000%	8

AVISO

MULTA Caso o número de ocorrências ultrapasse o limite máximo permitido para algum indicador será necessário averiguar o CONTRATUAL: percentual da multa contratual a ser cobrada posteriormente (vide item 14.3 do Termo de Referência).

INFORMAÇÕES

- INDICADOR Nº
- 1:
- INDICADOR Nº
- 2:
- INDICADOR Nº
- 3:
- Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
- Uso de Equipamentos para trabalho em altura - andaimes, escadas, balancins, etc.
- Deixar de solicitar, previamente, à fiscalização técnica do TRT, autorização para a subcontratação de serviços, conforme item 7.3.2 do Termo de Referência.

 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD296	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 354	Data: 03/07/2025 (Quinta-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 11	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

ANDRE
WAGNER
16/06/2025 14:15

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Observações feitas por fiscais
Mobilizar novas equipes para andamento da obra de acordo com o cronograma. Redução no efetivo de funcionários, que poderá comprometer o prazo da obra.

Galeria de Fotos	
	



PROAD n. 352/2024 DOC 515. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.DTKN.VBGV:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD297 Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 355	Data: 04/07/2025 (Sexta-Feira)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Termino: 10	Inicio: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Observações feitas por fiscais
Mobilizar novas equipes para andamento da obra de acordo com o cronograma. Redução no efetivo de funcionários, que poderá comprometer o prazo da obra.

Galeria de Fotos	
	





Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD299 Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 356	Data: 05/07/2025 (Sábado)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 9	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070	Termino Previsto: 14/07/2025	

Relatório Diário de Obra

Comentários
Não houve atividades nesse dia.

Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD299 Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 357	Data: 06/07/2025 (Domingo)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 8	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070	Termino Previsto: 14/07/2025	

Relatório Diário de Obra

Comentários
Não houve atividades nesse dia.

Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD298	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 358	Data: 07/07/2025 (Segunda-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 7	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Observações feitas por fiscais
Mobilizar novas equipes para andamento da obra de acordo com o cronograma. Redução no efetivo de funcionários, que poderá comprometer o prazo da obra.

Galeria de Fotos



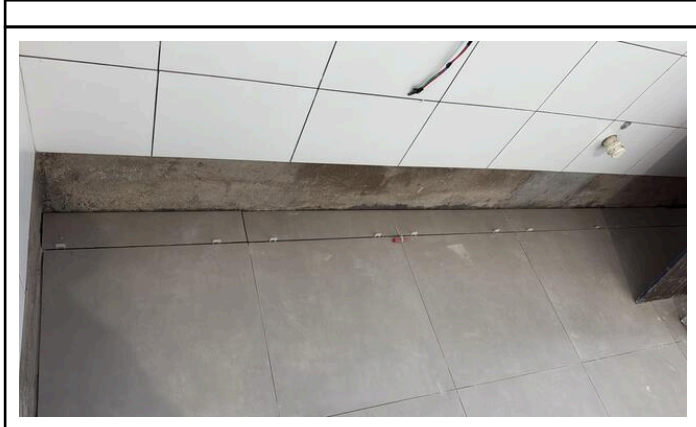





Fiscal

Responsável Técnico




 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD299 Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 359	Data: 08/07/2025 (Terça-Feira)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 6	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Observações feitas por fiscais
Mobilizar novas equipes para andamento da obra de acordo com o cronograma. Redução no efetivo de funcionários, que poderá comprometer o prazo da obra.

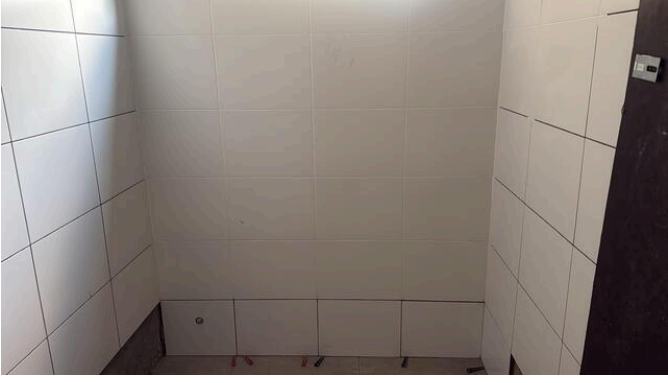Galeria de Fotos	
	
	



Fiscal

Responsável Técnico



PROAD n. 352/2024 DOC 515. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.DTKN.VBGV: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>


 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD300	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 360	Data: 09/07/2025 (Quarta-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 5	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Galeria de Fotos



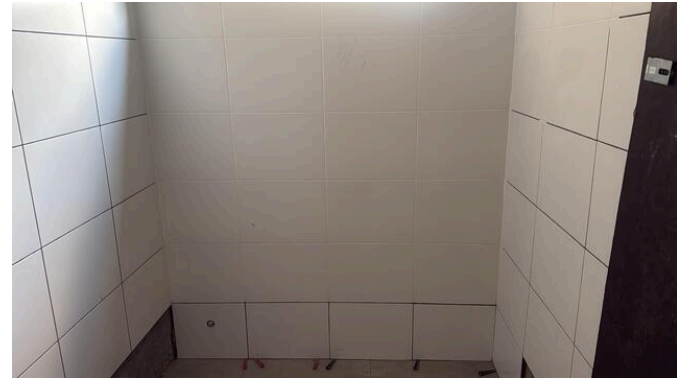

Fiscal

Responsável Técnico




 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD301	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 361	Data: 10/07/2025 (Quinta-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 4	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Galeria de Fotos

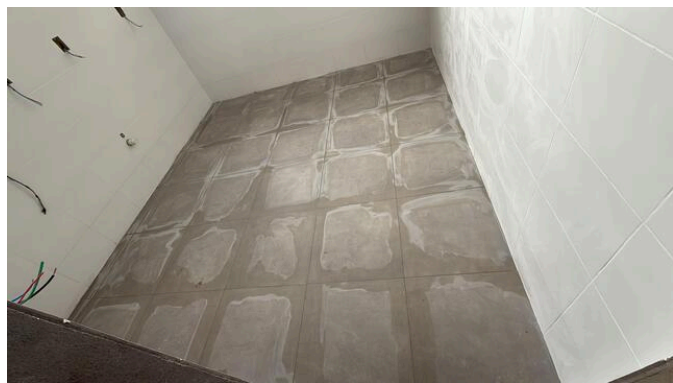



Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD302
	Dias Decorridos: 362	Data: 11/07/2025 (Sexta-Feira)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 3	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070	Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD304 Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 363	Data: 12/07/2025 (Sábado)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 2	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070	Termino Previsto: 14/07/2025	

Relatório Diário de Obra

Comentários
Não houve atividades nesse dia

Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD304 Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 364	Data: 13/07/2025 (Domingo)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: 1	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070	Termino Previsto: 14/07/2025	

Relatório Diário de Obra

Comentários
Não houve atividades nesse dia

Fiscal

Responsável Técnico




 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD303 Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 365	Data: 14/07/2025 (Segunda-Feira)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Termino: 0	Inicio: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	
Equipe Reforço estrutural	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Reforço da laje da caixa d'água	1.0		iniciado	

Galeria de Fotos

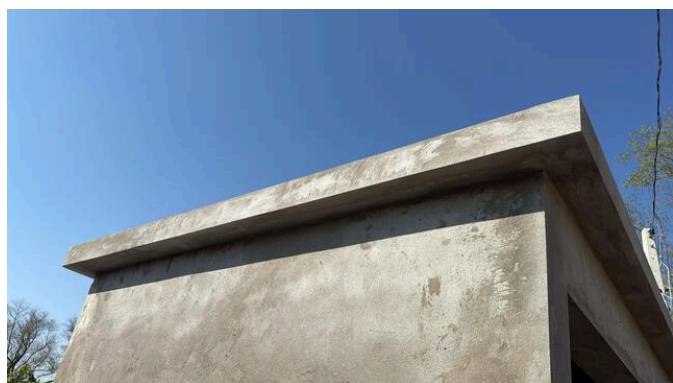

Fiscal

Responsável Técnico



PROAD n. 352/2024 DOC 515. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.DTKN.VBGV: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD304 Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 366	Data: 15/07/2025 (Terça-Feira)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -1	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	
Equipe Reforço estrutural	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Reforço da laje da caixa d'água	1.0		iniciado	

Galeria de Fotos	
	





Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD305	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 367	Data: 16/07/2025 (Quarta-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -2	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	
Equipe Reforço estrutural	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Reforço da laje da caixa d'água	1.0		iniciado	

Galeria de Fotos





Fiscal

Responsável Técnico




 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD306 Juntado em 11/07/2025
	Dias Decorridos: 368	Data: 17/07/2025 (Quinta-Feira)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -3	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070	Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	
Equipe Reforço estrutural	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Reforço da laje da caixa d'água	1.0		iniciado	

Galeria de Fotos	
	



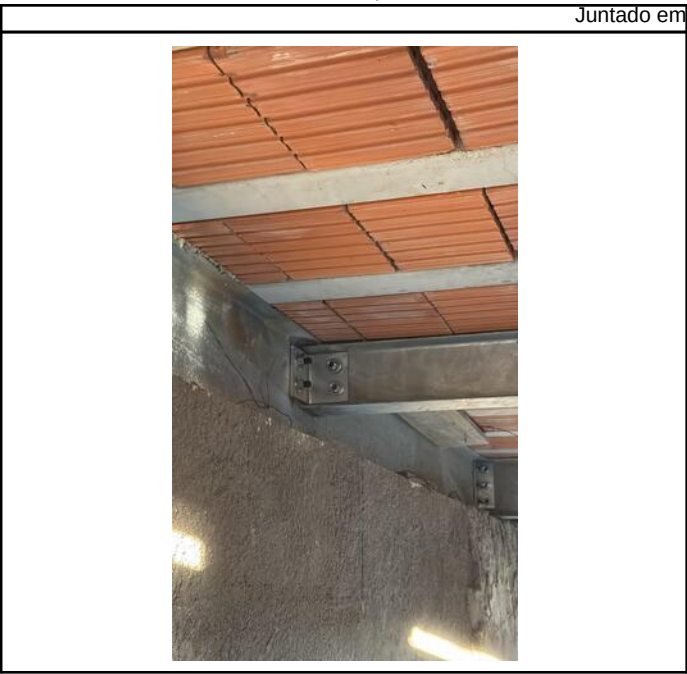

Fiscal

Responsável Técnico





PROAD n. 352/2024 DOC 515. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.DTKN.VBGV:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>


 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD307	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 369	Data: 18/07/2025 (Sexta-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -4	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			


ANDRÉ WAGNER
18/06/2025 14:15

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	
Equipe Reforço estrutural	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Reforço da laje da caixa d'água	1.0		finalizada	
Observações	Sem sub-tarefa			

Galeria de Fotos

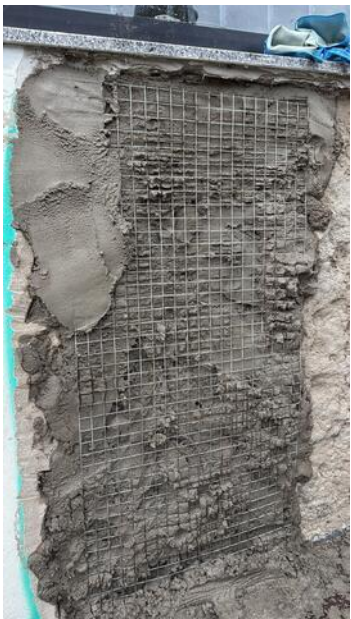	
---	--





Fiscal

Responsável Técnico



Cadastrado por 1584 - SIMONE BONATELLI CARDOSO

 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD309 Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 370	Data: 19/07/2025 (Sábado)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -5	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070	Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra		

Comentários

Não houve atividades nesse dia.

Fiscal_____
Responsável Técnico

 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD309 Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 371	Data: 20/07/2025 (Domingo)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -6	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070	Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra		

Fiscal

Responsável Técnico

 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD308	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 372	Data: 21/07/2025 (Segunda-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -7	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	
Equipe Reforço estrutural	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Reforço da laje da caixa d'água	1.0		finalizada	
Observações	Sem sub-tarefa			

Galeria de Fotos	
	





Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD309 Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 373	Data: 22/07/2025 (Terça-Feira)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -8	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070	Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Galeria de Fotos



Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD310	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 374	Data: 23/07/2025 (Quarta-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -9	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	2	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD310	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 375	Data: 24/07/2025 (Quinta-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -10	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Fiscal

Responsável Técnico




 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD310	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 376	Data: 25/07/2025 (Sexta-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -11	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Galeria de Fotos

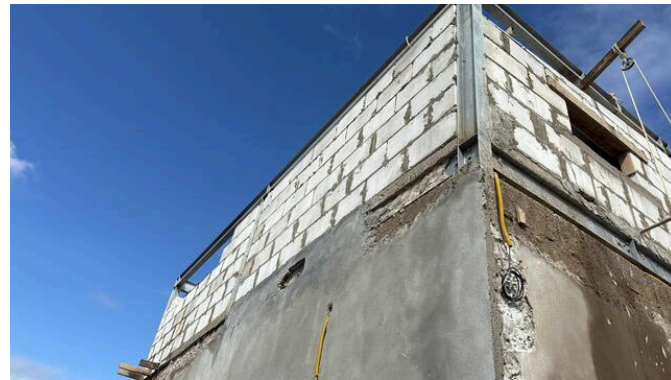



Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD312 Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 377	Data: 26/07/2025 (Sábado)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -12	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025
Relatório Diário de Obra		

Comentários

Não houve atividades nesse dia.

Fiscal_____
Responsável Técnico

 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD312	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 378	Data: 27/07/2025 (Domingo)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -13	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070			Termino Previsto: 14/07/2025

Relatório Diário de Obra

Comentários
Não houve atividades nesse dia.

Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD311
	Dias Decorridos: 379	Data: 28/07/2025 (Segunda-Feira)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -14	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070	Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD312	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 380	Data: 29/07/2025 (Terça-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -15	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Galeria de Fotos









Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD313	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 381	Data: 30/07/2025 (Quarta-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -16	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Fiscal

Responsável Técnico



Causado por 1564 - SIMONE BONATELLI CARDOSO

 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD314	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 382	Data: 31/07/2025 (Quinta-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -17	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	
PINTOR	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Pintura Interna	1.0		nenhum	

Galeria de Fotos





Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD315	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 383	Data: 01/08/2025 (Sexta-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -18	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	
PINTOR	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Pintura Interna	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			

Galeria de Fotos





Fiscal

Responsável Técnico



PROAD n. 352/2024 DOC 514. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.PWHD.DQCN: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



PROAD n. 352/2024 DOC 514. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.PWHD.DQCN:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD317	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 384	Data: 02/08/2025 (Sábado)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -19	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			



ANDRE
WAGNER
16/08/2025 14:15

Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD317 Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 385	Data: 03/08/2025 (Domingo)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -20	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025
Relatório Diário de Obra		

Comentários
Não houve atividades nesse dia.

Fiscal


Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD316 Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 386	Data: 04/08/2025 (Segunda-Feira)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -21	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	
PINTOR	2	
Equipe Piso vinílico	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Pintura Interna	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Impermeabilização para piso vinílico	0.0		em andamento	

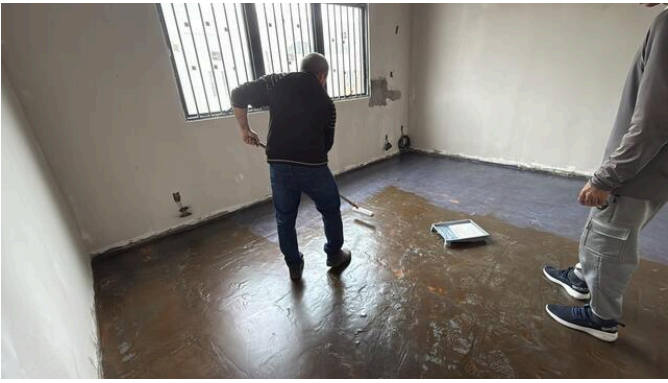Galeria de Fotos	
	
	

Fiscal

Responsável Técnico



PROAD n. 352/2024 DOC 513. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.KZDH.NXJL: <https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD317	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 387	Data: 05/08/2025 (Terça-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -22	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	
PINTOR	2	
Equipe Piso vinílico	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Pintura Interna	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Impermeabilização para piso vinílico	0.0		em andamento	

Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD318	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 388	Data: 06/08/2025 (Quarta-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -23	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	
PINTOR	2	
Equipe Piso vinílico	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Pintura Interna	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Impermeabilização para piso vinílico	0.0		em andamento	

Fiscal

Responsável Técnico




 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD319	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 389	Data: 07/08/2025 (Quinta-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -24	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	
PINTOR	2	
Equipe Piso vinílico	2	
Equipe elétrica	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Pintura Interna	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Impermeabilização para piso vinílico	0.0		em andamento	
Instalação das luminárias	0.0		em andamento	

Galeria de Fotos

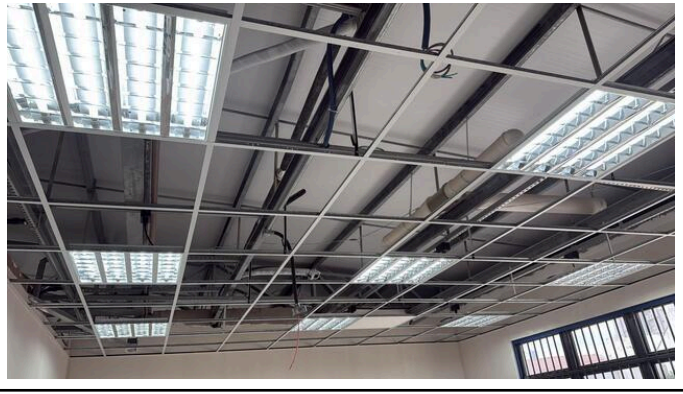	
---	--





Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD320	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 390	Data: 08/08/2025 (Sexta-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -25	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	
PINTOR	2	
Equipe Piso vinílico	2	
Equipe elétrica	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Pintura Interna	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Impermeabilização para piso vinílico	0.0		em andamento	
Instalação das luminárias	0.0		em andamento	

Galeria de Fotos



Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD322 Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 391	Data: 09/08/2025 (Sábado)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -26	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025
Relatório Diário de Obra		

Comentários
Não houve atividades nesse dia.

Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD322	Cadastrado por 1584 - SIMONE BONATELLI CARDOSO Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 392	Data: 10/08/2025 (Domingo)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -27	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070	Termino Previsto: 14/07/2025		
Relatório Diário de Obra			

Comentários

Não houve atividades nesse dia.

Fiscal_____
Responsável Técnico

 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD321 Juntado em 11/08/2025
	Dias Decorridos: 393	Data: 11/08/2025 (Segunda-Feira)
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -28	Início: 15/07/2024
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070	Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	
PINTOR	2	
Equipe Piso vinílico	2	
Equipe elétrica	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Pintura Interna	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Impermeabilização para piso vinílico	0.0		em andamento	
Instalação das luminárias	0.0		em andamento	

Fiscal



Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD322	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 394	Data: 12/08/2025 (Terça-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -29	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	
PINTOR	2	
Equipe Piso vinílico	2	
Equipe elétrica	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Pintura Interna	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Impermeabilização para piso vinílico	0.0		em andamento	
Instalação das luminárias	0.0		em andamento	

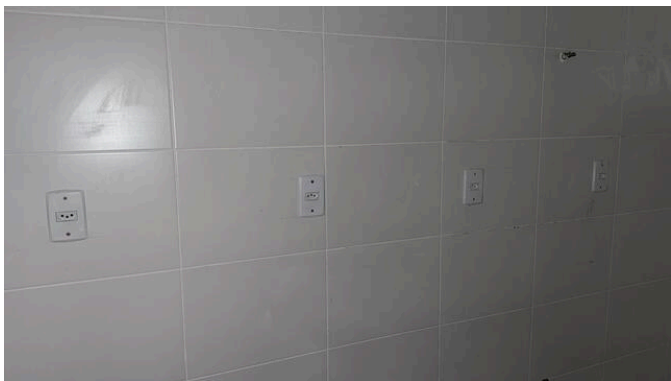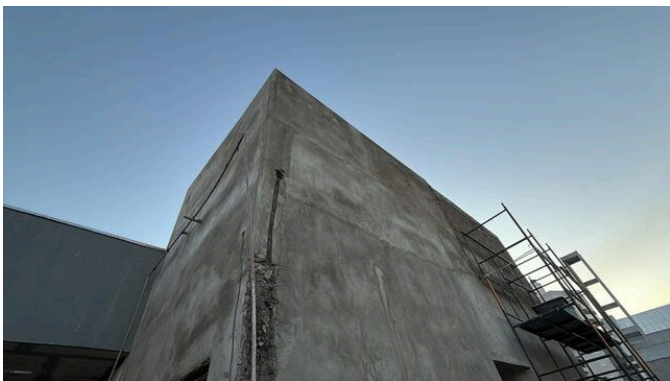Galeria de Fotos	
	





Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD323	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 395	Data: 13/08/2025 (Quarta-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -30	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	
PINTOR	2	
Equipe Piso vinílico	2	
Equipe elétrica	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Pintura Interna	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Impermeabilização para piso vinílico	0.0		em andamento	
Instalação das luminárias	0.0		em andamento	

Fiscal

Responsável Técnico



 TRT da 12ª Região	Dias Contratuais: 365	RDO: RD324	Juntado em 11/09/2025
	Dias Decorridos: 396	Data: 14/08/2025 (Quinta-Feira)	
Obra: Tubarão_Novo Fórum - Proad 352/2024	Dias para Terminar: -31	Início: 15/07/2024	
Endereço: esquina da Rua São Luiz com a Rua Aracaju, Vila Moema, SN, Tubarão - SC, 88705-070		Termino Previsto: 14/07/2025	
Relatório Diário de Obra			

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
Pedreiro	2	
Ajudante	3	
engenheiro	1	
PINTOR	2	
Equipe Piso vinílico	2	
Equipe elétrica	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
Limpeza e Organização	1.0		em andamento	
assentamento de azulejo	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
paver estacionamento	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
caixas de passagem	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
infra elétrica	1.0		em andamento	
Impermeabilização - Piso Vinílico	0.0		em andamento	
Fechamento de vãos	1.0		em andamento	
reboco subestação	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Instalação das soleiras	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Pintura Interna	1.0		em andamento	
Observações	Sem sub-tarefa			
Impermeabilização para piso vinílico	0.0		em andamento	
Instalação das luminárias	0.0		em andamento	

Observações feitas por fiscais
Fiscalização do TRT realizada neste dia pelo Eng. André Wagner. Verificados os serviços em andamento e os executados, com vistas à medição.

Fiscal

Responsável Técnico





PROAD n. 352/2024 DOC 513. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.KZDH.NXJL:
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA MEDIÇÃO

ITEM		Sim	Não	N/A	OBSERVAÇÕES
1	A medição somente poderá ser encaminhada se forem entregues pela contratada todos os documentos constantes no contrato, necessários à liberação da parcela de medição além de:				Documentos e procedimentos a serem observados a cada medição, <u>conforme o caso e análise da fiscalização.</u>
1.1	Documento de Encaminhamento da Medição, conforme modelo CPO e orientações do Manual de Fiscalização (item 7.3);	X			
1.2	Declaração de emprego de egressos do sistema carcerário, conforme contrato;	X			
1.3	Nota Fiscal/ Fatura, conforme valor da planilha, discriminando os valores de mão-de-obra e de material;	X			Inserida no SIGEO
1.4	Planilha de medição pré aprovada pelo fiscal (observar Acórdão TCU 2622/2013, quanto à medição da administração local);	X			
1.5	Cronograma físico-financeiro atualizado, caso haja;	X			
1.6	Diário de obras;	X			
1.7	Relatório fotográfico;	X			Do próprio diário de obras
1.8	Relatório de atualização do projeto "as built";		X		Não há nesta etapa de medição.
1.9	Recibo de entrega dos EPIs atualizado conforme atividades e quadro funcional vigente;		X		Sem atualizações.
1.10	Relação atualizada de empresas terceirizadas			X	
2	Atualização da planilha de gerenciamento de obra - PGO - para fins de controle contratual e atualização do Portal Transparência.	X			
3	Medições após aditivo				
3.1	No caso de alteração substancial do projeto o fiscal informou a Seguradora acerca das alterações requerendo apólice do seguro retificada.		X		A contratada apresentou a garantia complementar ref. aos 3ª e 4ª aditivos
3.2	No caso de alteração substancial do objeto, verificar se é necessário acrescentar códigos na ART ou aumento significativo de área construída		X		Não há necessidade, sendo alterações pequenas no projeto



INFORMAÇÃO DIGGPO Nº 44/25

Em 19-08-2025

De: Eng. André Wagner

Para: Coordenador de Projetos e Obras

 ANDRÉ
WAGNER
19/08/2025 18:30

 JACSON
ALEXANDRE
PEREIRA
19/08/2025 18:37

**Assunto: 12º MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM
TRABALHISTA DE TUBARÃO**

PROAD: 352/2024

Senhor Coordenador de Projetos e Obras,

Encaminha-se, para pagamento, a 12ª medição de serviços da construção da nova sede do Fórum Trabalhista de Tubarão que inclui, além da planilha inicial da obra, os aditivos 2, 3 e 4. São serviços em execução pela empresa CS Magon Construtora Ltda., por meio do contrato CE 352/2024. Inclui-se também a medição do reajuste referente à medição da planilha inicial.

A nota fiscal 379 corresponde aos serviços da medição da planilha inicial e dos aditivos, no valor de R\$ 280.414,87. A nota fiscal 380 corresponde ao reajuste aplicável à medição da planilha inicial, equivalente a 5,72%, no valor de R\$ 9.797,67. Ambas já estão disponíveis no Sigeo.

O valor ora medido inclui os serviços que foram executados no período de 03/07/2024 a 14/08/2025.


No marcador 7 do Proad 10727/2025 foi juntada a solicitação de medição enviada pela empresa por e-mail.

As planilhas de medição foram acostadas ao marcador 9 do Proad 10727/2025.

Quanto ao cumprimento do cronograma físico-financeiro, o valor acumulado correspondente ao 12º mês atingiu 75,71% do total do contrato, incluindo os aditivos já formalizados. A empresa apresentou novo Cronograma Físico Financeiro, considerando o prazo vigente para a execução da obra que vai até 27/09/2025, dividindo o saldo em 3 medições com período de execução próximo de 15 dias cada. Apesar do montante alto frente ao pouco prazo restante, a fiscalização fará o acompanhamento semanal, cobrando a Contratada quanto a qualidade de execução e o cumprimento do cronograma.

No gráfico a seguir pode-se verificar o andamento da obra até o momento:



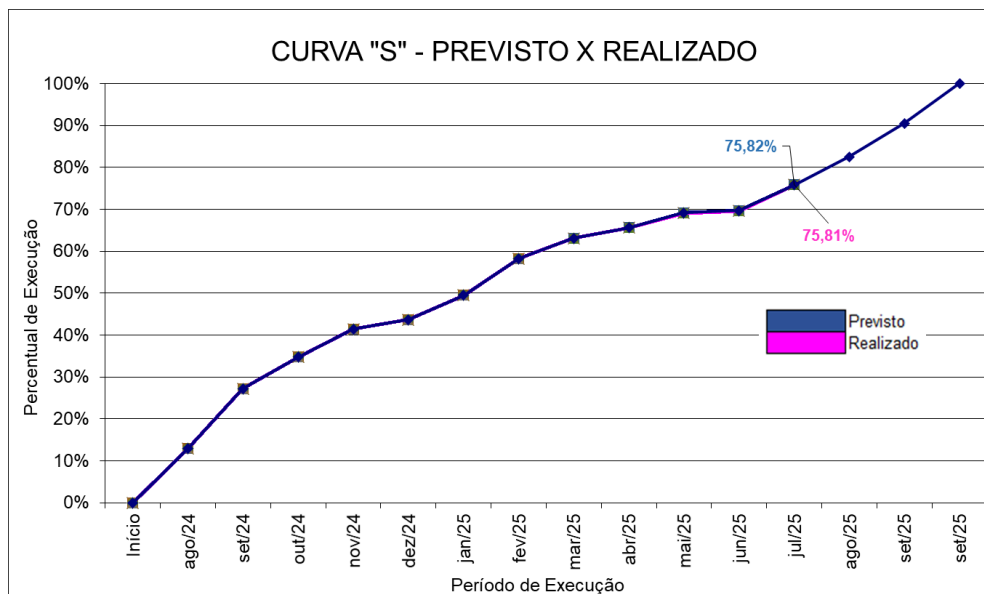

Também foram juntados ao Proad, os seguintes documentos:

- Tabela de IMR da medição 12 (m. 10 do Proad 10727/2025);
- Diário de obras (m. 2 a 4 do Proad 10727/2025);
- Manifestação da empresa sobre egressos do sistema carcerário (m. 6 do Proad 10727/2025);
- Lista de verificação da medição 12 (m. 12 do Proad 10727/2025);
- Cronograma Físico Financeiro atualizado (m. 11 do Proad 10727/2025).

Solicita-se providências aos setores competentes para conferência dos demais documentos, bem como o encaminhamento ao pagamento do valor medido.

À sua consideração.

André Wagner

Eng. Civil – CREA 068.622-2 - Matrícula 4262

De acordo.

À SECAD, para pagamento da medição.

Em 19-08-2025

Jacson Alexandre Pereira
Coordenador de Projetos e Obras





JUSTIÇA DO TRABALHO

TRT da 12ª Região (SC)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E ANÁLISE DA DESPESA

TERMO DE LIQUIDAÇÃO

Liquida(m)-se o(s) documento(s) abaixo relacionado(s) conforme Nota de Empenho, classificação da despesa e valor(es) informado(s) e em conformidade com o contrato próprio, de acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320 de 17/03/1964:

Processo: CE-352/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO DESTINADO AO FÓRUM TRABALHISTA DE TUBARÃO.

Fornecedor: 27.097.119/0001-80 C S MAGON CONSTRUTORA LTDA

NOTA DE EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	DATA DE LIQUIDAÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMPET.	DOCUMENTO	UNIDADE	VALOR
2024NE000353	449051 91 OBRAS EM ANDAMENTO	26/08/2025		07/2024	NF. 379	SPO	R\$ 280.414,87
2024NE000353	449051 91 OBRAS EM ANDAMENTO	26/08/2025		07/2025	NF. 380	SPO	R\$ 9.797,67
Total Geral:							R\$ 290.212,54
2024NE000353 449051							R\$ 290.212,54

Certifico que, referente a competência da(s) liquidação(ões) acima relacionada(s), os documentos exigidos em contrato encontram-se atualizados, mantidas as condições de habilitação da licitação.

Florianópolis/SC, 26 de agosto de 2025

Edinete Volpato Dutra de Souza

EDINETE VOLPATO DUTRA DE SOUZA

26/08/2025 13:31



	MUNICÍPIO DE CAMBIRA		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Número:		
	CANADA, 320 - 86890000 - CENTRO - CAMBIRA - PR		380		
	Núm. do RPS:		Data Prestação:		
		Série do RPS:		18/08/2025	
		Tipo do RPS:		Autenticidade:	
		Emissão RPS:		637995868	

SITE AUTENTICIDADE: <https://cambira.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Insc. Municipal: 00003098		CNPJ/CPF: 27.097.119/0001-80		Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO	
	Nome/Razão Social: CS MAGON CONSTRUTORA LTDA					
	Nome Fantasia: GLOCON ENGENHARIA					
	Endereço:					
	Rua CEU AZUL, 05 - RESIDENCIAL BELA VISTA					
Município/UF: CAMBIRA-PR						
CEP: 86.890-000						
Fone/Fax:						
E-Mail: CONTATO@GLOCON.COM.BR						

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:		CNPJ/CPF: 02.482.005/0001-23		Insc. Estadual:	
Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO					
Endereço: Rua Esteves Júnior, 395 - Centro					
Município/UF: Tubarão-SC					
CEP: 88.015-905					
Fone/Fax: (48) 3287-1000					
E-Mail: seof@trt12.jus.br					

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:				CNAE:	
702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA, DE TELECOMUNICACOES E DE OUTRAS SEMELHANÇAS, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE				4120400	
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:		
8/2025	Tubarão-SC	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO FORA DO		
A.R.T: 9326494-7	Nº Código da Obra:	Processo Obra:	Incorporação: NÃO		
Nome Obra:	Fórum Trabalhista de Tubarão	Resp. Obra:	CAIO CESAR MAGON		
Endereço Obra: CEP: , São Luiz, S/N, Bairro Vila Moema					

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Obra do novo prédio do Fórum Trabalhista de Tubarão
Referente à medição de reajuste da 12ª medição da planilha orçamentária inicial.
Contrato Nº 352/2024
CNO 90.019.53356/75
INSS não retido de acordo com o IN 2110/2022, em se tratando de obra publica.
Retenção de ISS 2,00%
Retenção de IRPJ 1,20%
Retenção de PIS 0,65%
Retenção de COFINS 3,00%
Retenção de CSLL 1,00%
Pagamento:
CNPJ: 27.097.119/0001-80 C S Magon Construtora LTDA/Glocon Engenharia
Banco Grafeno digital - 274
Ag: 0001
C/C: 08111473-8

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Incond.	Desc. Cond.	Valor Total
SIM	MAO DE OBRA	1,00000	2.468,04	0,00	0,00	2.468,04
SIM	MATERIAL	1,00000	7.329,63	0,00	0,00	7.329,63

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	195,95000	Sim
PIS	0,65000	63,68000	Sim
COFINS	3,00000	293,93000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,20000	117,57000	Sim
CSLL	1,00000	97,98000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	573,16000	Não
		0,00000	Não

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025-3-VFB-FORW:
REALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
<https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
9.797,67	0,00	0,00	9.028,56	9.797,67

NFS-E Nº

380

Recebemos de CS MAGON CONSTRUTORA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____

CERTIFICO no docto PROAD nº 13 e 14.

	MUNICÍPIO DE CAMBIRA		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Número:		
	CANADA, 320 - 85890000 - CENTRO - CAMBIRA - PR		379		
	Núm. do RPS:		Série do RPS:	Data Prestação:	
				18/08/2025	256718076

SITE AUTENTICIDADE: <https://cambira.oxy.elotech.com.br/lss/autenticar-documento-fiscal>

	DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO		Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO	
	Insc. Municipal: 00003098 CNPJ/CPF: 27.097.119/0001-80		Insc. Estadual:	
	Nome/Razão Social: CS MAGON CONSTRUTORA LTDA			
	Nome Fantasia: GLOCON ENGENHARIA			
Endereço:				
Rua CEU AZUL, 05 - RESIDENCIAL BELA VISTA				
Município/UF: CAMBIRA-PR				CEP: 86.890-000
Fone/Fax:		E-Mail: CONTATO@GLOCON.COM.BR		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO		Insc. Estadual:	
Insc. Municipal: 02.482.005/0001-23			
Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO			
Endereço: Rua Esteves Júnior, 395 - Centro			
Município/UF: Tubarão-SC		CEP: 88.015-905	
Fone/Fax: (48) 3287-1000		E-Mail: seof@trt12.jus.br	

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO		CNAE: 4120400	
Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:			
702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA, DE TELECOMUNICACOES E DE OUTRAS SEMELHANÇAS, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE			
Competência: 8/2025	Local da Prestação do Serviço: Tubarão-SC	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO FORA DO
A.R.T.: 9326494-7	Nº Código da Obra:	Processo Obra:	Incorporação: NÃO
Nome Obra: Fórum Trabalhista de Tubarão	Resp. Obra: CAIO CESAR MAGON		
Endereço Obra: CEP: , São Luiz, S/N , Bairro Vila Moema			

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
Obra do novo prédio do Fórum Trabalhista de Tubarão R\$171.287,91 referente à 12ª medição do contrato inicial R\$-15.004,01 referente ao abatimento de valores de medição do 2º aditivo de valores R\$99.086,58 referente à 1ª medição do 3º aditivo de valores R\$25.044,39 referente à 1ª medição do 4º aditivo de valores Contrato Nº 352/2024 CNO 90.019.53356/75 INSS não retido de acordo com o IN 2110/2022, em se tratando de obra publica. Retenção de ISS 2,00% Retenção de IRPJ 1,20% Retenção de PIS 0,65% Retenção de COFINS 3,00% Retenção de CSLL 1,00% Pagamento: CNPJ: 27.097.119/0001-80 C S Magon Construtora LTDA/Glocon Engenharia Banco Grafeno digital - 274 Ag: 0001 C/C: 08111473-8	

ITENS DO SERVIÇO						
Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Desc. Incond.	Desc. Cond.	Valor Total
SIM	MAO DE OBRA	1,00000	70.636,51	0,00	0,00	70.636,51
SIM	MATERIAL	1,00000	209.778,36	0,00	0,00	209.778,36

TRIBUTOS INCIDENTES			
Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	5.608,30000	Sim
PIS	0,65000	1.822,70000	Sim
COFINS	3,00000	8.412,45000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,20000	3.364,98000	Sim
LL	1,00000	2.804,15000	Sim
P	0,00000	0,00000	Não
Postos Federais	0,00000	16.404,27000	Não


PROAD n. 352/2024 DOC 529. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025. JVER EQRW: <https://posos-seguros.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
280.414,87	0,00	0,00	258.402,29	280.414,87

NFS-E Nº 379	Recebemos de CS MAGON CONSTRUTORA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ____/____/____ Assinatura: _____
-----------------	---

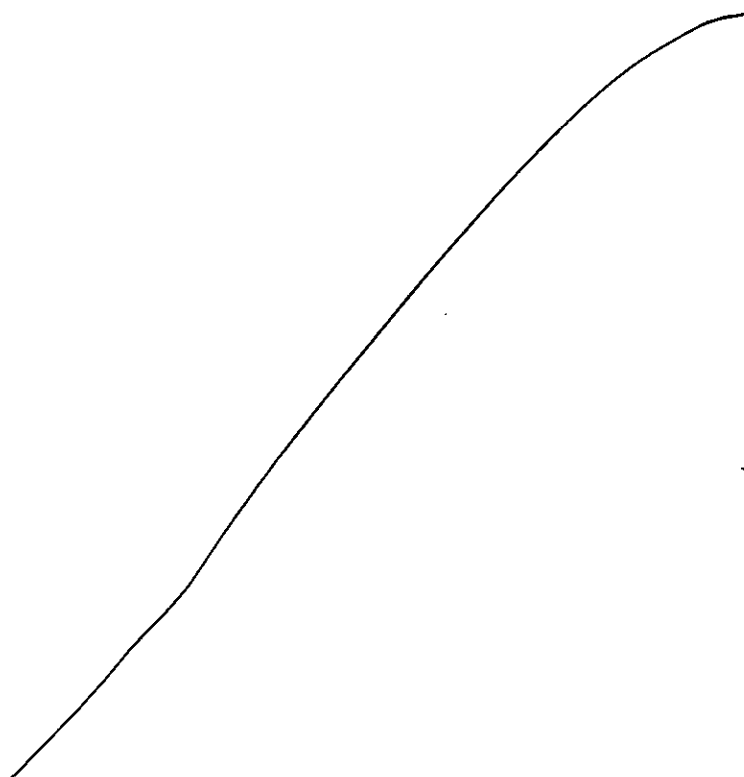CERTIFICO no docto PROAD nº 13 e 14

ATESTADO DE CONFORMIDADE PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE MÃO DE OBRA
NÃO RESIDENTE

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL			
CONTRATO/PROAD Nº CE- 352/2024		UNIDADE:	
EMPRESA CONTRATADA:		S C MAGON CONSTRUTORA LTDA	
VIGÊNCIA DO CONTRATO:			
RESPONSÁVEL:			
Item	SIM	NÃO	Não se aplica
1. NA LIQUIDAÇÃO MENSAL DA NOTA FISCAL:			
1.1 O Fiscal de Contrato atestou a conformidade na prestação dos serviços (Caso afirmativo informar o número do marcador do referido documento do respectivo proad)	X		
1.2 Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal			X
1.3 Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho)	X		
1.4 Período da prestação de serviços está correto (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura)			X
1.5 O gestor atestou a nota fiscal no SIGEO	X		
2. VALIDADE DAS CERTIDÕES NEGATIVAS:			
2.1 Certidão negativa de débitos trabalhistas	X		
2.2 GRF (FGTS)	X		
2.3 Certidão conjunta de débitos relativos as Tributos Federais e Dívida Ativa da União	X		
3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	X		
3.1 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	X		
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			
3.6			
3.7			

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
27/08/25 16:55 USUARIO : JEAN
DATA EMISSAO : 26Ago25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB003025
UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 27097119/0001-80 - C S MAGON CONSTRUTORA LTDA
BANCO : 274 AGENCIA : 0001 CONTA CORRENTE : 81114738
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2025NP001109 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004205790-6 PROCESSO : CE-352/2024
VALOR : 267.430,86

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 26/08/25

PAGAMENTO NFS-E 379 E 380 - 12ª MEDIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO DESTINADO AO FÓRUM TRABALHISTA DE TUBARÃO. CE-352/2024 - RETENÇÃO DE R\$ 5.804,25 REF. ISSRF. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - DCTFWEB - PROAD-1346/2025.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

27/08/25 16:55

USUARIO : JEAN

DATA EMISSAO : 26Ago25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB003025

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 27097119/0001-80 - C S MAGON CONSTRUTORA LTDA

BANCO : 274 AGENCIA : 0001 CONTA CORRENTE : 81114738

VALOR : 267.430,86

L EVENTO INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORB

VALOR

01 401006 2024NE000353400

44905191

267.430,86

02 531814 2024NE000353

213110400 44905191

267.430,86

03 561602 1000000000400D

267.430,86

LANCADO POR : 43050263920 - ALECIO

UG : 080013 26Ago25 15:59

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

27/08/25 16:55

USUARIO : JEAN

DATA EMISSAO : 26Ago25

NUMERO : 2025OB003025

UG/GESTAO EMITENTE : 080013 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP003023

ASS. ORDENADOR DESPESA : 044.834.179-40 DATA: 26Ago25 HORA: 14:24

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 430.502.639-20 DATA: 26Ago25 HORA: 15:58

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202508261002603

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 02932 DATA: 26Ago25 HORA: 16:10

LANCADO POR : 43050263920 - ALECIO UG : 080013 26Ago25 15:59

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

