



OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO

Oficio N.º 06

Brusque/16/08/2019.

À fiscalização,

A empresa Engaste Projetos Construções e Incorporações Ltda vem solicitar a primeira medição parcial do segundo aditivo da obra de Reforma do novo Fórum trabalhista de Brusque).

O valor solicitado nessa medição é de R\$ 206.286,26 (duzentos e seis mil e duzentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Atenciosamente,


Daniel Barbieri

Engaste Projetos, Construções e Incorporações Ltda.
Rua Anita Garibaldi, 270 – Sala 34 – Concórdia / SC - CEP: 89700-000
E-mail: atendimento@engaste.com.br

Documento 232 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.LDSQ.LMWB:
<https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



ALEXANDRE
RE
KOENIG S.
THIAGO

DIÁRIO DE OBRA

DATA : **12-Aug-19** | **_154_ /240**

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	CM	CM

SEGUNDA

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

Sub Empreiteiros

Eletricista	1		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	4		
Instalador de paredes de gesso	3		

Principais Atividades do Dia

- Instalação das paredes internas de gesso acartonado.
- Reboco externo.
- Limpeza diária da obra.
- Execução da massa corrida e pintura.
- Fixação de tubulações elétricas.
- Assentamento de revestimento cerâmico - parede e pisos.

Observações Engaste Projetos

Observações TRT

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT



Documento 265 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.TXKB.FJVG:
<https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



DIÁRIO DE OBRA

DATA : **13-Aug-19** | **_155_ /240**

TERÇA

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	B	B

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

Sub Empreiteiros

Eletricista	1		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	4		
Instalador de paredes de gesso	3		

Principais Atividades do Dia

- Instalação das paredes internas de gesso acartonado.
- Reboco externo.
- Limpeza diária da obra.
- Execução da massa corrida e pintura.
- Fixação de tubulações elétricas.
- Assentamento de revestimento cerâmico - parede e pisos.

Observações Engaste Projetos

Observações TRT

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



DIÁRIO DE OBRA

DATA : **14-Aug-19** | **_156_ /240**

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	B	B

QUARTA

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

Sub Empreiteiros

Eletricista	1		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	4		
Instalador de paredes de gesso	3		

Principais Atividades do Dia

- Instalação das paredes internas de gesso acartonado.
- Reboco externo.
- Limpeza diária da obra.
- Execução da massa corrida e pintura.
- Fixação de tubulações elétricas.
- Assentamento de revestimento cerâmico - parede e pisos.

Observações Engaste Projetos

Observações TRT

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



DIÁRIO DE OBRA

DATA : **15-Aug-19** | **_157_ /240**

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	B	B

QUINTA

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

Sub Empreiteiros

Eletricista	1		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	4		
Instalador de paredes de gesso	3		

Principais Atividades do Dia

- Instalação das paredes internas de gesso acartonado.
- Reboco externo.
- Limpeza diária da obra.
- Execução da massa corrida e pintura.
- Fixação de tubulações elétricas.
- Assentamento de revestimento cerâmico - parede e pisos.

Observações Engaste Projetos

Observações TRT

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



DIÁRIO DE OBRA

DATA : **16-Aug-19** | **_158_ /240**

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	B	B

SEXTA

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

Sub Empreiteiros

Eletricista	1		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	4		
Instalador de paredes de gesso	3		

Principais Atividades do Dia

- Instalação das paredes internas de gesso acartonado.
- Reboco externo.
- Limpeza diária da obra.
- Execução da massa corrida e pintura.
- Fixação de tubulações elétricas.
- Assentamento de revestimento cerâmico - parede e pisos.

Observações Engaste Projetos

Observações TRT

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



DIÁRIO DE OBRA

DATA : 17-Aug-19 | _159_ /240

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	B	B

SÁBADO

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mestre		Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	

Sub Empreiteiros

Eletricista			
Técnico de Ar Cond.			
Pintores			
Instalador de paredes de gesso			

Principais Atividades do Dia

SEM EXPEDIENTE.

Observações Engaste Projetos

.....
.....
.....
.....
.....

Observações TRT

.....
.....
.....
.....
.....

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



DIÁRIO DE OBRA

DATA : **18-Aug-19** | **_160_ /240**

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	B	B

DOMINGO

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mestre		Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	

Sub Empreiteiros

Eletricista			
Técnico de Ar Cond.			
Pintores			
Instalador de paredes de gesso			

Principais Atividades do Dia

SEM EXPEDIENTE.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Observações Engaste Projetos

.....

.....

.....

.....

Observações TRT

.....

.....

.....

.....

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



DIÁRIO DE OBRA

DATA : **19-Aug-19** | **_161_ /240**

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	B	B

SEGUNDA

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

Sub Empreiteiros

Eletricista	1		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	4		
Instalador de paredes de gesso	3		

Principais Atividades do Dia

- Instalação das paredes internas de gesso acartonado.
- Reboco externo.
- Limpeza diária da obra.
- Execução da massa corrida e pintura.
- Fixação de tubulações elétricas.
- Assentamento de revestimento cerâmico - parede e pisos.
- Impermeabilização dos requadros das esquadrias.

Observações Engaste Projetos

Observações TRT

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



DIÁRIO DE OBRA

DATA : **20-Aug-19** | **_162_ /240**

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	B	B

TERÇA

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

Sub Empreiteiros

Eletricista	1		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	4		
Instalador de paredes de gesso	3		

Principais Atividades do Dia

- Instalação das paredes internas de gesso acartonado.
- Reboco externo.
- Limpeza diária da obra.
- Execução da massa corrida e pintura.
- Fixação de tubulações elétricas.
- Assentamento de revestimento cerâmico - parede e pisos.
- Impermeabilização dos requadros das esquadrias.

Observações Engaste Projetos

Observações TRT

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



DIÁRIO DE OBRA

DATA : **21-Aug-19** | **_163_ /240**

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	B	B

QUARTA

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

Sub Empreiteiros

Eletricista	1		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	4		
Instalador de paredes de gesso	3		

Principais Atividades do Dia

- Instalação das paredes internas de gesso acartonado.
- Reboco externo.
- Limpeza diária da obra.
- Execução da massa corrida e pintura.
- Fixação de tubulações elétricas.
- Assentamento de revestimento cerâmico - parede e pisos.
- Impermeabilização dos requadros das esquadrias.

Observações Engaste Projetos

Observações TRT

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



DIÁRIO DE OBRA

DATA : **22-Aug-19** | **_164_ /240**

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	B	B

QUINTA

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

Sub Empreiteiros

Eletricista	1		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	4		
Instalador de paredes de gesso	3		

Principais Atividades do Dia

- Instalação das paredes internas de gesso acartonado.
- Reboco externo.
- Limpeza diária da obra.
- Execução da massa corrida e pintura.
- Fixação de tubulações elétricas.
- Assentamento de revestimento cerâmico - parede e pisos.
- Impermeabilização dos requadros das esquadrias.

Observações Engaste Projetos

Observações TRT

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



DIÁRIO DE OBRA

DATA : **23-Aug-19** | **_165_ /240**

SEXTA

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	NB	CM

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

Sub Empreiteiros

Eletricista	1		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	4		
Instalador de paredes de gesso	3		

Principais Atividades do Dia

- Instalação das paredes internas de gesso acartonado.
- Reboco externo.
- Limpeza diária da obra.
- Execução da massa corrida e pintura.
- Fixação de tubulações elétricas.
- Assentamento de revestimento cerâmico - parede e pisos.
- Impermeabilização dos requadros das esquadrias.

Observações Engaste Projetos

Observações TRT

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



DIÁRIO DE OBRA

DATA : **24-Aug-19** | **_166_ /240**

Mapa de Tempo

B = Bom
 CM = Chuva Moderada
 CF = Chuva Forte
 NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	B	B

SÁBADO

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mestre		Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	

Sub Empreiteiros

Eletricista			
Técnico de Ar Cond.			
Pintores			
Instalador de paredes de gesso			

Principais Atividades do Dia

SEM EXPEDIENTE.

Observações Engaste Projetos

Observações TRT

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



DIÁRIO DE OBRA

DATA : **25-Aug-19** | **_167_ /240**

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	CM	B

DOMINGO

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mestre		Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	

Sub Empreiteiros

Electricista			
Técnico de Ar Cond.			
Pintores			
Instalador de paredes de gesso			

Principais Atividades do Dia

SEM EXPEDIENTE.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Observações Engaste Projetos

.....

.....

.....

.....

Observações TRT

.....

.....

.....

.....

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



DIÁRIO DE OBRA

DATA : **26-Aug-19** | **_168_ /240**

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	B	B

SEGUNDA

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

Sub Empreiteiros

Eletricista	1		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	4		
Instalador de paredes de gesso	3		
Instalador paviflex	1		

Principais Atividades do Dia

- Instalação das paredes internas de gesso acartonado.
- Reboco externo.
- Limpeza diária da obra.
- Execução da massa corrida e pintura.
- Fixação de tubulações elétricas.
- Assentamento de revestimento cerâmico - parede e pisos.
- Impermeabilização dos requadros das esquadrias.
- Regularização do contrapiso para paviflex.

Observações Engaste Projetos

Observações TRT

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



DIÁRIO DE OBRA

DATA : **27-Aug-19** | **_169_ /240**

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	B	B

TERÇA

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

Sub Empreiteiros

Eletricista	1		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	4		
Instalador de paredes de gesso	3		
Instalador paviflex	1		

Principais Atividades do Dia

- Instalação das paredes internas de gesso acartonado.
- Reboco externo.
- Limpeza diária da obra.
- Execução da massa corrida e pintura.
- Fixação de tubulações elétricas.
- Assentamento de revestimento cerâmico - parede e pisos.
- Impermeabilização dos requadros das esquadrias.
- Regularização do contrapiso para paviflex.

Observações Engaste Projetos

Observações TRT

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



DIÁRIO DE OBRA

DATA : **28-Aug-19** | **_170_ /240**

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	B	B

QUARTA

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

Sub Empreiteiros

Eletricista	1		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	4		
Instalador de paredes de gesso	3		
Instalador paviflex	1		

Principais Atividades do Dia

- Instalação das paredes internas de gesso acartonado.
- Reboco externo.
- Limpeza diária da obra.
- Execução da massa corrida e pintura.
- Fixação de tubulações elétricas.
- Assentamento de revestimento cerâmico - parede e pisos.
- Impermeabilização dos requadros das esquadrias.
- Regularização do contrapiso para paviflex.

Observações Engaste Projetos

Observações TRT

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



DIÁRIO DE OBRA

DATA : **29-Aug-19** | **_171_ /240**

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	B	B

QUINTA

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

Sub Empreiteiros

Eletricista	1		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	4		
Instalador de paredes de gesso	3		
Instalador paviflex	1		

Principais Atividades do Dia

- Instalação das paredes internas de gesso acartonado.
- Reboco externo.
- Limpeza diária da obra.
- Execução da massa corrida e pintura.
- Fixação de tubulações elétricas.
- Assentamento de revestimento cerâmico - parede e pisos.
- Impermeabilização dos requadros das esquadrias.
- Regularização do contrapiso para paviflex.

Observações Engaste Projetos

Observações TRT

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



DIÁRIO DE OBRA

DATA : **30-Aug-19** | **_172_ /240**

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	B	B

SEXTA

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro	1	Pedreiro	3
Mestre	1	Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	5

Sub Empreiteiros

Eletricista	1		
Técnico de Ar Cond.			
Pintores	4		
Instalador de paredes de gesso	3		
Instalador paviflex	1		

Principais Atividades do Dia

- Instalação das paredes internas de gesso acartonado.
- Reboco externo.
- Limpeza diária da obra.
- Execução da massa corrida e pintura.
- Fixação de tubulações elétricas.
- Assentamento de revestimento cerâmico - parede e pisos.
- Impermeabilização dos requadros das esquadrias.
- Regularização do contrapiso para paviflex.

Observações Engaste Projetos

Observações TRT

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT

ENGASTE PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
Obra: REFORMA DO NOVO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE



DIÁRIO DE OBRA

DATA : 31-Aug-19 | _173_ /240

Mapa de Tempo

B = Bom
CM = Chuva Moderada
CF = Chuva Forte
NB = Nublado

MANHÃ	TARDE	NOITE
NB	CM	B

SÁBADO

Efetivo do Dia

Função	Efetivo	Função	Efetivo
Engenheiro		Pedreiro	
Mestre		Carpinteiro	
Contra-mestre		Armador	
Pintor		Servente	

Sub Empreiteiros

Electricista		
Técnico de Ar Cond.		
Pintores		
Instalador de paredes de gesso		

Principais Atividades do Dia

SEM EXPEDIENTE.

Observações Engaste Projetos

Observações TRT

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

TRT

BOLETIM DE MEDAÇÃO 1º ADITIVO

CLIENTE: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região

ENDERECO: Avenida Monte Castelo, 05 - Centro

MUNICÍPIO: Brusque

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Brusque

CONTRATO 8056/2018

PERÍODO: 12/03/2019 a 16/08/2019

ITEM	SERVIÇO	Valor Orçado	Medição Atual		Total do item (R\$)	
			Periodo: 12/03/2019 a 16/08/2019			
			Medição Atual (%)	Total do item (R\$)		
1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	R\$ 11.215,59		R\$		
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	R\$ 5.244,80		R\$		
1.3	DESPESAS MENSais ADMINISTRATIVAS: ÁGUA, LUZ, MATERIAL LIMPEZA, ETC	R\$ 440,63		R\$		
1.4	TAXAS E LICENÇAS INCLUINDO ALVARÁ DE REFORMA	R\$ 1.527,50		R\$		
1.5	LIMPEZA PERIÓDICA DA OBRA	R\$ 1.008,15		R\$		
TOTAL DO ITEM SUPERIOR		R\$ 16.381,67	0,00%	R\$		
2. SERVIÇOS INICIAIS						
2.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	R\$ 2.999,94	100,00%	R\$	2.999,94	
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 10.011,98	100,00%	R\$	10.011,98	
TOTAL DO ITEM SUPERIOR		R\$ 13.011,92	100,00%	R\$	13.011,92	
3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						
3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E CONTRAPISO COM MARTELETE	R\$ 9.036,58	100,00%	R\$	9.036,58	
3.2	CARGA, TRANSPORTE E BOTA FORA DE ENTULHO	R\$ 11.188,12	100,00%	R\$	11.188,12	
TOTAL DO ITEM SUPERIOR		R\$ 20.224,70	100,00%	R\$	20.224,70	
4. FECHAMENTOS						
4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO						
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	R\$ 22.493,94	100,00%	R\$	22.493,94	
4.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO (CCA) 30x25x10cm - EDIFÍCIO PRINCIPAL	R\$ 1.118,85	100,00%	R\$	1.118,85	
4.2 VERGAS E CONTRAVERGAS						
4.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	R\$ 2.158,93	100,00%	R\$	2.158,93	
4.2.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	R\$ 919,58	100,00%	R\$	919,58	
4.3 GESSO ACARTONADO ST (DUAS FACES COM ESTRUTURA TIPO DRYWALL)						
4.3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	R\$ 70.784,99	80,00%	R\$	56.627,99	
4.3.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P (ELIMINANDO O REVESTIMENTO DE UMA LATERAL DE PLACA DE GESSO - VIDE COTAÇÃO DA PLACA DE GESSO)	R\$ 22.497,52	80,00%	R\$	17.998,02	
4.3.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P (ELIMINANDO O REVESTIMENTO DE UMA LATERAL DE PLACA DE GESSO - VIDE COTAÇÃO DA PLACA DE GESSO) - REQUADRO DAS JANELAS	R\$ 8.705,09		R\$		
4.3.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, SÓ ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P (ELIMINANDO O REVESTIMENTO DAS DUAS LATERAIS DE PLACA DE GESSO, OU SEJA, MANTENDO SOMENTE ESTRUTURA - VIDE COTAÇÃO DA PLACA DE GESSO)	R\$ 16.029,46	80,00%	R\$	12.823,57	
4.3.5	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	R\$ 4.629,28	100,00%	R\$	4.629,28	
4.4 GESSO ACARTONADO RU (DUAS FACES COM ESTRUTURA TIPO DRYWALL)						
4.4.1	GESSO ACARTONADO RU COM ESTRUTURA TIPO DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 14.933,15	90,00%	R\$	13.439,84	
TOTAL DO ITEM SUPERIOR		R\$ 160.193,93	79,99%	R\$	128.133,13	
5. FORROS						
5.1	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	R\$ 160,82				
5.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	R\$ 1.317,05				
5.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	R\$ 1.194,50				
5.4	PINTURA FORRO DE GESSO, COM TINTA LATEX ACRÍLICA, TIPO SÜVINIL ACRÍLICO PREMIUM FOSCO, DA MARCA SÜVINIL OU SIMILAR, NA COR BRANCA	R\$ 1.530,10				
TOTAL DO ITEM SUPERIOR		R\$ 1.142,27	0,00%	R\$		
6. COBERTURA						
6.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	R\$ 37.745,81	100,00%	R\$	37.745,81	
6.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	R\$ 17.268,03	100,00%	R\$	17.268,03	
TOTAL DO ITEM SUPERIOR		R\$ 20.477,78	100,00%	R\$	20.477,78	

Documento 234 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.SRCH.LSQN:
<https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

20.784,75 100,00% R\$ 20.784,75

BB

ITEM	SERVIÇO	Valor Orçado	Medição Atual	
			Período: 12/03/2019 a 16/08/2019	
7.2	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA + MASSA DE PREPARAÇÃO DE CONTRAPISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 24.821,98		
7.3	PISO CERAMICO 30X30 CM BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA E REJUNTAMENTO DE 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 670,24		
7.3	PISO EM BASALTO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	-R\$ 1.010,46		
TOTAL DO ITEM SUPERIOR		R\$ 45.266,51	45,92%	R\$ 20.784,75
8.	PINTURA			
8.1	PINTURA INTERNA			
8.1.1	LIXAÇÃO DAS SUPERFÍCIES	R\$ 1.911,27		
8.1.2	APLICAÇÃO FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA	R\$ 110,65		
8.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	R\$ 9.737,40		
8.1.4	PINTURA PAREDES INTERNAS, COM TINTA LATEX ACRÍLICA TIPO SÜVINIL ACRÍLICO PREMIUM FOSCO DA MARCA SÜVINIL OU SIMILAR NA COR PALHA	R\$ 12.976,50		
TOTAL DO ITEM SUPERIOR		R\$ 24.735,82	0,00%	R\$
9.	ELEVADOR	R\$ 29.689,75		
9.1	ELEVADOR DAIKEN A TRAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SERÁ FEITO A TROCA DO ELEVADOR DE 3 PASSAGEIROS RESIDENCIAL PARA 8 PASSAGEIROS COMERCIAL - USADO COMO REFERÊNCIA O PREÇO DO ELEVADOR DA BOXTOP R\$ 83.800,00)	R\$ 13.361,40		
9.2	ESTRUTURA METÁLICA PARA ELEVADOR (projeto e estrutura)	R\$ 37.440,00		
9.3	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA PARA ELEVADOR	-R\$ 26.395,20		
9.4	Poço do elevador			
9.4.1	ACO 50-A, 8,0MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.881,78	30,00%	R\$ 564,53
9.4.2	ACO 50-A, 10,0MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 240,39	30,00%	R\$ 72,12
9.4.3	CONCRETO USINADO 25 MPa	R\$ 499,69		
9.4.4	FORMAS (CAIXARIA, CAIBROS, SARRAFOS, ETC)	R\$ 1.917,80	50,00%	R\$ 958,90
9.4.5	Escavação	R\$ 743,89	100,00%	R\$ 743,89
TOTAL DO ITEM SUPERIOR		R\$ 29.689,75	7,88%	R\$ 2.339,44
10.	IMPERMEABILIZAÇÃO			
10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Argamassa polimérica (cimento, agregados minerais inertes, polímeros acrílicos e aditivos), com tela de poliéster em raios e proteção de regularização (1:3 argamassa de cimento e areia média com espessura de 1,5 cm)	R\$ 846,74	100,00%	R\$ 846,74
10.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Argamassa polimérica (cimento, agregados minerais inertes, polímeros acrílicos e aditivos)	R\$ 467,80	100,00%	R\$ 467,80
TOTAL DO ITEM SUPERIOR		R\$ 1.314,54	100,00%	R\$ 1.314,54
				R\$ 206.286,26

Assinatura Eng Executor
Eng Civil Daniel Barbieri
CPF 036.569.959-40
CREA SC - 081.219-1

Assinatura Eng Fiscal

Data: 16/08/2019

Engêste Projetos, Construções e Incorporações Ltda
CNPJ 08.578.161/0001-79
Daniel Barbieri - SSP SC 2.694.158-9
Eng. Civil CREA SC 081219-1
Sócio Administrador

De: Eng. André Wagner - SPO
Para: Diretor do SPO



Assunto: MEDIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA – 6ª MEDIDAÇÃO – REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE

PROAD: CP 8056/2018


Prezado Diretor do SPO,

Pelo presente, junto ao PROAD 8056/2018 a nota fiscal eletrônica nº 608 da empresa **Engaste Projetos, Construções e Incorporações Ltda.**, no valor de **R\$ 206.286,26** correspondente à 6ª medição do contrato.

Esta medição representa 5,96% do valor do contrato que, acumulada com as medições anteriores, resulta em 35,80% da obra já executada, considerando o valor do contrato e o aditivo de valor 1 e 2. O valor acumulado previsto no Cronograma Físico Financeiro (CFF) para este mês de obra não foi atingido, quando era esperado que o percentual de obra executado acumulasse 44,09%.

Verifica-se na obra que esta tem sido bem administrada e os serviços tem sido iniciados e executados com empenho e qualidade. A empresa deverá apresentar nos próximos dias um novo cronograma físico financeiro, contemplando também o aditivo de prazo contemplado no 2º termo aditivo adequando os serviços restantes ao novo prazo da obra.

O gráfico a seguir demonstra o andamento da obra segundo o CFF Previsto em comparação ao valor medido na referência agosto/19, com destaque aos percentuais de serviços previstos e realizados:

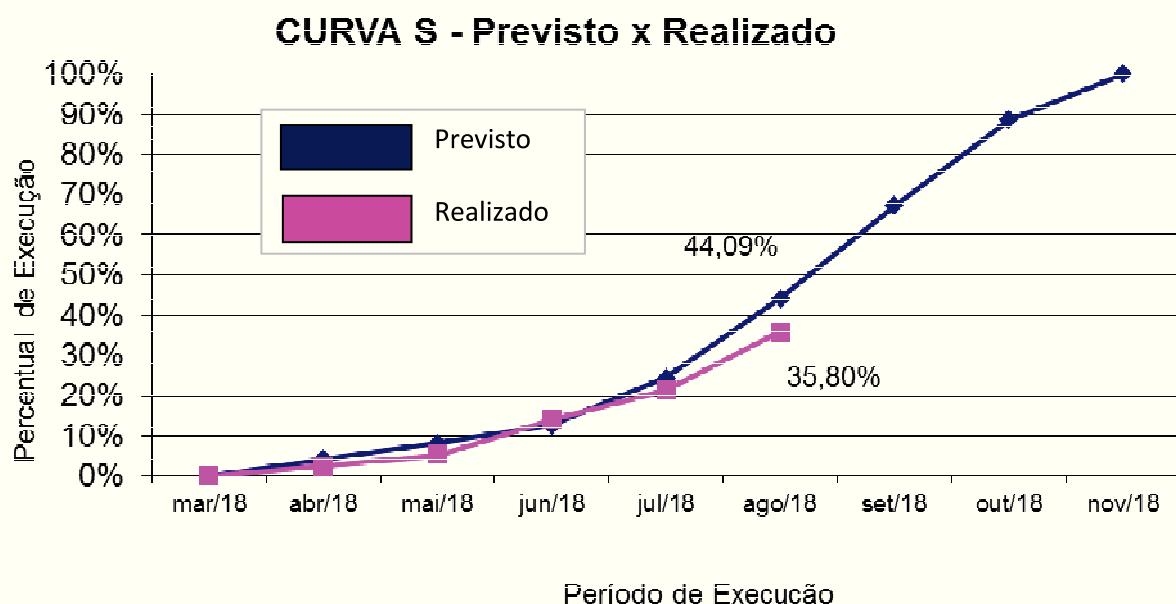

Documentos juntados:

- Pedido da empresa;
- Nota Fiscal;
- Informativo da empresa quanto à conta bancária
- Planilha da 6^a Medição.

Atenciosamente,

André Wagner

Analista Judiciário – Especialidade Engenharia Civil
Matrícula 4262 – CREA/SC 068.622-2
Serviço de Projetos e Obras

1193
ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
 CNPJ: 08.578.161/0001-79
 RUA ANITA GARIBALDI, 270 - LOJA 301
 CEP: 89700-126 - Bairro: CENTRO
 Município: CONCORDIA - SC
 Telefone: (49) 34412744 Celular: (499) 84025618
 Email: engaste@engasteconstrucoes.com.br
 Insc. Municipal: 23148 Insc. Estadual: 255318553

Número da NFS-e
608Situação
Emitido

Documento Seguro emitido com validação automática no servidor de banco de dados do Município.

SILENIO
JACINTO
DE
OLIVEIRA**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Autenticidade

0180830038401454

Data Emissão

19/08/2019

Hora Emissão

09:30:45**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	CPF/CNPJ 02.482.005/0001-23
Endereço RUA ESTEVES JUNIOR	Número 395
Bairro CENTRO	CEP 88015-905

Descrição dos serviços prestados

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	1,00	UN	206.286,2600	8055	2,00 %	TRBCRF	206.286,26	120.553,69	1.714,65

Descrição do Serviço: MEDIDA 6º - CONTRATO NUMERO 8056/2018. MATRICULA CEI 90.000.21974/72 OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE . SENDO APPLICADO R\$120.553,69 DE MATERIAL E R\$85.732,57 DE MÃO DE OBRA APPLICADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$206.286,26. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI (748), AGENCIA 0217, CONTA 811910.

Base de Cálculo 85.732,57	Valor ISSQN 1.714,65	Valor ISSRF 1.714,65	Desconto 0,00	Valor Total 206.286,26
IR 2.475,44	INSS 9.430,58	CSLL 2.062,86	COFINS 6.188,59	PIS 1.340,86

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

- 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço

8055 - BRUSQUE - SC

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 86/2011 de 23/12/2011.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/09/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.concordia.sc.gov.br >> Portal de Serviços On Line >> Consulta Autenticidade de NFS-e .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 27.745,50 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 6.498,02 (3.15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

MEDIDA 6º - CONTRATO NUMERO 8056/2018. MATRICULA CEI 90.000.21974/72 OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE BRUSQUE . SENDO APPLICADO R\$120.553,69 DE MATERIAL E R\$85.732,57 DE MÃO DE OBRA APPLICADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$206.286,26. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI (748), AGENCIA 0217, CONTA 811910.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

(3)

NP-1244-083833

DF 892

GP 169

Documento 253 do PROAD 8056/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.CMYS.FFVP:
<https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



Certifico que os serviços/materiais
especificados na presente nota/fatura
foram efetivamente prestados/entregues.

Em 19/08/19

ANDRÉ WAGNER

Analista Judiciário

Matrícula: 4262

Engº. Civil CREA-SC 068.622-2

Alexandre Koenig S. Thiago
Diretor do setor

TERMO DE LIQUIDAÇÃO

Liquida-se o presente documento de
acordo com o Artigo 63 da Lei nº 4.320/64.
O documento refere-se ao original da
1ª via, arquivado neste Setor.

Em 22/08/19

Simone Bonatti Cardoso

Técnico Judiciário

*J8NE1261
39-16 → R\$ 72.310,80

*J8NE1262
39-16 → R\$ 133.975,46
—————
CP 8056/2018

INFORMAÇÃO SELAD N° 70/2019

EM 19/08/2019.

Para: Diretora-Geral da Secretaria

Assunto: Falta de Certidão Negativa de Débitos – PROAD 8056/2018

Senhora Diretora-Geral,

Recebeu este Setor a nota fiscal nº 608 da empresa Engaste Projetos, Construções e Incorporações Ltda, devidamente certificada, referente a contratação da execução da obra de reforma geral do prédio que abrigará o novo Fórum Trabalhista de Brusque, CNPJ 08.578.161/0001-79, no valor de R\$ 206.286,26 (duzentos e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Tendo em vista que não foi possível obter através da internet, a Certidão Negativa de Tributos da Dívida Ativa da União devidamente atualizada, este Setor solicitou a referida Certidão para a contratada através de e-mail (anexo) e não obteve êxito.

Analisando o PROAD n. 10133/2015, marcador 6 (ASJUR 407/205), verificou-se o entendimento da Assessoria deste Tribunal no sentido de que não devem ser “retidos os pagamentos devidos a empresas contratadas quando, a despeito de irregularidades na situação fiscal e trabalhista destes, houver ocorrido a efetiva entrega dos bens e serviços avençados”.

Dessa forma, em conformidade com o entendimento supramencionado, este Setor solicita autorização para liquidação da referida despesa.

É a informação.

Contudo, à consideração de V. Sa.

Cordialmente,


Simone Bonatelli Cardoso

Técnico Judiciário



Setor de Liquidação e Análise da Despesa (SELAD) <selad@trt12.jus.br>

Certidão Negativa Atualizada - Tributos Federais

2 mensagens

Setor de Liquidação e Análise da Despesa (SELAD) <selad@trt12.jus.br>

Para: Adriana <engaste@engasteempreendimentos.com.br>

19 de agosto de 2019 16:51

Boa tarde,

Solicitamos a gentileza de encaminhar para este Setor, com a maior brevidade possível, a Certidão Negativa de Tributos Federais devidamente atualizada.

Atenciosamente,

Simone

Setor de Liquidação e Análise de Despesas (SELAD)

Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COF)

Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região

Adriana <engaste@engasteempreendimentos.com.br>

19 de agosto de 2019 17:37

Para: "Setor de Liquidação e Análise da Despesa (SELAD)" <selad@trt12.jus.br>

Boa tarde,

Prezada Simone,

Temos alguns parcelamentos de impostos junto a Receita Federal, desta forma nossa certidão é solicitada manualmente e pode levar até 10 dias para liberar. Segue em anexo a solicitação feita na receita.

Adriana Schereider
Gerente Administrativo

49 98910 0805 / 49 3425 9203
Rua Anita Garibaldi, 270 - Sala 301, Centro
Concórdia/SC - 89700-126
www.engasteempreendimentos.com.br

ENGASTE
SISTEMAS INOVADORES

I use the free version of Spam Reader to get rid of spam. The Professional version doesn't have this disclaimer in outgoing emails. Try Spam Reader for free now!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE DÉBITOS.pdf
282K



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

**Requerimento de Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais
e a Dívida da União**

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome / Nome Empresarial / Imóvel Rural ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	<input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> NIRF •08.578.161/0001-79	
Município CONCORDIA	UF SC	Telefone 4934412744

2. SOLICITANTE

Nome Andre Carlos Pagotto	CPF 001.114.089-54
------------------------------	-----------------------

3. TIPO DE CERTIDÃO PRETENDIDA

Negativa Positiva Positiva com efeitos de negativa

4. O PEDIDO BASEIA-SE EM DECISÃO JUDICIAL?

Não Sim, informe o número do processo judicial:

5. AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA

Deseja que terceiros retirem os documentos? Sim Não

Autorizo LEONARDO GAIOL CPF 077.726.159-65 a receber os relatórios de situação fiscal e complementar, extrato de débito inscrito em DAU ou a certidão positiva, responsabilizando-me pelo uso a ser dado aos referidos documentos e às informações neles contidos. Declaro, Sob as penas da lei, serem verdadeiros os fatos e comprovantes anexados a este documento.

Assinatura

Data 19/08/19

6. DOCUMENTOS RECEBIDOS (Não preencher)

<input type="checkbox"/> Relatórios de situação fiscal e/ou complementar <input type="checkbox"/> Extrato DAU <input type="checkbox"/> CND/CPEND <input type="checkbox"/> Certidão Negativa	
Assinatura	Data
Reservado para uso da RFB <input type="checkbox"/> RFB <input type="checkbox"/> PGFN <input type="checkbox"/> RFB E PGFN	Recepção

7. RECIBO DE REQUERIMENTO DE CERTIDÃO


Nome / Nome Empresarial / Imóvel Rural	<input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> NIRF
Não preencher - Reservado para uso da RFB	
<input type="checkbox"/> RFB <input type="checkbox"/> PGFN <input type="checkbox"/> RFB E PGFN	
1. Quando o requerimento for dirigido à PGFN, o interessado deverá acompanhar a tramitação deste, por meio do nº Sicar, no endereço: www.pgfn.gov.br . 2. A certidão emitida para a matriz terá validade para todos os demais estabelecimentos. 3. Após o deferimento do pedido, a CND e a CPEND poderão ser emitidas pela internet.	

ANEXO – V

ATESTADO DE CONFORMIDADE PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL			
CONTRATO/PROAD N°:	UNIDADE:		
EMPRESA CONTRATADA:	Empate		
PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:	11/12/2019		
RESPONSÁVEL:			
Item	SIM	NÃO	Não se aplica
1. NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
1.1 Houve anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2 Abertura de conta-depósito vinculada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3 Apresentação da garantia contratual	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4 Relação de todos os empregados que prestarão serviço	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.5 Houve o encaminhamento dos exames admissionais dos empregados	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6 Outros documentos exigidos no edital/contrato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. NA LIQUIDAÇÃO MENSAL DA NOTA FISCAL:			
2.1 O Fiscal de Contrato atestou a conformidade na prestação dos serviços (Caso afirmativo informar o número do marcador do referido documento do respectivo proad)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3 Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Período da prestação de serviços está correto (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 Caso haja falta informada pelo Fiscal do Contrato, verificar se houve desconto respectivo na Nota Fiscal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. A CONTRATADA FORNECEU TODA A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DA MÃO DE OBRA DIRETAMENTE ENVOLVIDA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:			
3.1 Aviso de férias e os respectivos comprovantes de quitação ao trabalhador	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2 Comprovantes de pagamento dos salários, vale-transporte e auxílio-alimentação dos empregados e cartão ponto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.3 Verificar se a empresa realizou a retenção da contribuição previdenciária	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Verificar se a empresa realizou o recolhimento dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DO FGTS POR MEIO DE:			
4.1 Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Cópia da relação de Tomadores/Obras (RET)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. COMPROVANTE DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS POR MEIO DE:			
5.1 Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Cópia do comprovante de declaração à Previdência	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante do recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.4 Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE)	X	
5.5 Cópia da relação de Tomadores/Obras (RET)	X	
6. NA ADMISSÃO/SUBSTITUIÇÃO DE TRABALHADORES:		
6.1 Houve anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social?		X
6.2 Houve encaminhamento dos exames admissionais dos empregados?		X
7. NA DISPENSA DE TRABALHADORES:		
7.1 Termo de rescisão de contrato de trabalho, devidamente homologado pelo Sindicato da categoria profissional do trabalhador	X	
7.2 Comprovante das verbas rescisórias devidamente assinado		X
7.3 Exames médicos demissionais dos empregados		X
7.4 Notificação de aviso prévio		X
8. VALIDADE DAS CERTIDÕES NEGATIVAS:		
8.1 Certidão negativa de débitos trabalhistas	X	
8.2 GPS (INSS)	X	
8.3 GRF (GFTS)	X	
8.4 Certidão conjunta de débitos relativos as Tributos Federais	X	
8.5 Certidão Dívida Ativa da União	X	
8.6 Certidão Negativa de Débitos Salariais	X	
8.7 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	X	
8.8 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	X	
9. OUTROS ITENS PREVISTOS NO EDITAL/CONTRATO		
9.1		
9.2		
9.3		
9.4		
9.5		
9.6		


 Simone Bonatelli Cardoso
 Técnico Judiciário


ATA EMISSAO : 26Ago19 VENCIMENTO: 26Ago19 NUMERO : 2019DF800892
3/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
ONTRIBUINTE : 08578161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPO
ECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
ROCESSO : CP-8056/2018 DOC.ORIGEM 080013 / 00001 / 2019NP001244
PERIODO APURACAO : 26Ago19 PERCENTUAL :
EFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
ECEITA : 6147
ALORES BASE DE CALCULO : 206286,26
ECEITA : 12.067,75
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 26/08/19
TOTAL : 12.067,75
BSERVACAO

ecolhimento de IRRF e contribuições, retidas cfe. Instr. Normativa RFB 1234/2
12, ref.Pagamento da Nota Fiscal 608 - Reforma do prédio que abrigará a nova
sede do Fórum de Brusqué. 6a. Medição. Proad 8056/2018.

ANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 26Ago19 14:08
P1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAT PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Visto.
Em 29/08/19

Demilson D'Agostini
Conformidade de Registro de Gestão - DIGER



ATA EMISSAO : 26Ago19 NUMERO : 2019GP800169
3/GESTAO EMITENTE: 080013/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
ECOLHEDOR : 900002197472
CODIGO DE PGTO : 2682 - CONTRIB RET S/A NF/FATURA PRESTADORA SERV-CEI
COMPETENCIA : AGO19
ECURSO : 3
ROCESSO : CP-8056/2018
DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2019NP001244 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 3582 , EM 26/08/19
VALOR INSS : 9.430,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 9.430,58

BSERVACAO

ecolhimento de contribuição, retida cfe. Instr. Normativa RFB 971/2009, ref. pagamento da Nota Fiscal 608 - Reforma do prédio que abrigará a nova sede do F

rum de Brusque. 6a. Medição. Proad 8056/2018. Retido R\$ 1.714,65 ref. ISS.

ANCADO POR : 58654976934 - GAMBA UG : 080013 26Ago19 14:09

F1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

— SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) —

27/08/19 17:55

USUARIO : GAMBA

DATA EMISSAO : 26Ago19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB803833

UG/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A. REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 08578161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPO

BANCO : 748 AGENCIA : 0217 CONTA CORRENTE : 811910

DOCUMENTO ORIGEM : 080013/00001/2019NP001244 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004069011-3 PROCESSO : CP-8056/2018

VALOR : 183.073,28

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 26/08/19

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 608 - REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DO FÓRUM DE BRUSQUE. 6A. MEDIDA. PROAD 8056/2018. RETIDO R\$ 1.714,65 REF. ISS.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Visto.

Em 29/08/19

Demilson Dagostim
Contabilidade de Registro de Gestão - CCRG



ATA EMISSAO : 26Ago19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB803833
G/GESTAO EMITENTE: 080013 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGI
BANCO : 001 AGENCIA : 3582 CONTA CORRENTE : 997380632
AVORECIDO : 08578161/0001-79 - ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORPO
BANCO : 748 AGENCIA : 0217 CONTA CORRENTE : 811910
VALOR : 183.073,28

EVENTO	INSCRIÇÃO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
1 401006 2018NE001261400		33903916		49.097,82
2 401006 2018NE001262400		33903916		133.975,46
3 531814 2018NE001261	213110400	33903916		49.097,82
4 531814 2018NE001262	213110400	33903916		133.975,46
5 561602 0100000000400C				133.975,46
6 561602 0350151130400C				49.097,82

ANCADO POR : 57841063920 - MARCUS VINICIUS UG : 080013 26Ago19 15:47
F1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
